



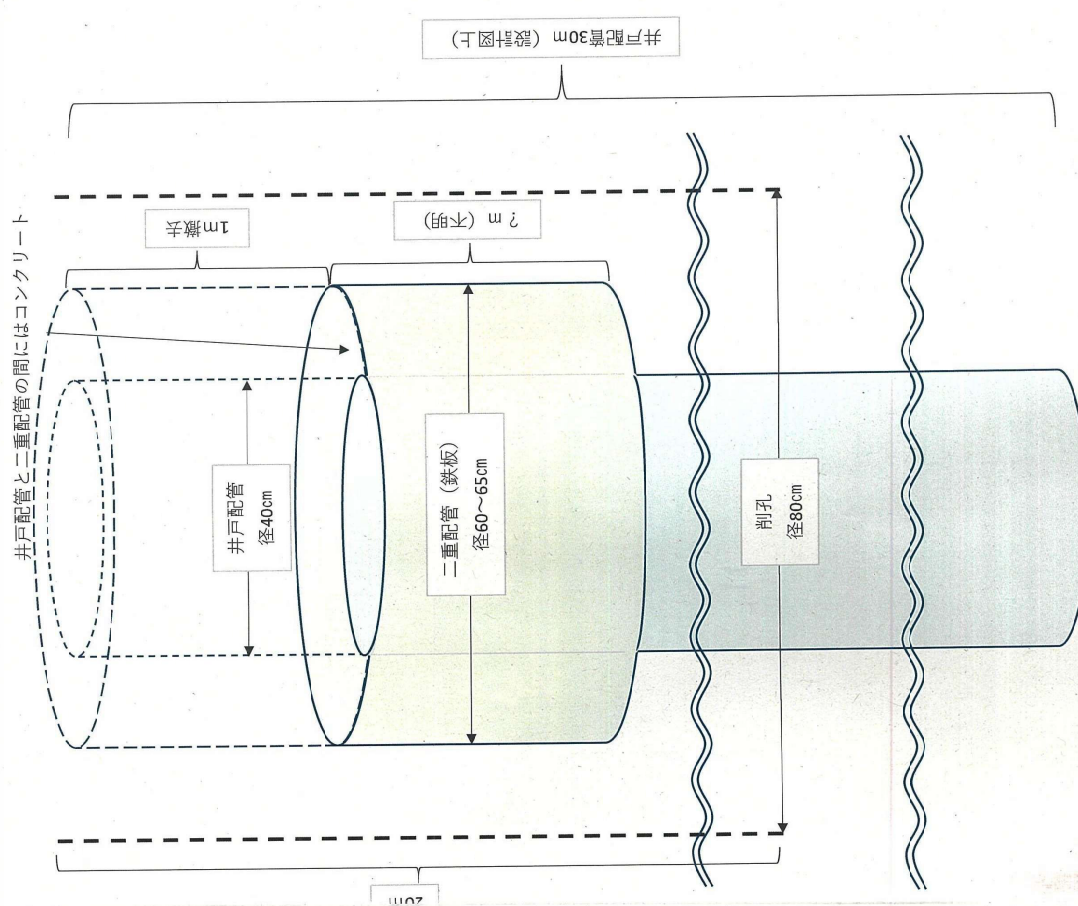



二重配管は地表からの雨水等の侵入を防ぐためのものであるため、地表から数m程度だと思われる。


残置物一覧 2023/08/31

残置物名		数量/単位	備考
①	基礎外端部	76 個	H=300mm φ=300mm ユニット製品円錐形状
②	浅井配管 (ケーシング)	1 本	H=10.4m φ=250mm 鋼製
③	井戸息抜きパイプ	1 本	塩ビ管VP25 L=2.0m
④	浅井配管 (ケーシング)	1 本	H=29.0m φ=400mm 鋼製
⑤	二重配管 (井戸配管周囲)	1 本	H=不明 φ=600mm~650mm ユニット及び鉄板
⑥	井戸息抜きパイプ	1 本	塩ビ管VP25 L=6.0m

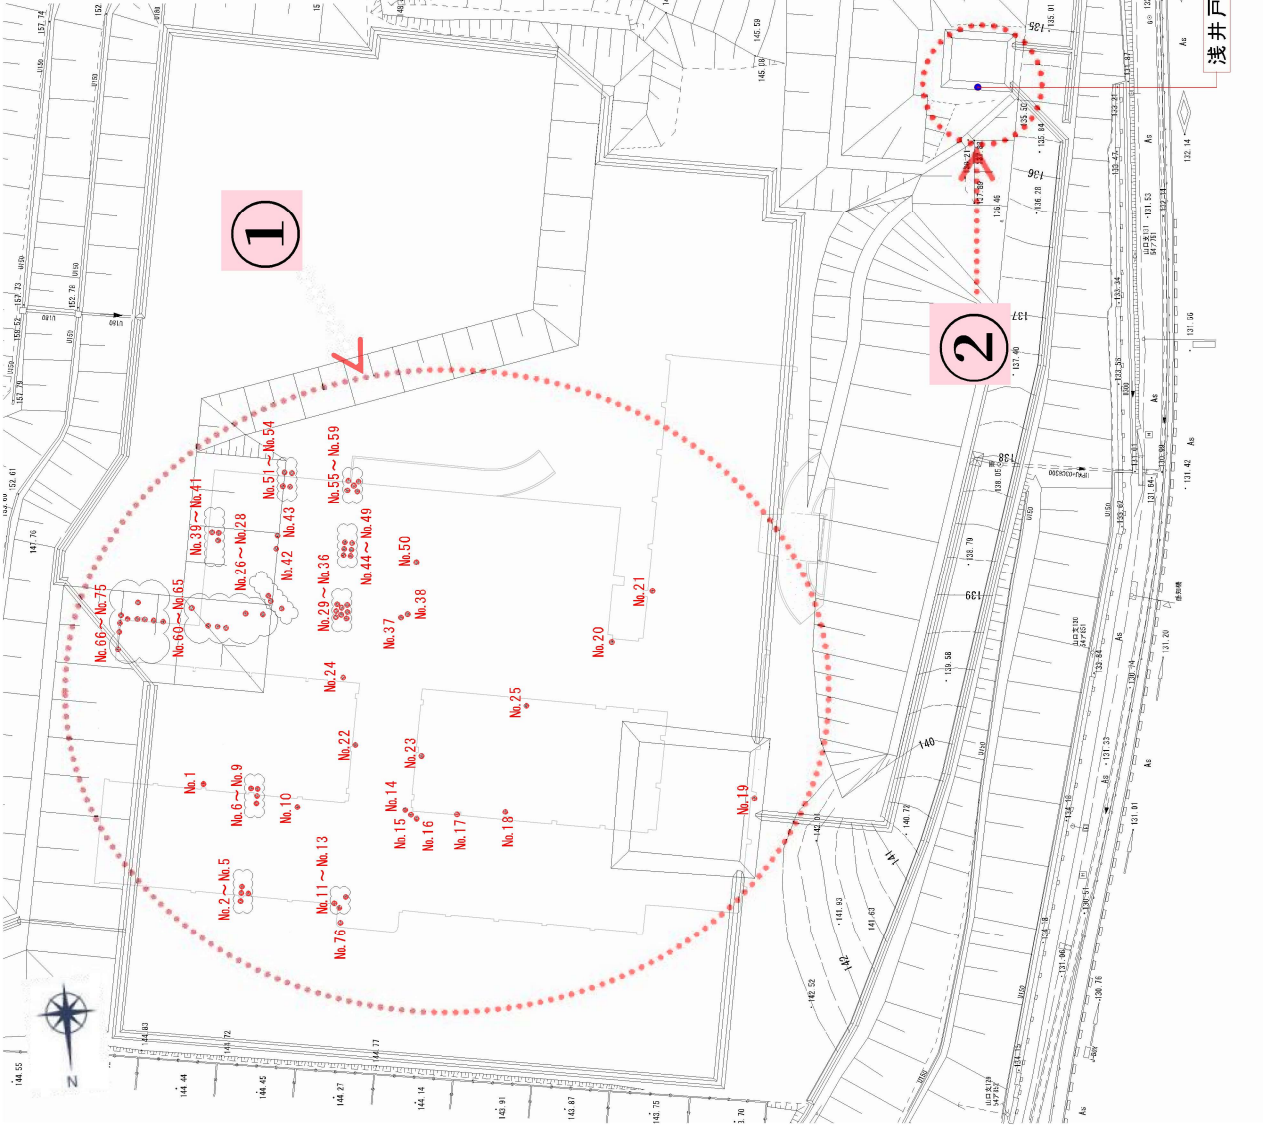

先端残杭位置図 2023/08/26

-  . . . 杭引抜施工範囲
-  . . . 杭先端残置箇所

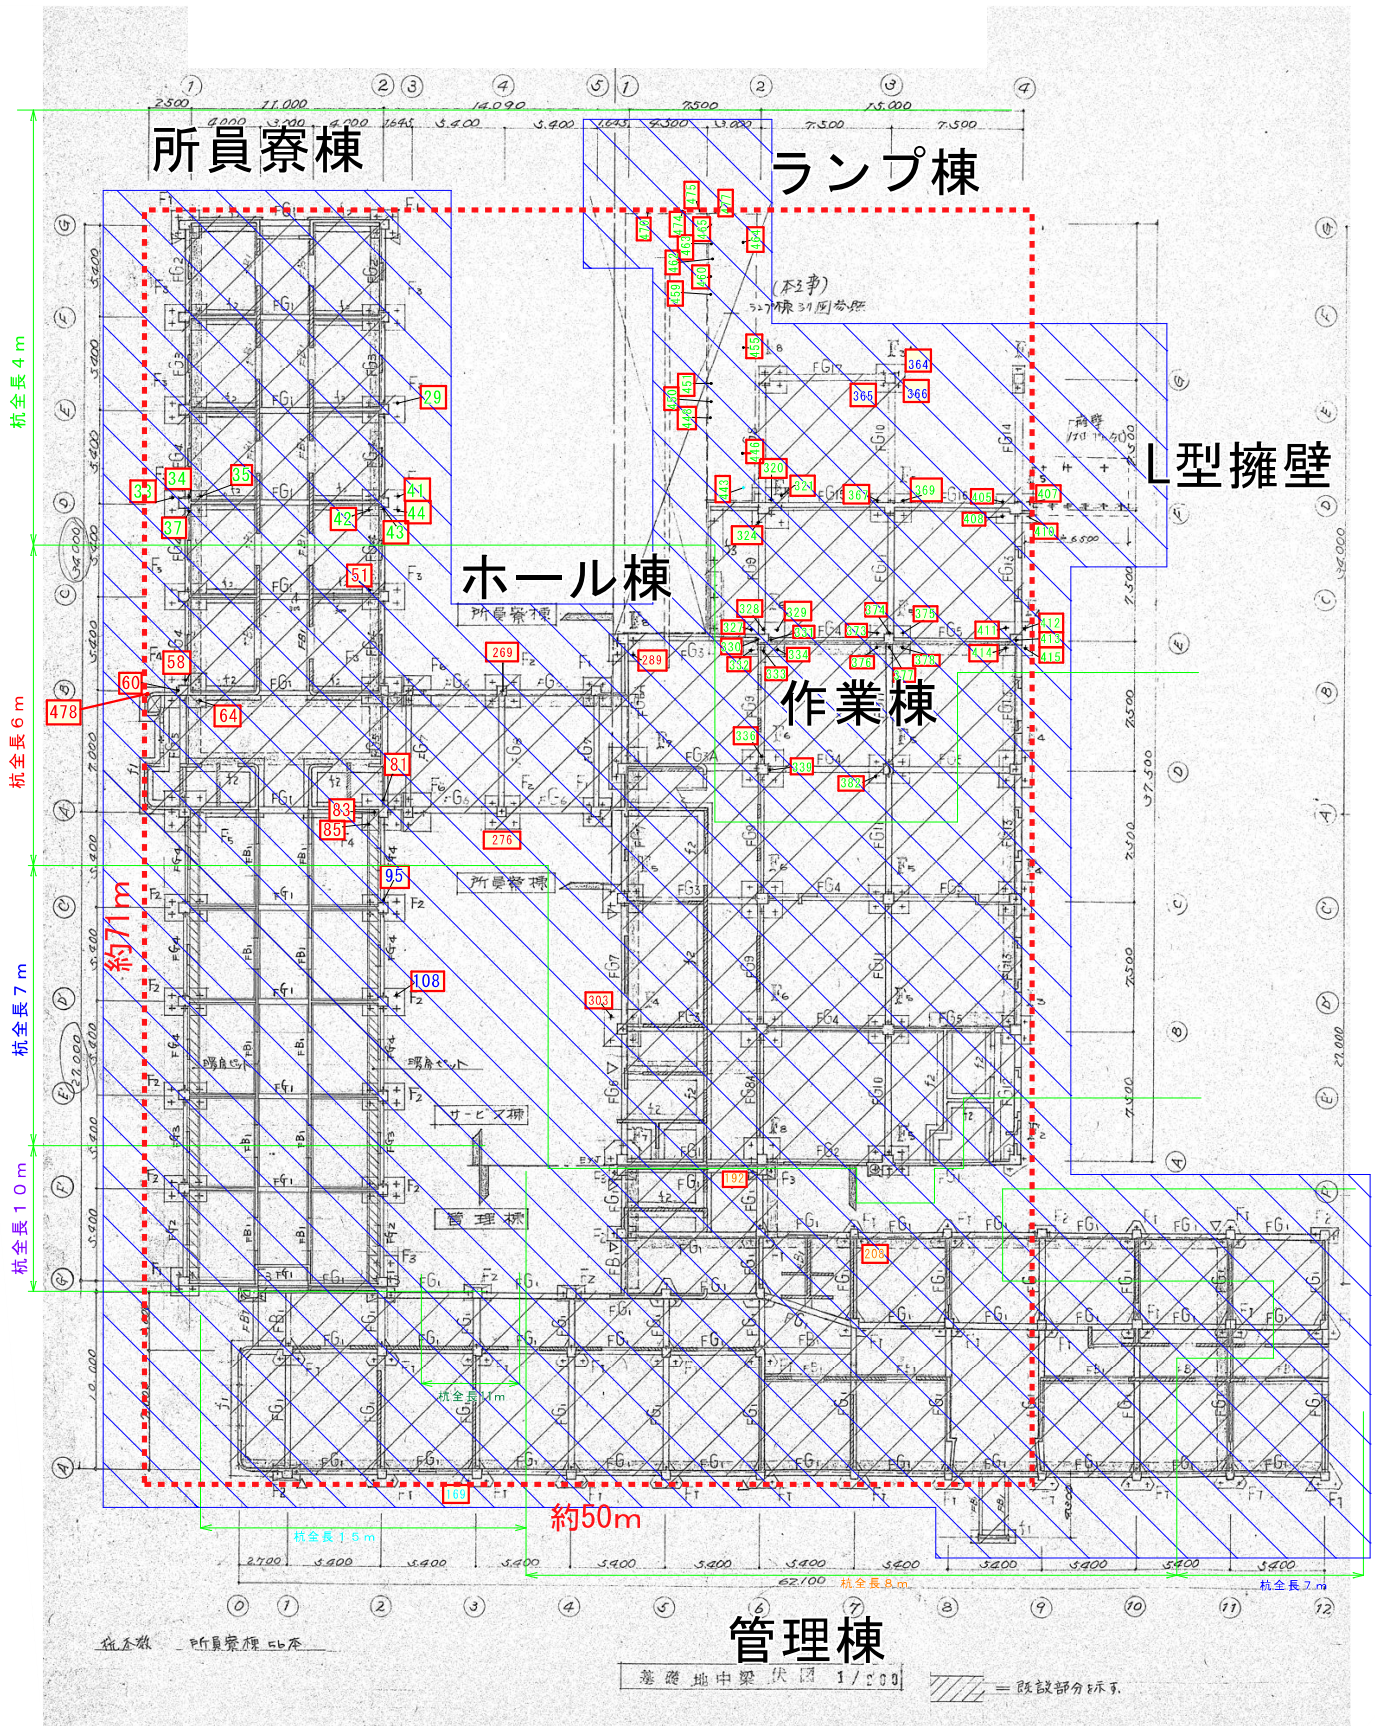

先端残杭一覽表 2023/10/31

- ・緑線③：確認できなかつた杭
- ・緑線④：杭全長4mを示す
- ・赤線⑤：杭全長6mを示す
- ・青線⑥：杭全長7mを示す

○ 中折杭を示す

航番号	設計長さmm	実測値mm	完了日	備考	分科用番号
No.29	10,000	3,100	2/24	所員寮様	1 P
No.33	10,000	3,240	2/24	所員寮様	2 P
No.34	10,000	2,940	2/24	所員寮様	3 P
No.35	10,000	3,000	2/24	所員寮様	4 P
No.37	10,000	2,600	2/24	所員寮様	5 P
No.41	10,000	2,900	2/24	所員寮様	6 P
No.42	10,000	3,200	2/24	所員寮様	7 P
No.43	10,000	3,180	2/24	所員寮様	8 P
No.44	10,000	3,060	2/24	所員寮様	9 P
No.51	10,000	5,300	3/4	所員寮様	10 P
No.58	10,000	3,700	2/25	所員寮様	11 P
No.60	10,000	3,700	2/25	所員寮様	12 P
No.64	10,000	4,500	2/25	所員寮様	13 P
No.81	10,000	3,400	3/3	所員寮様	14 P
No.83	10,000	2,700	3/3	所員寮様	15 P
No.85	10,000	3,200	3/3	所員寮様	16 P
No.95	10,000	5,600	3/2	所員寮様	17 P
No.108	10,000	6,400	3/1	所員寮様	18 P
No.169	10,000	13,900	3/6	駕道様	19 P
No.192	10,000	4,300	3/16	駕道様	20 P
No.208	10,000	6,650	3/18	駕道様	21 P
No.269	10,000	2,600	3/7	ホール様	22 P
No.276	10,000	2,900	3/7	ホール様	23 P
No.289	10,000	3,200	3/9	作業様	24 P
No.303	10,000	5,110	3/15	作業様	25 P
No.320	10,000	2,900	3/9	作業様	26 P
No.321	10,000	2,600	3/9	作業様	27 P
No.324	10,000	2,800	3/9	作業様	28 P
No.327	10,000	2,880	3/13	作業様	29 P
No.328	10,000	3,000	3/13	作業様	30 P
No.329	10,000	3,080	3/13	作業様	31 P
No.330	10,000	3,140	3/13	作業様	32 P
No.331	10,000	2,940	3/13	作業様	33 P
No.332	10,000	3,260	3/13	作業様	34 P
No.333	10,000	3,240	3/13	作業様	35 P
No.334	10,000	3,200	3/13	作業様	36 P
No.336	10,000	2,780	3/14	作業様	37 P
No.339	10,000	2,860	3/14	作業様	38 P
No.364	10,000	4,700	3/11	作業様	39 P
No.365	10,000	5,200	3/11	作業様	40 P
No.366	10,000	5,300	3/11	作業様	41 P
No.367	10,000	2,360	3/11	作業様	42 P
No.369	10,000	2,800	3/11	作業様	43 P
No.373	10,000	3,080	3/13	作業様	44 P
No.374	10,000	3,100	3/13	作業様	45 P
No.375	10,000	3,220	3/13	作業様	46 P
No.376	10,000	2,900	3/13	作業様	47 P
No.377	10,000	2,840	3/13	作業様	48 P
No.378	10,000	3,300	3/13	作業様	49 P
No.382	10,000	3,200	3/14	作業様	50 P

先端残杭一覽表 2023/10/31

- ・黒部川：確認できなかった杭
- ・緑部川：杭全長4mを示す
- ・赤部川：杭全長6mを示す
- ・青部川：杭全長7mを示す

○ 中新統を示す

杭番号	設計長さmm	実測値mm	完了日	備考	実測値mm
No.405	10,000	2,800	3/13	作業機	51 P
No.407	10,000	3,000	3/13	作業機	52 P
No.408	10,000	3,100	3/13	作業機	53 P
No.410	10,000	3,300	3/13	作業機	54 P
No.411	10,000	2,730	3/13	作業機	55 P
No.412	10,000	2,990	3/13	作業機	56 P
No.413	10,000	3,000	3/13	作業機	57 P
No.414	10,000	3,180	3/13	作業機	58 P
No.415	10,000	2,940	3/13	作業機	59 P
No.443	10,000	2,900	3/10	ランプ壁	60 P
No.446	10,000	2,900	3/10	ランプ壁	61 P
No.448	10,000	2,700	3/10	ランプ壁	62 P
No.450	10,000	2,900	3/10	ランプ壁	63 P
No.451	10,000	2,600	3/10	ランプ壁	64 P
No.455	10,000	2,300	3/10	ランプ壁	65 P
No.459	10,000	2,900	3/10	ランプ壁	66 P
No.460	10,000	3,160	3/10	ランプ壁	67 P
No.462	10,000	3,060	3/10	ランプ壁	68 P
No.463	10,000	3,200	3/10	ランプ壁	69 P
No.464	10,000	2,700	3/10	ランプ壁	70 P
No.465	10,000	3,200	3/10	ランプ壁	71 P
No.470	10,000	2,240	3/10	ランプ壁	72 P
No.474	10,000	3,100	3/10	ランプ壁	73 P
No.475	10,000	3,100	3/10	ランプ壁	74 P
No.477	10,000	3,100	3/10	ランプ壁	75 P
478	10,000	4,060	2/25	所員壁	76 P

井戸撤去結果一覧

2023.08.31


	サイズ等	浅井戸①	浅井戸②
設計図	井戸配管径	250mm	400mm
設計図	長さ	27m	30m
井戸内部深さ	GL～井戸底まで	15.55m	26.9m
回収工法	掘削工法	オーガ-ケーシング工法	オーガ-ケーシング工法
掘削長さ	掘削長さ	18.7m	20m
回収長さ	井戸配管 (ケーシング)	16.6m	1m
回収長さ	ポンプ配管	22.9m	26.05m

残置長さ (推定)	井戸配管 (ケーシング)	10.4m	29.0m (鉄板+コンクリート詰込2m以深)
残置長さ	ポンプ配管	0m	0m

井戸配管撤去施工報告書 浅井戸① 2023/08/07

浅井戸①：井戸配管（ケーシング）16.6m撤去済（地中に10.4m程度残置を想定）
 〃 井戸ポンプ配管 22.9m撤去済（電源ケーブル、水位センサー、同ケーブル共）
 自然水位：現GL-1.1m

※井戸配管（ケーシング）は腐食により途中で破断した為、撤去する事が出来ました。

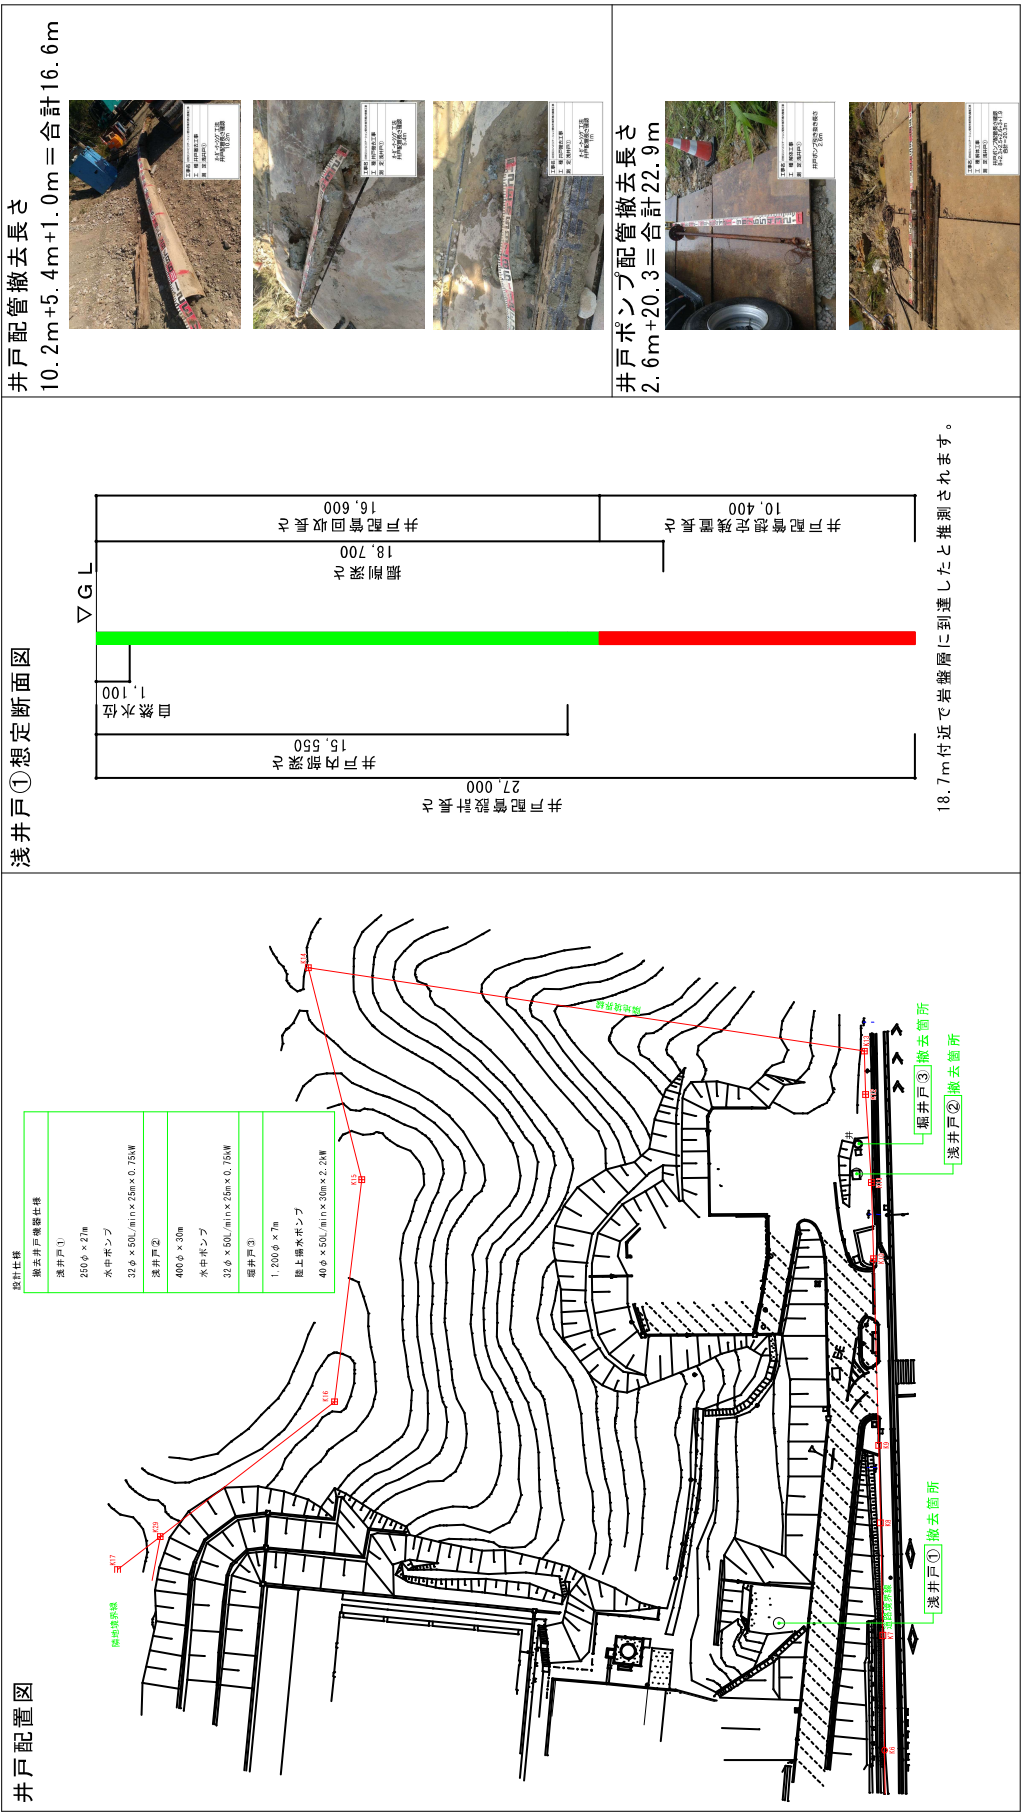

井戸配管撤去施工報告書 浅井戸② 2023/08/07


浅井戸②：井戸配管（ケーシング）1m撤去済（地中に29m程度残置を想定）

井戸ポンプ配管 26.05m 撤去済 (電源ケーブル、水位センサー、同ケーブル共)


自然水位：現GL-1.45m

※井戸配管（ケーシング）は腐食しておらずGL-約20m以深も一体となっていた為、撤去する事が出来ませんでした。（後日、上部1.0mを撤去済）

圖畫記凡井

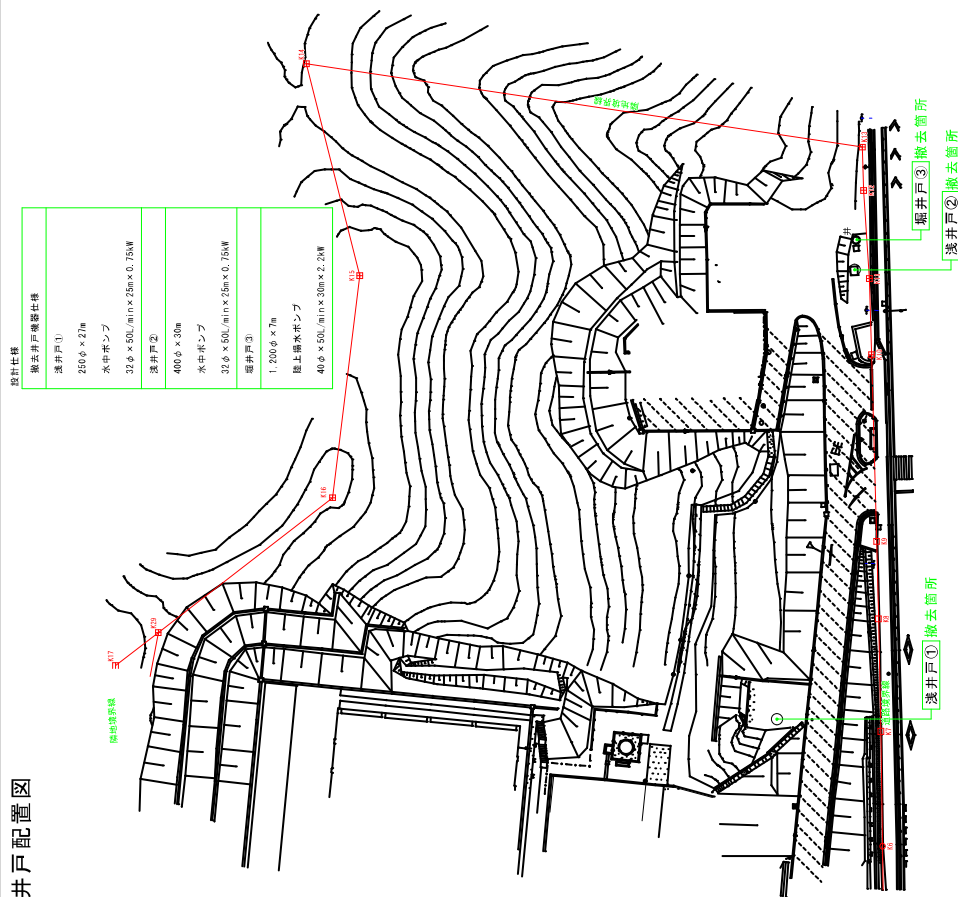

図面想定②浅井戸

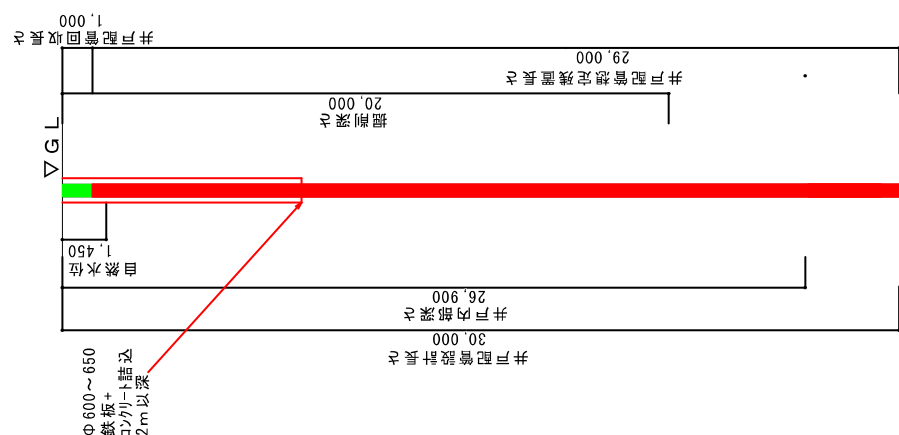

20m付近で岩盤層に到達したと推測されます。

井戸配管撤去長七

1 m



井戸ポンプ配管撤去長さ
 $3.65 + 2.8 \times 8 =$ 合計 26.05m



※黒板の計算が間違っております。

先端殘置杭位置圖



先端残置杭座標値

	X	Y
K1	-7.651m	-104.931m
K22	0	0
K26	-0.594m	-77.050m
K27	-3.442m	-72.306m
K32	1.063m	33.048m


[illegible]

※境界点K22を原点 (0, 0) とする。
先端残置杭座標値及び境界点座標値はK22からの値です。
先端残置杭の位置に関しては、設計図面（基礎図面 A20）より抽出して作図しております。

埋設物確認範囲図

※範囲内をBIM/MITにて深さ1.5mの範囲を埋設物が残置していないか確認を行なう。
埋設配管路（赤線・青線）部分は重点的に施工する。

		完了確認チェック欄	
		施工日	完了確認日
1工区	施工日	3/31	3/31
	完了確認日	3/31	3/31
2工区	施工日	3/31	3/31
	完了確認日	3/31	3/31
3工区	施工日	3/22~27	3/27
	完了確認日	3/27	3/27
4工区	施工日	3/22~27	3/27
	完了確認日	3/27	3/27
5工区	施工日	3/15~30	3/30
	完了確認日	3/30	3/30
6工区	施工日		
	完了確認日		

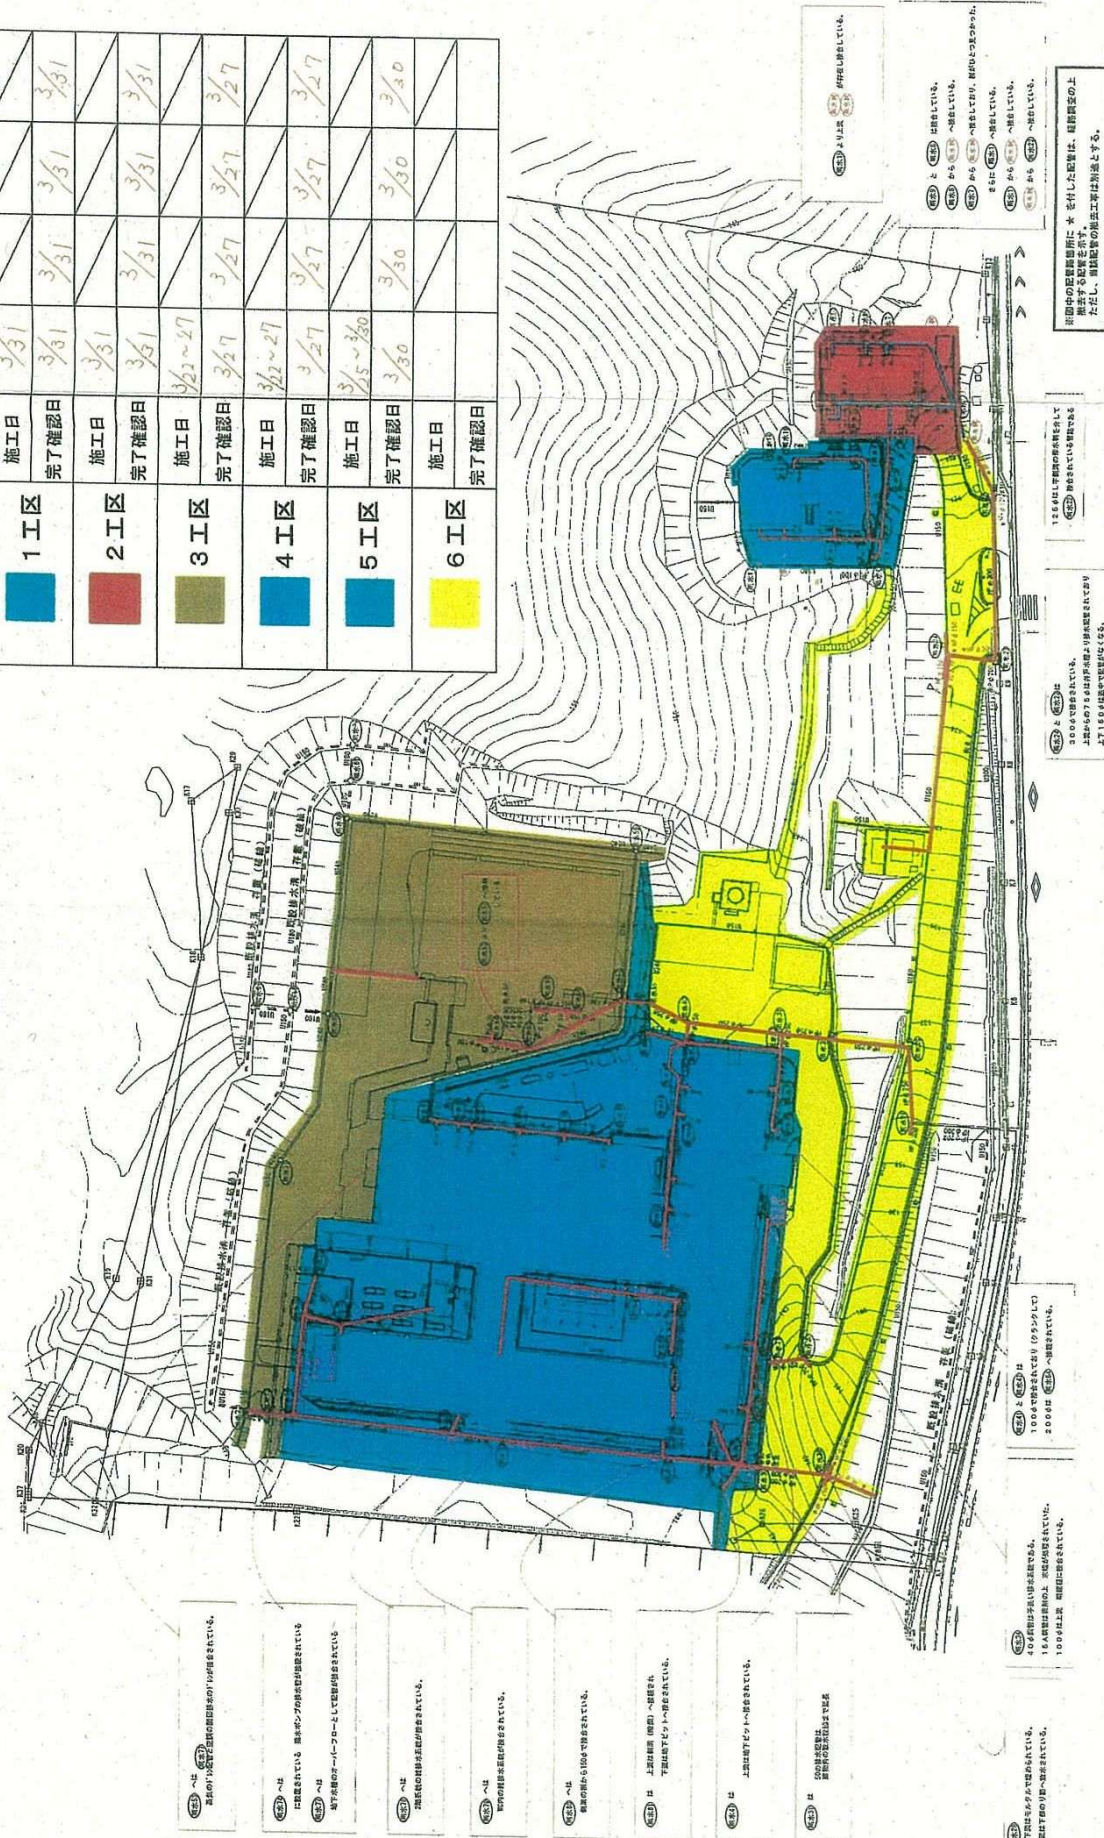





塩ビ管①

K9東側に設置、φ 125mm



塩ビ管②

K7東側に設置、φ 250mm



コルゲート管（北側から撮影）

K10北東側に設置

φ 1100mm



コルゲート管（南側から撮影）

K10北東側に設置

φ 1100mm
