

## 第Ⅱ編 共 通 工

第1章	土	工	.....	Ⅱ-1-①-1
第2章	共	通	工	..... Ⅱ-2-①-1
第3章	基	礎	工	..... Ⅱ-3-①-1
第4章	コンクリート工			..... Ⅱ-4-①-1
第5章	仮	設	工	..... Ⅱ-5-①-1

## 第1章 土 工

① 土量変化率等……………Ⅱ-1-①- 1	⑤-2 安定処理工(自走式土質改良工)
1 土量の変化……………Ⅱ-1-①- 1	……………Ⅱ-1-⑤- 4
2 土量変化率……………Ⅱ-1-①- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-1-⑤- 4
3 適用土質及び機械損料補正……………Ⅱ-1-①- 2	2 施工概要……………Ⅱ-1-⑤- 4
4 土質の区分の対応……………Ⅱ-1-①- 3	3 自走式土質改良機設置・撤去工……………Ⅱ-1-⑤- 4
5 岩質の判定基準……………Ⅱ-1-①- 4	4 土質改良工……………Ⅱ-1-⑤- 5
6 積算上の土質の区分……………Ⅱ-1-①- 5	5 単価表……………Ⅱ-1-⑤- 6
7 積算上の床掘り勾配及び余裕幅 （土木工事数量算出要領）……………Ⅱ-1-①- 6	⑥ 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)
8 建設副産物の取扱い……………Ⅱ-1-①- 7	……………Ⅱ-1-⑥- 1
② 土工……………Ⅱ-1-②- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-1-⑥- 1
②-1 土工……………Ⅱ-1-②- 1	2 施工概要……………Ⅱ-1-⑥- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-1-②- 1	3 機種の選定……………Ⅱ-1-⑥- 1
2 施工概要……………Ⅱ-1-②- 3	4 機械の施工歩掛……………Ⅱ-1-⑥- 2
3 施工パッケージ……………Ⅱ-1-②- 7	5 単価表……………Ⅱ-1-⑥- 3
②-2 土工( I C T )……………Ⅱ-1-②-32	⑦ (参考歩掛)伐採工……………Ⅱ-1-⑦- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-1-②-32	1 適用範囲……………Ⅱ-1-⑦- 1
2 施工概要……………Ⅱ-1-②-32	2 施工歩掛……………Ⅱ-1-⑦- 1
3 施工パッケージ……………Ⅱ-1-②-33	
4 I C T建設機械経費加算額……………Ⅱ-1-②-39	
5 その他 I C T建設機械経費等……………Ⅱ-1-②-39	
6 参考資料……………Ⅱ-1-②-40	
③ 作業土工……………Ⅱ-1-③- 1	
③-1 床掘工……………Ⅱ-1-③- 1	
1 適用範囲……………Ⅱ-1-③- 1	
2 施工概要……………Ⅱ-1-③- 2	
3 施工パッケージ……………Ⅱ-1-③- 4	
③-2 埋戻工……………Ⅱ-1-③- 8	
1 適用範囲……………Ⅱ-1-③- 8	
2 施工概要……………Ⅱ-1-③- 8	
3 施工パッケージ……………Ⅱ-1-③- 8	
④ 人力運搬工……………Ⅱ-1-④- 1	
1 適用範囲……………Ⅱ-1-④- 1	
2 施工概要……………Ⅱ-1-④- 1	
3 施工パッケージ……………Ⅱ-1-④- 2	
⑤ 安定処理工……………Ⅱ-1-⑤- 1	
⑤-1 安定処理工……………Ⅱ-1-⑤- 1	
1 適用範囲……………Ⅱ-1-⑤- 1	
2 施工概要……………Ⅱ-1-⑤- 1	
3 施工パッケージ……………Ⅱ-1-⑤- 2	

# 第1章 土 工

## ① 土量変化率等 （建地－Ⅰ）

### 1. 土量の変化

土量の変化は次の3つの状態の土量に区分して考える。

地山の土量……………掘削すべき土量

ほぐした土量……………運搬すべき土量

締固め後の土量……………出来上がりの盛土量

三つの状態の体積比を次式のように表わし、L及びCを土量の変化率という。

$$L = \frac{\text{ほぐした土量 (m}^3\text{)}}{\text{地山の土量 (m}^3\text{)}}$$

$$C = \frac{\text{締固め後の土量 (m}^3\text{)}}{\text{地山の土量 (m}^3\text{)}}$$

土量の配分計画を立てる場合には、この土量変化率を用いて、切土、盛土の土量計算を行う。

### 2. 土量変化率

統一分類法により分類した土の各土質に応じた変化率は、表2.1を標準とする。なお、細分し難いときは、表2.2を使用してよい。

表2.1 土量の変化率

分 類 名 称			変化率L	変化率C
主 要 区 分		記 号		
レキ質土	レ キ	(GW) (GP) (GPS) (G-M) (G-C)	1.20	0.95
	レキ質土	(GM) (GC) (GO)	1.20	0.90
砂及び 砂質土	砂	(SW) (SP) (SPu) (S-M) (S-C) (S-V)	1.20	0.95
	砂質土 (普通土)	(SM) (SC) (SV)	1.20	0.90
粘性土	粘性土	(ML) (CL) (OL)	1.30	0.90
	高含水比 粘性土	(MH) (CH)	1.25	0.90
岩塊・玉石			1.20	1.00
軟 岩 Ⅰ			1.30	1.15
軟 岩 Ⅱ			1.50	1.20
中 硬 岩			1.60	1.25
硬 岩 Ⅰ			1.65	1.40

(注) 本表は体積(土量)より求めたL, Cである。

表 2.2 土量の変化率

分類名称	変化率L	変化率C	1/C	L/C
主 要 区 分				
レキ質土	1.20	0.90	1.11	1.33
砂及び砂質土	1.20	0.90	1.11	1.33
粘性土	1.25	0.90	1.11	1.39

- (注)1. 本表は体積（土量）より求めたL，Cである。  
 2. 1/Cは「締固め後の土量」を「地山の土量」に換算する場合に使用する。  
 3. L/Cは「締固め後の土量」を「ほぐした土量」に換算する場合に使用する。

## 3. 適用土質及び機械損料補正

表 3.1 適用土質及び機械損料補正

分類名称	掘削積込		ダンプトラック運搬		敷均し・締固め 損料補正
	適用土質	損料補正	適用土質	損料補正	
レキ質土	レキ質土	1.00	土砂	1.00	1.00
砂・砂質土	砂・砂質土	1.00	〃	1.00	1.00
粘性土	粘性土	1.00	〃	1.00	1.00
岩塊・玉石	岩塊・玉石	1.00	〃	1.00	1.00
軟岩（Ⅰ）	レキ質土	1.00	軟岩	1.00	1.00
軟岩（Ⅱ）	〃	1.00	〃	1.00	1.00
中硬岩	破碎岩	1.25	硬岩	1.25	1.25
硬岩（Ⅰ）	〃	1.25	〃	1.25	1.25

- (注)1. 軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩Ⅰの掘削積込は，「ルーズな状態」に適用する。  
 2. 各土質の分類名称の定義は，土木工事共通仕様書による。  
 3. 機械損料補正は歩掛のみに適用する。なお，施工パッケージについては，パッケージ単価に岩石作業における機械損料の影響を含んでいる。



## 4. 土質区分の対応

土木工事共通仕様書における土質分類と積算条件の土質区分の関係は、以下のとおりである。

表 4. 1 適用土質(1)

施工パッケージ 区分 分類名称	掘削	床掘り・ 埋戻し	掘削 (砂防)	積込 (ルーズ)	人力積込	積込 (ルーズ) (砂防)	押土 (ルーズ)	押土 (ルーズ) (砂防)
レキ質土	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂	土砂
砂・砂質土								
粘性土								
岩塊・玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石	岩塊・ 玉石
軟岩Ⅰ	軟岩	—	軟岩	土砂	軟岩	土砂	土砂	土砂
軟岩Ⅱ								
中硬岩	硬岩	—	硬岩	破碎岩	中硬岩	破碎岩	破碎岩	破碎岩
硬岩					硬岩			
転石	—	—	転石	—	—	—	—	—

表 4. 2 適用土質(2)

施工パッケージ 区分 分類名称	法面整形	土砂等運搬	土砂等運搬 (砂防)	人肩運搬 小車運搬 ベルトコンベヤ（ポータブル） 併用人力掘削 ベルトコンベヤ（ポータブル） 併用人力積込
レキ質土	レキ質土，砂・砂質土， 粘性土	土砂	土砂	土砂
砂・砂質土				
粘性土				
岩塊・玉石	—			岩塊・玉石
軟岩Ⅰ	軟岩Ⅰ	軟岩	軟岩	—
軟岩Ⅱ	軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩			—
中硬岩		硬岩	硬岩	—
硬岩Ⅰ				
転石	—	—	—	—

## 5. 岩質の判定基準

表 5.1 岩質の判定基準

国土交通省岩分類	岩種グループ別	変成岩及び堆積岩										堆積岩						火成岩											
		主として古生代										中生代				第三紀		深成岩					火山岩						
		片麻岩	砂質片岩	黒色片岩	緑色片岩	千枚岩	珪岩・角岩	石灰岩	砂岩	粘板岩	輝緑凝灰岩	粘板岩	頁岩	砂岩	れき岩	頁岩泥岩	砂岩	凝灰岩	凝灰角礫岩	花こう岩	セン緑岩	ハンレイ岩	カンラン岩	蛇紋岩	流紋岩	ヒン岩	安山岩	玄武岩	集塊岩
軟岩Ⅰ	A	●			●		●	●		●			●	●		▲			●	●				●	●		●	●	
	B			△		●				●	▲	▲			△	△	●	●					▲						▲
軟岩Ⅱ	A	▲	●		●		●	▲	▲	▲			▲	▲		○	○		▲	▲	●	●	△	▲	●	●	▲	▲	
	B		▲	○	▲	▲			▲	△	△	△		△	◎	◎	△	△	△	▲	▲	▲	△	△	▲	▲	▲	▲	○
中硬岩	A	△	▲		△		▲	○	△	△			△	○					△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	
	B		▲	◎		△			△	○	◎	◎		○			◎	◎		△	△	△	△						
硬岩Ⅰ	A	○	△		○		○			○			○						◎	◎	◎	◎		○	○	○	○	○	
	B	◎	○		◎	◎			◎															◎	◎	◎	◎	◎	
硬岩Ⅱ	A		◎				○																						
	B																												

● 全体に変化が進み変色しているもの。

△ 割れ目に沿って風化変色が少なく、岩片内部は新鮮なもの。

▲ 割れ目に沿って幅広く風化しているが球状、レンズ状に未風化部を残すもの。

○ 割れ目が少なく風化変色がほとんどなく新鮮で硬いもの。

◎ 岩石が特に硬く全く新鮮なもの。

＊ Aグループは、花崗岩・安山岩・砂岩・珪岩のように、造岩物質、固結度共に硬く、風化が進み、亀裂が入って、弾性波速度が遅くても、岩片耐圧強度の高い岩種類。

＊ Bグループは、頁岩・粘板岩・黒色片岩のように、造岩物質が軟らかく、風化が進むと泥化し新鮮なもので弾性波速度が早くても、岩片耐圧強度の低い岩種類。

## 6. 積算上の土質の区分（県－Ⅰ）

## 土の分類

(1) 土：レキ質土、砂、砂質土、粘性土、高含水粘性土で切土及び掘削に際し、ブルドーザー等が有効に利用できるもの。

(2) 玉石混じり土の積算は次のとおりとする。

イ 玉石混じり土とは粒径 7.5cm 以上の混入率がおおむね 30%以上混入されていると判断され、かつ、20cm 以上の岩塊、玉石が混じっている土質をいう。

ロ 混入率が 50%を超える場合は機械損料が補正されるので採用にあたっては慎重を要する。

(3) 転石混じり土の積算は次のとおりとする。

イ 転石混じり土は、転石部分を火薬もしくはブレーカー類等で破碎し機械積込、運搬は破碎岩（硬岩）として扱い、土砂部分と区別するものとする。

又、法面整形についても、転石部分（岩）と土砂部分を区別する。

ロ 転石混じり土区分（100m<sup>3</sup>中の転石と土砂の比率）は下表を標準とする。

区 分	転石混じり土（Ⅰ）	転石混じり土（Ⅱ）	転石混じり土（Ⅲ）
転 石 量	5～20%	20～35%	35～50%
転 石	12m <sup>3</sup>	27m <sup>3</sup>	42m <sup>3</sup>
土 砂	88m <sup>3</sup>	73m <sup>3</sup>	58m <sup>3</sup>

転石とは、1ヶ0.5m<sup>3</sup>（球体では、直径約 1m）以上のものをいう。

(4) 土丹、硬粘土、陶土等の積算は次のとおりとする。

が「土丹」「硬粘土」「陶土」等の場合は、軟岩（Ⅰ）相当として準用する。

(5) 軟岩（Ⅰ）の破碎後はレキ質土扱いとして変化率（C）は 1.15 とする。

## 7. 積算上の床掘り勾配及び余裕幅（土木工事数量算出要領）


オープン掘削の床掘り勾配は、下表のとおりとする。

土質区分	掘削面の高さ	床掘り勾配	小段の幅
中硬岩・硬岩	5m 未満	直	—
	全掘削高 5m 以上	1 : 0. 3	下から H=5m 毎に 1m
軟岩Ⅰ・軟岩Ⅱ	1m 未満	直	—
	1m 以上 5m 未満	1 : 0. 3	—
	全掘削高 5m 以上	1 : 0. 3	下から H=5m 毎に 1m
レキ質土・砂質土 粘性土・岩塊玉石	1m 未満	直	—
	1m 以上 5m 未満	1 : 0. 5	—
	全掘削高 5m 以上	1 : 0. 6	下から H=5m 毎に 1m
砂	5m 未満	1 : 1. 5	—
	全掘削高 5m 以上	1 : 1. 5	下から H=5m 毎に 2m
発破などにより崩壊し やすい状態になってい る地山	2m 未満	1 : 1. 0	下から H=5m 毎に 2m

注) 上記により難い場合は、別途考慮できる。

余裕幅は、下表のとおりとする。

種別	足場工の有無	余裕幅
オープン掘削	足場工なし	50cm
	足場工あり (フーチング高さ 2m 未満でフ ーチング上に足場を設置する 場合)	170cm (50cm)
土留掘削	足場工なし (プレキャスト構造物で自立型 土留めの場合)	100cm (70cm)
	足場工あり (フーチング高さ 2m 未満でフ ーチング上に足場を設置する 場合)	220cm (100cm)

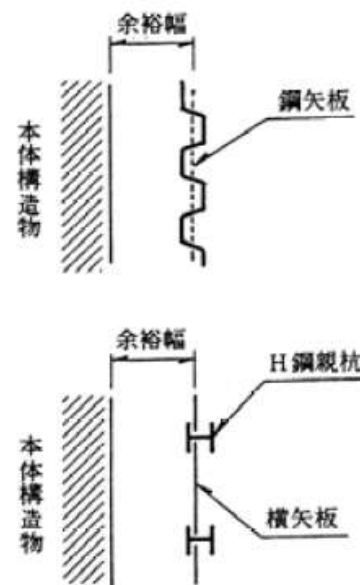

- 注) 1. 余裕幅は本体コンクリート端からとする。  
 2. 矢板施工の余裕幅は矢板のセンターからの距離。  
 3. 足場工が必要な場合は、H=2m 以上の構造物。  
 4. 雪寒仮囲いを使用する場合は、必要幅を計上すること。  
 5. 小構造物等でこれによることが不適当な場合は別途余裕幅を考慮する。  
 6. 共同溝等の特殊な場合は、別途取り扱う。

## 8. 建設副産物の取扱い（県－Ⅰ）

## (1) 処理方針

## (ア) 建設発生土の積極的な有効利用

建設発生土に関しては、発生土処理地の確保が困難になっていることや資源の有効活用の観点から、次により運用する。

## 1) 発生量の抑制

「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 H31.4.1」に基づき、必要に応じて土質改良をするなど、発生量の抑制に努める。

## 2) 再利用の促進

発生土の他の現場への流用については土質改良も検討し有効利用を図る。

このため、発生土量や購入土量の状況について、必要な情報収集・提供のため（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が管理する「建設発生土情報交換システム」を積極的に活用し、建設発生土側と利用者側の状況を把握し、建設発生土の利用を促進する。

当面、建設発生土については、最大 50km の範囲においてできる限り近傍の工事現場（民間建設工事を含む）に搬出し有効利用を図ることとする。

## (イ) 建設汚泥の適正処理の徹底

建設汚泥については、個別指定制度等を活かし有効利用を図るが、処理施設で処理する場合は処理費を計上し適正な処理をする。

## (ウ) 再生資材について

再生資材については、次により事業の種類にかかわらず、一般的に利用することとし、適正な品質が確保されないときには、新材を使用する。

1) 再生骨材等については、40km の範囲に再資源化施設がある場合。

2) 再生加熱アスファルト混合物については 40km 及び運搬時間 1.5 時間の範囲に再資源施設がある場合。

なお、工事費の積算にあたり、当初設計で再生資材を計上しながら、資材の入手が困難なときは、速やかに設計変更を行う。

## (2) 設計積算の具体的方法

## (ア) 発生土の場合（「廃棄物処理法」の適用外）

1) 発生土の取扱いについては、受入場所、距離等を勘案のうえ発生工事箇所を基に搬出地までの実運搬距離を計上し、特記仕様書に搬出先、受入条件等の処理条件を明示する。

なお、工事契約後に明示された処理条件に、変更が生じた場合、適切な設計変更を行う。

2) 処理地における処理費の取り扱いは次のとおりとする。

通常の場合は、積算基準及び歩掛表Ⅱ－1－②－21「整地」を参照のこと。又やむを得ず処理費を必要とする処理地へ搬出する場合は処理費用を計上する。

## (イ) コンクリート塊及びアスファルトコンクリート塊等（「廃棄物処理法」、「建設リサイクル法」の適用）

建設廃棄物関係の取扱いについては、その処理方法、処理場所等を勘案のうえ発生工事箇所を基に処分地までの実運搬距離及び処理費を計上し、特記仕様書に処理場所、受入条件等の処理条件を明示する。

また愛知県産業廃棄物条例に基づく産業廃棄物税相当額の計上が必要となる場合は適切に設計計上すること。

なお、工事契約後に明示された処理条件に、変更が生じた場合、適切な設計変更を行う。

## (ウ) 建設副産物処理費の決定方法

見積りにより処理費を決定する場合は、受入可能な3社以上の処理施設から見積りを徴収し、見積価格に処理施設までの運搬費、試験費等の必要経費を含めた価格について比較を行い、最低価格（異常値の排除は行わない）となる見積りを採用する。

## (エ) 設計積算上の注意事項

次の事項は主管事業課と協議検討したうえで設計計上を決定すること。

1) 発生土における通常処理の場合、処理費以外に必要最小限の土留工、排水工等の設置費等

2) 骨材等に活用可能な砂、岩塊等

3) その他本処理基準により難しい事項

## ② 土工（建地－Ⅰ）

### ②－Ⅰ 土工

#### 1. 適用範囲

本資料は、施工パッケージによる土工に適用する。

##### 1－Ⅰ 適用できる範囲

###### 1－Ⅰ－Ⅰ 掘削

- (1) 土砂、岩塊・玉石、軟岩、硬岩の掘削
- (2) 掘削深さが5m以内のバックホウ掘削の場合
- (3) 陸上掘削でクラムシェルによる水中掘削積込を行う場合
- (4) 破砕片除去を伴う際は、掘削面と機械基面の高低差が5mまでの場合
- (5) 軟岩、硬岩の床掘りの場合（軟岩の場合、施工数量が5,000m<sup>3</sup>未満）

###### 1－Ⅰ－Ⅱ 土砂等運搬

- (1) 自工区内の土砂等の運搬
- (2) 土取場（仮置場）から採取する土砂等の運搬
- (3) 構造物築造のために行う作業土工で生じた残土の処分場又は他工区までの運搬
- (4) 掘削工で生じた残土の処分場又は他工区までの運搬

###### 1－Ⅰ－Ⅲ 整地

- (1) 構造物築造のために行う作業土工で生じた土砂等又は掘削工で生じた土砂等の受入れ地（仮置場）、土取場での整地

###### 1－Ⅰ－Ⅳ 路体（築堤）盛土

- (1) 自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等を使用した路体（築堤）盛土
- (2) 他工区内で発生し運搬されてくる土砂等を使用した路体（築堤）盛土
- (3) 土取場（仮置場）で採取し運搬されてくる土砂等を使用した路体（築堤）盛土
- (4) 購入土を使用した路体（築堤）盛土

###### 1－Ⅰ－Ⅴ 路床盛土

- (1) 自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等を使用した路床盛土
- (2) 他工区内で発生し運搬されてくる土砂等を使用した路床盛土
- (3) 土取場（仮置場）で採取し運搬されてくる土砂等を使用した路床盛土
- (4) 購入土を使用した路床盛土

###### 1－Ⅰ－Ⅵ 押土（ルーズ）

- (1) 運搬距離60m以下の押土による土砂等の運搬作業の場合
- (2) 運搬距離30m以下の岩掘削後の集積用押土の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅶ 積込（ルーズ）

- (1) 土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の積込み
- (2) 仮置きされた土砂等の積込み
- (3) 破砕片除去の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅷ 人力積込

- (1) 仮置きされた土砂等の人力による積込み

###### 1－Ⅰ－Ⅸ 転石破碎

- (1) 道路、河川工事等の岩掘削に伴う転石破碎

###### 1－Ⅰ－Ⅹ 土材料

- (1) 道路土工、河川土工等における土材料（現場渡し単価又は土場渡し単価）を購入する場合

###### 1－Ⅰ－Ⅺ 残土等処分

- (1) 残土運搬された土砂等の残土の処分場での処分
- (2) 泥水運搬された汚泥、泥水等の受入れ地での処分

## 1-2 適用できない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）

## 1-2-1 掘削

- (1) 海上・水上作業におけるクラムシェル水中掘削積込
- (2) クラムシェルによる床掘り（作業土工）
- (3) 深礎工，鋼管矢板基礎工，共同溝工，地すべり防止工におけるクラムシェル掘削積込
- (4) 河川堤防に布設する光ケーブル配管工事の掘削（土の状態を問わない）を行う場合
- (5) 掘削（砂防）
- (6) 情報ボックス工の設置工事の掘削
- (7) 掘削（トンネル工）
- (8) 電線共同溝工事における掘削
- (9) 砂防，ダム，トンネルの本体工事の岩掘削及び水中掘削
- (10) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂，岩塊・玉石の掘削積込
- (11) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂の片切掘削

## 1-2-2 土砂等運搬

- (1) 土砂等運搬（砂防）
- (2) 河床等沈殿物，底沼等軟弱土を除去した後の運搬作業
- (3) 機械運搬が使用できない箇所での人力運搬

## 1-2-3 整地

- (1) 締固めを含む場合
- (2) 硬岩の場合

## 1-2-4 路体（築堤）盛土

- (1) 路床盛土工
- (2) 3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路体（築堤）盛土

## 1-2-5 路床盛土

- (1) 凍上抑制層を有する場合
- (2) 路体盛土工
- (3) 3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路床盛土

## 1-2-6 押土（ルーズ）

- (1) 地山の掘削を伴う押土の場合
- (2) 押土（ルーズ）（砂防）

## 1-2-7 積込（ルーズ）

- (1) 地山を掘削した土砂等を直接運搬車両等に投入する場合
- (2) 積込（ルーズ）（砂防）
- (3) 人力による積込み

## 1-3 適用できない範囲（別途考慮するもの）


## 1-3-1 土砂等運搬

- (1) 自動車専用道路を利用する場合
- (2) 運搬距離が60kmを超える場合

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー


## 2-1-1 「掘削」, 「転石破碎」, 「押土（ルーズ）」, 「積込（ルーズ）」, 「人力積込」, 「土砂等運搬」

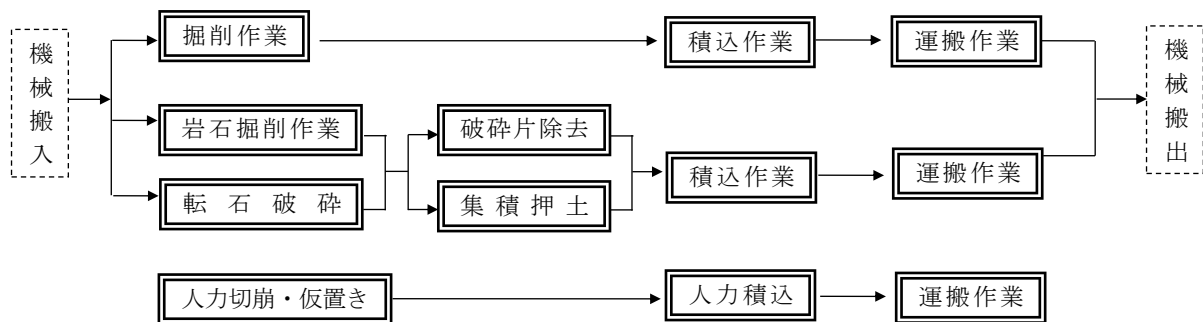

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 破砕片除去、集積押土は必要な場合計上する（岩石（軟岩、硬岩）掘削においては条件区分「有」を選択し、転石破碎においては「積込（ルーズ）」又は「押土（ルーズ）」を別途計上する）。  
 3. 積込み、運搬は必要な場合計上する（積込みについては表「(参考) ダンプトラックによる土砂等運搬時に積込（ルーズ）の計上が必要な掘削の積算条件」による）。  
 4. 人力切崩は現場制約有り（機械施工ができない箇所の人力施工）に適用する。  
 5. 各作業の対象となる施工パッケージは「2-2 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ」による。

図 2-1 「掘削」, 「転石破碎」, 「押土（ルーズ）」, 「積込（ルーズ）」,  
「人力積込」, 「土砂等運搬」施工フロー図

## 2-1-2 「路体(築堤)盛土」, 「路床盛土」, 「整地」




- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 残土受入れ地での整地は、土砂、岩塊・玉石、軟岩、中硬岩にかかわらず適用できる。

図 2-2 「路体(築堤)盛土」, 「路床盛土」, 「整地」施工フロー図



## 2-1-3 「掘削」におけるクラムシェル工法選定フロー

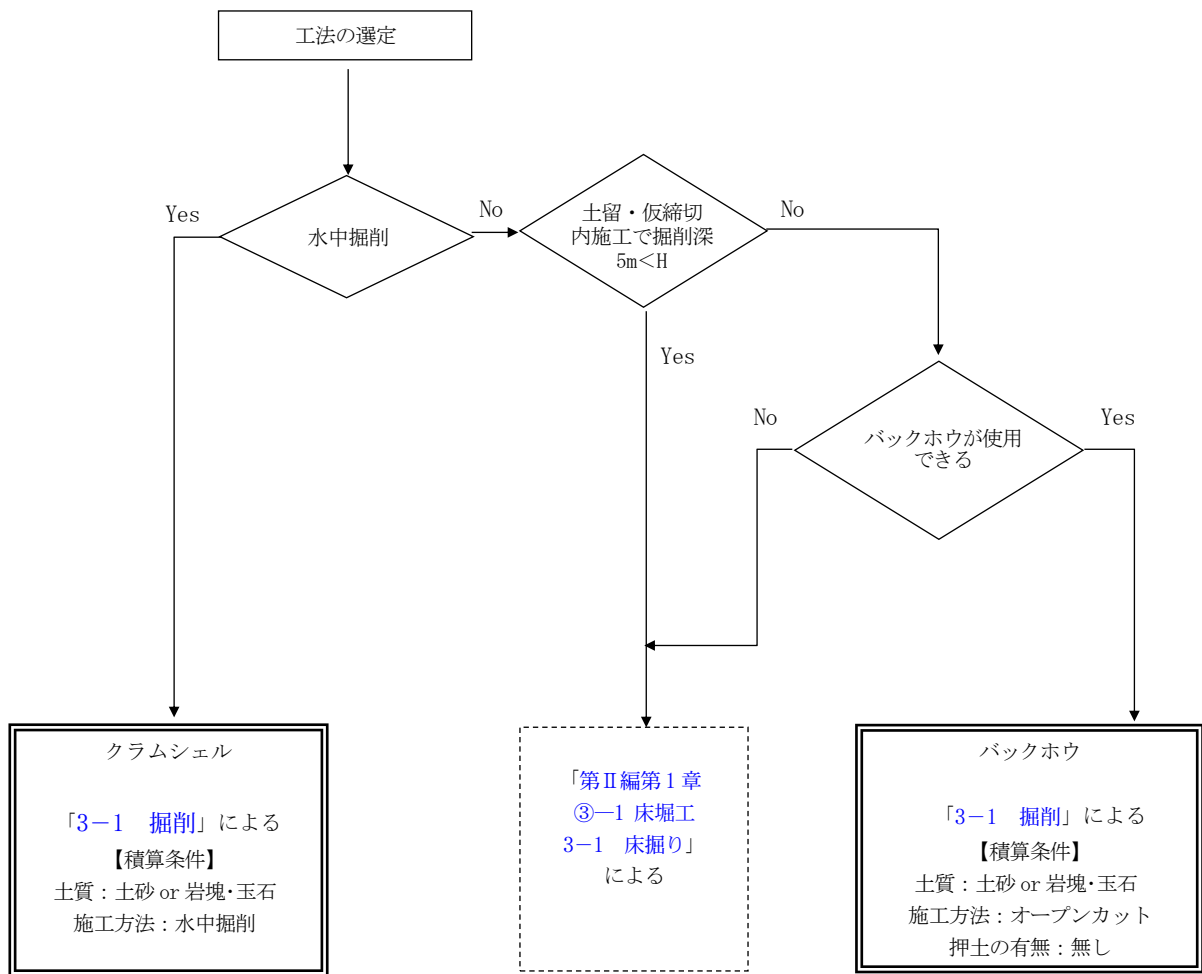


(注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-3 「掘削」におけるクラムシェル工法選定フロー図

## 2-2 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ

## (1) 道路土工, 河川土工等

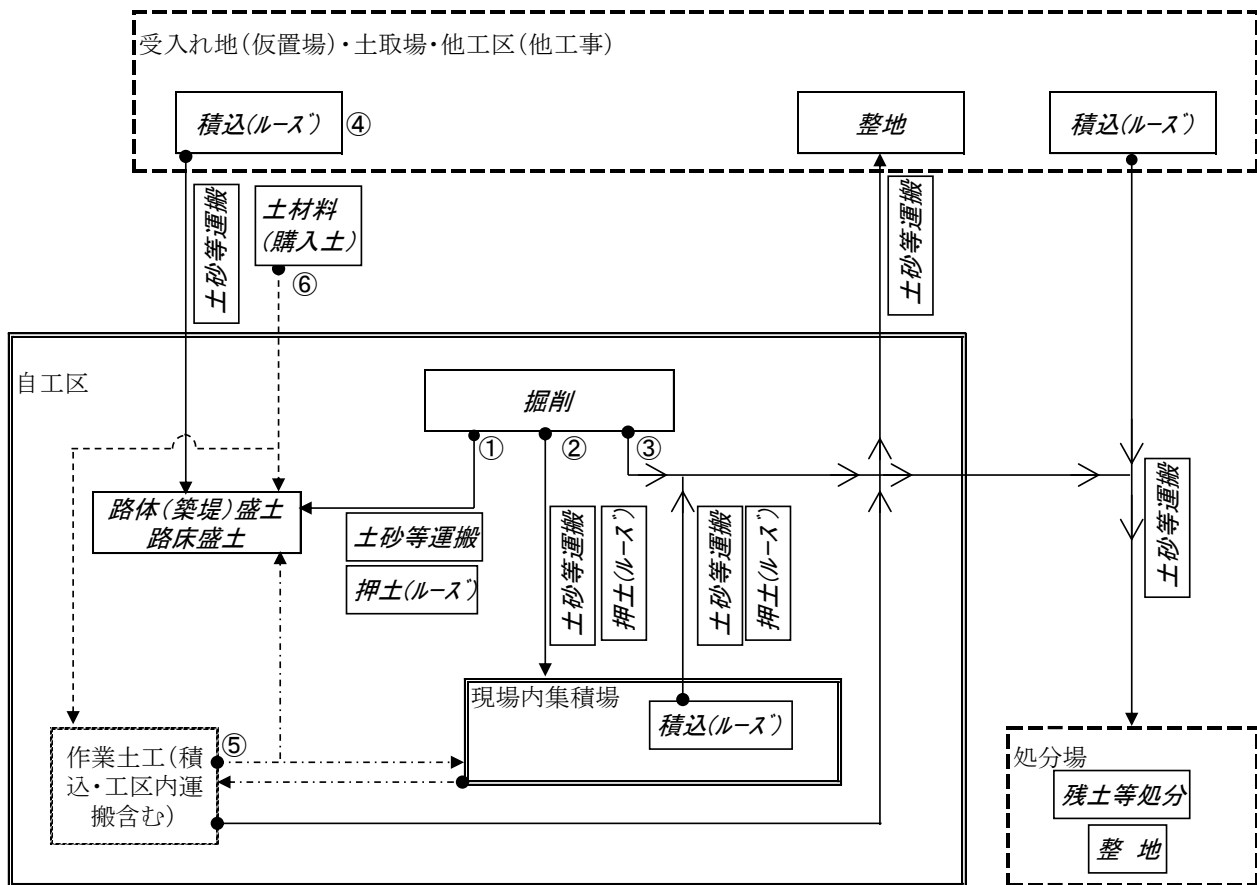

- 凡例
- \* **掘削**等施工パッケージ名称を斜体で示した。
  - \* **土砂等運搬**, **押土(ルース)**を実線で示した。
  - \* **土材料**(購入土)は通常現場着単価であり運搬は**土材料**に含まれるため破線で示した。
  - (図中⑥)
  - ただし, **土材料**(購入土)を土場渡し単価で積算する場合は**土砂等運搬**を計上する。
  - \* 作業土工(床掘り・埋戻し・工区内運搬)における土の流れを一点鎖線で示した。(図中⑤)

- (注) 1. **掘削**に含まれる自工区内の運搬について(図中①, ②)
- (1) 土質が土砂, 岩塊・玉石の場合
    - ・ **掘削**において, 押土「有り」を選択した場合, 60m以内の工区内運搬を含む。
  - (2) 土質が軟岩又は硬岩の場合
    - ・ **掘削**において, 以下の条件を選択した場合, 30m以内の工区内運搬を含む。
      - 「軟岩」で施工数量「500m<sup>3</sup>以上」又は集積押土「有り」を選択した場合
      - 「硬岩」で火薬使用「可」又は集積押土「有り」を選択した場合
2. 土砂等運搬時の積込作業について(図中①～③)
- ・ **掘削**において, 条件区分により積込作業を含まない場合がある。
  - ・ **積込(ルース)**を別途計上する必要がある条件区分は, 「(参考)ダンプトラックによる土砂等運搬時に**積込(ルース)**の計上が必要な掘削の積算条件」参照のこと。
3. 地山状態の土を掘削する場合は, **掘削**を使用する。(図中④)
3. 地山状態の土を掘削する場合は, **掘削**を使用する。(図中④)

(参考) ダンプトラックによる土砂等運搬時に~~積込~~ (ルース) の計上が必要な~~掘削~~の積算条件

掘削									積込 (ルース)
積算条件									
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	
土砂	オープンカット	－	有り	－	※1	－	－	－	要
			無し	※1	※1	－	－	－	不要
	片切掘削	－	－	－	－	－	－	要	
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	不要 ※2	
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	不要	
	上記以外(小規模)	－	－	－	※1	－	－	－	不要
岩塊・玉石	オープンカット	－	有り	－	※1	－	－	－	要
			無し	※1	※1	－	－	－	不要
	水中掘削	－	－	－	－	－	－	不要	
	現場制約あり	－	－	－	－	－	－	不要 ※2	
軟岩	※1	－	－	－	※1	－	※1	※1	要
硬岩	※1	－	－	－	－	※1	※1	※1	要

(注) 1. 表中「※1」は積算条件の区分の記載を省略している。

2. 表中「※2」は人力積込の計上が必要となる。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 掘削（SCB210100）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 掘削 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無
土砂	オープンカット	—	有り	—	普通土30,000m <sup>3</sup> 未満 又は湿地軟弱土	—	—	—
					普通土30,000m <sup>3</sup> 以上	—	—	—
			無し	無し	5,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					50,000m <sup>3</sup> 以上	—	—	—
				有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					50,000m <sup>3</sup> 以上	—	—	—
	片切掘削	—	—	—	—	—	—	—
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	—
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—
	上記以外 (小規模)	—	—	—	標準(※1)	—	—	—
					標準以外(※2)	—	—	—
岩塊・玉石	オープンカット	—	有り	—	普通土30,000m <sup>3</sup> 未満 又は湿地軟弱土	—	—	—
					普通土30,000m <sup>3</sup> 以上	—	—	—
			無し	無し	5,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					50,000m <sup>3</sup> 以上	—	—	—
				有り	5,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					5,000m <sup>3</sup> 以上 10,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	—	—	—
					50,000m <sup>3</sup> 以上	—	—	—
	水中掘削	—	—	—	—	—	—	—
	現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—

土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無
軟岩	オープンカット	—	—	無し	1,000m³未満	—	無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
							有り (50,000m³以上)	無し
					1,000m³以上 5,000m³未満	—	無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
							有り (50,000m³以上)	無し
					5,000m³以上	—	—	—
				有り	5,000m³未満	—	無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
							有り (50,000m³以上)	無し
	片切掘削	—	—	—	—	—	無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
							有り (50,000m³以上)	無し
	現場制約あり	軟岩(Ⅰ)	—	—	—	—	—	—
		軟岩(Ⅱ)	—	—	—	—	—	—
硬岩	オープンカット	—	—	無し	—	不可	無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
							有り (50,000m³以上)	無し
				有り	—	不可	—	無し
							無し	有り
							有り (50,000m³未満)	無し
	片切掘削	—	—	—	—	不可	有り (50,000m³以上)	無し
							無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
				—	—	可	有り (50,000m³以上)	無し
							無し	無し
							有り (50,000m³未満)	有り
	現場制約あり	中硬岩	—	—	—	—	—	—
		硬岩(Ⅰ)	—	—	—	—	—	—

- (注) 1. 表 3. 1 は、土砂、岩塊・玉石の掘削、積込み（掘削と同時に行う積込み）、運搬（掘削と同時に行う押土による運搬）、軟岩・硬岩の掘削、積込み、破砕片除去及び集積押土（積込みは含まないため、別途計上）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 土量は、地山土量とする。
3. 施工方法は、掘削箇所の地形により「オープンカット」、「片切り」に区分する。

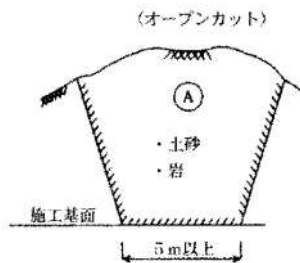


図 3-1

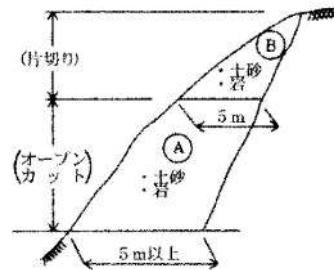


図 3-2




図 3-3

## ① オープンカット

図3. 1に示すような切取面が、水平もしくは緩傾斜をなすように施工ができる場合で、切取幅5m以上、かつ延長 20m 以上を標準とする。

## ② 片切掘削

図3. 2及び図3. 3に示すような切取幅5m 未満の領域Bとする。なお、図3. 2に示すような箇所にあっても、地形及び工事量などの現場条件等を十分考慮のうえ、前述のオープンカットが可能と判断される場合はオープンカットを適用する。

## ③ 水中掘削

土留・仮締切工の施工条件において掘削深さが5m を超える場合、又は掘削深さが5m 以内でも土留・仮締切工の切梁等のためバックホウが使用できない場合で水中の掘削・積込作業。

## ④ 現場制約あり

機械施工が困難な場合。

土砂、岩塊・玉石は、直接積込みできない箇所の人力による片切部分等の切崩し作業。

軟岩、硬岩は、人力により片切掘削及び床掘りした岩を距離3m 程度までの範囲で投棄し、掘削面の法面整形を含む作業。

## ⑤ 上記以外（小規模）

※1 標準：1箇所当りの施工土量が100m<sup>3</sup>以下、又は100m<sup>3</sup>以上で現場が狭隘な場合

2 標準以外：構造物及び建造物等の障害物により施工条件が制限されるような狭隘な場合、又は1箇所当りの施工土量が50m<sup>3</sup>以下の場合

## 4. 押土の有無

- ① 有り：土砂、岩塊・玉石の場合は、60m までの運搬を含む。ただし、軟岩のオープンカットかつ掘削土量 5,000m<sup>3</sup> 以上を選択した場合及び硬岩のオープンカットで火薬使用「可」を選択した場合、30m までの押土を含む。

## 5. 障害の有無

土質：土砂、岩塊・玉石の場合

- ① 無し：構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されず、連続掘削作業ができる場合
- ② 有り：掘削作業において障害物等により施工条件に制限があり（例えば作業障害が多い場合）連続掘削作業ができない場合。掘削深さ 5m 以内で掘削箇所が地下水位等で排水をせず水中掘削（溝掘り、基礎掘削）を行う場合

土質：軟岩の場合

- ① 無し：掘削量が 5,000m<sup>3</sup> 未満で掘削箇所に大型ブレーカが入り作業できる場合、もしくは掘削量が 5,000m<sup>3</sup> 以上の場合
- ② 有り：掘削量が 5,000m<sup>3</sup> 未満で掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合

土質：硬岩の場合

- ① 無し：掘削箇所に大型ブレーカが入り作業できる場合、もしくは火薬を使用する場合
- ② 有り：掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合

## 6. 施工数量、破砕片除去数量

- ① 施工数量は「小規模」を除き、1 工事当りの数量とする。

表 3. 1 の条件区分「施工数量」、「破砕片除去の有無」に示す数量区分は、1 工事当りの取扱い数量で判断する。1 工事当りの取扱い数量は、掘削、掘削（ICT）、積込（ルーズ）の施工数量を表 3. 2 の数量区分の規格別に「○」、「●」及び「△」の項目を条件区分によらず全て合計した数量とする。なお、これにより難しい場合は別途考慮する。

表 3.2 1 工事当りの取扱い数量について

名称	条件区分					施工数量，破砕片除去数量の 数量区分				
						A	B	C	D	
掘削	土質	施工方法	押土	破砕片除去	集積押土					
	土砂	オープンカット	有	—	—	○				
			無	—	—		○	△		
	片切掘削	—	—	—				△		
		岩塊・玉石	オープンカット	有	—	—	○			
	無			—	—		○	△		
	軟岩	オープンカット	—	有	無		●			
				無	有					
		片切掘削		有	無		●			
				無	有					
	硬岩	オープンカット	—	有	無		●			
				無	有					
		片切掘削	—	有	無		●			
				無	有					
	掘削 (ICT)	土砂	オープンカット	—	—	—			○	
片切掘削			—	—	—				○	
岩塊・玉石		オープンカット	—	—	—			○		
積込 (ルース)	—						○			

※1. ○：施工数量，●：破砕片除去数量，△：同一の施工箇所においてICT建機と通常建機を組合せて施工する場合で，通常建機による施工分の施工数量。

※2. 数量区分の規格は，以下のとおりとする。この区分で1工事当りの取扱い数量を判断する。なお，各区分の取扱い数量は重複して合計しないこと。（例えば，掘削[土砂，オープンカット，押土無]において，同一施工箇所でのICT建機との組合せによる通常建機施工の場合は，数量区分C（上表：△）として計上し，数量区分Bには含めない）

A：①30,000m³未満，②30,000m³以上

B：①5,000m³未満，②5,000m³以上10,000m³未満，③10,000m³以上50,000m³未満，④50,000m³以上

C：①5,000m³未満，②5,000m³以上10,000m³未満，③10,000m³以上50,000m³未満，④50,000m³以上

D：①50,000m³未満，②50,000m³以上



※3. 掘削（軟岩，オープンカット）は，条件区分が「軟岩」かつ施工方法「オープンカット」について合計した施工数量にて判断する（下図破線部）。ただし，「①：5,000m<sup>3</sup>未満」でかつ「b：障害無し」の（掘削箇所に大型ブレーカが入って作業ができる）場合は，「5,000m<sup>3</sup>未満」かつ「障害無し」の施工数量によって積算条件区分を判断する（下図一点鎖線部）。

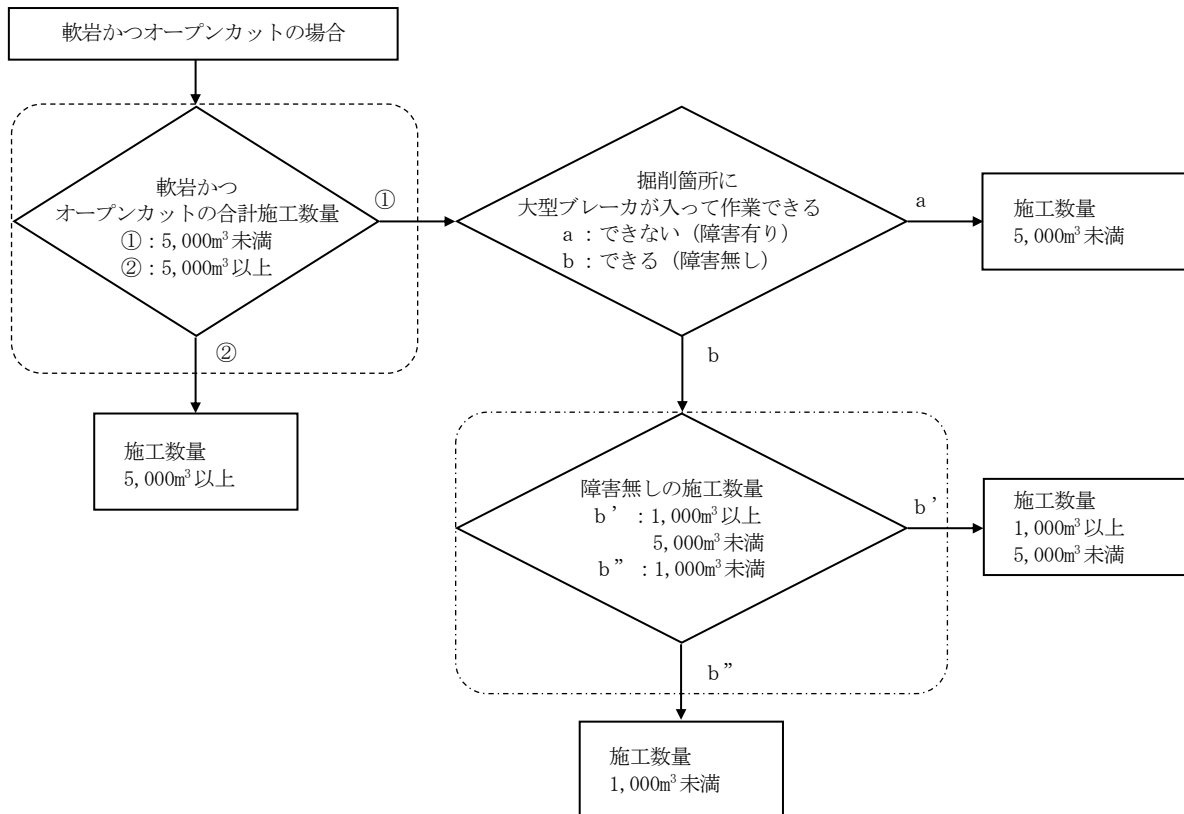


図 3-4

②軟岩及び硬岩の掘削，床掘りは，土質及び作業内容ごとの「施工数量」で判断する。

③掘削（ICT）は，同一の施工箇所において3D-MG又はMCバックホウ（以下，「ICT建機」という。）と通常建機（ICT建機を使用しない通常機種のバックホウ）を組合せて施工する場合，両者を合計した掘削土量をその箇所の施工数量とする。

④施工方法「上記以外（小規模）」の施工数量における「1箇所」とは，目的物（構造物・掘削等）1箇所当りのことであり，目的物が連続している場合は，連続している区間を1箇所とする。

⑤湿地軟弱土での作業の施工数量は，1工事当りの取扱い土量に含めない。

⑥土質「軟岩」，「硬岩」における床掘平均掘削幅 2m 未満の場合の破砕片除去及び積込みは，破砕片除去「無」を選択の上，「3-7 積込（ルーズ）」により別途計上する。

⑦掘削（土砂及び岩塊・玉石，オープンカット，集積押土無）には，掘削と同時に行う積込みを含む。

7. 火薬の標準的な使用量は，オープンカットでは1日当り含水爆薬 13.4kg，AN-F019.5kg，片切掘削では1日当り含水爆薬 1.8 kg とし，これにより難い場合は別途計上する。

8. 集積押土の有無

①有り：集積押土の距離は30m までとする。

9. 軟岩又は硬岩の場合で，盛土等に流用するための小割りに破砕が再度必要となった場合は，小割りに要する費用は別途考慮する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.3 掘削 代表機労材規格一覧

土質	項目	代表機労材規格	施工方法														水中掘削	現場制約あり
			オープンカット							片切掘削			小規模					
			施工数量															
			普通土 30,000 m3未満 又は 湿地 軟弱土	普通土 30,000 m3 以上	5,000 m3 未満	5,000 m3 以上 10,000 m3 未満	10,000 m3 以上 50,000 m3 未満	50,000 m3 以上	-				小規模 (標準)	小規模 (標準 以外)				
土砂（岩塊・玉石混り土含む）	機械	ブルドーザ「湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）」20t級	○															
		ブルドーザ「普通・排出ガス対策型（第1次基準値）」32t級		○														
		バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）			○	○	○		○									
		バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m3（平積1.0m3）								○								
		バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.28m3（平積0.2m3）										○						
		小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.13m3（平積0.10m3）												○				
		クラムシェル【油圧ロープ式・クローラ型】平積0.8m3													○			
	労務	K2	-															
		K3	-															
		R1	運転手（特殊）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		R2	普通作業員									○				○		
	材料	R3	-															
		R4	-															
		Z1	軽油1.2号 バトロール給油	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		Z2	-															
		Z3	-															
		Z4	-															
	市場単価	S	-															
土質	項目	代表機労材規格	施工方法														-	現場制約あり
			オープンカット							片切掘削								
			施工数量															
			5,000m3未満							5,000m3以上			-					
	項目	代表機労材規格	破砕片除去の有無															
			集積押土の有無															
			無し	有り	無し	無し	-	無し	有り	無し	無し	無し	有り	有り	有り	-		
			50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	-	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3以上		
軟岩	機械	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	○	○	○	○	○	-	無し	○	○	○	○	○		○		
		ブルドーザ「リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）」32t級																
		空気圧縮機「可搬式・エンジン駆動・スクリュー型」排出ガス対策型（第1次基準値）吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa																
		大型ブレーカ（ベースマシン含まず）「油圧式」質量1,300kg級 さく岩機「コンクリートブレーカ」20kg級	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		ブルドーザ「湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）」20t級		○							○							
		バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）			○							○						
	労務	バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m3（平積1.0m3）					○						○					
		R1	特殊作業員							○	○	○	○	○	○	○		
		R2	運転手（特殊）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		R3	普通作業員							○	○	○	○	○	○	○		
	材料	R4	-															
		Z1	軽油1.2号 バトロール給油	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		Z2	-															
		Z3	-															
		Z4	-															
		市場単価	S	-														
土質	項目	代表機労材規格	施工方法														-	現場制約あり
			オープンカット							片切掘削								
			火薬使用															
			不可							可			不可					
	項目	代表機労材規格	破砕片除去の有無															
			集積押土の有無															
			無し	有り	無し	無し	-	無し	有り	無し	無し	無し	有り	有り	有り	有り		
			50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	-	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3未満	50,000m3以上	50,000m3以上		
硬岩	機械	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		空気圧縮機「可搬式・エンジン駆動・スクリュー型」排出ガス対策型（第1次基準値）吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa														○		
		大型ブレーカ（ベースマシン含まず）「油圧式」質量1,300kg級ブルドーザ「リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）」32t級 さく岩機「コンクリートブレーカ」20kg級	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		ブルドーザ「湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）」20t級		○						○					○	○		
		バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】山積0.8m3（平積0.6m3）			○						○				○			
		バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）】山積1.4m3（平積1.0m3）					○						○			○		
	労務	クロラドリル「油圧式」【搭乗式】ドリフト質量150kg級											○	○	○	○		
		R1	特殊作業員								○	○	○	○	○	○		
		R2	運転手（特殊）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		R3	さく岩工								○	○	○	○	○	○		
	材料	R4	土木一般世話役											○	○	○		
		Z1	軽油1.2号 バトロール給油	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		Z2	-															
		Z3	-															
		Z4	-															
		市場単価	S	-														

## 3-2 土砂等運搬（SCB210110）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 4 土砂等運搬 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離
標準	バックホウ山積 0.8m³ (平積0.6m³)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.5)
			有り	(表3.6)
		軟岩	無し	(表3.5)
			有り	(表3.6)
		硬岩	無し	(表3.5)
			有り	(表3.6)
	バックホウ山積 1.4m³ (平積1.0m³)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.7)
			有り	(表3.8)
		軟岩	無し	(表3.7)
			有り	(表3.8)
		硬岩	無し	(表3.7)
			有り	(表3.8)
	バックホウ山積 0.45m³ (平積0.35m³)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.9)
			有り	(表3.10)
		軟岩	無し	(表3.9)
			有り	(表3.10)
		硬岩	無し	(表3.9)
			有り	(表3.10)
	クラムシェル 平積0.4m³ または平積0.8m³	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.11)
			有り	(表3.12)
		軟岩	無し	(表3.11)
			有り	(表3.12)
		硬岩	無し	(表3.11)
			有り	(表3.12)
小規模	バックホウ山積 0.28m³ (平積0.2m³)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.13)
			有り	(表3.14)
	バックホウ山積 0.13m³ (平積0.1m³)	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.15)
			有り	(表3.16)
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	無し	(表3.17)
			有り	(表3.18)
		軟岩	無し	(表3.17)
			有り	(表3.18)
		硬岩	無し	(表3.17)
			有り	(表3.18)

(注) 1. 上表は、掘削工又は作業土工における土砂・軟岩・硬岩の運搬、路体・路床盛土工又は置換工等における土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の運搬、構造物築造のために行う作業土工で生じた残土の処分場までの運搬又は掘削工で生じた残土の処分場までの運搬の他、運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理に掛かる費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. タイヤ損耗の「良好」「普通」「不良」にかかわらず適用出来る。

3. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。

4. DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。

5. 運搬距離が60kmを超える場合は、別途考慮する。

6. 運搬土量は地山の土量とする。

7. 小規模は、1箇所当りの施工土量が100m³以下、又は100m³以上で現場が狭隘な場合とする。また、構造物及び建造物の障害物により施工条件が制限されるような狭隘な場合、又は1箇所当りの施工土量が、50m³以下の場合とする。

8. 現場制約有りとは、現場狭小のため機械搬入が不可な場合。

9. 標準とは、「小規模」、「現場制約有り」に該当しない場合。

表 3. 5 運搬距離(1)

積算条件	区分
運搬距離	0.3km以下
	0.5km以下
	1.0km以下
	1.5km以下
	2.0km以下
	3.0km以下
	4.0km以下
	5.5km以下
	6.5km以下
	7.5km以下
	9.5km以下
	11.5km以下
	15.5km以下
	22.5km以下
	49.5km以下
	60.0km以下

表 3. 6 運搬距離(2)

積算条件	区分
運搬距離	0.3km以下
	0.5km以下
	1.0km以下
	1.5km以下
	2.0km以下
	3.0km以下
	3.5km以下
	5.0km以下
	6.0km以下
	7.0km以下
	8.5km以下
	11.0km以下
	14.0km以下
	19.5km以下
	31.5km以下
	60.0km以下

表 3. 7 運搬距離(3)

積算条件	区分
運搬距離	0.3km以下
	0.5km以下
	1.0km以下
	1.5km以下
	2.0km以下
	2.5km以下
	3.0km以下
	3.5km以下
	4.5km以下
	6.0km以下
	7.0km以下
	8.5km以下
	10.0km以下
	12.5km以下
	16.5km以下
	23.5km以下
	51.5km以下
	60.0km以下

表 3. 8 運搬距離(4)

積算条件	区分
運搬距離	0. 3km以下
	0. 5km以下
	1. 0km以下
	1. 5km以下
	2. 0km以下
	2. 5km以下
	3. 0km以下
	3. 5km以下
	4. 5km以下
	5. 5km以下
	6. 5km以下
	8. 0km以下
	9. 5km以下
	11. 5km以下
	15. 0km以下
	20. 5km以下
	33. 0km以下
	60. 0km以下

表 3. 9 運搬距離(5)

積算条件	区分
運搬距離	0. 5km以下
	1. 0km以下
	2. 0km以下
	2. 5km以下
	3. 5km以下
	4. 5km以下
	6. 0km以下
	7. 5km以下
	10. 0km以下
	13. 5km以下
	19. 5km以下
	39. 0km以下
	60. 0km以下

表 3. 10 運搬距離(6)

積算条件	区分
運搬距離	0. 5km以下
	1. 0km以下
	1. 5km以下
	2. 0km以下
	3. 0km以下
	4. 0km以下
	5. 5km以下
	7. 0km以下
	9. 0km以下
	12. 0km以下
	17. 5km以下
	28. 5km以下
	60. 0km以下

表 3. 11 運搬距離(7)

積算条件	区分
運搬距離	0.5km以下
	2.0km以下
	2.5km以下
	4.0km以下
	5.5km以下
	7.5km以下
	10.5km以下
	16.0km以下
	30.0km以下
	60.0km以下

表 3. 12 運搬距離(8)

積算条件	区分
運搬距離	0.5km以下
	2.0km以下
	2.5km以下
	3.5km以下
	5.0km以下
	7.0km以下
	10.0km以下
	14.5km以下
	24.5km以下
	60.0km以下

表 3. 13 運搬距離(9)

積算条件	区分
運搬距離	0.2km以下
	1.0km以下
	1.5km以下
	2.5km以下
	3.5km以下
	4.0km以下
	5.0km以下
	6.0km以下
	7.5km以下
	10.0km以下
	13.0km以下
	19.0km以下
	35.0km以下
	60.0km以下

表 3. 14 運搬距離(10)

積算条件	区分
運搬距離	0. 2km以下
	1. 0km以下
	1. 5km以下
	2. 0km以下
	3. 0km以下
	3. 5km以下
	4. 5km以下
	5. 5km以下
	7. 0km以下
	9. 0km以下
	12. 0km以下
	17. 0km以下
	27. 0km以下
	60. 0km以下

表 3. 15 運搬距離(11)

積算条件	区分
運搬距離	0. 3km以下
	1. 0km以下
	1. 5km以下
	2. 5km以下
	3. 0km以下
	3. 5km以下
	4. 5km以下
	5. 5km以下
	7. 0km以下
	9. 0km以下
	12. 0km以下
	17. 0km以下
	28. 5km以下
	60. 0km以下

表 3. 16 運搬距離(12)

積算条件	区分
運搬距離	0. 3km以下
	1. 0km以下
	1. 5km以下
	2. 5km以下
	3. 0km以下
	3. 5km以下
	4. 5km以下
	5. 0km以下
	6. 5km以下
	8. 0km以下
	11. 0km以下
	15. 0km以下
	24. 0km以下
	60. 0km以下

表 3. 17 運搬距離(13)

積算条件	区分
運搬距離	0.3km以下
	0.5km以下
	1.5km以下
	2.0km以下
	2.5km以下
	3.0km以下
	4.0km以下
	5.0km以下
	6.5km以下
	8.5km以下
	11.0km以下
	16.0km以下
	27.5km以下
	60.0km以下

表 3. 18 運搬距離(14)

積算条件	区分
運搬距離	0.3km以下
	0.5km以下
	1.0km以下
	1.5km以下
	2.0km以下
	2.5km以下
	3.5km以下
	4.5km以下
	6.0km以下
	8.0km以下
	10.5km以下
	14.5km以下
	23.0km以下
	60.0km以下



## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3. 19 土砂等運搬 代表機材規格一覧

土砂等 発生現場	項目		代表機材規格	備考
標準	機械	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	運転手(一般)	
		R2	—	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	
小規模	機械	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	・積込機種・規格がバックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.2m <sup>3</sup> )の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級	・積込機種・規格がバックホウ山積 0.13m <sup>3</sup> (平積 0.1m <sup>3</sup> )の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	運転手(一般)	
		R2	—	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	
現場制約 あり	機械	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t 積級	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	運転手(一般)	
		R2	—	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	

## 3-3 整地 (SCB210610)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 20 整地 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

作業区分	敷均し作業内容
残土受入れ地での処理	—
敷均し(ルーズ)	標準
	標準以外
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)
	トラフィカビリティが確保できない場合

- (注) 1. 上表は、構造物築造のために行う作業土工で生じた土砂等又は掘削工で生じた土砂等の受入れ地（仮置場）、土取場での整地、締固めを行わない場合の土の敷均し等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 作業区分で残土受入れ地での処理を選択した場合の土量は地山の土量とする。
3. 作業区分で敷均し（ルーズ）を選択した場合の土量は敷均し後の土量とする。なお、敷均しのため、変化率C=1.0とする。
4. 敷均し作業内容における標準以外とは、1工事当りの全体盛土量が10,000m<sup>3</sup>以上の場合である。
5. 幅2.5m未満の狭隘箇所での作業は「第1章③-2埋戻工（現場制約あり）」による。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 21 整地 代表機労材規格一覧

作業区分	項目		代表機労材規格	備考
残土受け 入れ地で の処理	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	賃料
		K2	－	
		K3	－	
	労務	R1	運転手（特殊）	
		R2	－	
		R3	－	
		R4	－	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	－	
		Z3	－	
		Z4	－	
	市場単価	S	－	
敷均し (ルーズ)	機械	K1	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕15t 級	敷均し作業内容が標準の場合
			ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕21t 級	敷均し作業内容が標準以外の場合
			ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕3t 級	敷均し作業内容が狭小幅員（幅 2.5m 以上 4m 未満）の場合
			ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t 級	敷均し作業内容がトラフィカビリティが確保できない場合
		K2	－	
		K3	－	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	運転手（特殊）	
		R3	－	
		R4	－	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	－	
		Z3	－	
		Z4	－	
	市場単価	S	－	

## 3-4 路体（築堤）盛土（SCB210510）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 22 路体（築堤）盛土 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

施工幅員	施工数量	障害の有無
2.5m未満	—	—
2.5m以上4.0m未満	—	—
4.0m以上	10,000m³未満	無し
		有り
	10,000m³以上	無し
		有り

- (注) 1. 上表は、路体又は築堤の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 施工数量は、1工事当りの全体盛土量（施工幅員4.0m以上の合計盛土量）とする。なお、ICT施工による盛土量は含めないものとする。
3. 土量は締固め後の土量とする。
4. 障害の有無
- ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、築堤工事等）
- ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事、拡築（腹付、嵩上）工事等）
5. ブルドーザ（湿地）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ローラの締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。
6. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 23 路体(築堤)盛土 代表機労材規格一覧

施工幅員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考
2.5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	賃料
			K2 —	
			K3 —	
		労務	R1 普通作業員	
			R2 特殊作業員	
			R3 —	
			R4 —	
		材料	Z1 軽油 1.2号 バトロール給油	
			Z2 —	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	
2.5m 以上 4.0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量3～4t	賃料
			K2 バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 山積0.28m³（平積0.2m³）	賃料
			K3 —	
		労務	R1 運転手(特殊)	
			R2 普通作業員	
			R3 —	
			R4 —	
		材料	Z1 軽油 1.2号 バトロール給油	
			Z2 —	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	
4.0m 以上	10,000m³ 未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）] 7t 級	賃料
			K2 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量11～12t	賃料
			K3 —	
		労務	R1 運転手(特殊)	
			R2 普通作業員	
			R3 —	
			R4 —	
		材料	Z1 軽油 1.2号 バトロール給油	
			Z2 —	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	
	10,000m³ 以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）] 16t 級	賃料
			K2 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 運転質量11～12t	賃料
			K3 —	
		労務	R1 運転手(特殊)	
			R2 普通作業員	
			R3 —	
			R4 —	
		材料	Z1 軽油 1.2号 バトロール給油	
			Z2 —	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	

## 3-5 路床盛土（SCB210520）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 24 路床盛土 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

施工幅員	施工数量	障害の有無
2.5m未満	—	—
2.5m以上4.0m未満	—	—
4.0m以上	10,000m³未満	無し
		有り
	10,000m³以上	無し
		有り

- (注) 1. 上表は、路床の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 施工数量は、1 工事当りの全体盛土量（施工幅員 4.0m 以上の合計盛土量）とする。なお、I C T 施工による盛土量は含めないものとする。
3. 土量は締固め後の土量とする。
4. 障害の有無
- ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、あるいは新設の築堤工事等）
- ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事、あるいは拡築（腹付、嵩上）工事等）
5. ブルドーザ（湿地）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ローラの締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。
6. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 20cm 以下とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 25 路床盛土 代表機労材規格一覧

施工幅員	施工数量	項目	代表機労材規格		備考
2.5m 未満	—	機械	K1	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]運転質量0.8～1.1t	賃料
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	普通作業員	
			R2	特殊作業員	
			R3	—	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
2.5m 以上 4.0m 未満	—	機械	K1	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）]運転質量3～4t	賃料
			K2	バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積0.28m³（平積0.2m³）	賃料
			K3	—	
		労務	R1	運転手(特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	—	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
4.0m 以上	10,000m³ 未満	機械	K1	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）] 7t 級	賃料
			K2	振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）]運転質量11～12t	賃料
			K3	—	
		労務	R1	運転手(特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	—	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
	10,000m³ 以上	機械	K1	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）] 16t 級	賃料
			K2	振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）]運転質量11～12t	賃料
			K3	—	
		労務	R1	運転手(特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	—	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	

## 3-6 押土（ルーズ）（SCB210010）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 26 押土（ルーズ）積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>3</sup>）

土質
土砂
岩塊・玉石
破碎岩

（注）1. 上表は、ルーズな状態の土砂、岩塊・玉石、破碎岩の集積押土や押土による運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. 土量は地山土量とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 27 押土（ルーズ）代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t 級	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手(特殊)	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	



## 3-7 積込（ルーズ）（SCB210020）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 28 積込（ルーズ）積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

土質	作業内容
土砂	土量50,000m³未満
	土量50,000m³以上
	平均施工幅1m以上2m未満
	小規模(標準)
	小規模(標準以外)
岩塊・玉石	土量50,000m³未満
	土量50,000m³以上
	平均施工幅1m以上2m未満
破碎岩	土量50,000m³未満
	土量50,000m³以上
	平均施工幅1m以上2m未満

(注) 1. 上表は、路体（築堤）盛土、路床盛土、電線共同溝工事等における土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の積込み、掘削工又は作業土工で生じた残土の仮置場での積込み等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. 土量は地山土量とする。

3. 土量は1工事当りの数量とする。また、1工事当りの数量の取扱いは、表3. 2によるものとする。

4. 「(標準)」とは1箇所当りの施工土量が100m³以下、又は100m³以上で現場が狭隘な場合とする。また、「(標準以外)」とは構造物及び建造物等の障害物により施工条件が制限されるような狭隘な場合、又は1箇所当りの施工土量が、50m³以下の場合とする。

5. 岩石の床掘平均掘削幅2m未満の場合の積込み（ルーズ）は、平均施工幅1m以上2m未満を適用する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 29 積込（ルーズ）代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m³（平積0.6m³）
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積1.4m³（平積1.0m³）
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m³（平積0.35m³）
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m³（平積0.2m³）
		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m³（平積0.10m³）
	K2	—
	K3	—
労務	R1	運転手(特殊)
	R2	—
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油
	Z2	—
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## 3-8 人力積込（SCB210830）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 30 人力積込 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

土質等区分
土砂
岩塊・玉石
軟 岩
中硬岩
硬 岩
アスファルト塊
コンクリート塊

- (注) 1. 上表は、仮置きされた土砂、岩（アスファルト塊、コンクリート塊を含む）を人力により直接積込むまでの作業に必要な全ての労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
2. 土量は地山土量とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 31 人力積込 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-9 転石破碎（SCB210260）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 32 転石破碎 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

火薬使用の有無
無し
有り

- (注) 1. 上表は、道路、河川工事等の岩掘削に伴う転石破碎の他、火薬・雷管、さく岩機損料及びさく岩機用空気圧縮機の運転経費、さく岩機のロッド・ビット及びチゼルの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 転石の掘出し、破碎石の除去は含まない。
3. 転石粒径が 0.5m 以上、及び作業範囲が施工幅 4.0m 以上の箇所、機械走行面より上下に 5.0m 以内の場合は、火薬使用の有無「無し」を適用する。
4. 転石粒径が 1.0m 以上で、作業範囲が施工幅 4.0m 未満又は機械走行面より上下に 5.0m 超の場合は、火薬使用の有無「有り」を適用する。
5. 火薬の標準的な使用量は、10m³ 当り含水爆薬 1.6kg とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 33 転石破碎 代表機労材規格一覧

火薬使用の有無	項目		代表機労材規格	備考
無し	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.8m³（平積 0.6m³）	
		K2	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 1,300kg 級	
		K3	—	
	労務	R1	運転手(特殊)	
		R2	—	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	
有り	機械	K1	—	
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	さく岩工	
		R2	特殊作業員	
		R3	土木一般世話役	
		R4	普通作業員	
	材料	Z1	—	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	

## 3-10 土材料

土材料の積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$  とする。

（注）路体盛土工，路床盛土工における盛土材料，作業土工等における埋戻材料又は置換工における置換材料等の購入に要する全ての費用（現場渡し単価又は土場渡し単価）を含む。

## 3-11 残土等処分

残土等処分の積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$  とする。

（注）残土等処分は，構造物築造のために行う作業土工又は掘削工で生じた残土，地盤改良等で発生した汚泥，泥水等の処分場での処分に要する全ての費用を含む。

## ②-2 土工（ICT）（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、ICTによる土工に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 掘削（ICT）※[ICT建機使用割合 100%]

- (1) 3D-MG又はMCバックホウによる土砂、岩塊・玉石の掘削積込、又は、3D-MG又はMCバックホウによる土砂の片切掘削

## 1-1-2 路体（築堤）盛土（ICT）

- (1) 3D-MG又はMCブルドーザによる施工幅員 4.0m 以上の土砂等を使用した路体（築堤）盛土

## 1-1-3 路床盛土（ICT）

- (1) 3D-MG又はMCブルドーザによる施工幅員 4.0m 以上の土砂等を使用した路床盛土

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 掘削（ICT）※[ICT建機使用割合 100%]

- (1) 3D-MG又はMCバックホウ以外による掘削

## 1-2-2 路体（築堤）盛土（ICT）

- (1) 3D-MG又はMCブルドーザ以外による路体（築堤）盛土


## 1-2-3 路床盛土（ICT）

- (1) 3D-MG又はMCブルドーザ以外による路床盛土

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー


## 2-1-1 「掘削（ICT）※[ICT建機使用割合 100%]」

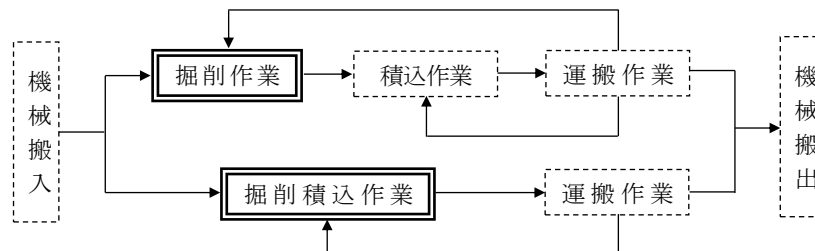

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 積込、運搬作業が必要な場合は、「第Ⅱ編第1章土工②-1 土工」により別途計上すること。

図 2-1 「掘削(ICT)※[ICT建機使用割合 100%]」施工フロー

## 2-1-2 「路体(築堤)盛土（ICT）」, 「路床盛土（ICT）」



- (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-2 「路体(築堤)盛土(ICT)」, 「路床盛土(ICT)」施工フロー

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100%〕（SCB210121）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100%〕 積算条件区分一覧

（積算単位：m³）

土質	施工方法	障害の有無	施工数量
土砂	オープンカット	無し	5,000m³未満
			5,000m³以上10,000m³未満
			10,000m³以上50,000m³未満
			50,000m³以上
		有り	5,000m³未満
			5,000m³以上10,000m³未満
			10,000m³以上50,000m³未満
			50,000m³以上
	片切掘削	—	—
岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m³未満
			5,000m³以上10,000m³未満
			10,000m³以上50,000m³未満
			50,000m³以上
		有り	5,000m³未満
			5,000m³以上10,000m³未満
			10,000m³以上50,000m³未満
			50,000m³以上

（注）1. 上表は、土砂、岩塊・玉石の掘削積込（片切掘削は掘削のみ）の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. 上表は、同一の施工箇所において、3D-MG 又はMCバックホウ（以下「ICT建機」という。）のみで施工する（ICT建機使用割合 100%）場合である。

なお、施工数量は、1 工事当りの全体掘削土量により判定し、「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削（注）6. 施工数量、破砕片除去数量」によるものとする。また、該当する施工箇所における ICT 建機による施工の掘削土量をその箇所の掘削土量とし、これを合計したものを全体掘削土量とする。

3. 土砂、岩塊・玉石の掘削積込、又は土砂の片切掘削について、同一の施工箇所において ICT 建機と通常建機（ICT 建機を使用しない通常機種のバックホウ）を組合せて施工する（ICT 建機使用割合 100%以外）場合は、該当する箇所における掘削土量を ICT 建機使用割合に応じて ICT 建機による施工分と通常建機による施工分に分割し、ICT 建機による施工分に上表を適用する。また、通常建機による施工分は、「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削」により別途計上する。

なお、施工数量は、1 工事当りの全体掘削土量により判定し、「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削（注）6. 施工数量、破砕片除去数量」によるものとする。また、該当する施工箇所における ICT 建機による施工分と通常建機による施工分を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし、これを合計したものを全体掘削土量とする。

4. 土量は、地山土量とする。

5. 施工方法は、掘削箇所の地形により「オープンカット」、「片切り」に区分する。

区分については、「第Ⅱ編第1章土工②-1 土工」の図 3-1、図 3-2、図 3-3 を参照のこと。

## 6. 障害の有無

- ①無し：構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されず、連続掘削作業ができる場合
- ②有り：掘削作業において障害物等により施工条件に制限があり（例えば作業障害が多い場合）連続掘削作業ができない場合。掘削深さ 5m 以内で掘削箇所が地下水位等で排水をせず水中掘削（溝掘り、基礎掘削）を行う場合

7. ICT建機使用割合は、上記（注）2. 又は3. の1工事当りの全体掘削土量に対する1工事当りのICT建機による掘削土量の割合である。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3. 2 掘削(ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）] 山積 0.8m³（平積 0.6m³）吊能力 2.9t	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m³未満の場合 ・「片切掘削」の場合
		バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 山積 1.4m³（平積 1.0m³）	「オープンカット」で施工数量 50,000m³以上の場合
	K2	ICT建設機械経費加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m³ 未満の場合 ・「片切掘削」の場合
		ICT建設機械経費損料加算額 （バックホウ）	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m³ 以上の場合
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	普通作業員	片切掘削の場合
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

（注）1. ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。

2. ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ）は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。

## 3-2 路体（築堤）盛土（ICT）（SCB210570）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.3 路体(築堤)盛土(ICT) 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

施工数量	障害の有無
10,000m³未満	無し
	有り
10,000m³以上	無し
	有り

- (注) 1. 上表は、路体又は築堤の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事  
で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均  
し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 施工数量は、ICT施工による1工事当りの全体盛土量（施工幅員4.0m以上の合計盛土量）と  
する。
3. 土量は締固め後の土量とする。
4. 障害の有無
- ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、築堤工  
事等）
- ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現  
道拡幅工事、拡築（腹付、嵩上）工事等）
5. 湿地ブルドーザ（湿地・ICT施工対応型）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ロー  
ラ（土工用）の締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。



## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 路体(築堤)盛土(ICT) 代表機労材規格一覧

施工数量	項目		代表機労材規格	備考
10,000m <sup>3</sup> 未満	機械	K1	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t級	賃料
		K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （ブルドーザ（ICT施工対応型））	賃料
		K3	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕11～12t	賃料
	労務	R1	運転手（特殊）	
		R2	－	
		R3	－	
		R4	－	
	材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
		Z2	－	
		Z3	－	
		Z4	－	
	市場単価	S	－	
10,000m <sup>3</sup> 以上	機械	K1	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t級	賃料
		K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （ブルドーザ（ICT施工対応型））	賃料
		K3	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕11～12t	賃料
	労務	R1	運転手（特殊）	
		R2	－	
		R3	－	
		R4	－	
	材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
		Z2	－	
		Z3	－	
		Z4	－	
	市場単価	S	－	

（注）ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。

## 3-3 路床盛土（ICT）（SCB210580）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 5 路床盛土(ICT) 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

施工数量	障害の有無
10,000m³未満	無し
	有り
10,000m³以上	無し
	有り

- (注) 1. 上表は、路床の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事  
で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂  
等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 施工数量は、ICT施工による1工事当りの全体盛土量（施工幅員4.0m以上の合計盛土量）と  
する。
3. 土量は締固め後の土量とする。
4. 障害の有無
- ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、あるい  
は新設の築堤工事等）
- ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現  
道拡幅工事、あるいは拡築（腹付、嵩上）工事等）
5. 湿地ブルドーザ（湿地・ICT施工対応型）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ロー  
ラ（土工用）の締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 6 路床盛土(ICT) 代表機労材規格一覧

施工数量	項目		代表機労材規格	備考
10,000m <sup>3</sup> 未満	機械	K1	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕7t 級	賃料
		K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （ブルドーザ（ICT施工対応型））	賃料
		K3	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕11～12t	賃料
	労務	R1	運転手（特殊）	
		R2	—	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	
10,000m <sup>3</sup> 以上	機械	K1	ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）〕16t 級	賃料
		K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （ブルドーザ（ICT施工対応型））	賃料
		K3	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕11～12t	賃料
	労務	R1	運転手（特殊）	
		R2	—	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	

（注）ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。

## 4. ICT建設機械経費加算額

## 4-1 ICT建設機械経費賃料加算額

地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。

- (1) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））  
13,000 円/日
- (2) ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型））  
13,000 円/日

## 4-2 ICT建設機械経費損料加算額

建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。

- (1) ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ）  
41,000 円/日

## 5. その他ICT建設機械経費等

ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。

## 5-1 保守点検

ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。

- (1) 掘削（ICT）※ [ICT建機使用割合 100%]

$$\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^3)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^3/\text{日})} \times \frac{100}{100}$$

(注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章 その他①作業日当り標準作業量」の標準作業量による。

- (2) 路体（築堤）盛土（ICT），路床盛土（ICT）

$$\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.07(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^3)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^3/\text{日})}$$

(注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他①作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。

## 5-2 システム初期費

ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。

- (1) 掘削（ICT）※ [ICT建機使用割合 100%] 対象機械：バックホウ  
598,000 円/式
- (2) 路体（築堤）盛土（ICT），路床盛土（ICT） 対象機械：ブルドーザ  
548,000 円/式

## 5-3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。

## 5-4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における経費の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。

- ・共通仮設費率補正係数：1.2
- ・現場管理費率補正係数：1.1

※小数点第3位四捨五入2位止め

なお、土工（ICT）において、経費の計上が適用となる出来形管理は、以下の（1）～（5）又は完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお、その他の出来形管理の経費は、共通仮設費及び現場管理費率に含まれる。

- （1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
- （2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- （3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- （4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- （5）上記（1）～（4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

## 6. 参考資料（掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合100%〕）

## 6-1 ICT建機使用割合100%以外の場合における積算

土砂、岩塊・玉石の掘削積込、又は土砂の片切掘削について、同一の施工箇所においてICT建機と通常建機を組合せて施工する（ICT建機使用割合100%以外）場合は、以下のとおりとする。

## （1）施工数量の判定

施工数量は、1工事当りの全体掘削土量により判定し、「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削（注）6. 施工数量、破砕片除去数量」によるものとする。なお、該当する施工箇所におけるICT建機による施工分と通常建機による施工分を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし、これを合計したものを全体掘削土量とする。

## （2）積算

該当する施工箇所の掘削土量をICT建機使用割合に応じてICT建機による施工分と通常建機による施工分に分割し、以下のとおり計上する。


## 【ICT建機による施工分】

施工パッケージ「掘削（ICT）〔ICT建機使用割合100%〕」を適用し、該当する施工箇所における掘削土量（ICT建機による施工分と通常建機による施工分の掘削土量の合計）にICT建機使用割合を乗じて算出した値をICT建機による施工分の掘削土量として計上する。なお、ICT建機使用割合を乗じて算出した値は、四捨五入した数値とし、数値は「第Ⅰ編第6章数値基準等」によるものとする。

## 【通常建機による施工分】

該当する施工箇所における掘削土量からICT建機による施工分の掘削土量を差し引いて算出した値を通常建機による施工分の掘削土量とし、「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削」により別途計上する。

## 6-2 積算例（ICT建機使用割合 100%以外の場合）

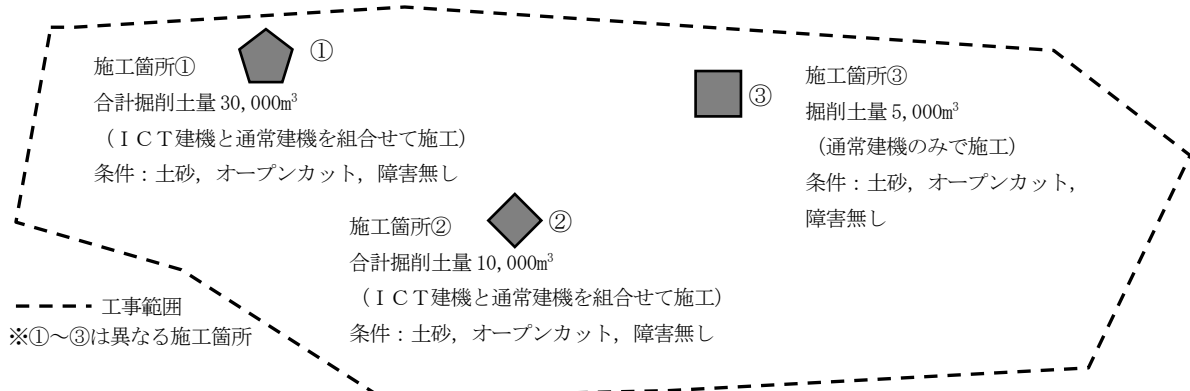

(注) 積算例は，施工箇所（図中①～③）が点在する工事に該当しない場合であり，施工箇所が点在する工事に該当する場合は，「第Ⅰ編第12章施工箇所が点在する工事の積算」による。

## 【ICT建機使用割合 25%の場合】

## ・施工数量の判定

施工箇所①：30,000m<sup>3</sup> + 施工箇所②：10,000m<sup>3</sup> = 40,000m<sup>3</sup> < 50,000m<sup>3</sup>

よって，施工数量は「10,000m<sup>3</sup>以上 50,000m<sup>3</sup>未満」を選択する。

施工箇所③：通常建機のみによる施工であるため，「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削」による。

## ・積算

施工箇所①：{「掘削(ICT)※ [ICT 建機使用割合 100%]，土砂，オープンカット，障害無し，10,000m<sup>3</sup>以上 50,000m<sup>3</sup>未満」の単価} × 7,500m<sup>3</sup> + {「掘削，土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，10,000m<sup>3</sup>以上 50,000m<sup>3</sup>未満」の単価} × 22,500m<sup>3</sup>

施工箇所②：{「掘削(ICT)※ [ICT 建機使用割合 100%]，土砂，オープンカット，障害無し，10,000m<sup>3</sup>以上 50,000m<sup>3</sup>未満」の単価} × 2,500m<sup>3</sup> + {「掘削，土砂，オープンカット，押土無し，障害無し，10,000m<sup>3</sup>以上 50,000m<sup>3</sup>未満」の単価} × 7,500m<sup>3</sup>

施工箇所③：通常建機のみによる施工であるため，「第Ⅱ編第1章土工②-1 3-1 掘削」による。

### ③ 作業土工（建地－Ⅰ）

#### ③－Ⅰ 床掘工

##### 1. 適用範囲

本資料は、構造物の築造又は撤去を目的とした、土砂、岩塊・玉石の掘削等である床掘りに適用する。

##### 1－Ⅰ 適用できる範囲

###### 1－Ⅰ－Ⅰ 床掘り

(1) 作業土工（床掘り）のうち、土砂、岩塊・玉石におけるバックホウ床掘・クラムシェル床掘・人力床掘の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅱ 掘削補助機械搬入搬出

(1) 掘削深さ 20m 以下のクラムシェル床掘で、土留・仮締切工の中に切梁・腹起し又は基礎杭等の障害物があるため、掘削補助機械を使用する場合

(2) 掘削深さ 20m 超のクラムシェル床掘で掘削補助機械を使用する場合

###### 1－Ⅰ－Ⅲ 基面整正

(1) 機械による床掘り作業における床付面の基面整正の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅳ 舗装版破碎積込（小規模土工）

(1) 1箇所当りの施工土量が 100m<sup>3</sup> 程度まで、又は平均施工幅 1m 未満の床掘り作業に伴う舗装厚 5cm 以内の舗装版破碎積込の場合

##### 1－Ⅱ 適用できない範囲

###### 1－Ⅱ－Ⅰ 床掘り

(1) 深礎工、鋼管矢板基礎工、共同溝工、地すべり防止工のクラムシェル床掘の場合

(2) 地山の掘削作業の場合


(3) 積込み単独の作業の場合

###### 1－Ⅱ－Ⅱ 基面整正

(1) 人力床掘の場合

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

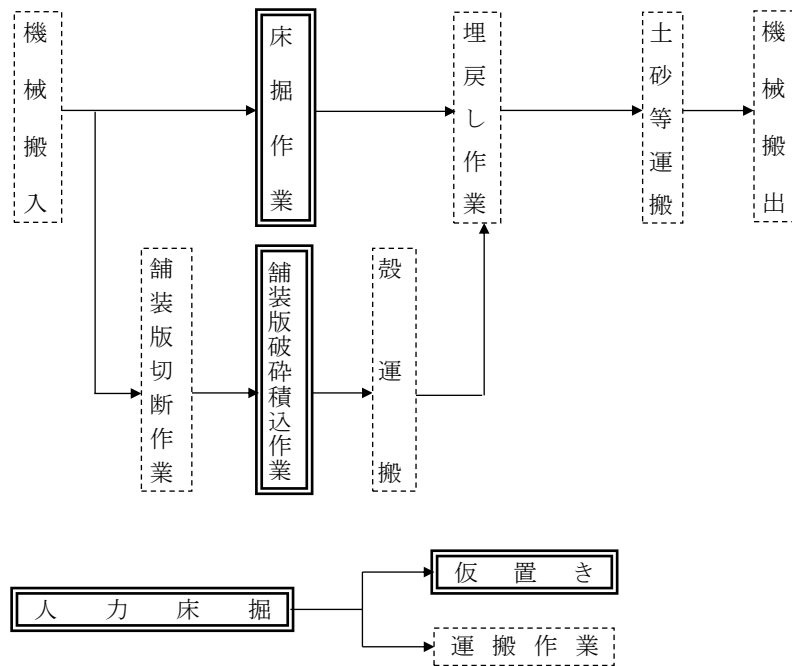


- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 人力床掘は現場制約有り（機械施工ができない箇所の人力施工）に適用する。  
 3. 埋戻しは「第Ⅱ編第1章③-2埋戻工」による。  
 4. 土砂等運搬は「第Ⅱ編第1章②土工」による。  
 5. 殻運搬は「第Ⅱ編第2章共通工⑤殻運搬」による。

図 2-1 施工フロー



## 2-2 クラムシェル工法選定フロー

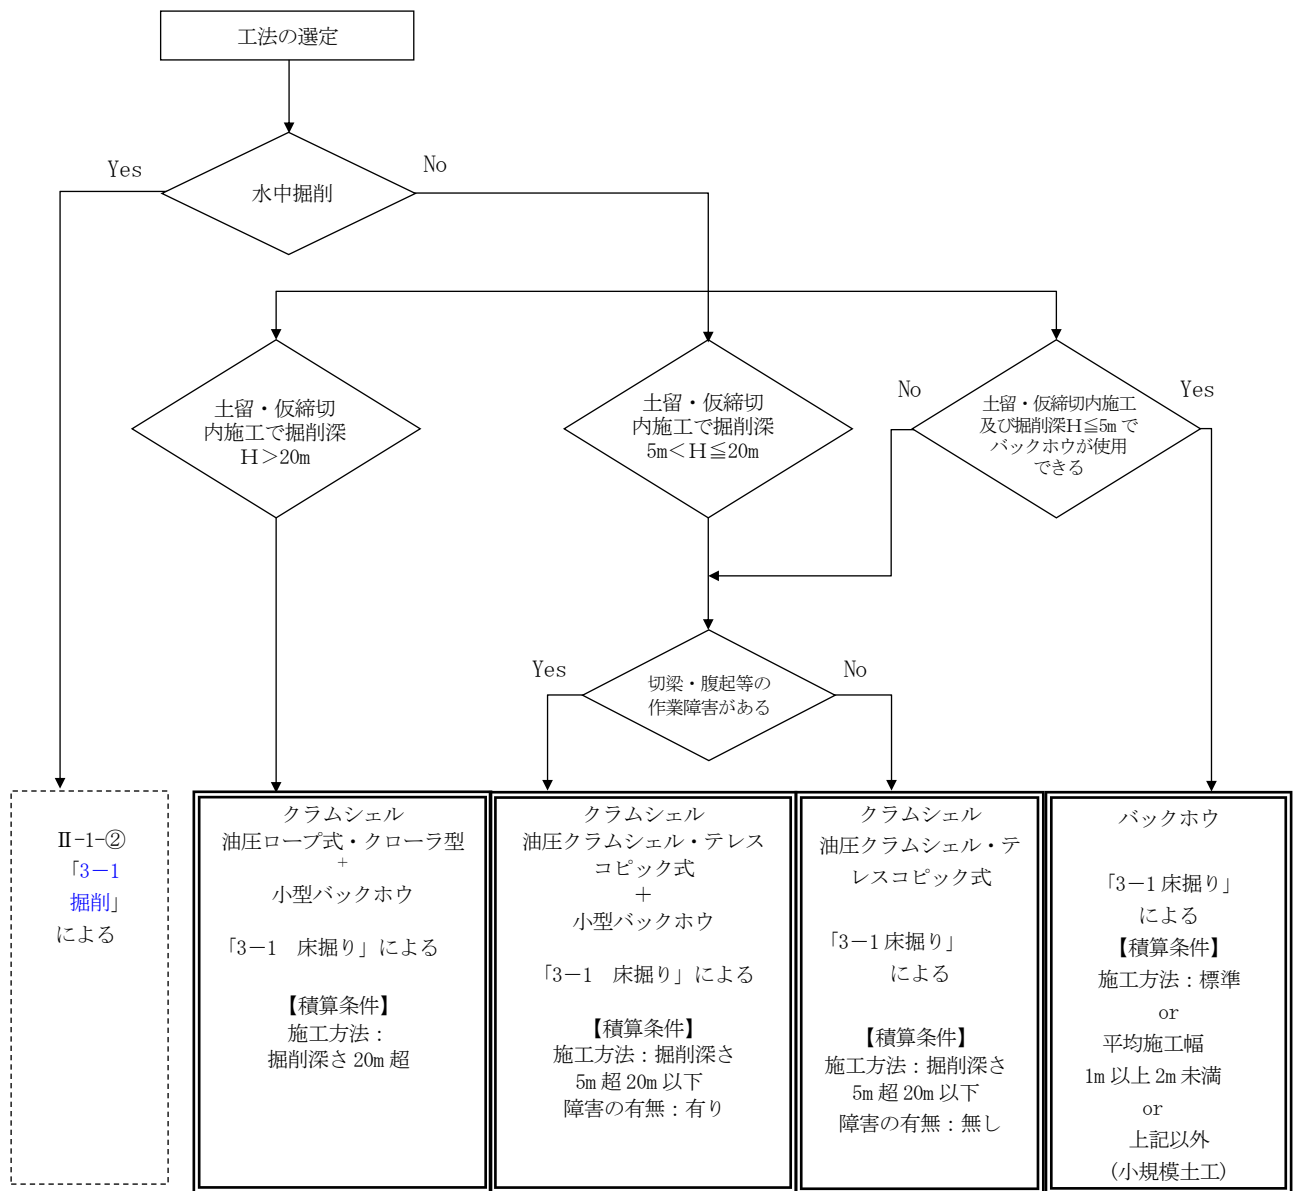

(注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-2 クラムシェル工法選定フロー図

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 床掘り (SCB210030)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 床掘り 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無
土 砂	標準	無し	(表 3.2)
		自立式	
		グラントアンカー式	
		切梁腹起式	
	平均施工幅 1m 以上 2m 未満	無し	
		自立式	
		グラントアンカー式	
		切梁腹起式	
	掘削深さ 5m 超 20m 以下	グラントアンカー式	
		切梁腹起式	
	掘削深さ 20m 超	グラントアンカー式	—
		切梁腹起式	—
	上記以外(小規模)	—	—
	現場制約あり	—	—
岩塊・玉石	標準	無し	(表 3.2)
		自立式	
		グラントアンカー式	
		切梁腹起式	
	平均施工幅 1m 以上 2m 未満	無し	
		自立式	
		グラントアンカー式	
		切梁腹起式	
	掘削深さ 5m 超 20m 以下	グラントアンカー式	
		切梁腹起式	
	掘削深さ 20m 超	グラントアンカー式	—
		切梁腹起式	—
	現場制約あり	—	—

- (注) 1. 上表は、構造物の築造又は撤去を目的とした土砂、岩塊・玉石の掘削等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。なお、施工方法「上記以外（小規模）」の場合は床掘作業における補助労務（基面整正、浮き石の除去）を含み、施工方法「現場制約あり（機械施工ができない箇所的人力施工）」の場合は基面整正を含む。
2. 施工方法「上記以外（小規模）」又は「現場制約あり」以外で基面整正を行う場合は、「[3-3 基面整正](#)」により別途計上する。
3. 施工方法「上記以外（小規模）」とは、1 箇所当りの施工土量が 100m<sup>3</sup> 程度まで、又は平均施工幅 1m 未満の床掘りで、「1 箇所当り」とは、目的物 1 箇所当りであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を 1 箇所とする。
4. 施工方法「現場制約あり」とは、機械施工が困難な場合。

## 5. 障害の有無

有り：①床掘作業において、障害物等により施工条件に制限がある場合（たとえば作業障害が多い場合）

②土留・仮締切工の中に切梁・腹起し又は基礎杭等の障害がある場合

無し：①構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されないオープン掘削の場合

②構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されない矢板のみの土留・仮締め切り工法掘削の場合

③土留・仮締切工の中に切梁・腹起し又は基礎杭等の障害がない場合

6. 施工方法「標準」及び「平均施工幅 1m 以上 2m 未満」において掘削箇所が地下水位等で排水をせず水中掘削作業を行う場合は、障害の有無で「有り」を適用する。

7. 小型バックホウの坑内搬入搬出については、「3-2 掘削補助機械搬入搬出」により計上する。

8. 坑内でバックホウを使用する場合、及び基面整正、床掘補助作業に防護施設、送風機等が必要な場合は別途計上する。

表 3. 2 障害の有無

積算条件	区 分
障害の有無	無し
	有り

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 3 床掘り 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	施工方法						備考
		標準	平均 施工幅 1m 以上 2m 未満	掘削 深さ 5m 超 20m 以下	掘削 深さ 20m 超	左記 以外 (小規模)	現場 制約 あり	
機械	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.8m³（平積 0.6m³）	○						賃料
	バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.45m³（平積 0.35m³）		○					賃料
	バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 山積 0.28m³（平積 0.2m³）					○		
	クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型] 平積 0.8m³				○			
	クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]平積 0.4m³			○				
	小型バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 山積 0.08m³（平積 0.06m³）			◎	○			
	K3 ー							
労務	R1 運転手（特殊）	○	○	○	○	○		
	R2 普通作業員	△	△	○	○	○	○	
	R3 特殊作業員			◎	○			
	R4 ー							
材料	Z1 軽油 1.2 号 パトロール給油	○	○	○	○	○		
	Z2 ー							
	Z3 ー							
	Z4 ー							
市場単価	S ー							

※◎：障害有りの場合，△：土留方式無し以外の場合

## 3-2 掘削補助機械搬入搬出（SCB210070）

## (1) 条件区分

掘削補助機械搬入搬出の積算条件区分はない。

積算単位は、回とする。

- (注) 1. 掘削補助機械搬入搬出は、構造物の築造目的に基面を掘下げる床掘作業において、掘削補助機械を用いる場合の補助機械搬入搬出等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。  
2. 「搬入＋搬出」を1回とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である

表 3. 4 掘削補助機械搬入搬出 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 基面整正（SCB210080）

## (1) 条件区分

基面整正の積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^2$  とする。

- (注) 1. 基面整正は、床掘り作業における床付面の整正等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。  
2. 施工パッケージ「床掘り」において施工方法「現場制約あり」又は「上記以外（小規模）」を選択した場合は、基面整正を計上する必要はない。

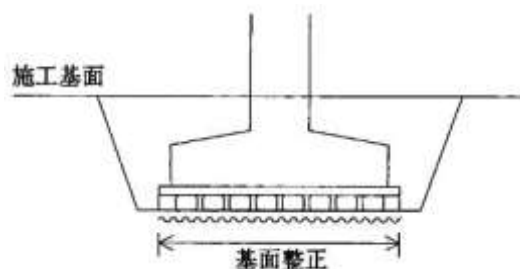


図 3-1 基面整正の計上部分

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 基面整正 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-4 舗装版破碎積込（小規模土工）（SCB210720）

## (1) 条件区分

舗装版破碎積込（小規模土工）の積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^2$ とする。

（注）舗装版破碎積込（小規模土工）は、1箇所当りの施工土量が  $100m^3$  程度まで、又は平均施工幅 1m 未満の床掘作業に伴う舗装版破碎積込（舗装厚 5cm 以内）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。なお、「1箇所当り」とは目的物（構造物・掘削等）1箇所当りのことであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を 1箇所とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.6 舗装版破碎積込（小規模土工）代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 $0.13m^3$ （平積 $0.10m^3$ ）	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ③-2 埋戻工（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、構造物の築造及び撤去後の床掘り部における埋戻しに適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 埋戻し


- (1) 埋戻しにおいて材料のはねつけを行う場合
- (2) 埋戻しにおいて敷均しを行う場合
- (3) 埋戻しにおいて締固めを行う場合

## 1-1-2 タンパ締固め

- (1) タンパによる締固めを行う場合

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー



（注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

2. 床掘作業は「第Ⅱ編第1章③-1 床掘工」による。

図2-1 施工フロー図

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 埋戻し（SCB210410）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表3.1 埋戻し 積算条件区分一覧

（積算単位：m³）

施工方法	土質	締固めの有無
最小埋戻幅 4m 以上	—	—
最大埋戻幅 4m 以上	—	—
最大埋戻幅 1m 以上 4m 未満	—	—
最大埋戻幅 1m 未満	—	—
上記以外（小規模）	土砂	—
現場制約あり	土砂	有り
		無し
	岩塊・玉石	有り
		無し

（注）1. 上表は、構造物の築造及び撤去後の床掘部のはねつけ、埋戻し、敷均し・締固め等、補助労務（敷均し及びタンパ締固め補助）、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 施工方法「上記以外（小規模）」とは、1箇所当たりの施工土量が100m³程度まで、又は平均施工幅1m未満の床掘りに伴う埋戻しで、「1箇所当たり」とは、目的物1箇所当たりであり、目的物が連続している場合は、連続している区間を1箇所とする。

3. 施工方法「現場制約あり」とは機械施工が困難な場合。


## 4. 埋戻幅

最大埋戻幅：次図における埋戻幅（W1）

最小埋戻幅：次図における埋戻幅（W2）

なお、擁壁等で前背面の最大埋戻幅が異なる場合は、広い方の領域を基準とし、狭い方も同一条件区分を適用するものとする。

5. 最小埋戻幅が4m以上の場合は、最大埋戻幅に関係なく、最小埋戻幅4m以上を適用する。
6. はねつけ機械の搬入が困難な場合は、施工方法を現場制約あり、締固め有りとする。
7. 機械施工が困難な場合において、小運搬や盛土法面整形が必要な場合は、別途計上する。
8. 締固めを伴わない作業等、本施工パッケージによることが著しく不適当と判断される場合は別途考慮する。

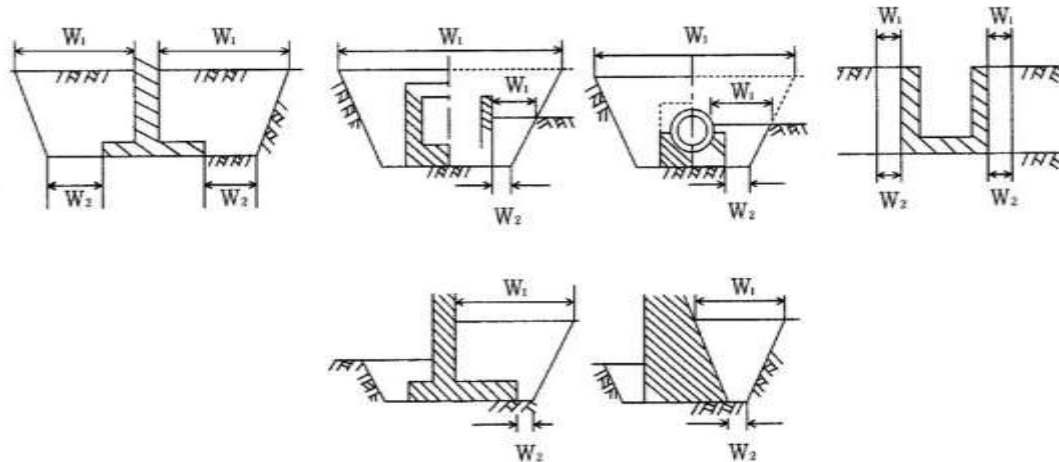

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

項目	代表機労材規格	施工方法					備考
		最小埋戻幅 4m以上	最大埋戻幅 4m以上	最大埋戻幅 1m以上 4m未満	最大埋戻幅 1m未満	左記以外 (小規模)	
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	○	○	○		
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）			○		
		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）				○	
	K2	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 15t 級	○				
		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.8～1.1t		○	○		賃料
	K3	タンバ及びランマ 質量 60～80kg		○	○	○	※
		ランマ 質量 60～80kg				○	
労務	R1	運転手（特殊）	○	○	○	○	
	R2	特殊作業員		○	○	○	※
	R3	普通作業員		○	○	○	
	R4	—					
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	○	○	○	○	
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド		○	○	○	※
	Z3	—					
	Z4	—					
市場単価	S	—					

※締固め有りの場合

## 3-2 タンパ締固め（SCB210450）

## (1) 条件区分

タンパ締固めの積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$ とする。

- (注) 1. タンパ締固めは、タンパによる締固め作業等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。
2. 土量は締固め後の土量とする。
3. 埋戻しの現場制約ありで締固め有りを選択した場合は、タンパ締固めを含んでいるので、別途計上する必要はない。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である

表 3. 2 タンパ締固め 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	普通作業員	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	ガソリン レギュラー スタンド	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	



## ④ 人力運搬工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、機械運搬が使用できない箇所において、小車を使用した人力運搬に適用する。

なお、法勾配は1：3.75（15度）以下の現場に適用する。


## 1-1 適用できる範囲

- (1) 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）は、人力による積込み、小車による運搬、人力による取卸しに適用し、人力運搬（運搬～取卸し）は、小車による運搬、人力による取卸しに適用する。
- (2) 運搬対象は土砂（粘性土，砂，砂質土，レキ質土，岩塊・玉石混じり土）とする。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。


- (1) 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）



（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-1 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)施工フロー

- (2) 人力運搬（運搬～取卸し）



（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-2 人力運搬(運搬～取卸し)施工フロー

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）（SCB211150）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>3</sup>）

換算距離
（表 3.2）

（注）1. 上表は、仮置きされた土砂の積込み～人力運搬～取卸しの一連作業の他、小車の損料等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離を適用する。また、複数個所で積込み（または取卸し）をする場合は、その中心を起点（又は終点）として水平距離を算出する。

$$L = H + h \times 8$$

L：換算距離（m）

H：水平距離（m）

h：高低差（m）

表 3.2 換算距離

積算条件	区分
換算距離	20m 以下
	40m 以下
	60m 以下
	80m 以下
	100m 以下
	120m 以下
	140m 以下
	160m 以下
	180m 以下
	200m 以下

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.3 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 人力運搬（運搬～取卸し）（SCB211180）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 4 人力運搬（運搬～取卸し） 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

換算距離
(表 3. 2)

(注) 1. 上表は、人力掘削（床掘り）から人力運搬～取卸しの一連作業の他、小車の損料等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離を適用する。また、複数箇所での積み（または取卸し）をする場合、その中心を起点（または終点）として水平距離を算出する。

$$L = H + h \times 8$$

L：換算距離（m）

H：水平距離（m）

h：高低差（m）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 5 人力運搬（運搬～取卸し） 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	—
	K2	—
	K3	—
労務	R1	普通作業員
	R2	—
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	—
	Z2	—
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## ⑤ 安定処理工（建地－Ⅰ）

## ⑤－Ⅰ 安定処理工

## 1. 適用範囲

本資料は、地盤改良工における安定処理に適用する。

## (1) スタビライザ混合

現位置での路上混合作業で、混合深さ 1m 以下、かつ 1 層までの混合に適用する。

なお、1 層の混合深さが 1m を超える場合や 2 層以上混合する場合は、別途考慮する。

## (2) バックホウ混合

現場条件によりスタビライザによる施工ができない路床改良工事のうち 1 層の混合深さが路床 1m 以下における現位置での混合作業、又は構造基礎の地盤改良工事で 1 層の混合深さが 2m 以下における現位置での混合作業に適用する。


なお、固化材はセメント系のみとし、路床改良における適用可能な現場条件とは次のいずれかに該当する箇所とする。

- ① 施工現場が狭隘な場合
- ② 転石がある場合
- ③ 移設できない埋設物がある場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。


## (1) スタビライザ混合



- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 養生中の飛散防止等の有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。

図 2-1 スタビライザ混合施工フロー図

## (2) バックホウ混合



- (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-2 バックホウ混合施工フロー図

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 安定処理（SCB211410）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 安定処理 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材 100㎡ 当り 使用量	混合回数
スタビライザ	－	0.6m 以下	(実数入力)	1 回
		0.6m を超え 1m 以下		2 回
				1 回
				2 回
バックホウ	路床	1m 以下		－
	構造物基礎	1m 以下		－
		1m を超え 2m 以下		－

- (注) 1. 上表は、地盤表層部もしくは路床、構造物基礎の改良材散布混合、敷均し・締固め、養生中の飛散防止（シート掛け）、現場内小運搬（スタビライザは 100m 程度の仮置場～現場、バックホウは 50m 程度の現場内小運搬）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。
2. スタビライザ施工の混合回数は、消石灰・セメント系は 1 回、生石灰は 2 回を標準とする。ただし、土質状態により、これにより難しい場合は、別途考慮する。
3. 条件区分の「固化材 100m<sup>2</sup> 当り使用量」は、実数量（材料ロスを含んだ数量）とする。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.2 安定処理 代表機材規格一覧

使用機種	施工箇所	項目	代表機材規格	備考
スタビライザ	—	機械	K1 スタビライザ [路床改良用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 処理深さ 0.6m×幅 2.0m	混合深さ 0.6m 以下の場合
			K1 スタビライザ [路床改良用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 処理深さ 1.2m×幅 2.0m	混合深さ 0.6m を超え 1m 以下の場合
			K2 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.45m³ (平積 0.35m³) 吊能力 2.9t	賃料
		労務	K3 ブルドーザ湿地 [低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 7t 級	賃料
			R1 運転手 (特殊)	
			R2 普通作業員	
			R3 土木一般世話役	
			R4 —	
		材料	Z1 セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1t パック	
			Z2 軽油 1.2 号 パトロール給油	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	
バックホウ	路床	機械	K1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.45m³ (平積 0.35m³) 吊能力 2.9t	賃料
			K2 タイヤローラ [普通型・低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 8~20t	賃料
			K3 —	
		労務	R1 運転手 (特殊)	
			R2 普通作業員	
			R3 土木一般世話役	
			R4 —	
		材料	Z1 セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1t パック	
			Z2 軽油 1.2 号 パトロール給油	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	
バックホウ	構造物基礎	機械	K1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m³ (平積 0.6m³) 吊能力 2.9t	賃料
			K2 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8~1.1t	賃料
			K3 —	
		労務	R1 土木一般世話役	
			R2 運転手 (特殊)	
			R3 特殊作業員	
			R4 普通作業員	
		材料	Z1 セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1t パック	
			Z2 軽油 1.2 号 パトロール給油	
			Z3 —	
			Z4 —	
		市場単価	S —	


## ⑤－２ 安定処理工（自走式土質改良工）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、自走式土質改良機内で改良機内で建設発生土の原料土を固化材と均質に混合し、改良土として再利用するための安定処理工（自走式土質改良工）に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

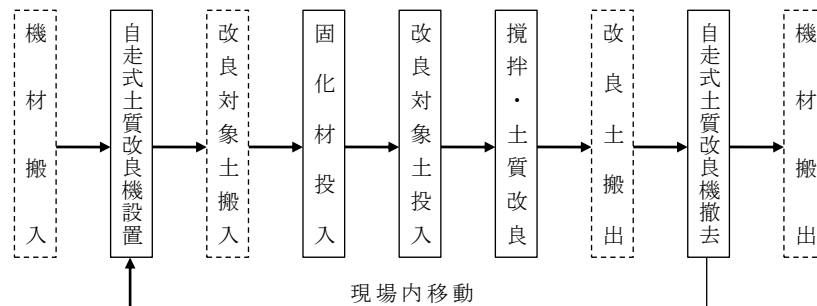

- （注） 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 改良対象土搬入・改良土搬出は別途計上とする。  
 3. 搬入・搬出時及び公道等を跨いで現場内移動する場合は、自走式土質改良機設置・撤去工を計上する。

図2-1 施工フロー図

## 3. 自走式土質改良機設置・撤去工

## 3-1 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種を選定

作業種別	機械名	規 格	単 位	数 量
自走式土質改良機 設置・撤去	自走式土質改良機	[解砕・固化材混合式]機械質量20t級	台	1

（注） 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 3-2 施工歩掛

自走式土質改良機設置・撤去工における施工歩掛は、次表とする。

表3.2 施工歩掛

（1台1回当たり）

名 称	単 位	設 置	撤 去
土木一般世話役	人	0.39	0.27
特殊作業員	〃	0.39	0.27
運転手（特殊）	〃	0.39	0.27
自走式土質改良機運転	日	0.39	0.27

## 4. 土質改良工

土質改良工は、固化材投入、改良対象土投入、攪拌・土質改良までの作業とする。

## 4-1 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表4.1 機種を選定

作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量
固化材投入、攪拌・土質改良	自走式土質改良機	[解砕・固化材混合式]機械質量20t級	台	1
改良対象土投入	バックホウ (クローラ型)	超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³)	〃	1

(注) 1. バックホウは、賃料とする。  
2. 現場状況により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 4-2 編成人員

土質改良工の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4.2 日当り編成人員 (人)

土木一般世話役	特 殊 作 業 員
1	1

## 4-3 日当り施工量

土質改良工における日当り施工量は、次表を標準とする。

表4.3 日当り作業量 (m³/日)

土質分類	数量
レキ質土	375
砂及び砂質土	316
粘性土	301

(注) 1. 土量は、地山土量とする。  
2. 上表は、玉石等(200mm以上)の除去作業は含まない数量であり、除去作業が必要な場合は、別途計上する。

## 4-4 固化材使用量

固化材の使用量は、次式による。

固化材使用量 = 設計量 × (1+K)……………式4.1

固化材使用量：地山土量100m³当り固化材使用量 (t)

設計量：地山土量100m³当り固化材設計添加量 (t)

K : ロス率

表4.4 ロス率(K)

K	+0.04
---	-------

## 4-5 諸雑費

諸雑費は、自走式土質改良機付属器（ハンマ、カッタ、パドル、ベルトコンベア、フィルタ）の損料等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表4.5 諸雑费率 (%)

諸 雑 費 率	7
---------	---



## 5. 単価表

## (1) 自走式土質改良機設置（撤去）1台1回当り単価表

SWB211710

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2
特 殊 作 業 員		〃		〃
運 転 手 （ 特 殊 ）		〃		〃
自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械 質量20t級	日		〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 土質改良工100m<sup>3</sup>当り単価表

SWB211720

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3
特 殊 作 業 員		〃	1×100/D	〃
固 化 材		t		表4.4, 式4.1
自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械 質量20t級	日	100/D	表4.1, 表4.3 機械損料
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ） 運 転	超低騒音型・排出ガス対策 型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	〃	100/D	〃 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.5
計				

(注) D：日当り施工量

## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質 量20t級	機-24	燃料消費量 →115 機械損料数量→1.82
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ） 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →105 機械賃料数量→1.80


## ⑥ 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、土砂（岩塊・玉石混り土含む）の掘削に伴い、バックホウで積込み、不整地運搬車にて土砂を運搬する作業に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

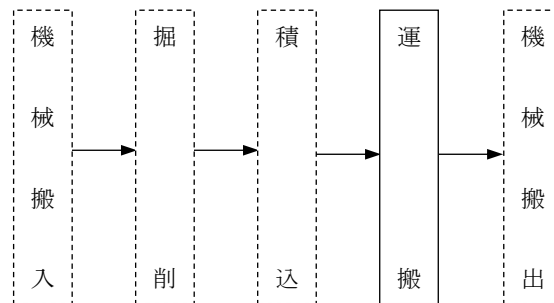

- （注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 掘削・積込は、「[第Ⅱ編第1章土工②土工](#)」による。

図 2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

不整地運搬に使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	摘 要
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型（第2次基準値）6～7t積	5,000m³未満
	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型（第2次基準値）10～11t積	5,000m³以上

- （注）1. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。  
 2. 上表で示す土量は、1工事当りの不整地運搬車による取扱い土量（地山土量）である。  
 3. 不整地運搬車は、賃料とする。

## 4. 機械の施工歩掛

## (1) 日当り運搬量

バックホウで積込み、不整地運搬車で運搬する場合、日当り運搬量は表4. 1、表4. 2、表4. 3及び表4. 4による。

表4. 1 日当り運搬量（土砂）

積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）									
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（第2次基準値）6～7t 積〕									
運搬距離（m）	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下
日当り運搬量（m <sup>3</sup> ）	280	267	243	217	188	160	133	104	76	48

表4. 2 日当り運搬量（土砂）

積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）									
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（第2次基準値）6～7t 積〕									
運搬距離（m）	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下
日当り運搬量（m <sup>3</sup> ）	210	203	189	172	152	134	115	92	68	44

表4. 3 日当り運搬量（土砂）

積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）									
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（第2次基準値）10～11t 積〕									
運搬距離（m）	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下
日当り運搬量（m <sup>3</sup> ）	392	377	339	306	273	229	190	152	112	73

表4. 4 日当り運搬量（土砂）

積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）									
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（第2次基準値）10～11t 積〕									
運搬距離（m）	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下
日当り運搬量（m <sup>3</sup> ）	264	258	240	225	207	181	154	128	99	66

（注）1. 表4. 1～表4. 4は、1日に運搬する地山土量である。

2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。

3. 運搬距離が800mを超える場合は、別途考慮する。

4. 積込機械の規格は、土砂運搬工の前段で行う掘削・積込・作業土工にて選択されたバックホウの機種に基づき選定を行う。

5. 上記の積込機械により難しい場合は、別途考慮する。

## 5. 単価表

(1) 不整地運搬車 100m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB211810

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(第2次基準値) ○t 積	日	100/D	表 4.1～表 4.4 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) D：日当り運搬量 (m<sup>3</sup>/日)

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 10～11t 積	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 175 機械賃料数量 → 1.54
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 6～7t 積	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 112 機械賃料数量 → 1.54

## ⑦（参考歩掛）伐採工（県-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、山間地斜面の立木伐採に必要な、伐倒、枝払、玉切、片付、積込、運搬に適用する。  
なお、現場条件等によりこれにより難い場合は、別途考慮すること。

## 2. 施工歩掛

## 2-1 伐倒、枝払、玉切、片付、積込作業歩掛

## 2-1-1 伐倒

伐倒歩掛は次表を標準とする。

表2.1 伐倒歩掛

(100本当たり)

名 称	単位	胸高直径					適 用
		10cm未満	10cm以上 20cm未満	20cm以上 30cm未満	30cm以上 40cm未満	40cm以上 50cm未満	
土木一般世話役	人	0.50	0.67	0.85	1.35	1.95	
特殊作業員	〃	1.01	1.35	1.70	2.70	3.90	
普通作業員	〃	0.50	0.67	0.85	1.35	1.95	
諸雑費	%	4					

備考 1 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2-1-2 枝払

伐倒木の枝払を行う場合は、次表を標準とする。

表2.2 枝払歩掛

(100本当たり)

名 称	単位	胸高直径					適 用
		10cm未満	10cm以上 20cm未満	20cm以上 30cm未満	30cm以上 40cm未満	40cm以上 50cm未満	
土木一般世話役	人	0.20	0.27	0.35	0.55	0.80	
特殊作業員	〃	0.41	0.55	0.70	1.11	1.60	
普通作業員	〃	0.20	0.27	0.35	0.55	0.80	
諸雑費	%	4					

備考 1 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2-1-3 玉切

伐倒及び枝払した材の玉切を行う歩掛は、次表を標準とする。

表2.3 玉切歩掛

(100本当り)

名 称	単位	胸高直径					適 用
		10cm未満	10cm以上 20cm未満	20cm以上 30cm未満	30cm以上 40cm未満	40cm以上 50cm未満	
土木一般世話役	人	0.23	0.31	0.40	0.63	0.91	
特殊作業員	〃	0.47	0.63	0.80	1.27	1.83	
普通作業員	〃	0.23	0.31	0.40	0.63	0.91	
諸雑費	%	4					

備考 1 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2-1-4 片付

玉切した丸太を片付ける歩掛は、次表を標準とする。

表2.4 片付歩掛

(100本当り)

名 称	単位	胸高直径					適 用
		10cm未満	10cm以上 20cm未満	20cm以上 30cm未満	30cm以上 40cm未満	40cm以上 50cm未満	
一般土木世話役	人	0.27	0.37	0.47	0.74	1.07	
特殊作業員	〃	0.56	0.75	0.95	1.51	2.18	
普通作業員	〃	0.27	0.37	0.47	0.74	1.07	
バックホウ運転 排出ガス対策型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h	2.16	2.96	3.76	5.92	8.56	

## 2-1-5 積込

玉切した丸太を積み込む歩掛は、次表を標準とする。

表2.5 積込歩掛

(25m<sup>3</sup>当り)

名 称	単位	各胸高直径	適 用
土木一般世話役	人	0.27	
特殊作業員	〃	0.55	
普通作業員	〃	0.27	
バックホウ運転 排出ガス対策型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h	2.16	

備考 1 100本当り25m<sup>3</sup>で換算することを標準とするが、これにより難しい場合には別途考慮すること。

## 2-2 運搬作業歩掛

工事区域外に搬出する際の運搬は次表を標準とする。

表2.6 運搬作業歩掛

(1台当り)

運搬機械	ダンプ 4t積、10t積					
運搬距離(km)	1.8以下	3.2以下	4.6以下	6.0以下	7.5以下	9.1以下
運搬時間(h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
運搬距離(km)	10.7以下	12.4以下	14.2以下	16.1以下	18.1以下	20.3以下
運搬時間(h)	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
運搬距離(km)	22.7以下	25.2以下	28.4以下	30.0以下		
運搬時間(h)	1.3	1.4	1.5	1.6		

備考 1 上表はダンプダンプトラック 4 又は 10t 積により運搬する場合であり、これにより難しい場合は別途考慮すること。

2 重量により数量算出を行う場合は、0.8t/m<sup>3</sup>により換算するものとする。

## 第2章 共通工

① 法面工……………Ⅱ-2-①- 1	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-②- 2
①-1 法面整形工……………Ⅱ-2-①- 1	③ コンクリートブロック積(張)工……………Ⅱ-2-③- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-2-③- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-①- 1	2 施工概要……………Ⅱ-2-③- 3
3 施工フロー……………Ⅱ-2-①- 2	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-③- 5
4 施工パッケージ……………Ⅱ-2-①- 4	4 参考図……………Ⅱ-2-③-20
①-2 法面整形工(ⅠＣＴ)……………Ⅱ-2-①- 6	④ 場所打擁壁工……………Ⅱ-2-④- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①- 6	④-1 場所打擁壁工(1)……………Ⅱ-2-④- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-①- 6	1 適用範囲……………Ⅱ-2-④- 1
3 施工フロー……………Ⅱ-2-①- 6	2 施工概要……………Ⅱ-2-④- 2
4 施工パッケージ……………Ⅱ-2-①- 7	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-④- 5
5 ⅠＣＴ建設機械経費加算額……………Ⅱ-2-①- 8	④-2 場所打擁壁工(2)……………Ⅱ-2-④-16
6 その他ⅠＣＴ建設機械経費等……………Ⅱ-2-①- 8	1 適用範囲……………Ⅱ-2-④-16
①-3 芝付工……………Ⅱ-2-①- 9	2 施工パッケージ……………Ⅱ-2-④-16
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①- 9	⑤ 石積(張)工……………Ⅱ-2-⑤- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-①- 9	⑤-1 石積(張)工……………Ⅱ-2-⑤- 1
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-①-10	1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑤- 1
①-4 コンクリート法枠工……………Ⅱ-2-①-11	2 施工概要……………Ⅱ-2-⑤- 3
1 プレキャスト法枠工……………Ⅱ-2-①-11	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-⑤- 3
2 現場打法枠工……………Ⅱ-2-①-14	⑥ プレキャスト擁壁工……………Ⅱ-2-⑥- 1
3 単価表……………Ⅱ-2-①-17	1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑥- 1
①-5 法面施肥工……………Ⅱ-2-①-21	2 施工概要……………Ⅱ-2-⑥- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①-21	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-⑥- 2
2 機種の選定……………Ⅱ-2-①-21	⑦ 補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁)
3 施工歩掛……………Ⅱ-2-①-21	……………Ⅱ-2-⑦- 1
4 単価表……………Ⅱ-2-①-22	1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑦- 1
①-6 吹付法面とりこわし工……………Ⅱ-2-①-23	2 施工概要……………Ⅱ-2-⑦- 2
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①-23	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-⑦- 3
2 施工概要……………Ⅱ-2-①-23	⑧ ジオテキスタイル工……………Ⅱ-2-⑧- 1
3 工法の選定……………Ⅱ-2-①-23	1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑧- 1
4 施工パッケージ……………Ⅱ-2-①-24	2 施工概要……………Ⅱ-2-⑧- 1
①-7 プレキャストコンクリート板設置工	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-⑧- 2
……………Ⅱ-2-①-26	4 参考資料……………Ⅱ-2-⑧- 5
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①-26	⑨ 構造物補修工……………Ⅱ-2-⑨- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-①-26	⑨-1 構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-①-26	……………Ⅱ-2-⑨- 1
①-8 人工張芝工……………Ⅱ-2-①-29	1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑨- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-①-29	2 施工概要……………Ⅱ-2-⑨- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-①-29	3 施工歩掛……………Ⅱ-2-⑨- 2
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-①-29	4 単価表……………Ⅱ-2-⑨- 3
② 基礎・裏込砕石工……………Ⅱ-2-②- 1	⑨-2 構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))
1 適用範囲……………Ⅱ-2-②- 1	……………Ⅱ-2-⑨- 4
2 施工概要……………Ⅱ-2-②- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑨- 4



2 施工概要……………Ⅱ-2-⑨- 4	Ⅱ-4 高圧噴射攪拌工……………Ⅱ-2-Ⅱ-18
3 施工歩掛……………Ⅱ-2-⑨- 5	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅱ-18
4 単価表……………Ⅱ-2-⑨- 6	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅱ-18
⑨-3 構造物補修工(断面修復工(左官工法))	3 機種の選定……………Ⅱ-2-Ⅱ-19
……………Ⅱ-2-⑨- 7	4 編成人員……………Ⅱ-2-Ⅱ-20
1 適用範囲……………Ⅱ-2-⑨- 7	5 施工歩掛……………Ⅱ-2-Ⅱ-20
2 施工概要……………Ⅱ-2-⑨- 7	6 単価表……………Ⅱ-2-Ⅱ-29
3 施工歩掛……………Ⅱ-2-⑨- 8	Ⅱ-5 中層混合処理工……………Ⅱ-2-Ⅱ-32
4 単価表……………Ⅱ-2-⑨- 9	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅱ-32
⑩ 排水構造物工……………Ⅱ-2-Ⅹ- 1	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅱ-32
⑩-1 排水構造物工……………Ⅱ-2-Ⅹ- 1	3 機種の選定……………Ⅱ-2-Ⅱ-33
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅹ- 1	4 編成人員……………Ⅱ-2-Ⅱ-33
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅹ- 3	5 施工歩掛……………Ⅱ-2-Ⅱ-34
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅹ- 6	6 単価表……………Ⅱ-2-Ⅱ-35
⑩-2 排水構造物工(溶接金網及び埋設鋼板型枠)	⑫ 薬液注入工……………Ⅱ-2-Ⅻ- 1
……………Ⅱ-2-Ⅹ-28	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅻ- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅹ-28	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅻ- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅹ-28	3 機種の選定……………Ⅱ-2-Ⅻ- 2
3 施工歩掛……………Ⅱ-2-Ⅹ-28	4 編成人員……………Ⅱ-2-Ⅻ- 3
4 単価表……………Ⅱ-2-Ⅹ-29	5 施工歩掛……………Ⅱ-2-Ⅻ- 4
⑩-3 排水構造物工(現場打ち水路(本体))	6 単価表……………Ⅱ-2-Ⅻ-11
……………Ⅱ-2-Ⅹ-30	⑬ アンカー工(ロータリーパーカッション式)
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅹ-30	……………Ⅱ-2-Ⅼ- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅹ-30	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅼ- 1
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅹ-31	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅼ- 1
⑩-4 排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体))	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅼ- 2
……………Ⅱ-2-Ⅹ-34	⑭ 構造物とりこわし工……………Ⅱ-2-Ⅽ- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅹ-34	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅽ- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅹ-34	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅽ- 1
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅹ-35	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅽ- 2
⑪ 軟弱地盤処理工……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1	⑮ コンクリート削孔工……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1
⑪-1 サンドマット工……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅰ- 2
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅰ- 1	⑯ ガス切断工……………Ⅱ-2-Ⅱ- 1
⑪-2 粉体噴射攪拌工(DJM工法)……………Ⅱ-2-Ⅰ- 3	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅱ- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅰ- 3	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅱ- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅰ- 3	3 施工歩掛……………Ⅱ-2-Ⅱ- 1
3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅰ- 4	4 単価表……………Ⅱ-2-Ⅱ- 1
⑪-3 スラリー攪拌工……………Ⅱ-2-Ⅰ- 8	⑰ 吸出し防止材設置工……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅰ- 8	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1
2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅰ- 8	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1
3 機種の選定……………Ⅱ-2-Ⅰ- 9	3 施工パッケージ……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1
4 編成人員……………Ⅱ-2-Ⅰ-10	⑱ 目地・止水板設置工……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1
5 施工歩掛……………Ⅱ-2-Ⅰ-11	1 適用範囲……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1
6 単価表……………Ⅱ-2-Ⅰ-16	2 施工概要……………Ⅱ-2-Ⅲ- 1

3	施工パッケージ	Ⅱ-2-⑱- 2
4	参考(塩ビ止水板)	Ⅱ-2-⑱- 4
⑲	旧橋撤去工	Ⅱ-2-⑲- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-⑲- 1
2	施工概要	Ⅱ-2-⑲- 3
3	施工パッケージ	Ⅱ-2-⑲- 4
⑳	かご工	Ⅱ-2-㉔- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉔- 1
2	施工概要	Ⅱ-2-㉔- 1
3	施工パッケージ	Ⅱ-2-㉔- 2
4	かご工(じゃかご、ふとんかご)参考図	Ⅱ-2-㉔- 4
㉑	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	Ⅱ-2-㉑- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉑- 1
2	施工概要	Ⅱ-2-㉑- 1
3	施工パッケージ	Ⅱ-2-㉑- 3
4	参考図	Ⅱ-2-㉑-10
㉒	骨材再生工(自走式)	Ⅱ-2-㉒- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉒- 1
2	施工概要	Ⅱ-2-㉒- 1
3	自走式破碎機設置・撤去工	Ⅱ-2-㉒- 1
4	骨材再生工	Ⅱ-2-㉒- 2
5	単価表	Ⅱ-2-㉒- 3
㉓	函渠工	Ⅱ-2-㉓- 1
㉓-1	函渠工(1)	Ⅱ-2-㉓- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉓- 1
2	施工概要	Ⅱ-2-㉓- 1
3	施工パッケージ	Ⅱ-2-㉓- 2
㉓-2	函渠工(2)	Ⅱ-2-㉓- 6
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉓- 6
2	施工パッケージ	Ⅱ-2-㉓- 6
㉓-3	函渠工(3)大型プレキャストカルバート工	Ⅱ-2-㉓- 8
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉓- 8
2	施工概要	Ⅱ-2-㉓- 8
3	機種の選定	Ⅱ-2-㉓- 9
4	施工歩掛	Ⅱ-2-㉓-10
5	基礎材	Ⅱ-2-㉓-12
6	均しコンクリート	Ⅱ-2-㉓-12
7	単価表	Ⅱ-2-㉓-13
㉔	現場取卸費	Ⅱ-2-㉔- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉔- 1
2	施工パッケージ	Ⅱ-2-㉔- 1
㉕	殻運搬	Ⅱ-2-㉕- 1
1	適用範囲	Ⅱ-2-㉕- 1
2	施工パッケージ	Ⅱ-2-㉕- 1

## 第2章 共 通 工

### ① 法面工 （建地－Ⅰ）

#### ①－1 法面整形工 （建地－Ⅰ）

##### 1. 適用範囲

本資料は、盛土法面整形工及び切土法面整形工に適用する。

##### 1－1 適用できる範囲

(1) 土質がレキ質土、砂及び砂質土、粘性土、軟岩Ⅰ・Ⅱ、中硬岩、硬岩の法面整形

##### 1－2 適用できない範囲

(1) 3D－MG又はMCバックホウによる法面整形

##### 2. 施工概要

##### 2－1 盛土法面整形工


法面表層部を締め整形することを盛土法面整形工という。

##### 2－2 切土法面整形工

法面表層部を削取りながら整形することを切土法面整形工という。

## 3. 施工フロー

## 3-1 法面整形工 工法選定フロー

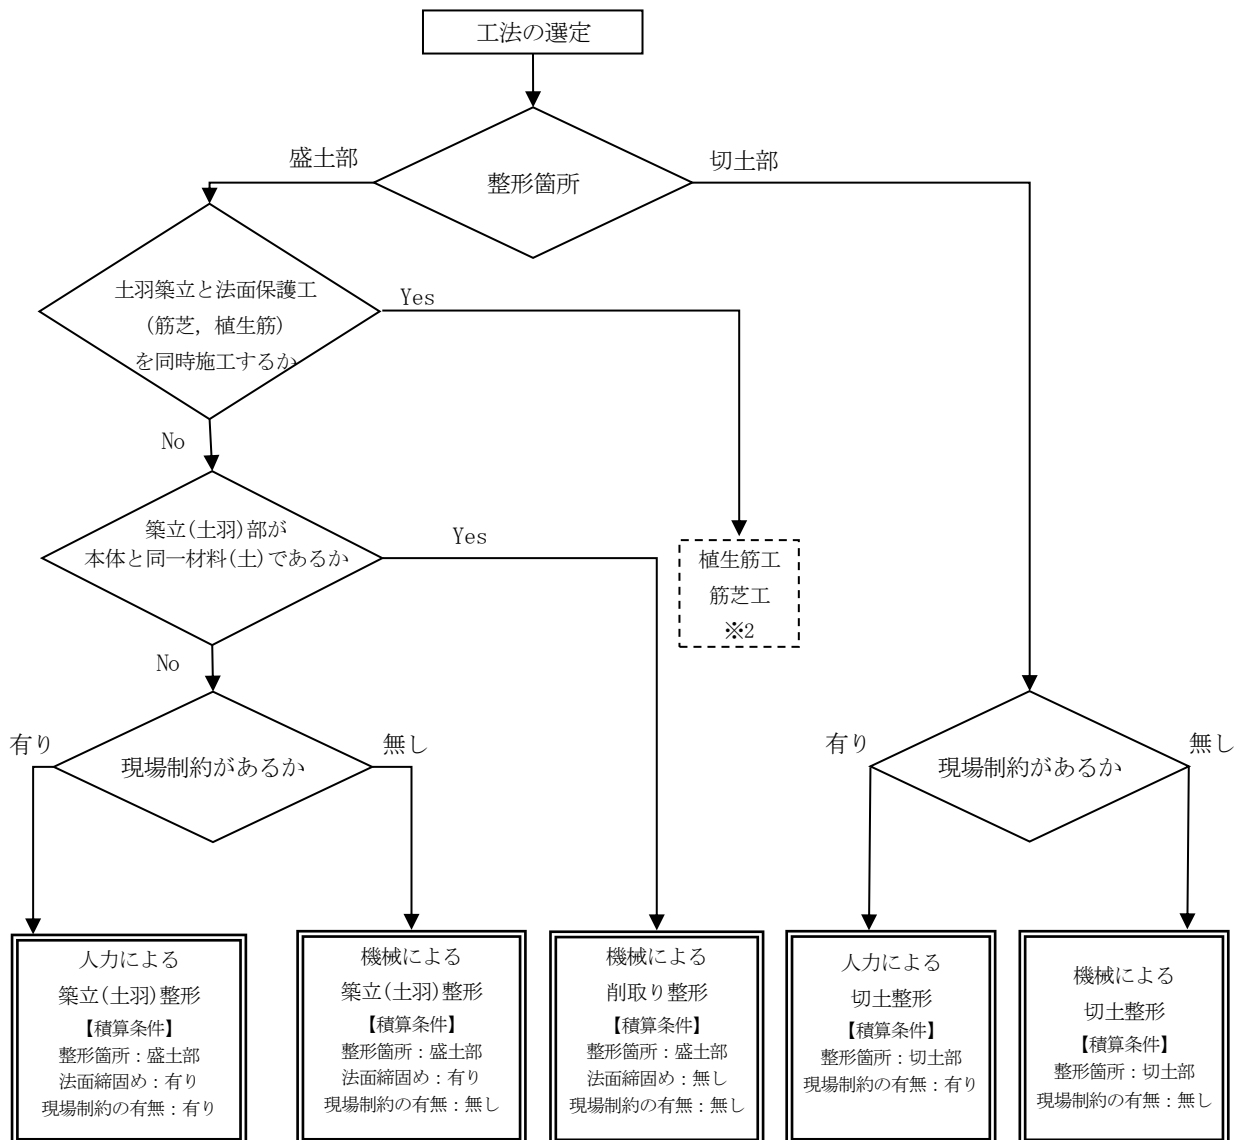

(注) 1. 下記の条件のいずれかに該当する場合は現場制約有りとする。

- ・機械施工が困難な場合
- ・一度法面整形を完成した後、局部的に浸食・崩壊を生じた場合
- ・法面保護工を施工する前に必要に応じて行う整形作業（二次整形）をする場合

2. 植生筋工，筋芝工については「第Ⅵ編第1章市場単価④-1 法面工」により別途計上すること。

図 3-1 法面整形工 工法選定フロー図

## 3-2 盛土部施工フロー

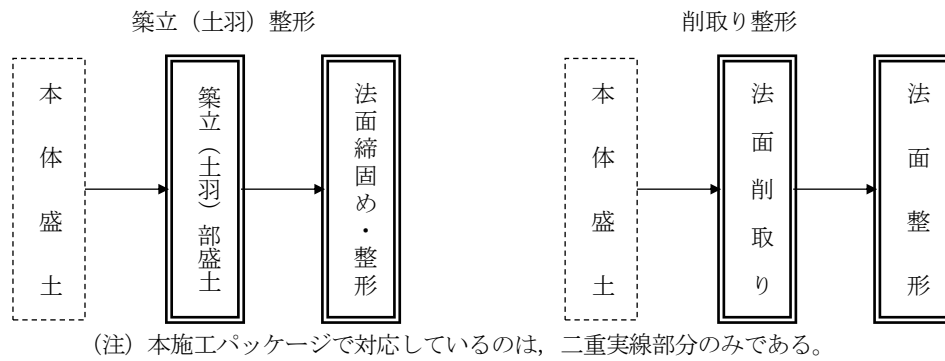


図 3-2 盛土部施工フロー図

## 3-3 切土部施工フロー

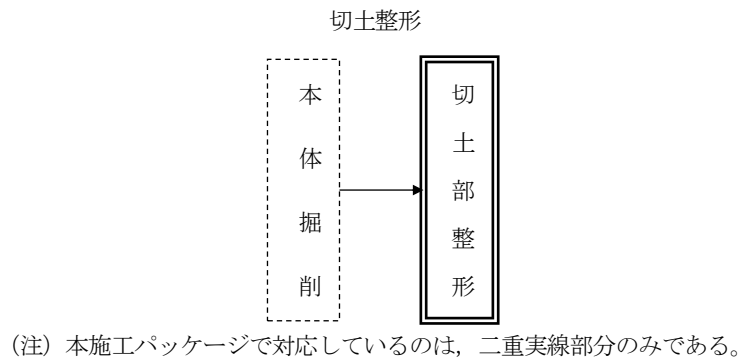


図 3-3 切土部施工フロー図

## 4. 施工パッケージ

## 4-1 法面整形（SCB220010）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 4. 1 法面整形 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土，粘性土
		無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土
	無し	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土
切土部	—	有り	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土
			軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩
		無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土
			軟岩Ⅰ

(注) 1. 上表は、切土法面の表層部を削取りながらの法面整形又は盛土法面の表層部を削取りながらの法面整形及び築立てながらの法面（土羽）整形，土羽土の現場内小運搬（20m 程度）の他，空気圧縮機，ピックハンマ賃料，チゼル損耗費等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. 残土の積み込み，工区外の運搬，並びに法面保護工は含まない。

3. 土羽土の搬入等は含まない。

4. 下記の条件のいずれかに該当する場合は現場制約有りとする。

- ・機械施工が困難な場合
- ・一度法面整形を完成した後，局部的に浸食・崩壊を生じた場合
- ・法面保護工を施工する前に必要に応じて行う整形作業（二次整形）をする場合

5. 現場制約がある場合は，切土・盛土ともに人力施工になる。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 4.2 法面整形 代表機労材規格一覧

現場制約の有無	整形箇所	項目		代表機労材規格	備考
無し	盛土部 切土部	機械	K1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	賃料
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	普通作業員	
			R2	運転手（特殊）	
			R3	土木一般世話役	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
有り	盛土部	機械	K1	ランマ 質量 60～80kg	
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	普通作業員	
			R2	土木一般世話役	
			R3	特殊作業員	
			R4	—	
		材料	Z1	ガソリン レギュラー スタンド	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
	切土部	機械	K1	—	
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	普通作業員	
			R2	土木一般世話役	
			R3	特殊作業員	軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩の場合
			R4	—	
		材料	Z1	—	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	

## ①-2 法面整形工（ICT）（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、ICTによる盛土法面整形工及び切土法面整形工に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

- (1) 3D-MG又はMCバックホウによる土質がレキ質土、砂及び砂質土、粘性土、軟岩Ⅰの法面整形

## 1-2 適用できない範囲

- (1) 3D-MG又はMCバックホウ以外の法面整形  
(2) 現場制約がある場合

現場制約：「第Ⅱ編第2章共通工①-1法面整形工 3. 施工フロー 3-1法面整形工 工法選定フロー（注）1」による。

## 2. 施工概要

## 2-1 盛土法面整形工

法面表層部を締め整形することを盛土法面整形工という。

## 2-2 切土法面整形工

法面表層部を削取りながら整形することを切土法面整形工という。

## 3. 施工フロー

## 3-1 法面整形工（ICT） 工法選定フロー

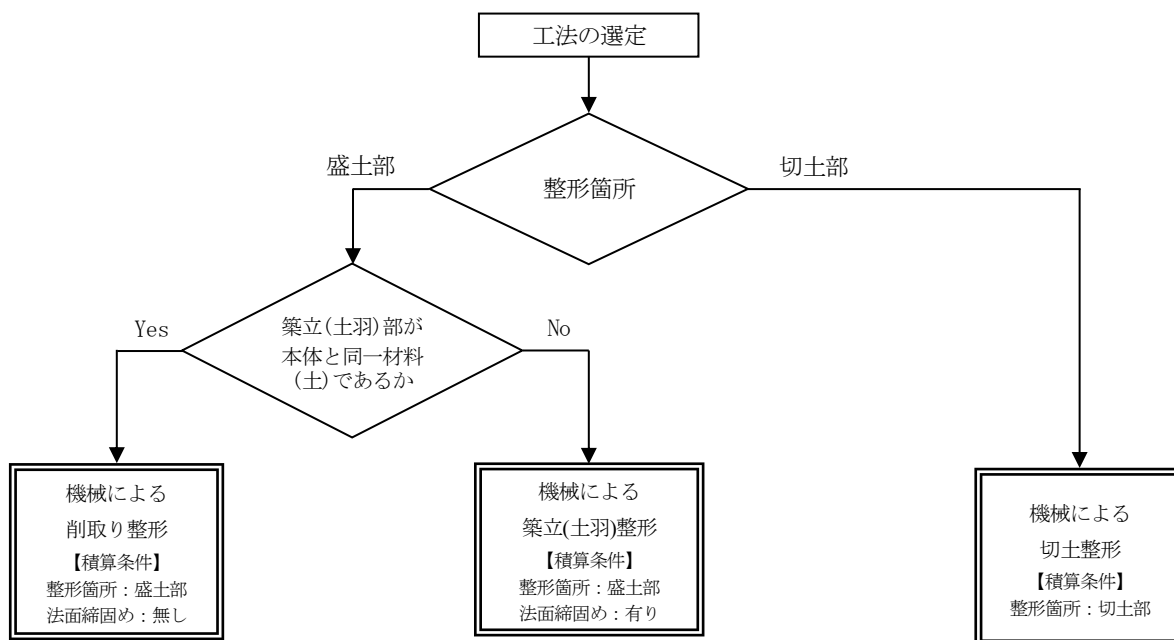


図 3-1 法面整形工(ICT) 工法選定フロー図

(注) 盛土部・切土部の施工フローは、「第Ⅱ編第2章共通工①-1 法面整形工」の図3-2を、  
切土部の施工フローは、図3-3を参照のこと。



## 4. 施工パッケージ

## 4-1 法面整形（ICT）（SCB220070）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 4. 1 法面整形(ICT) 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

整形箇所	法面締固めの有無	土質
盛土部	有り	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
切土部	—	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
		軟岩Ⅰ

- (注) 1. 上表は、切土法面の表層部を削取りながらの法面整形又は盛土法面の表層部を削取りながらの法面整形及び築立てながらの法面（土羽）整形、土羽土の現場内小運搬（20m程度）の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
 2. 残土の積み込み、工区外の運搬、並びに法面保護工は含まない。  
 3. 土羽土の搬入等は含まない。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 4. 2 法面整形(ICT) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）吊能力2.9t	賃料
	K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））	賃料
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	土木一般世話役	
	R3	普通作業員	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2号 バトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

- (注) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。

## 5. ICT建設機械経費加算額

## 5-1 ICT建設機械経費賃料加算額

地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。

- (1) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））  
13,000 円/日

## 6. その他 ICT建設機械経費等

ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。

## 6-1 保守点検

ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。

- (1) 法面整形（ICT）

$$\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量}(\text{m}^2)}{\text{作業日当り標準作業量}(\text{m}^2/\text{日})}$$

(注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」による。

## 6-2 システム初期費

ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。

- (1) 法面整形（ICT） 対象機械：バックホウ  
598,000 円/式

## 6-3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。

## 6-4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における経費の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。

- ・共通仮設費率補正係数 : 1.2
- ・現場管理費率補正係数 : 1.1

※小数点第3位四捨五入2位止め

なお、法面整形工（ICT）において、経費の計上が適用となる出来形管理は、以下の（1）～（5）又は完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお、その他の出来形管理の経費は、共通仮設費及び現場管理費率に含まれる。

- (1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
- (2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- (3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- (4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- (5) 上記（1）～（4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理

## ①-3 芝付工（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、平面部に施工する市松芝工（格子状に張る場合）に適用する。


## 1-1 適用できる範囲

- (1) 平面部への高麗芝、野芝の芝付

## 1-2 適用できない範囲

- (1) 耳芝のみの施工の場合  
(2) 法面部への高麗芝、野芝の芝付  
(3) 公園工事の場合

【平面図】



【断面図】



## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。




図 2-1 施工フロー図

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 散水養生は必要に応じて別途計上する。  
3. 芝串の有無にかかわらず適用できる。  
4. 施肥は必要に応じて別途計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 市松芝（SCB220210）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 市松芝 積算条件区分一覧

(積算単位：㎡)

芝の規格
高麗芝
野芝

- (注) 1. 上表は、芝の張付け、耳芝、目串、現場内小運搬(20m程度)等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
 2. 散水養生は必要に応じて別途計上する。  
 3. 施肥は必要に応じて別途計上する。  
 4. 芝の標準使用量は、対象面積の50%とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 2 市松芝 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	—
	K2	—
	K3	—
労務	R1	普通作業員
	R2	土木一般世話役
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	野芝
	Z2	—
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## ①-4 コンクリート法枠工（建地-I）


## 1. プレキャスト法枠工

## 1-1 適用範囲

本資料は、プレキャストブロック（質量1,400kg未満/個）による法枠工に適用する。

## 1-2 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

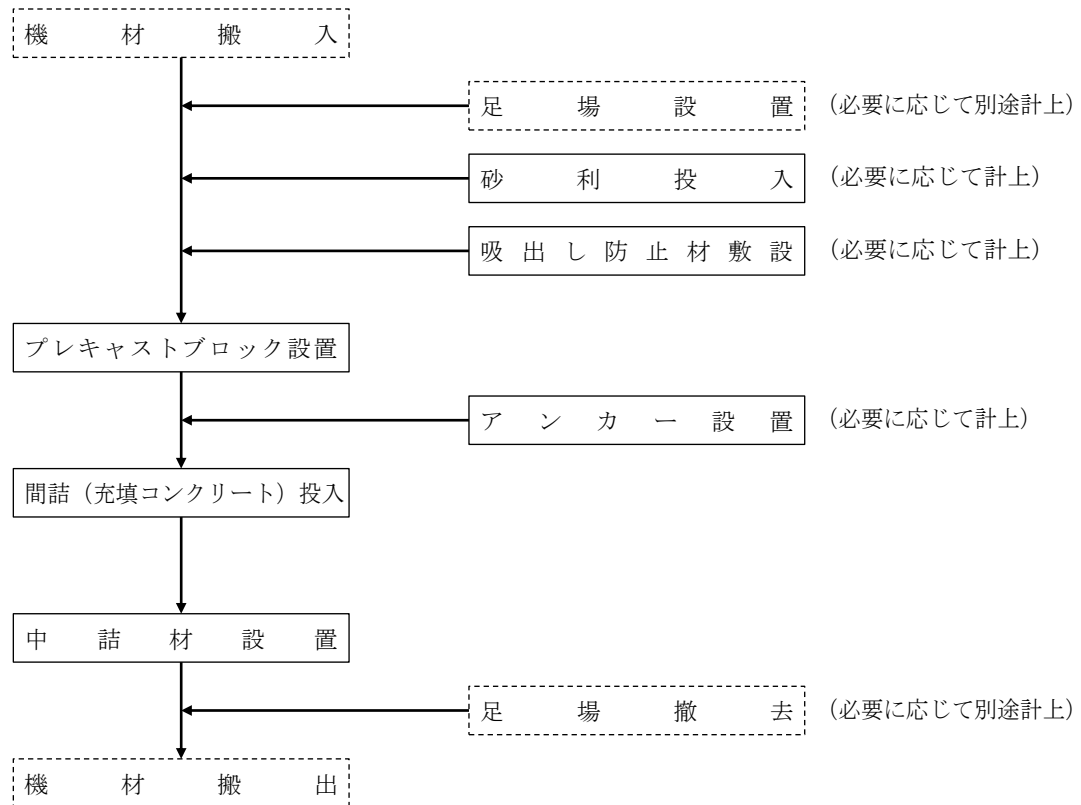

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図1-1 施工フロー

## 1-3 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表1.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
プレキャストブロック設置 中詰材設置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	台	1	
中詰材設置	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	〃	1	

（注） 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。  
2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 1-4 編成人員

プレキャストブロック設置の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表1. 2 日当り編成人員

名 称	単位	数量
土 木 一 般 世 話 役	人	1
ブ ロ ッ ク 工	〃	1
普 通 作 業 員	〃	3

## 1-5 日当り施工量

プレキャストブロック設置の日当り施工量は、次表を標準とする。

表1. 3 日当り施工量 (1日当り)

日当り施工量	単位	数量
プレキャストブロック設置	m <sup>2</sup>	36

- (注) 1. 上表は法枠設置（中詰ブロックを除く）、間詰（充填コンクリート）の施工量であり、施工量は中詰面積を含めた数量である。  
2. 上表には、25m程度の現場内小運搬を含む。

## 1-6 諸雑費

プレキャストブロック設置等の諸雑費率は、次表を標準とする。

表1. 4 諸雑費率

工 種 名	工種の組合せ			
プレキャストブロック設置工	○	○	○	○
ア ン カ ー 設 置 工	×	○	×	○
吸 出 し 防 止 材 敷 設 工	×	×	○	○
諸 雑 費 率 ( % )	3	18	20	35

- (注) 1. ○：当該工種有り。 ×：当該工種無し。  
2. プレキャストブロック設置工：間詰（充填コンクリート）材料費  
アンカー設置工：設置労務費、アンカー材料費  
吸出し防止材敷設工：設置労務費、吸出し防止材材料費  
3. プレキャストブロック設置労務費及び機械賃料の合計額に、上表から選択した率を乗じた金額を上限として計上する。

## 1-7 敷砂利

砂利投入が必要な場合は、次表により計上することができる。

表1.5 敷砂利施工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単位	数量
普 通 作 業 員		人	1.0
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	h	2.0

(注) 1. バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。

2. 砂利の使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量 (m}^3\text{)} \times (1 + K)$$

設計数量：m<sup>3</sup>

K：ロス率

ロス率 (K) の値は、次表を標準とする。

表1.6 ロス率 (K)

ロ ス 率	+0.20
-------	-------

## 1-8 中詰工

中詰工施工の歩掛は、次表を標準とする。

表1.7 中詰工施工歩掛

名 称	規 格	単位	中 詰 区 分				
			中 詰 ブロック (100m <sup>2</sup> )	客 土 (100m <sup>2</sup> )	植 生 土のう (1,000袋)	割石又は 栗石 (10m <sup>2</sup> )	砕 石 (10m <sup>2</sup> )
土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5
ブ ロ ッ ク 工		〃	4.4	—	—	—	—
法 面 工		〃	—	6.0	2.7	—	—
普 通 作 業 員		〃	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	h	—	—	—	—	5.4
諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—

(注) 1. 中詰ブロックの積算対象は、法枠面積を含めた100m<sup>2</sup>当りとする。

2. 植生土のうを製作する場合は、普通作業員1.8 (人/100袋)を加算し、使用土量は2 (m<sup>3</sup>/100袋)を標準とする。また、植生土のうの使用数量は、6 (袋/m<sup>2</sup>)を標準とする。

3. 諸雑費は、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

4. 中詰コンクリート工は、の小型構造物に準じ別途計上する。

5. 中詰張芝工が必要な場合は、「第Ⅵ編第1章市場単価④-1法面工」により別途計上する。

6. 中詰ブロックを3段以上施工する場合は、ラフテレーンクレーンの運転日数0.7 (日/100m<sup>2</sup>)を本表に加算する。

7. 中詰砕石工において、バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。

8. 客土、割石又は栗石及び砕石の使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量 (m}^3\text{)} \times (1 + K)$$

設計数量：m<sup>3</sup>

K：ロス率

ロス率 (K) の値は、次表を標準とする。

表1.8 ロス率 (K)

材 料 名	客 土	割石又は栗石、砕石
ロ ス 率	+0.16	+0.20

## 1-9 足場工

足場を必要とする場合は、「第Ⅱ編第5章⑦-1 足場工」により別途計上する。


## 2. 現場打法枠工

## 2-1 適用範囲

本資料は、施工面積 3,000m<sup>2</sup>以下、平均法長 30m 以下、法勾配 1 : 0.3~1 : 2.0 の法面における現場打法枠工に適用する。

## 2-2 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

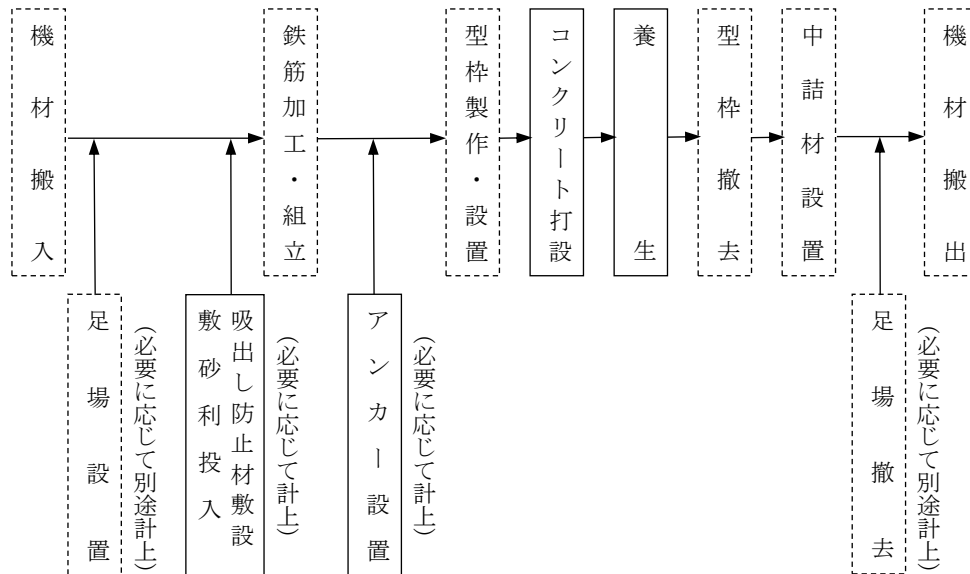

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2-1 施工フロー

## 2-3 施工方法の選定

施工方法の選定は、次表を標準とする。

表2.1 施工方法の選定

施工方法	施工条件
人力打設	施工法面の天端にコンクリート運搬車が接近出来、直打・シュート打が可能な箇所、平均法長 11m 以下、法勾配 1 : 1.5~1 : 2.0 の法面
コンクリートポンプ車打設	上記以外の法面
（注）現場条件等により上表により難しい場合は、別途考慮する。	



## 2-4 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 2. 2 機種の選定

作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90～110m³/h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用
型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t 吊	〃	1	

- (注) 1. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。  
 2. ラフテレーンクレーンは、法尻からの最大法直高 4m 以上の現場において、全数量に適用する。  
 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 2-5 コンクリート投入打設

## 2-5-1 人力打設

人力によるコンクリート投入打設は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」の小型構造物による。

## 2-5-2 コンクリートポンプ車打設

コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛は、次表を標準とする。

ただし、コンクリート混合物の使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量 (m}^3\text{)} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式 5. 1}$$

K：ロス率（+0.15）

表 2. 3 コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛 (100m³当り)

名 称	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役	人	3.8
特 殊 作 業 員	〃	8.8
普 通 作 業 員	〃	13.9
コンクリートポンプ車運転	h	22.7
諸 雑 費 率	%	2

- (注) 1. 上表は、法枠本体の投入打設歩掛であり、養生の労務を含む。  
 2. コンクリートポンプ車の配管打設の場合の圧送管組立・撤去歩掛は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。  
 3. 諸雑費は、コンクリートパイプレータの機械損料、運転経費及び養生材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2-6 アンカー工

アンカーが必要な場合は、次表により計上する。

表 2. 4 アンカー設置工歩掛 (10本当り)

名 称	単位	数量
普 通 作 業 員	人	0.3

(注) アンカーは打込式とし、アンカーピン長さは1m以内とする。

## 2-7 敷砂利及び吸出し防止材

## 2-7-1 敷砂利

敷砂利が必要な場合の歩掛は、「プレキャスト法枠工」による。

## 2-7-2 吸出し防止材

吸出し防止材が必要な場合は、次表により計上する。

ただし、吸出し防止材の使用数量は、次式による。

使用数量（㎡）＝設計数量（㎡）×（1＋K）……式 7. 1

K：ロス率（＋0.08）

表 2. 5 吸出し防止材敷設歩掛 (100㎡当り)

名 称	単位	数量
普 通 作 業 員	人	0.5

## 2-8 中詰工

中詰工歩掛は、「プレキャスト法枠工」の中詰工による。

## 2-9 型枠工

型枠の製作・設置・撤去は、「第Ⅱ編第4章②-1 型枠工」の小型構造物により計上する。

ただし、ラフテレーンクレーンが必要となる場合は、0.8 日（100 ㎡当り）加算する。

なお、ラフテレーンクレーンの規格は、表 2.2 による。

## 2-10 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章市場単価①-1 鉄筋工」により別途計上する。

## 2-11 足場工

足場が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章⑦-1 足場工」により別途計上する。

## 3. 単価表

(1) プレキャストブロック設置 100m<sup>2</sup>当り単価表

SWB220310

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表1.2 表1.3
ブ ロ ッ ク 工		〃	1×100/D	〃 〃
普 通 作 業 員		〃	3×100/D	〃 〃
ブ ロ ッ ク		個		
敷 砂 利		m <sup>3</sup>		単価表(2) 必要に応じて計上
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t 吊	日	1×100/D	表1.3 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表1.4
計				

(注) D：日当り施工量

(2) 敷砂利 10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB220311

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1.5
砂 利		m <sup>3</sup>		表1.5(注)2
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	h		表1.5 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(3) 中詰ブロック設置 100m<sup>2</sup>当り単価表

SWB220330

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7
ブ ロ ッ ク 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ブ ロ ッ ク		個		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t 吊	日		表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上
諸 雑 費		式	1	表1.7
計				

(4) 中詰客土設置 100m<sup>3</sup>当り単価表

SWB220340

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7
法 面 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
客 土		m <sup>3</sup>		表1.7(注)8
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t 吊	日		表1.7 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(5) 中詰植生土のう設置 1,000 袋当り単価表

SWB220350

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7
法 面 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
植 生 土 の う		袋	1,000	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t 吊	日		表1.7 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(6) 中詰割石又は栗石設置 10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB220360

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7
普 通 作 業 員		〃		〃
割 石 又 は 栗 石		m <sup>3</sup>		表1.7(注)8
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t 吊	日		表1.7 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(7) 中詰碎石設置 10m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB220360

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7
普 通 作 業 員		〃		〃
砕 石		m <sup>3</sup>		表1.7(注)8
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 ) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	h		表1.7 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(8) 植生土のう製作 100 袋当り単価表

SWB220380

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1.7(注)2
植 生 土 の う 袋	400×600	袋	100	
植 生 土		m <sup>3</sup>	2	表1.7(注)2 必要に応じて計上
諸 雑 費		式	1	
計				

(9) コンクリートポンプ車打設 100m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB220390

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 2.3
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式 5.1
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	h		表 2.3 機械損料
圧送管組立・撤去費		m <sup>3</sup>	100	(10)単価表 必要に応じて計上
諸 雑 費		式	1	表 2.3
計				

(10) 圧送管組立・撤去費 10m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB220410

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.46×L/7.2	
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) L は、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超えた部分の圧送管延長とする。

(11) アンカー設置工 10 本当り単価表

SWB220313

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 2.4
ア ン カ ー		本	10	
諸 雑 費		式	1	
計				

(12) 吸出し防止材敷設工 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB220312

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 2.5
吸 出 し 防 止 材		m <sup>2</sup>		式 7.1
諸 雑 費		式	1	
計				

(13) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	機-1	
コンクリートポンプ車	トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m <sup>3</sup> /h	機-3	機械損料 1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力 90～110 m <sup>3</sup> /h) 機械損料 2→コンクリート圧送管(径 125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h

(注) Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超えた部分の圧送管延長とする。

## ①ー5 法面施肥工（建地ーD）

## 1. 適用範囲

本資料は、道路法面における法面施肥作業で1㎡当りの吹付肥料が90～120gのもので、法勾配1割以上、平均法長50m以下に適用する。

## 2. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 2.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要
種 子 吹 付 機	車載式(種子専用) タンク容量2.5 m <sup>3</sup> 搭載トラック3t 車	台	1	
ト ラ ッ ク	普通型 4～4.5t 積	〃	1	吹付機搭載用

## 3. 施工歩掛

法面施肥工の歩掛は、次表を標準とする。

表 3.1 法面施肥工歩掛

(1,000㎡当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	
			平均法長 20m 以下	平均法長 20m を超える
土 木 一 般 世 話 役		人	0.14	0.16
普 通 作 業 員		〃	0.28	0.32
種 子 吹 付 機 運 転	車載式(種子専用) タンク容量2.5m <sup>3</sup> 搭載トラック3t 車	h	1.2	1.5
ト ラ ッ ク 運 転	普通型 4～4.5t 積	〃	1.2	1.5
諸 雑 費 率		%	2	

- (注) 1. 諸雑費は、給水用ポンプの損料等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
2. 1日当り作業量は、平均法長20m 以下の場合、5,600㎡/日、平均法長20m を超える場合、4,500㎡/日を標準とする。

## 4. 単価表

(1) 法面施肥工 1,000m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB220510

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1
普 通 作 業 員		〃		〃
肥 料		kg		
種 子 吹 付 機 運 転	車載式(種子専用) タンク容量2.5m <sup>3</sup> 搭載トラック3t 車	h		表 3.1 機械損料
ト ラ ッ ク 運 転	普通型 4～4.5t 積	〃		表 3.1 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.1
計				

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
種 子 吹 付 機	車載式(種子専用) タンク容量2.5m <sup>3</sup> 搭載トラック3t 車	機－13	
ト ラ ッ ク	普通型 4～4.5t 積	機－6	



## ①-6 吹付法面とりこわし工（建地-D）


## 1. 適用範囲

本資料は、モルタルの吹付法面とりこわし工のうち、「仮設ロープを用いたピックハンマ、又はコンクリートカッタ、又はピックハンマとコンクリートカッタの併用による人力とりこわし作業」と「機械によるとりこわし作業（高さ5mまで）」に適用する。

ただし、モルタル厚は5～15cmとする。

## 2. 施工概要

(1) 施工フローは、下記を標準とする。

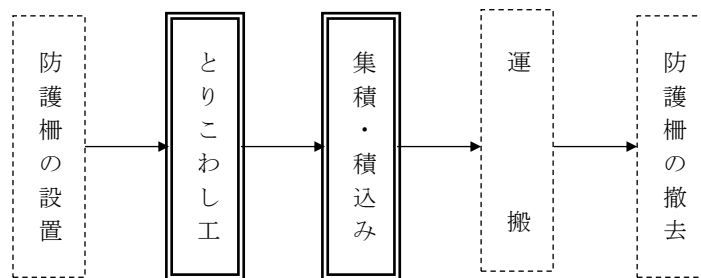

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 運搬は「第Ⅱ編第2章共通工⑤穀運搬」による。  
 3. 防護柵の設置・撤去は「第Ⅱ編第5章④仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）」による。

図2-1 施工フロー

## 3. 工法の選定

(1) とりこわし工法選定は、図3-1による。

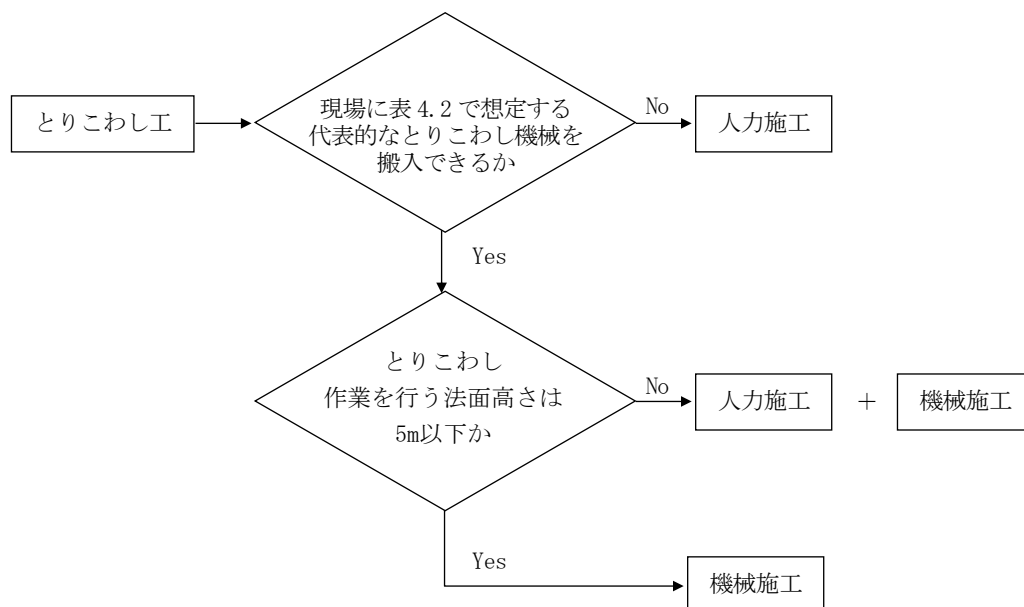


図3-1 とりこわし工法の選定フロー

## (2) 施工形態

「人力施工+機械施工」の場合の施工形態は、図3-2による。

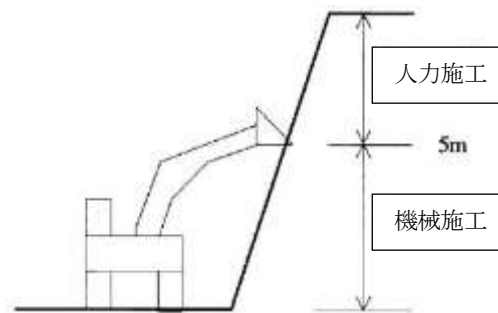


図3-2 施工形態

## 4. 施工パッケージ

## 4-1 吹付法面とりこわし (SCB220710)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表4.1 吹付法面取壊し 積算条件区分一覧

(積算単位：㎡)

集積積込の有無	工法区分
有り	人力施工
	機械施工
無し	人力施工
	機械施工

- (注) 1. 上表で人力施工の場合は、吹付法面のとりこわし、集積・積込み、ラス等の撤去の他、空気圧縮機賃料、ピックハンマ賃料、コンクリートカッタ（ブレード付）賃料、チゼルの損耗費、仮設ロープ、ライフライン（仮設ロープの予備）、仮設ロープ・ライフライン固定用の単管、クランプ、エアホースの費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 上表で機械施工の場合は、吹付法面のとりこわし、集積・積込み、ラス等の撤去等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
3. モルタル殻を径30cm以上50cm以下程度に破砕する小割り作業を含む。
4. 殻運搬、殻処分は含まない。
5. 施工数量は、構造物をとりこわす対象面積(㎡)とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧

集積積込の有無	工法区分	項目		代表機労材規格	備考
有り	人力施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m <sup>3</sup> （平積 0.4m <sup>3</sup> ）	賃料
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	法面工	
			R2	普通作業員	
			R3	土木一般世話役	
			R4	運転手（特殊）	
		材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m <sup>3</sup> （平積 0.4m <sup>3</sup> ）	賃料
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	運転手（特殊）	
			R2	普通作業員	
			R3	土木一般世話役	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
無し	人力施工	機械	K1	—	
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	法面工	
			R2	普通作業員	
			R3	土木一般世話役	
			R4	—	
		材料	Z1	—	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	
	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m <sup>3</sup> （平積 0.4m <sup>3</sup> ）	賃料
			K2	—	
			K3	—	
		労務	R1	運転手（特殊）	
			R2	土木一般世話役	
			R3	—	
			R4	—	
		材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
			Z2	—	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	

## ①-7 プレキャストコンクリート板設置工（建地-D）

## 1. 適用範囲

本資料は、グラウンドアンカーとプレキャストコンクリート板を緊結することにより、斜面等の安定化を図る工法に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 プレキャストコンクリート板

(1) プレキャストコンクリート板が、クロスタイプ、セミスクエアタイプ及びスクエアタイプの場合

## 1-1-2 ジョイント処理

(1) プレキャストコンクリート板が、クロスタイプ及びセミスクエアタイプの場合

(2) ジョイント1箇所当りのモルタル使用数量が $0.05\text{m}^3$ 以下の場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

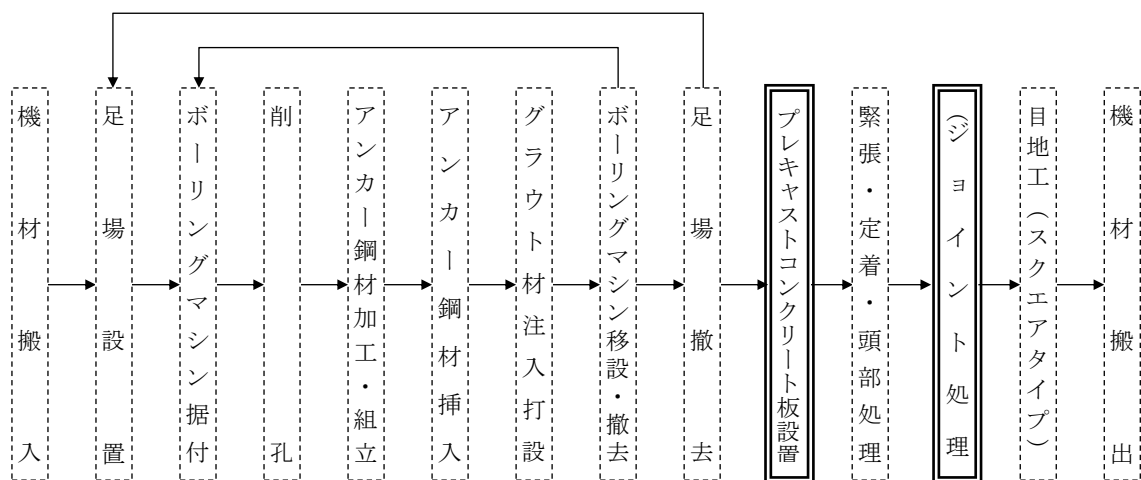


図2-1 施工フロー

(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

2. ボーリングマシンをロータリーパーカッション式ボーリングマシン・クローラ式とするときは、足場設置・撤去及びボーリングマシン据付け・移設・撤去は対象外となる。

3. ジョイント処理は必要な場合計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 削孔工

「第Ⅱ編第2章⑬アンカー工（ロータリーパーカッション式）」の削孔（アンカー）による。

## 3-2 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）

「第Ⅱ編第2章⑬アンカー工（ロータリーパーカッション式）」のアンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）による。

## 3-3 グラウト注入打設工

「第Ⅱ編第2章⑬アンカー工（ロータリーパーカッション式）」のグラウト注入（アンカー）による。

## 3-4 プレキャストコンクリート板（SCB220810）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 プレキャストコンクリート板 積算条件区分一覧

(積算単位：枚)

フレームタイプ	1列当り平均据付枚数
クロスタイプ	20枚未満
	20枚以上 30枚未満
	30枚以上
セミスクエアタイプ・ スクエアタイプ	20枚未満
	20枚以上 30枚未満
	30枚以上

(注) 1. 上表は、プレキャストコンクリート板の設置の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、プレキャストコンクリート板（材料費）は含まない。

2. プレキャストコンクリート板の材料費は別途計上する。

3. 1列当り平均据付枚数は、次式により求める。

$$1 \text{ 列当り平均据付枚数} = \text{総据付枚数} \div \text{施工列数}$$

4. 1列当り平均据付枚数は、1工事単位とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 2 プレキャストコンクリート板 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊	賃 料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	ブロック工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-5 プレキャストコンクリート板（材料費）

## (1) 条件区分

プレキャストコンクリート板（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、枚とする。

## 3-6 裏込工

斜面の不陸による斜面とプレキャストコンクリート板との間に発生する空隙に対して裏込工を施工する場合は、別途計上する。

## 3-7 ジョイント処理 (SCB220820)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 3 ジョイント処理 積算条件区分一覧

(積算単位：箇所)

モルタル規格	モルタル使用量 (m <sup>3</sup> /箇所)
1 : 3 モルタル (普通)	0.016m <sup>3</sup> 以下
	0.016m <sup>3</sup> を超え 0.032m <sup>3</sup> 以下
	0.032m <sup>3</sup> を超え 0.050m <sup>3</sup> 以下
1 : 3 モルタル (高炉 B)	0.016m <sup>3</sup> 以下
	0.016m <sup>3</sup> を超え 0.032m <sup>3</sup> 以下
	0.032m <sup>3</sup> を超え 0.050m <sup>3</sup> 以下
モルタル不要	—

- (注) 1. 上表は、プレキャストコンクリート板(クロスタイプ及びセミスクエアタイプ)の連結部のモルタル処理を含むジョイント処理の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、ジョイント金物(材料費)は含まない。
2. ジョイント金物の材料費は別途計上する。
3. モルタルの配合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」を参照のこと。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 4 ジョイント処理 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	—
	K2	—
	K3	—
労務	R1	普通作業員
	R2	土木一般世話役
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	セメント 高炉 B 25kg 袋入
	Z2	砂 細目 (洗い)
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## 3-8 ジョイント金物 (材料費)

## (1) 条件区分

ジョイント金物(材料費)における積算条件区分はない。

積算単位は、組とする。

(注) ジョイント金物はジョイント金物の他、連結ボルト等ジョイント 1 箇所当りに必要な金具類を含む。

## 3-9 目地工

スクエアタイプにおけるジョイント処理及び目地工は、別途計上する。

## 3-10 ボーリングマシン移設工

「第Ⅱ編第2章③アンカー工(ロータリーパーカッション式)」のボーリングマシン移設(アンカー)による。

## 3-11 足場工

足場が必要な場合は、別途計上する。

## ①－8 人工張芝工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、人工張芝（ネット又はワラ付張芝）を法面に施工する場合に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

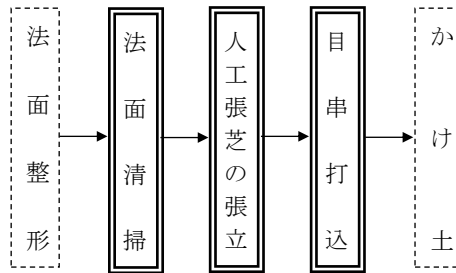


図2-1 施工フロー

- （注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 法面清掃は、法面のゴミ、浮き石等を除去し、地山と人工張芝（ネット又はワラ付張芝）との付着を良好にする作業とする。  
 3. かけ土は必要に応じて別途計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 人工張芝（SCB220910）

## （1）条件区分

人工張芝における積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^2$ とする。

- （注）1. 法面清掃，人工張芝の張立，目串打込，現場内小運搬等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
 2. 法面整形は含まない。  
 3. 落下防止，姿勢維持のための仮設ロープ等を使用する場合は別途計上する。  
 4. 人工張芝の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.14）

## （2）代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 1 人工張芝 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	張芝 幅 100cm ワラ付	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ② 基礎・裏込砕石工（建地－F）

### 1. 適用範囲

本資料は、無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎・裏込砕石工に適用する。

#### 1-1 適用できる範囲

##### 1-1-1 基礎砕石

- (1) 厚さが 30cm 以下の基礎砕石の敷均し及び締固め作業の場合
- (2) 再生資材を用いる場合

##### 1-1-2 裏込砕石

- (1) 裏込砕石の敷均し及び締固め作業の場合
- (2) 再生資材を用いる場合

#### 1-2 適用できない範囲

##### 1-2-1 基礎砕石

- (1) 「第Ⅱ編第2章共通工④-1 場所打擁壁工(1)、⑤-1 函渠工(1)、第Ⅳ編第4章橋梁工⑨-1 橋台・橋脚工(1)」の場合

### 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

基礎・裏込砕石工




図 2-1 施工フロー

（注）本施工パッケージは、上記フローの全ての作業に対応している。



## 3. 施工パッケージ

## 3-1 基礎砕石（SCB221110）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 基礎砕石 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

砕石の厚さ	砕石の種類
7.5cm 以下	(表 3.2)
7.5cm を超え 12.5cm 以下	
12.5cm を超え 17.5cm 以下	
17.5cm を超え 20.0cm 以下	
20.0cm を超え 22.5cm 以下	
22.5cm を超え 27.5cm 以下	
27.5cm を超え 30.0cm 以下	

- (注) 1. 上表は基礎砕石工における材料の投入、敷均し、締固め及び現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
 2. 砕石の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.20）  
 3. 基礎砕石の敷均し厚は 30cm を上限とする。

表 3.2 砕石の種類

積算条件	区分
砕石の種類	クラッシャラン 40～0
	クラッシャラン 30～0
	クラッシャラン 20～0
	高炉スラグ CS-40
	高炉スラグ MS-25
	高炉スラグ HMS-25
	クラッシャラン 80～0
	再生クラッシャラン 40～0
	再生クラッシャラン 80～0
	砕石（各種）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.3 基礎砕石 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	賃料
	K2 —	
	K3 —	
労務	R1 普通作業員	
	R2 特殊作業員	
	R3 土木一般世話役	
	R4 運転手（特殊）	
材料	Z1 再生クラッシャラン RC-40	
	Z2 軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z3 —	
	Z4 —	
市場単価	S —	

## 3-2 裏込砕石（SCB221120）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.4 裏込砕石 積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>3</sup>）

砕石の種類	
クラッシャラン	40～0
クラッシャラン	30～0
クラッシャラン	20～0
高炉スラグ	CS-40
高炉スラグ	MS-25
高炉スラグ	HMS-25
クラッシャラン	80～0
再生クラッシャラン	40～0
再生クラッシャラン	80～0
砕石（各種）	

- （注）1. 上表は裏込砕石工における材料の投入、敷均し、締固め及び現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 砕石の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.20）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 裏込砕石 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	再生クラッシャラン RC-40	
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

### ③ コンクリートブロック積（張）工（建地－F）

#### 1. 適用範囲

本資料は、コンクリートブロック積（張）に適用する。

##### 1-1 適用できる範囲

###### 1-1-1 コンクリートブロック積

(1) 間知ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個以上450kg/個以下）の場合

###### 1-1-2 大型ブロック積

(1) 大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）の場合

###### 1-1-3 間知ブロック張

(1) 間知ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の場合

###### 1-1-4 平ブロック張

(1) 平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の場合

###### 1-1-5 連節ブロック張

(1) 連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の場合

(2) 連結方式が鉄筋又は鋼線による場合

###### 1-1-6 緑化ブロック積

(1) 緑化ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量980kg/個以下）の場合

###### 1-1-7 胴込・裏込コンクリート

(1) コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込コンクリート打設の場合

###### 1-1-8 胴込・裏込材（碎石）

(1) コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込材の投入転圧の場合

(2) 土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

###### 1-1-9 遮水シート張

(1) 間知ブロック、平ブロック、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）における遮水シートの設置の場合

(2) 土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

###### 1-1-10 吸出し防止材（全面）設置

(1) 間知ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個以上450kg/個以下）、大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）及び平ブロック、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）における吸出し防止材の設置の場合

(2) 土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

###### 1-1-11 植樹

(1) 緑化ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量980kg/個以下）の植栽の場合

###### 1-1-12 現場打基礎コンクリート

(1) コンクリートブロック積（張）、大型ブロック積及び石積（張）における現場打基礎の場合

(2) 土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

###### 1-1-13 天端コンクリート

(1) コンクリートブロック積（張）工、大型ブロック積及び石積（張）工における天端コンクリートの場合

(2) 土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

###### 1-1-14 プレキャスト基礎ブロック

(1) コンクリートブロック積（張）工及び石積（張）工におけるプレキャスト基礎ブロック（製品長2,500mm以下、ブロック質量1,330kg/個以下）の場合

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 コンクリートブロック積

- (1) 土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満，ブロック質量150kg/個未満）の場合
- (2) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-2 大型ブロック積

- (1) 作業半径が12mを超える場合又は吊上げ高さが30mを超える場合

## 1-2-3 間知ブロック張

- (1) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-4 平ブロック張

- (1) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-5 連節ブロック張

- (1) 連結金具を使用する場合
- (2) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-6 緑化ブロック積

- (1) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-7 胴込・裏込コンクリート

- (1) 石積（張）における胴込・裏込コンクリート打設の場合
- (2) 大型ブロック以外の胴込・裏込コンクリート打設は，作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合，大型ブロックの胴込・裏込コンクリート打設は，作業半径が12mを超える場合又は吊上げ高さが30mを超える場合

## 1-2-8 胴込・裏込材（碎石）

- (1) 石積（張）における碎石等の胴込・裏込材設置の場合
- (2) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-9 現場打基礎コンクリート

- (1) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-10 天端コンクリート

- (1) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 1-2-11 プレキャスト基礎ブロック

- (1) 作業半径が8.5mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

## 2-1 コンクリートブロック積工（コンクリートブロック積、大型ブロック積）

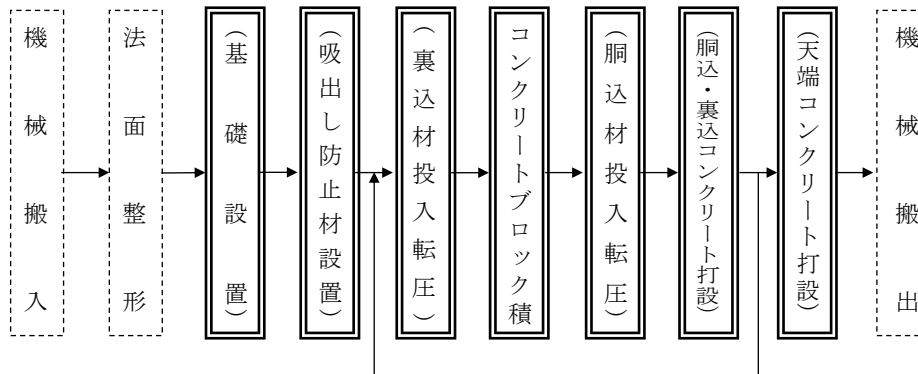


図 2-1 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. ( ) 書きは必要な場合計上する。  
 3. 間知ブロックの場合、水抜きパイプ設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。  
 4. 基礎設置は、現場打ち基礎又はプレキャスト基礎にかかわらず適用できる。なお、現場打ち基礎は「3-14 現場打基礎コンクリート」、プレキャスト基礎は「3-16 プレキャスト基礎ブロック」より計上する。  
 5. 吸出し防止材設置は、「3-12 吸出し防止材（全面）設置」より計上する。  
 6. 裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3-10 胴込・裏込材（碎石）」より計上する。  
 7. 胴込・裏込コンクリート打設は、「3-9 胴込・裏込コンクリート」より計上する。  
 8. 天端コンクリート打設は、「3-15 天端コンクリート」より計上する。

## 2-2 コンクリートブロック張工（間知ブロック張，平ブロック張，連節ブロック張）

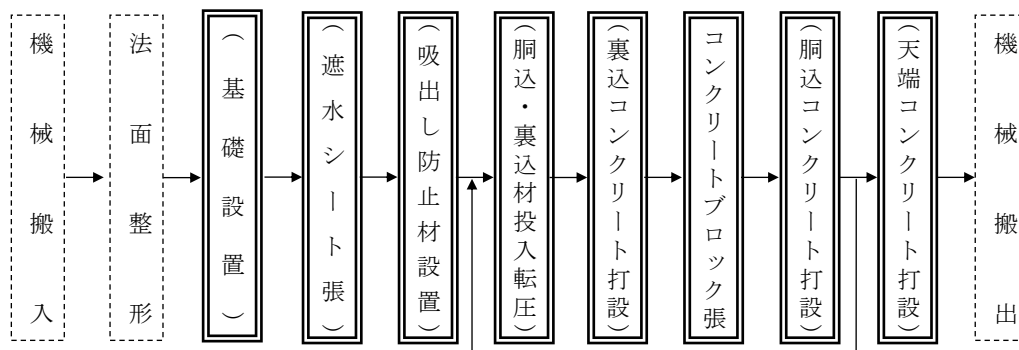


図2-2 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. ( ) 書きは必要な場合計上する。  
 3. 基礎設置は、現場打ち基礎又はプレキャスト基礎にかかわらず適用できる。なお、現場打ち基礎は「3-14 現場打基礎コンクリート」、プレキャスト基礎は「3-16 プレキャスト基礎ブロック」より計上する。  
 4. 天端コンクリート打設は、「3-15 天端コンクリート」より計上する。  
 5. 間知ブロック張は、吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。  
 6. 平ブロック張は、裏込コンクリート打設及び胴込コンクリート打設を含まない。  
 7. 連節ブロック張は、胴込・裏込材投入転圧、裏込コンクリート打設及び胴込コンクリート打設を含まない。

## 2-3 緑化ブロック積工

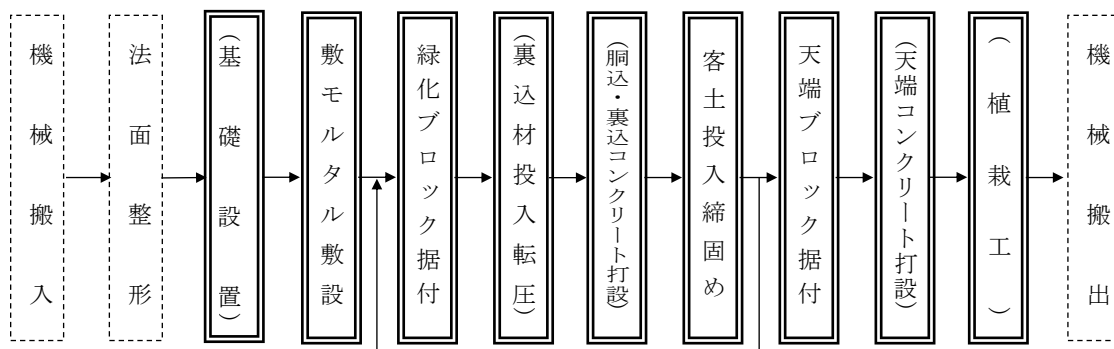


図2-3 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. ( ) 書きは必要な場合計上する。  
 3. 基礎設置は、現場打ち基礎又はプレキャスト基礎にかかわらず適用できる。なお、現場打ち基礎は「3-14 現場打基礎コンクリート」、プレキャスト基礎は「3-16 プレキャスト基礎ブロック」より計上する。  
 4. 客土投入締固めの有無にかかわらず適用出来る。  
 5. 天端ブロック据付の有無にかかわらず適用出来る。  
 6. 天端コンクリート打設は、「3-15 天端コンクリート」より計上する。  
 7. 植栽工は、「3-13 植樹」より計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 コンクリートブロック積（SCB226060）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 コンクリートブロック積 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

鉄筋規格	鉄筋 10m <sup>2</sup> 当り使用量
(表 3.2)	0.1t 以下
	0.1t を超え 0.2t 以下

(注) 1. 上表は、間知ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 150kg/個以上 450kg/個以下）の設置、鉄筋（加工・組立）、目地材の設置、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、現場内小運搬（50m まで）の他、水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含む）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、目地材料費は含まない。

2. 鉄筋の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.03）

3. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。

4. 目地材料費は必要量を別途計上する。

5. 裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3-10 胴込・裏込材（碎石）」より計上する。

6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。

(4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)

表 3.2 鉄筋規格

積算条件	区 分
鉄筋規格	SD295 D13
	SD295 D16
	SD345 D13
	SD345 D16～25
	鉄筋コンクリート用棒鋼 各種
	不要

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.3 コンクリートブロック積 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	ブロック工	
	R3	普通作業員	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面	
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	鉄筋規格「不要」の場合を除く
	Z3	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 大型ブロック積（SCB226230）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.4 大型ブロック積 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

水抜きパイプの有無
有り
無し

(注) 1. 上表は、大型ブロック（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）の設置、鉄筋（加工・組立）、目地材の設置、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、現場内小運搬（50mまで）の他、水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含む）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、鉄筋材料費及び目地材料費は含まない。

2. 鉄筋材料費は必要量を別途計上する。

3. 裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3-10 胴込・裏込材（碎石）」より計上する。

4. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。

5. 目地材料費は、実数量（材料ロスを含んだ数量）を別途計上する。

6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。

(4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 大型ブロック積 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）]25t吊	賃料
	K2 —	
	K3 —	
労務	R1 普通作業員	
	R2 ブロック工	
	R3 土木一般世話役	
	R4 特殊作業員	
材料	Z1 大型ブロック 控え 500mm	
	Z2 —	
	Z3 —	
	Z4 —	
市場単価	S —	



## 3-3 間知ブロック張（SCB226020）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.6 間知ブロック張 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材 10m <sup>2</sup> 当り使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート 10m <sup>2</sup> 当り使用量	遮水シート 規格		
150kg/個未満 控え 350mm 滑面タイプ	(表 3. 7)	—	(表 3. 9)	—	(表 3. 11)		
150kg/個未満 各種		(表 3. 8)		(表 3. 10)			
150kg/個以上 各種							

- (注) 1. 上表は、間知ブロック（勾配1割以上・ブロック質量770kg/個以下）の設置、裏込材設置、胴込・裏込コンクリート打設、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、吸出し防止材、遮水シート張（ブロック背面、基礎、隔壁、小口止の端部継手）、現場内小運搬（50m まで）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 裏込材、胴込・裏込コンクリート、遮水シート、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、裏込材、胴込・裏込コンクリート及び吸出し防止材が+0.12、遮水シートが+0.08 とする。
3. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯、天端コンクリートは別途計上する。
- (4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)
4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2章⑧目地・止水板設置工」により別途計上する。
5. 水抜きパイプが必要な場合には、設置手間・材料費を別途計上する。
6. 間知ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は、同施工面積とする。

表 3.7 裏込材規格

積算条件	区 分
裏込材規格	再生砕石 RC-40
	再生砕石 RC-80
	砕石 C-40
	砕石 C-80
	砕石各種
	不要

表 3.8 裏込材 10m<sup>2</sup>当り使用量

積算条件	区 分
裏込材10m <sup>2</sup> 当り使用量	1.0m <sup>3</sup> 以下
	1.0m <sup>3</sup> を超え3.0m <sup>3</sup> 以下
	3.0m <sup>3</sup> を超え5.0m <sup>3</sup> 以下
	5.0m <sup>3</sup> を超え7.0m <sup>3</sup> 以下

表 3. 9 胴込・裏込コンクリート規格

積算条件	区 分
胴込・裏込 コンクリート規格	18-8-25(普通)
	18-8-40(普通)
	18-8-25(高炉)
	18-8-40(高炉)
	生コンクリート各種
	不要

表 3. 10 胴込・裏込コンクリート 10m<sup>2</sup> 当り使用量

積算条件	区 分
胴込・裏込コンクリート 10m <sup>2</sup> 当り使用量	0.1m <sup>3</sup> 以上 0.5m <sup>3</sup> 以下
	0.5m <sup>3</sup> を超え 0.9m <sup>3</sup> 以下
	0.9m <sup>3</sup> を超え 1.3m <sup>3</sup> 以下
	1.3m <sup>3</sup> を超え 1.7m <sup>3</sup> 以下
	1.7m <sup>3</sup> を超え 2.1m <sup>3</sup> 以下
	2.1m <sup>3</sup> を超え 2.3m <sup>3</sup> 以下
	2.3m <sup>3</sup> を超え 2.7m <sup>3</sup> 以下
	2.7m <sup>3</sup> を超え 3.1m <sup>3</sup> 以下
	3.1m <sup>3</sup> を超え 3.5m <sup>3</sup> 以下

表 3. 11 遮水シート規格

積算条件	区 分
遮水シート規格	遮水シート A (厚 1.0+10.0mm)
	遮水シート各種
	不要

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 間知ブロック張 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1 バックホウ（クローラ型）[標準型・ クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2 ー	
	K3 ー	
労務	R1 普通作業員	
	R2 運転手（特殊）	
	R3 特殊作業員	
	R4 ブロック工	
材料	Z1 間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面	
	Z2 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格 「不要」の場合を除く
	Z3 再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く
	Z4 遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く
市場単価	S ー	

## 3-4 平ブロック張 (SCB226030)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 13 平ブロック張 積算条件区分一覧

(積算単位：㎡)

ブロックの 質量	平ブロック 規格	裏込材 規格	裏込材 10m <sup>2</sup> 当り使用量	遮水シート 規格	吸出し防止 材の有無	連結金具 の有無	連結金具 10m <sup>2</sup> 当り使用量
150kg/個 未満	平ブロック 控 180mm	(表 3. 7)	(表 3. 14)	(表 3. 11)	有り	有り	(表 3. 15)
						無し	
					無し	有り	
						無し	
	有り				有り		
					無し		
	無し				有り		
					無し		
	有り				有り		
					無し		
	無し				有り		
					無し		
150kg/個 以上	平ブロック 控 120mm	(表 3. 7)	(表 3. 14)	(表 3. 11)	有り	有り	(表 3. 15)
						無し	
					無し	有り	
						無し	
	有り				有り		
					無し		
	無し				有り		
					無し		
	有り				有り		
					無し		
	無し				有り		
					無し		
150kg/個 以上	平ブロック 各種	(表 3. 7)	(表 3. 14)	(表 3. 11)	有り	有り	(表 3. 15)
						無し	
					無し	有り	
						無し	
					有り	有り	
						無し	
					無し	有り	
						無し	
有り	有り						
	無し						
無し	有り						
	無し						

- (注) 1. 上表は、平ブロック (勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下) の設置、連結金具組立、裏込材 (砕石) 投入、調整コンクリートの打設 (材料費を含む)、吸出し防止材、遮水シート張 (ブロック背面、基礎、隔壁、小口止の端部継手)、現場内小運搬 (50m まで) の他、タンバ締固めの損料、目地モルタルを使用した場合の材料費・設置手間等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費 (損料等を含む) を含む。
2. 裏込材、遮水シート、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、裏込材及び吸出し防止材が +0.12、遮水シートが +0.08 とする。
3. 目地モルタルの有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。
4. 平ブロック張と遮水シート張 (ブロック背面) は、同施工面積とする。
5. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。
6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。

(4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)

表 3. 14 裏込材 10m<sup>2</sup> 当り使用量

積算条件	区 分
裏込材10m <sup>2</sup> 当り使用量	1. 0m <sup>3</sup> 以下
	1. 0m <sup>3</sup> を超え 3. 0m <sup>3</sup> 以下
	3. 0m <sup>3</sup> を超え 5. 0m <sup>3</sup> 以下

表 3. 15 連結金具 10m<sup>2</sup> 当り使用量

積算条件	区 分
連結金具10m <sup>2</sup> 当り使用量	5. 0 個以下
	5. 0 個を超え 15. 0 個以下
	15. 0 個を超え 20. 0 個以下

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 16 平ブロック張 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	平ブロック 厚さ 100mm	
	Z2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」 の場合を除く
	Z3	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材有り の場合
	Z4	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格 「不要」の場合を 除く
市場単価	S	—	

## 3-5 連節ブロック張（SCB226040）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 17 連節ブロック張 積算条件区分一覧

(積算単位：㎡)

ブロックの質量	連節鉄筋 (鋼線) 規格	遮水シート 規格	吸出し防止材の有無
150kg/個未満	(表 3. 18)	(表 3. 11)	有り
			無し
			有り
			無し
150kg/個以上			有り
			無し
			有り
			無し

- (注) 1. 上表は、連節ブロック（勾配1割以上・ブロック質量770kg/個以下）の設置、連節鉄筋（鋼線）の加工・組立・溶接、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、遮水シート（ブロック背面、基礎、隔壁、小口止の端部継手）、吸出し防止材、現場内小運搬（50m まで）の他、溶接機、接着剤等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 連節鉄筋（鋼線）、遮水シート、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、連節鉄筋（鋼線）が+0.03、遮水シートが+0.08、吸出し防止材が+0.12 とする。
3. 連節ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は、同施工面積とする。
4. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。
5. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。

(4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)

表 3. 18 連節鉄筋（鋼線）規格

積算条件	区 分
連節鉄筋（鋼線）規格	亜鉛アルミメッキ鋼線 径 6mm
	亜鉛アルミメッキ鋼線 径 8mm
	SR235 径 9mm
	SR235 径 13mm
	鉄筋コンクリート用棒鋼各種

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 19 連節ブロック張 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	ブロック工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	連節ブロック 厚さ 220mm	
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	
	Z3	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格 「不要」の場合を除く
	Z4	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材有りの場合
市場単価	S	—	

## 3-6 緑化ブロック積（SCB226050）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 20 緑化ブロック積 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材 10m <sup>2</sup> 当り 使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	胴込・裏込コンクリート 10m <sup>2</sup> 当り使用量
150kg/個未満	(表 3. 7)	(表 3. 21)	(表 3. 9)	(表 3. 22)
150kg/個以上				(表 3. 23)

- (注) 1. 上表は、緑化ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 980kg/個以下）の設置、裏込材（砕石）投入、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、胴込・裏込コンクリート打設、天端ブロック、客土投入・締固め、現場内小運搬（50m まで）の他、敷モルタル・目地モルタルの材料費及び設置手間、タンパ締固めの損料及び油脂類の費用、コンクリートバケット、コンクリートパイププレート、電力に関する経費、型枠の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、緑化ブロック及び天端ブロックの材料費は含まない。
2. 裏込材、胴込・裏込コンクリート、客土材の材料ロスを含む。標準ロス率は、裏込材及び胴込・裏込コンクリートが+0.12、客土材が+0.07 とする。
3. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上することができる。
4. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、天端コンクリートは別途計上する。  
(4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)
5. 緑化ブロック、天端ブロックの材料費は別途計上する。

表 3. 21 裏込材 10m<sup>2</sup> 当り使用量

積算条件	区 分
裏込材 10m <sup>2</sup> 当り使用量	2. 0m <sup>3</sup> 以下
	2. 0m <sup>3</sup> を超え 4. 0m <sup>3</sup> 以下
	4. 0m <sup>3</sup> を超え 6. 0m <sup>3</sup> 以下

表 3. 22 胴込・裏込コンクリート 10m<sup>2</sup> 当り使用量(150kg/個未満)

積算条件	区 分
胴込・裏込コンクリート 10m <sup>2</sup> 当り 使用量(150kg/個未満)	0. 7m <sup>3</sup> 以下
	0. 7m <sup>3</sup> を超え 1. 7m <sup>3</sup> 以下
	1. 7m <sup>3</sup> を超え 2. 7m <sup>3</sup> 以下
	2. 7m <sup>3</sup> を超え 3. 7m <sup>3</sup> 以下
	3. 7m <sup>3</sup> を超え 4. 7m <sup>3</sup> 以下
	4. 7m <sup>3</sup> を超え 6. 0m <sup>3</sup> 以下

表 3. 23 胴込・裏込コンクリート 10m<sup>2</sup> 当り使用量(150kg/個以上)

積算条件	区 分
胴込・裏込コンクリート 10m <sup>2</sup> 当り 使用量(150kg/個以上)	1. 0m <sup>3</sup> 以下
	1. 0m <sup>3</sup> を超え 2. 0m <sup>3</sup> 以下
	2. 0m <sup>3</sup> を超え 3. 0m <sup>3</sup> 以下
	3. 0m <sup>3</sup> を超え 4. 0m <sup>3</sup> 以下
	4. 0m <sup>3</sup> を超え 5. 0m <sup>3</sup> 以下
	5. 0m <sup>3</sup> を超え 6. 0m <sup>3</sup> 以下

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 24 緑化ブロック積 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・ クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	運転手（特殊）	
	R3	ブロック工	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格 「不要」の場合を除く
	Z2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く
	Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	裏込材規格「不要」の場合を除く
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-7 緑化ブロック（材料費）

## (1) 条件区分

緑化ブロック（材料費）における積算条件区分はない。  
積算単位は、m<sup>2</sup>とする。

## 3-8 天端ブロック（材料費）

## (1) 条件区分

天端ブロック（材料費）における積算条件区分はない。  
積算単位は、m<sup>2</sup>とする。

## 3-9 胴込・裏込コンクリート（SCB226110）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 25 胴込・裏込コンクリート 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

ブロックの種類	生コンクリート規格
間知ブロック・緑化ブロック	(表 3. 9)
大型ブロック	

- (注) 1. 上表は、コンクリートブロック積(張)の胴込・裏込コンクリート設置、現場内小運搬(50m まで)の他、コンクリートバケット、パイプレータ、電力に関する経費、型枠の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。
2. 胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.12)
3. 養生が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 26 胴込・裏込コンクリート 代表機労材規格一覧

ブロックの種類	項目		代表機労材規格	備考
間知ブロック 緑化ブロック	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	賃料
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	特殊作業員	
		R3	運転手(特殊)	
		R4	—	
	材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く
		Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	
大型ブロック	機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	賃料
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	特殊作業員	
		R3	—	
		R4	—	
	材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	



## 3-10 胴込・裏込材（碎石）（SCB226120）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 27 胴込・裏込材（碎石） 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

ブロックの種類	胴込・裏込材規格
間知・平・連節・緑化ブロック	(表 3. 7)
大型ブロック	

(注) 1. 上表は、コンクリートブロック積(張)の胴込・裏込材設置（投入・転圧）、現場内小運搬（50m まで）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 胴込・裏込材の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.12）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 28 胴込・裏込材（碎石） 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	—	
材料	Z1	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く
	Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-11 遮水シート張（SCB226130）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 29 遮水シート張 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

遮水シート規格
遮水シート A（厚 1.0+10.0mm）
遮水シート各種

(注) 1. コンクリートブロック張におけるブロック背面部の遮水シートの設置の他、基礎・隔壁・小口止部の遮水シート及び接着剤の費用等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 遮水シートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.08）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 30 遮水シート張 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-12 吸出し防止材（全面）設置（SCB226140）

## (1) 条件区分

吸出し防止材（全面）設置の積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^2$ とする。

（注）1. コンクリートブロック積（張）の吸出し防止材（全面）の設置等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 吸出し防止材の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.12）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 31 吸出し防止材（全面）設置 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	吸出し防止材 合繊不織布 $t=10mm$ 9.8kN/m	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-13 植樹（SCB226160）

## (1) 条件区分

植樹の積算条件区分はない。

積算単位は、本とする。

（注）1. 樹木の植穴掘り、植付け、埋戻し、養生、現場内小運搬等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料を含む）を含む。ただし、土壤改良に要する費用は含まない。

2. 樹高は、50cm以下とする。

3. 新植樹木の植栽にも適用できる。ただし、移植及び根廻し工事にかかわるものは除く。

4. 植樹割増しの有無にかかわらず適用できる。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 32 植樹 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	造園工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	サツキツツジ 樹高 30cm	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-14 現場打基礎コンクリート (SCB226170)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 33 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類
(表 3. 34)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)
		養生工なし
	無し	一般養生・特殊養生(練炭)
		養生工なし

- (注) 1. 上表は、コンクリート、基礎材、目地板、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離剤、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料、コンクリート打設、養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。
2. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.06)
3. 基礎砕石の幅は控長 35cm 以下、裏込めコンクリート厚さ 150mm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
4. 目地の有無、材料の種類にかかわらず本施工パッケージを適用できる。
5. 特殊養生(ジェットヒータ養生)の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「[第Ⅱ編第4章①コンクリート工](#)」により別途計上すること。
6. 均しコンクリートは別途計上する。

表 3. 34 生コンクリート規格

積算条件	区 分
生コンクリート規格	18-8-25(普通)
	18-8-40(普通)
	18-8-25(高炉)
	18-8-40(高炉)
	生コンクリート各種

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 35 現場打基礎コンクリート 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	・賃料 ・基礎砕石有りの場合
	K3	—	
労務	R1	型わく工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-15 天端コンクリート (SCB226180)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 36 天端コンクリート 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

生コンクリート規格	養生工の種類
(表 3. 34)	一般養生
	特殊養生(練炭)
	養生工なし

- (注) 1. 上表は、現場打ちによる天端コンクリート設置におけるコンクリート、型枠(製作・設置・撤去)、雑機械器具(電気ドリル、電気ノコギリ、コンクリート打設機器)の損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。
2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+6)
3. 特殊養生(ジェットヒータ養生)の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「[第Ⅱ編第4章①コンクリート工](#)」により別途計上すること。
4. 目地材は必要に応じて「[第Ⅱ編第2章⑱目地・止水板設置工](#)」により別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 37 天端コンクリート 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	型わく工	
	R2	普通作業員	
	R3	特殊作業員	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-16 プレキャスト基礎ブロック（SCB226220）

## (1) 条件区分

プレキャスト基礎ブロックの積算条件区分はない。

積算単位は、mとする。

- （注）1. プレキャスト基礎ブロックにおけるブロックの設置、連結等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、プレキャスト基礎ブロック（材料費）は含まない。
2. 中詰コンクリートを打設する場合は、材料費・打設手間を別途計上する。
3. 基礎材は必要に応じて、「第Ⅱ編第2章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。
4. 目地材は必要に応じて、「第Ⅱ編第2章⑧目地・止水板設置工」により別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 38 プレキャスト基礎ブロック 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	運転手（特殊）	
	R3	特殊作業員	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-17 プレキャスト基礎ブロック（材料費）


## (1) 条件区分

プレキャスト基礎ブロック（材料費）の積算条件区分はない。

積算単位は、mとする。

## 4. 参考図


4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート

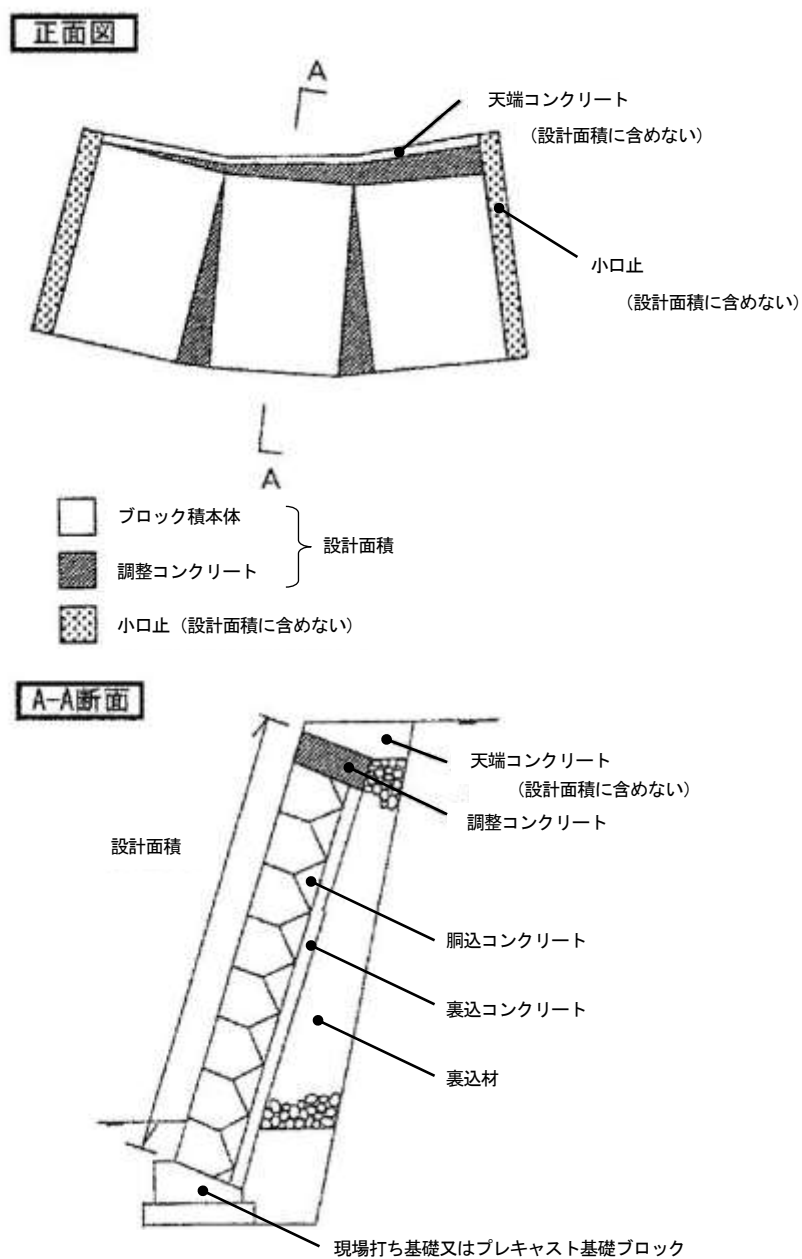


## 4-2 各種ブロック参考図

## (1) コンクリートブロック積（間知ブロック積）

正面図

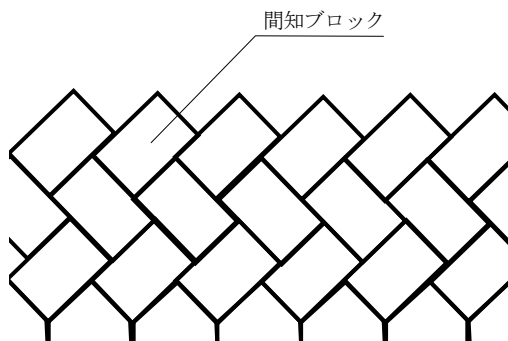


断面図

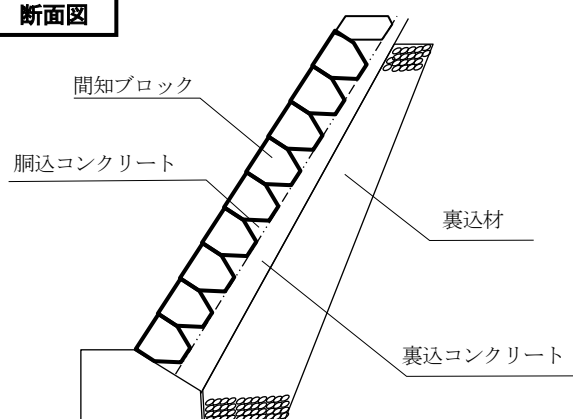


## (2) 緑化ブロック積

ブロックの参考図

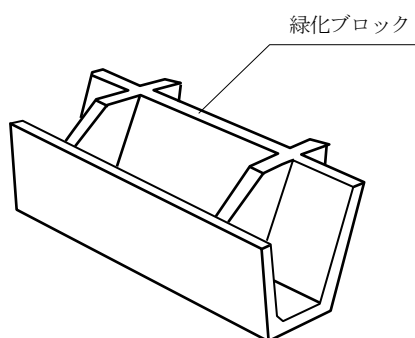


断面図

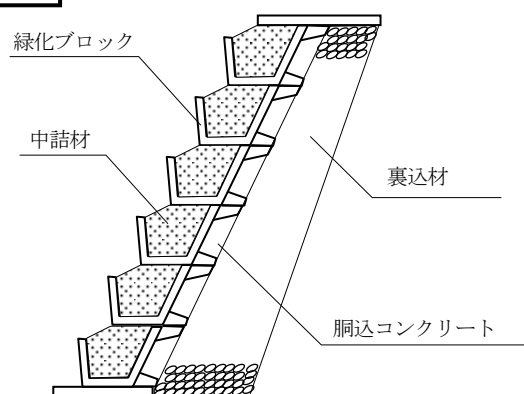


## (3) 大型ブロック積

ブロックの参考図

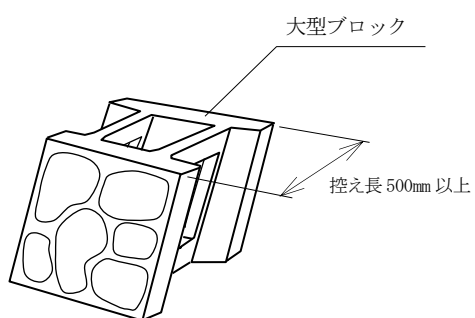


断面図

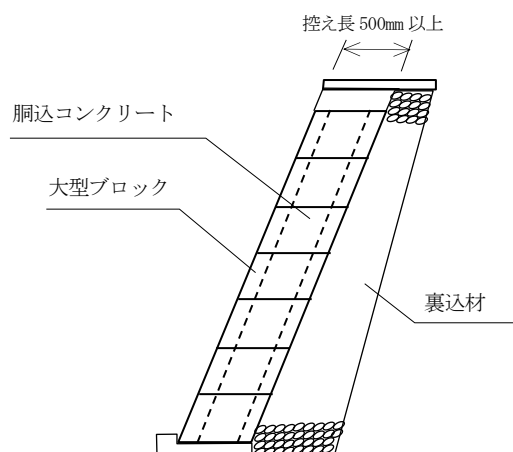


## (4) 間知ブロック張

正面図

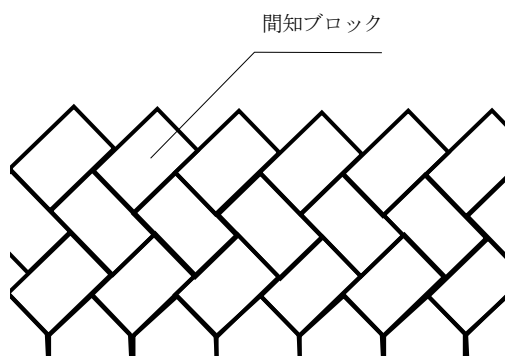


断面図

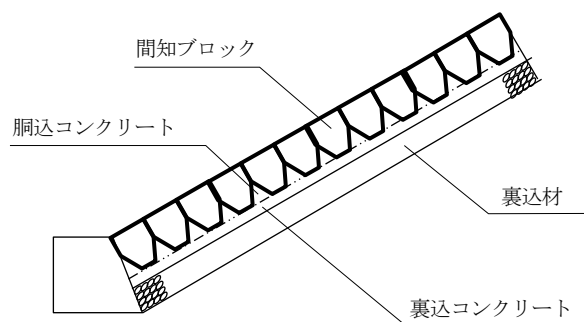


## (5) 平ブロック張

正面図

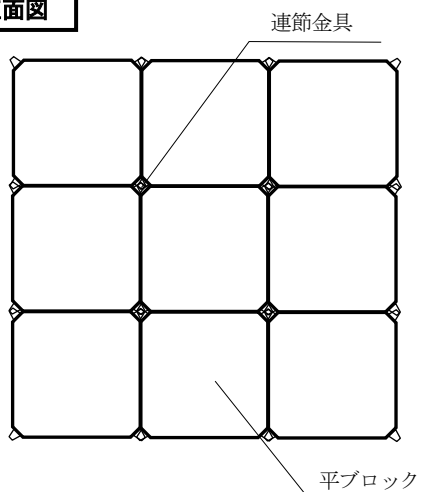


断面図

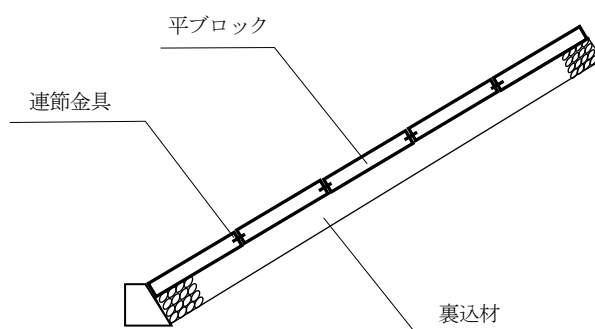


## (6) 連節ブロック張

正面図

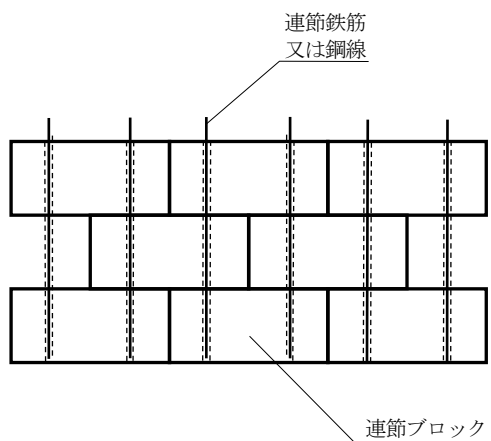

断面図

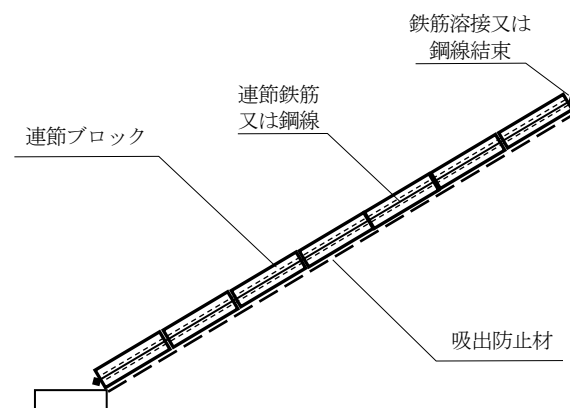



## ④ 場所打擁壁工

## ④-1 場所打擁壁工（1）（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、擁壁工における擁壁に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 小型擁壁

- (1) 擁壁平均高さが 0.5m 以上 1.0m 以下の小型擁壁
- (2) コンクリート打設地上高さが施工基面より上の場合、  
打設地上高さ 0m 以上 2.5m 以下、且つ水平打設距離 4.5m 以下
- (3) コンクリート打設地上高さが施工  
基面より下の場合、打設地上高さ-7.0m 以上  
0m 未満、且つ水平打設距離 3.5m 以下

## 1-1-2 重力式擁壁

- (1) 擁壁平均高さが 1.0m を超え 5.0m 以下の重力式擁壁
- (2) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が  
280m 以下の場合
- (3) 圧送コンクリートのスランプ値が 8~12cm、  
粗骨材の最大寸法が 40mm 以下の場合

## 1-1-3 もたれ式擁壁


- (1) 擁壁平均高さが 3.0m 以上 8.0m 以下のもたれ式擁壁
- (2) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が  
280m 以下の場合
- (3) 圧送コンクリートのスランプ値が 8~12cm、粗骨材の最大寸法が 40mm 以下の場合

## 1-1-4 逆T型擁壁

- (1) 擁壁平均高さが 3.0m 以上 10.0m 以下の逆T型擁壁
- (2) 使用鉄筋量が  $0.04\text{t/m}^3$  以上  $0.14\text{t/m}^3$  未満の場合
- (3) 鉄筋規格が SD345 D13 から SD345 D32 の場合
- (4) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が 280m 以下の場合
- (5) 圧送コンクリートのスランプ値が 8~12cm、粗骨材の最大寸法が 40mm 以下の場合

## 1-1-5 L型擁壁

- (1) 擁壁平均高さが 3.0m 以上 7.0m 以下のL型擁壁
- (2) 使用鉄筋量が  $0.04\text{t/m}^3$  以上  $0.14\text{t/m}^3$  未満の場合
- (3) 鉄筋規格が SD345 D13 から SD345 D32 の場合
- (4) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が 280m 以下の場合
- (5) 圧送コンクリートのスランプ値が 8~12cm、粗骨材の最大寸法が 40mm 以下の場合

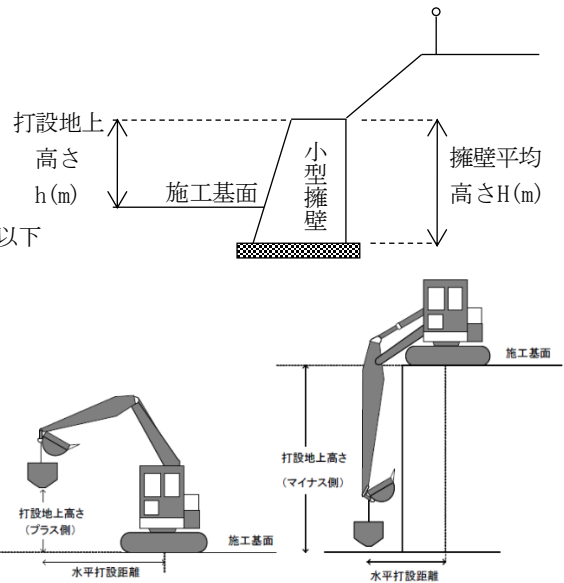

参考図（バックホウによるコンクリート打設範囲）

また、本項の適用を外れる現場打擁壁工については、場所打擁壁工（2）を適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

## 2-1 小型擁壁

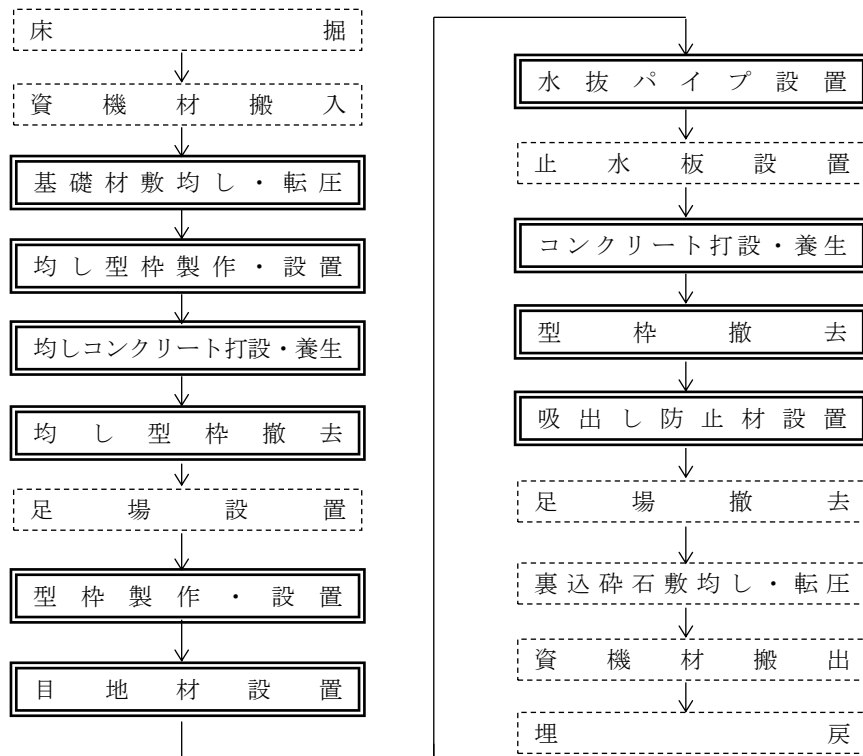


図2-1 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 基礎材敷均し・転圧，均し型枠製作設置・撤去，均しコンクリート打設・養生は，必要に応じて計上する。  
 3. 目地材，水抜きパイプ，吸出防止材は施工の有無にかかわらず適用できる。

## 2-2 重力式擁壁，もたれ式擁壁

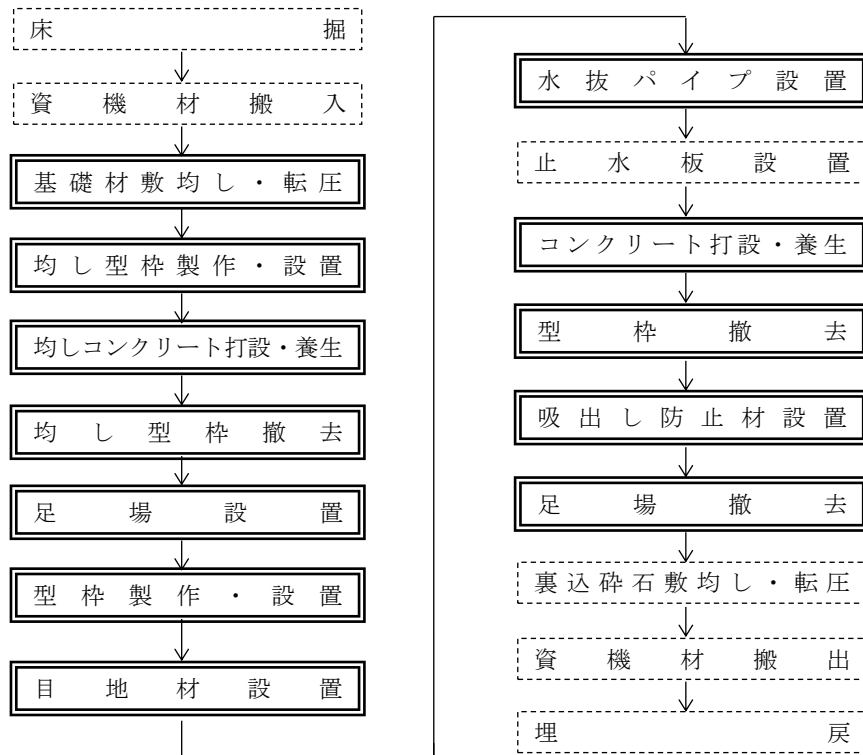


図2-2 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは，二重実線部分のみである。  
 2. 基礎材敷均し・転圧，均し型枠製作設置・撤去，均しコンクリート打設・養生は，必要に応じて計上する。  
 3. 目地材，水抜きパイプ，吸出防止材は施工の有無にかかわらず適用できる。

## 2-3 逆T型擁壁，L型擁壁

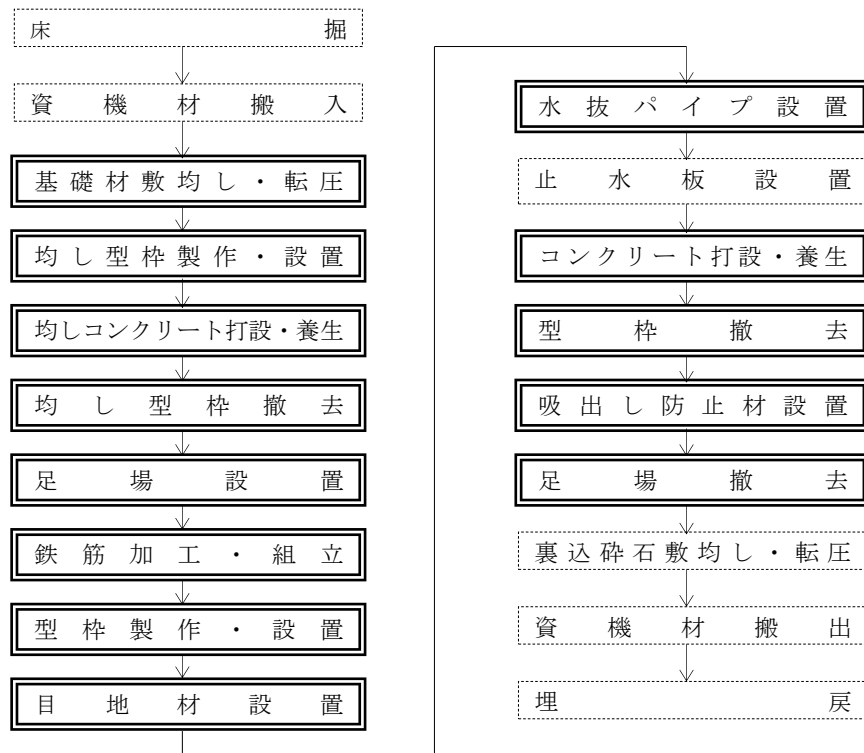


図2-3 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。
2. 基礎材敷均し・転圧，均し型枠製作設置・撤去，均しコンクリート打設・養生は，必要に応じて計上する。
3. 目地材，水抜きパイプ，吸出し防止材は施工の有無にかかわらず適用できる。ただし，吸出し防止材は，点在で設置する場合を標準としており，面及び帯状のものを使用する場合は，別途計上する。
4. ガス圧接が必要な場合は「第Ⅵ編第1章①-2 鉄筋工（ガス圧接工）」により，別途計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 小型擁壁 (SCB226311)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 小型擁壁 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類
(表 3.2)	(表 3.3)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
				養生工無
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
				養生工無
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
				養生工無
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
				養生工無

(注) 1. 上表は、小型擁壁（擁壁平均高さ 0.5m 以上 1.0m 以下）のコンクリート、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業含む）、基礎材、均しコンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材（点在）、養生（一般養生、特殊養生（練炭）、特殊養生（ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ））、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業を行う機械付補助労務、ペーラインコンクリートの施工の他、雑機械器具（コンクリートパイプレータ、工事用水中モータポンプ、電気ドリル、電気ノコギリ、シュート、ホッパ等）の損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、化粧型枠は含まない。

2. コンクリート打設に使用するバケットの容量は 0.3m<sup>3</sup> を基準とする。

3. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.06）

4. 化粧型枠については加算費用を、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1 型枠工 3-2 化粧型枠」により別途計上すること。

5. ペーラインコンクリートの材料費については、「3-8 ペーラインコンクリート（材料費）」により別途計上すること。

6. 足場が必要な場合は別途計上すること。

7. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。

8. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。

表 3.2 擁壁平均高さ

積算条件	区分
擁壁平均高さ	0.5m以上0.6m未満
	0.6m以上0.8m未満
	0.8m以上1.0m以下

表 3.3 コンクリート規格

積算条件	区分	
コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	18-8-40(高炉)
	21-12-25(20) (普通)	18-12-40(高炉)
	24-8-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)
	24-12-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)
	27-8-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)
	27-12-25(20) (普通)	24-12-40(高炉)
	18-8-40(普通)	21-8-25 (早強)
	18-12-40(普通)	21-12-25 (早強)
	21-8-40(普通)	24-8-25 (早強)
	21-12-40(普通)	24-12-25 (早強)
	24-8-40(普通)	18-8-25(高炉)
	24-12-40(普通)	18-12-25(高炉)
	21-8-25(20) (高炉)	各種
	21-12-25(20) (高炉)	
	24-8-25(20) (高炉)	
	24-12-25(20) (高炉)	

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 小型擁壁 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排気ガス対策型（2011 年規制）〕山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	
	K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h) 油種, 灯油	・特殊養生(ジェットヒータ)の場合 ・賃料
	K3	－	
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	特殊養生(ジェットヒータ)の場合
	Z3	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z4	－	
市場単価	S	－	

## 3-2 重力式擁壁 (SCB226320)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.5 重力式擁壁 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分
1.0m を超え 2.0m 未満	(表 3.3)	無し	無し	一般養生	(表 3.6)
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				養生工無	
			有り	一般養生	
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				養生工無	
		有り	無し	一般養生	
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				養生工無	
			有り	一般養生	
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				養生工無	
2.0m 以上 5.0m 以下	(表 3.3)	無し	無し	一般養生	(表 3.6)
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	
				養生工無	
			有り	一般養生	
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	
				養生工無	
		有り	無し	一般養生	
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	
				養生工無	
			有り	一般養生	
				特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内ジェットヒータ養生	
				養生工無	

(注) 1. 上表は、重力式擁壁（擁壁平均高さ 1.0m を超え 5.0m 以下）のコンクリート、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業含む）、基礎材、均しコンクリート、一般足場（擁壁平均高さが 2m 未満の場合）、手摺先行型枠組足場（擁壁平均高さが 2m 以上の場合）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材（点在）、養生（一般養生、特殊養生（練炭・ジェットヒータ）、仮囲い内ジェットヒータ養生）、圧送管の組立・撤去、ペーラインコンクリートの施工の他、雑機械器具（コンクリートバイブレータ、工事用水中モータポンプ、電気ドリル、電気ノコギリ、シュート、ホッパ等）の損料、コンクリートポンプ車のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、化粧型枠は含まない。

2. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.04）

3. 設計数量は、つま先版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量とする。

4. 化粧型枠については加算費用を、「第Ⅱ編第 4 章コンクリート工②-1 型枠工 3-2 化粧型枠」により別途計上すること。

5. ペーラインコンクリートの材料費については、「3-8 ペーラインコンクリート（材料費）」により別途計上すること。

6. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
7. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。
8. 「仮囲い内ジェットヒータ養生」の場合には「足場」費用は含んでいない。足場が必要な場合は、別途計上する。
9. 擁壁平均高さが 1.0m を超え 2.0m 未満で、「仮囲い内ジェットヒータ養生」が必要な場合には別途考慮すること。

表 3.6 圧送管延長距離区分

積算条件	区分
圧送管延長 距離区分	延長無し
	90m 未満
	90m 以上 180m 未満
	180m 以上 280m 以下

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.7 重力式擁壁 代表機材規格一覧

擁壁平均高さ	項目		代表機材規格	備考
1m を超え 2m 未満	機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m³/h	
		K2	－	
		K3	－	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	型わく工	
		R3	土木一般世話役	
		R4	特殊作業員	
	材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
		Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z3	－	
		Z4	－	
	市場単価	S	－	
2m 以上 5m 以下	機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕圧送能力 90～110m³/h	
		K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料
		K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
	労務	R1	普通作業員	
		R2	型わく工	
		R3	土木一般世話役	
		R4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
	材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
		Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
		Z4	－	
	市場単価	S	－	





## [参考図]

擁壁高さが変化する場合の擁壁平均高さH (m)

$$H = A / L$$

A = 正面図での擁壁面積 (m<sup>2</sup>)

L = 擁壁延長 (m)

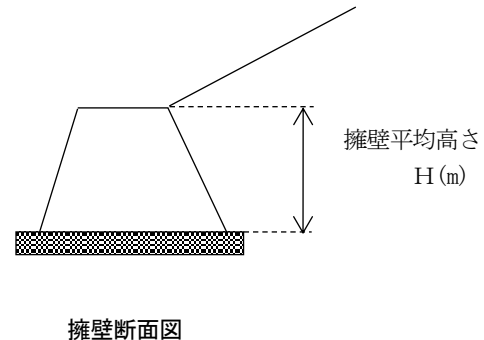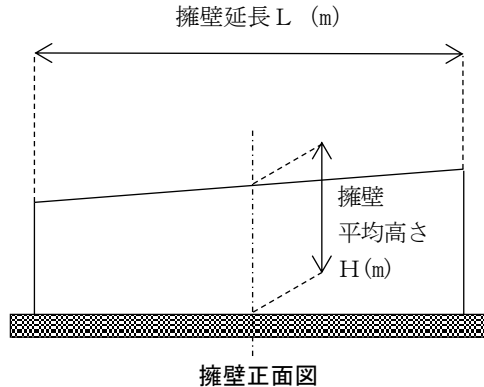

## 3-3 もたれ式擁壁 (SCB226330)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.8 もたれ式擁壁 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

コンクリート規格	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分
(表 3.3)	無し	無し	一般養生	(表 3.6)
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
			仮囲い内ジェットヒータ養生	
			養生工無	
		有り	一般養生	
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
			仮囲い内ジェットヒータ養生	
			養生工無	
	有り	無し	一般養生	
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
			仮囲い内ジェットヒータ養生	
			養生工無	
		有り	一般養生	
			特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	
			仮囲い内ジェットヒータ養生	
			養生工無	

- (注) 1. 上表は、もたれ式擁壁（擁壁平均高さ 3.0m 以上 8.0m 以下）のコンクリート、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業含む）、基礎材、均しコンクリート、足場工、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材（点在）、養生（一般養生・特殊養生（練炭）、特殊養生（ジェットヒータ）、仮囲い内ジェットヒータ養生）、圧送管の組立・撤去、ペーラインコンクリートの施工の他、雑機械器具（コンクリートパイプレータ、工事用水中モータポンプ、電気ドリル、電気ノコギリ、シュート、ホッパ等）の損料、コンクリートポンプ車のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、化粧型枠は含まない。
2. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.04）
3. 設計数量は、つま先版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量とする。
4. 化粧型枠については加算費用を、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1型枠工 3-2化粧型枠」により別途計上すること。

5. ペーラインコンクリートの材料費については、「3-8 ペーラインコンクリート（材料費）」により別途計上すること。
6. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
7. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。
8. 「仮囲い内ジェットヒータ養生」の場合には「足場」費用は含んでいない。足場が必要な場合は、別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.9 もたれ式擁壁 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m³/h	
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	軽油 1.2号 バトロール給油	
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
	Z4	-	
市場単価	S	-	

## 3-4 逆T型擁壁（SCB226340）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 10 逆T型擁壁 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

コンクリート規格	鉄筋量	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分
(表 3. 3)	(表 3. 11)	無し	無し	一般養生	(表 3. 6)
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	
			有り	一般養生	
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	
		有り	無し	一般養生	
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	
			有り	一般養生	
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	

- (注) 1. 上表は、逆T型擁壁（擁壁平均高さ 3.0m 以上 10.0m 以下）のコンクリート、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業含む）、鉄筋、基礎材、均しコンクリート、手摺先行型枠組足場、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材（点在）、養生（一般養生、特殊養生（練炭・ジェットヒータ）、仮囲い内ジェットヒータ養生）、圧送管の組立・撤去、ペーラインコンクリートの施工の他、雑機械器具（コンクリートバイブレータ、工事用水中モータポンプ、電気ドリル、電気ノコギリ、シュート、ホッパ等）の損料、コンクリートポンプ車のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、化粧型枠は含まない。
2. コンクリート・鉄筋の材料ロスを含む。標準ロス率は、コンクリートが+0.02、鉄筋が+0.03とする。
3. 設計数量は、つま先版、かかと版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量とする。
4. 化粧型枠については加算費用を、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1 型枠工 3-2 化粧型枠」により別途計上すること。
5. ペーラインコンクリートの材料費については、「3-8 ペーラインコンクリート（材料費）」により別途計上すること。
6. ガス圧接が必要な場合は、「第Ⅵ編第1章①-2 鉄筋工（ガス圧接工）」により別途計上する。
7. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
8. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。
9. 「仮囲い内ジェットヒータ養生」の場合には「足場」費用は含んでいない。足場が必要な場合は、別途計上する。

表 3.11 鉄筋量

積算条件	区分
鉄筋量	0.04t/m <sup>3</sup> 以上 0.06t/m <sup>3</sup> 未満
	0.06t/m <sup>3</sup> 以上 0.08t/m <sup>3</sup> 未満
	0.08t/m <sup>3</sup> 以上 0.10t/m <sup>3</sup> 未満
	0.10t/m <sup>3</sup> 以上 0.12t/m <sup>3</sup> 未満
	0.12t/m <sup>3</sup> 以上 0.14t/m <sup>3</sup> 未満

(注) 条件区分の鉄筋量は、ロスを含まない数量とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.12 逆T型擁壁 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・ 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・ 賃料
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C55%	
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m <sup>3</sup> 以上 0.06t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m <sup>3</sup> 以上 0.08t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m <sup>3</sup> 以上 0.10t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m <sup>3</sup> 以上 0.12t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m <sup>3</sup> 以上 0.14t/m <sup>3</sup> 未満の場合
	Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z4	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	

## 3-5 L型擁壁 (SCB226350)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 13 L型擁壁 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

コンクリート規格	鉄筋量	基礎碎石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分
(表 3. 3)	(表 3. 11)	無し	無し	一般養生	(表 3. 6)
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	
			有り	一般養生	
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	
		有り	無し	一般養生	
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	
			有り	一般養生	
				特殊養生 (練炭・ジェットヒータ)	
				仮囲い内 ジェットヒータ養生	

- (注) 1. 上表は、L型擁壁（擁壁平均高さ 3.0m 以上 7.0m 以下）のコンクリート、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業含む）、鉄筋、基礎材、均しコンクリート、手摺先行型枠組足場、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材（点在）、養生（一般養生、特殊養生（練炭・ジェットヒータ）、仮囲い内ジェットヒータ養生）、圧送管の組立・撤去、ペーラインコンクリートの施工の他、雑機械器具（コンクリートパイプレータ、工事用水中モータポンプ、電気ドリル、電気ノコギリ、シュート、ホッパ等）の損料、コンクリートポンプ車のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、化粧型枠は含まない。
2. コンクリート・鉄筋の材料ロスを含む。標準ロス率は、コンクリートが+0.02、鉄筋が+0.03 とする。
3. 設計数量は、つま先版、かかと版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量とする。
4. 化粧型枠については加算費用を、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1 型枠工 3-2 化粧型枠」により別途計上すること。
5. ペーラインコンクリートの材料費については、「3-8 ペーラインコンクリート（材料費）」により別途計上すること。
6. ガス圧接が必要な場合は、「第Ⅵ編第1章①-2 鉄筋工（ガス圧接工）」により別途計上する。
7. 基礎碎石の敷均し厚は、20 cm 以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
8. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断すること。
9. 「仮囲い内ジェットヒータ養生」の場合には「足場」費用は含んでいない。足場が必要な場合は、別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 14 L型擁壁 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータ養生の場合 ・賃料
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	とび工 特殊作業員	一般、特殊養生の場合 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋量が 0.04t/m <sup>3</sup> 以上 0.06t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	鉄筋量が 0.06t/m <sup>3</sup> 以上 0.08t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25	鉄筋量が 0.08t/m <sup>3</sup> 以上 0.10t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29	鉄筋量が 0.10t/m <sup>3</sup> 以上 0.12t/m <sup>3</sup> 未満の場合
		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D32	鉄筋量が 0.12t/m <sup>3</sup> 以上 0.14t/m <sup>3</sup> 未満の場合
	Z3	軽油 1.2 号 パトロール給油	
市場単価	Z4	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	

## 3-6 化粧型枠

「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1型枠工3-2化粧型枠」による。

## 3-7 化粧型枠（材料費）

「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1型枠工3-3化粧型枠（材料費）」による。

## 3-8 ペーラインコンクリート（材料費）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.15 ペーラインコンクリート(材料費) 積算条件区分一覧  
(積算単位: m<sup>3</sup>)

擁壁種類	コンクリート規格
小型擁壁	(表 3.3)
重力式・もたれ式擁壁	
逆T型・L型擁壁	

(注) 1. 施工費は、④-1 場所打擁壁工 (1) の各種擁壁工の積算条件区分に含まれる。

2. 上表は、場所打擁壁工におけるペーラインコンクリートの材料費（ロス等含む）を含む。

3. ペーラインコンクリートのロス率は、次表を標準とする。

表 3.16 ロス率

材料	擁壁種類	ロス率
ペーラインコンクリート	小型擁壁	+0.06
	重力式・もたれ式擁壁	+0.04
	逆T型・L型擁壁	+0.02

## 3-9 止水板設置

止水板が必要な場合は、別途計上する。

## 3-10 裏込砕石

裏込砕石が必要な場合は、「第Ⅱ編第2章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。

## ④-2 場所打擁壁工（2）（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、場所打擁壁工（1）の適用範囲を外れた擁壁工（表1.1）のコンクリート打設に適用する。

表1.1 場所打擁壁工(1)の適用範囲を外れた擁壁工

- ・重力式擁壁[擁壁平均高さ5mを超えるもの]
- ・もたれ式擁壁[擁壁平均高さ1mを超え3m未満のもの、あるいは8mを超えるもの]
- ・逆T型擁壁[擁壁平均高さ1mを超え3m未満のもの、あるいは10mを超えるもの]
- ・L型擁壁[擁壁平均高さ1mを超え3m未満のもの、あるいは7mを超えるもの]
- ・重力式擁壁、もたれ式擁壁、逆T型擁壁、L型擁壁以外の形式の現場打擁壁

## 1-1 適用できる範囲

- (1) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が280m以下の場合
- (2) 圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

## 2. 施工パッケージ

## 2-1 コンクリート（場所打擁壁）（SCB226410）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表2.1 コンクリート(場所打擁壁) 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

生コンクリート規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分
(表2.2)	一般養生	延長無し
		90m 未満
		90m 以上 180m 未満
		180m 以上 280m 以下
	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し
		90m 未満
		90m 以上 180m 未満
		180m 以上 280m 以下
	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し
		90m 未満
		90m 以上 180m 未満
		180m 以上 280m 以下

- (注) 1. 上表は、場所打擁壁のコンクリート打設、ホースの筒先作業等を行う機械付補助労務、養生、圧送管組立・撤去、ペーラインコンクリートの施工の他、コンクリートパイプブレータ損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.02）
3. ペーラインコンクリートの材料費については、「[第Ⅱ編第2章④場所打擁壁工④-1 場所打擁壁工\(1\)](#)」[3-8 ペーラインコンクリート（材料費）](#)により別途計上する。
4. 作業範囲（30m）を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を90m未満、90m以上180m未満、180m以上280m以下から該当する区分を選択する。
5. 擁壁平均高さは、擁壁の前面勾配あるいは背面勾配、天端幅、擁壁種類が同一の構造形式のブロックにて判断する。
6. 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合は、足場費を別途計上する。



表 2.2 生コンクリート規格

積算条件	区分	
生コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	24-12-25(20) (高炉)
	21-12-25(20) (普通)	18-8-40(高炉)
	24-8-25(20) (普通)	18-12-40(高炉)
	24-12-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)
	27-8-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)
	27-12-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)
	18-8-40(普通)	24-12-40(高炉)
	18-12-40(普通)	21-8-25 (早強)
	21-8-40(普通)	21-12-25 (早強)
	21-12-40(普通)	24-8-25 (早強)
	24-8-40(普通)	24-12-25 (早強)
	24-12-40(普通)	18-8-25(高炉)
	21-8-25(20) (高炉)	18-12-25(高炉)
	21-12-25(20) (高炉)	各種
	24-8-25(20) (高炉)	

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 2.3 コンクリート(場所打擁壁) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m³/h	
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・賃料 ・仮囲い内ジェットヒータ 養生の場合
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ 養生の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手 (特殊)	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータ 養生の場合
	Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z4	ー	
市場単価	S	ー	

## 2-2 型枠工

型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。

## 2-3 足場工

足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工⑦-1足場工」により別途計上する。

## 2-4 その他

上記以外で必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。

⑤ 石積（張）工

⑤-1 石積 (張) 工 (建地-F)

## 1. 適用範圍

本資料は、玉石及び雑割石（控長 25cm～50cm）の積工（勾配 1 割未満）及び張工（勾配 1 割以上）の場合に適用する。

### 1-1 適用できる範囲

1-1-1 石積（練石）（複合）

(1) 表 1. 1 に示す条件に該当する場合

1-1-2 石張(複合)

(1) 表 1. 3 に示す条件に該当する場合

なお、1-1-1 あるいは 1-1-2 が適用できない場合は、石積（張）、胴込・裏込コンクリート、裏込材（クラッシュラン）を適用する。

表 1.1 石積(練石)(複合)の適用範囲

控長 (cm)	直高 (m)	前面勾配	胴込・裏込コンクリート使用数量 (m <sup>3</sup> /10m <sup>2</sup> )		裏込材使用数量 (m <sup>3</sup> /10m <sup>2</sup> )
			玉石の場合	雑割石の場合	
35cm	1.0m以上1.5m以下	1 : 0.3～ 0.5	2.25 以上 2.42 以下	2.83 以上 3.05 以下	2.24以上2.95以下
	1.5mを超え2.0m以下	1 : 0.4～ 0.5	2.25 以上 2.35 以下	2.83 以上 2.98 以下	2.81以上3.83以下
	2.0mを超え2.5m以下	1 : 0.4～ 0.5	2.23 以上 2.31 以下	2.81 以上 2.94 以下	3.21以上4.33以下
	2.5mを超え3.0m以下	1 : 0.4～ 0.5	2.22 以上 2.29 以下	2.80 以上 2.92 以下	3.53以上4.70以下
	3.0mを超え5.0m以下	1 : 0.5	2.73 以上 2.82 以下	3.31 以上 3.45 以下	3.81以上5.02以下

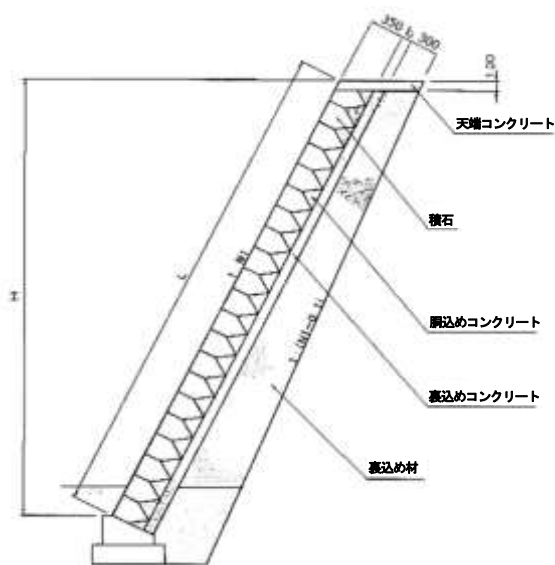


表 1. 2 「参考図 石積(練石)(複合)の断面図」の寸法

H(直高) (m)	L (のり長) (mm)			控長 (mm)	裏込め コンク リート厚さ (mm)
	N1 (前面勾配)				
	1:0.3	1:0.4	1:0.5		b
1.00	1044	1077	1118	350	100
1.50	1566	1616	1677	350	100
2.00	—	2154	2236	350	100
2.50	—	2693	2795	350	100
3.00	—	3231	3354	350	100
3.50	—	—	3913	350	150
4.00	—	—	4472	350	150
4.50	—	—	5031	350	150
5.00	—	—	5590	350	150

参考図 石積(練石)(複合)の断面図

表 1.3 石張(複合)の適用範囲

練石張の場合


玉石控 (cm)	裏込材の有無	胴込・裏込コンクリート 使用量 ( $\text{m}^3/10\text{m}^2$ )	裏込材使用量 ( $\text{m}^3/10\text{m}^2$ )
25cm以上35cm以下	有り	1.60	2.00
	無し	1.60	—
30cm以上40cm以下	有り	1.90	2.00
	無し	1.90	—
35cm以上45cm以下	有り	2.10	2.00
	無し	2.10	—
40cm以上50cm以下	有り	2.40	2.00
	無し	2.40	—
45cm以上50cm以下	有り	2.70	2.00
	無し	2.70	—

空石張の場合

玉石控 (cm)	裏込材の有無	胴込材使用量 ( $\text{m}^3/10\text{m}^2$ )	裏込材使用量 ( $\text{m}^3/10\text{m}^2$ )
25cm以上35cm以下	有り	1.00	2.00
	無し	1.00	—
30cm以上40cm以下	有り	1.20	2.00
	無し	1.20	—
35cm以上45cm以下	有り	1.30	2.00
	無し	1.30	—
40cm以上50cm以下	有り	1.50	2.00
	無し	1.50	—
45cm以上50cm以下	有り	1.70	2.00
	無し	1.70	—

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

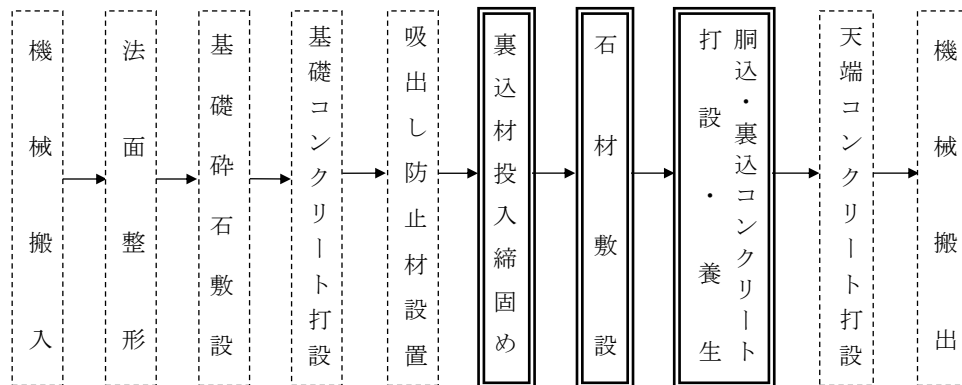

(注) 本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。

図 2-1 施工フロー

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 石積（練石）（複合）（SCB221810）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 石積（練石）（複合） 積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>2</sup>）

石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格
玉石	(表 3.2)	(表 3.3)	(表 3.4)
雑割石			

- (注) 1. 上表は、石積工における石材の設置、胴込・裏込コンクリートの打設、裏込材の設置、水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材含む）の設置の他、コンクリートバケット損料、パイプブレータ損料、電力に関する経費、締固め機械等の損料、油脂類の費用、据付時の石材の微調整、吊上げ・吊下げ作業（石材、胴込材、裏込材等）、現場内小運搬（バケット作業）、振動コンパクタによる締固め作業等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、石積（張）（材料費）は含まない。
2. 吸出し防止材を全面に設置する場合は、「第Ⅱ編第2章⑩吸出し防止材設置工」により別途計上する。
3. 石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。
4. 基礎コンクリート及び天端コンクリートは、「第Ⅱ編第2章③コンクリートブロック積（張）工」による。
5. 胴込・裏込コンクリート、裏込材の材料ロスを含む。標準ロス率は、胴込・裏込コンクリートが+0.16、裏込材が+0.18 とする。
6. 養生が必要な場合には、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。
7. 水抜きパイプ・吸出し防止材の材料費は、別途計上する。

表 3.2 直高

積算条件	区分
直 高	1.0m以上1.5m以下
	1.5mを超え2.0m以下
	2.0mを超え2.5m以下
	2.5mを超え3.0m以下
	3.0mを超え5.0m以下

表 3.3 胴込・裏込コンクリート規格

積算条件	区分
胴込・裏込コンクリート 規 格	18-8-25
	18-8-40
	19.5-8-40
	21-8-25
	18-8-25 （高炉）
	18-8-40 （高炉）
	19.5-8-40 （高炉）
	21-8-25 （高炉）
	各 種

表 3.4 裏込材規格

積算条件	区分
裏 込 材 規 格	再生クラッシュラン RC-40
	再生クラッシュラン RC-80
	クラッシュラン C-40
	クラッシュラン C-80
	各 種

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 石積(練石)(複合) 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）1.7t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	石工	
	R3	特殊作業員	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	再生クラッシュラン RC-40	
	Z3	軽油 1.2 号 バトルール給油	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 石張（複合）（SCB221820）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 6 石張（複合） 積算条件区分一覧

(積算単位：㎡)

構造区分	玉石控	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格
練石	(表 3. 7)	(表 3. 3)	有り	(表 3. 8)
空石			無し	

- (注) 1. 上表は、石張工における石材の設置、胴込・裏込コンクリートの打設、胴込・裏込材の設置、水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材含む）の設置の他、コンクリートバケット損料、バイブレータ損料、電力に関する経費、締固め機械等の損料、油脂類の費用、据付時の石材の微調整、吊上げ・吊下げ作業、（石材、胴込材、裏込材等）、現場内小運搬（バケット作業）、振動コンパクタによる締固め作業等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、石積（張）（材料費）は含まない。
2. 吸出し防止材を全面に設置する場合は、「第Ⅱ編第2章④吸出し防止材設置工」により別途計上する。
3. 石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。
4. 基礎コンクリート及び天端コンクリートは「第Ⅱ編第2章③コンクリートブロック積（張）工」による。
5. 胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材の材料ロスを含む。標準ロス率は、胴込・裏込コンクリートが+0.16、胴込・裏込材が+0.18 とする。
6. 養生が必要な場合には、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。
7. 水抜きパイプ・吸出し防止材の材料費は、別途計上する。

表 3. 7 玉石控

積算条件	区分
玉石控	25cm以上35cm以下
	30cm以上40cm以下
	35cm以上45cm以下
	40cm以上50cm以下
	45cm以上50cm以下

表 3. 8 胴込・裏込材規格

積算条件	区分
胴込・裏込材規格	再生クラッシュラン RC-40
	再生クラッシュラン RC-80
	クラッシュラン C-40
	クラッシュラン C-80
	各 種

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 9 石張(複合) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	石工	
	R3	運転手 (特殊)	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材が有りの場合
	Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 石積(張) (SCB221830)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 10 石積(張) 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

積張の区分	構造区分	石の種類
積工	練石	玉石
		雑割石
張工	練石	玉石
		雑割石
	空石	玉石

(注) 1. 上表は、石積(張)工における石材の設置、据付時の石材の微調整、水抜パイプ(水抜き孔用吸出し防止材含む)の設置、吊上げ・吊下げ作業(石材、胴込材、裏込材等)、現場内小運搬(バケット作業)等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、石積(張)(材料費)は含まない。

2. 吸出し防止材を全面に設置する場合は、「第Ⅱ編第2章④吸出し防止材設置工」により別途計上する。

3. 石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。

4. 水抜きパイプ・吸出し防止材の材料費は、別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 11 石積(張) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	・賃料 ・積工の場合
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・張工の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	石工	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-4 石積(張) (材料費)

## (1) 条件区分

石積(張) (材料費) における積算条件区分はない。

積算単位は、m<sup>2</sup>とする。

- (注) 1. 石積(練石)(複合)は、控長 35cm のみ適用できる。  
2. 石張(複合)は、玉石のみ適用できる。

## 3-5 胴込・裏込コンクリート (SCB221840)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 12 胴込・裏込コンクリート 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格
積工	(表 3. 3)
張工	

- (注) 1. 上表は、石積(張)工における胴込・裏込コンクリートの打設の他、コンクリートバケット損料、パイプレータ損料、電力に関する経費等、その施工に必要な全て機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
2. 基礎コンクリート及び天端コンクリートは、「第Ⅱ編第2章③コンクリートブロック積(張)工」による。  
3. 胴込コンクリート量は、玉石の場合は面積に控長の1/3を、雑割石の場合は1/2を乗じたものとする。  
4. 養生が必要な場合には、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。  
5. 胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.16）



## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 13 胴込・裏込コンクリート 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	・賃料 ・積工の場合
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・張工の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	—	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	
	Z2	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-6 裏込材（クラッシュラン）（SCB221850）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 14 裏込材（クラッシュラン） 積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>3</sup>）

積張の区分	裏込材規格
積工	(表 3. 4)
張工	

- (注) 1. 上表は、石積(張)工における裏込材（クラッシュラン）の設置の他、締固め機械等の損料、油脂類の費用、振動コンパクタによる締固め作業等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 空石張の胴込材の量は、面積に玉石の控長の 1/3 を乗じたものとする。
3. 裏込材の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.18）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 15 裏込材(クラッシャラン) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	・賃料 ・積工の場合
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・張工の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	運転手（特殊）	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	再生クラッシャラン RC-40	
	Z2	軽油 1.2号 バトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ⑥ プレキャスト擁壁工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、次に示すプレキャスト擁壁の施工に適用する。

## 1-1 適用できる範囲（以下の全ての条件に該当する場合）

- (1) 擁壁の形式：L型、逆T型、側溝付、天端勾配カット、ブロック分割型、嵩上品  
 ※天端勾配カットとは製品天端を斜めにカットしたタイプ  
 ※嵩上品とは嵩上コンクリート打継ぎ用に差筋を配したタイプ
- (2) 擁壁の高さ：0.5m以上5.0m以下  
 天端勾配カットは中央値、嵩上品はブロック高さ（差筋を含まない）とする。
- (3) ブロック単体の長さ：2.0m/個

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

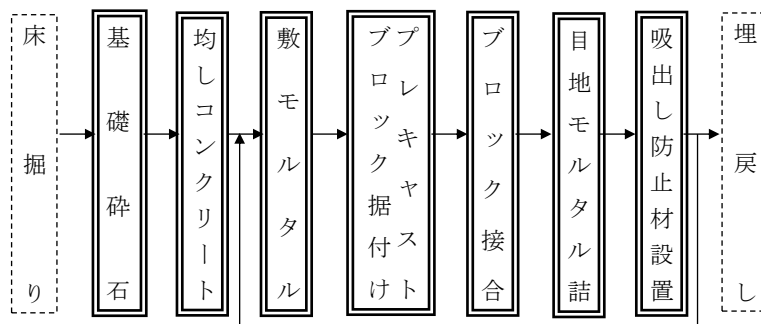


図2-1 施工フロー

- （注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 本施工パッケージには、撤去は含まれていない。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 プレキャスト擁壁設置 (SCB222110)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 プレキャスト擁壁設置 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

プレキャスト 擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無
0.5m以上1.0m以下	有り	有り
		無し
	無し	有り
		無し
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り
		無し
	無し	有り
		無し
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り
		無し
	無し	有り
		無し
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り
		無し
	無し	有り
		無し

- (注) 1. 上表は、プレキャスト擁壁設置，基礎砕石（敷設・転圧労務，材料投入・締固め機械運転経費，砕石等材料費），均しコンクリート（コンクリート・養生材料費，打設・養生労務，電力に関する経費，シュート，ホップ，コンクリートパイプレータ損料），型枠（型枠材料費，型枠製作・設置・撤去労務，はく離剤塗布及びケレン），養生，ブロック接合，現場内小運搬（10m 程度），敷モルタル，目地モルタル，吸出し防止材等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 基礎砕石の敷均し厚は，20cm 以下を標準としており，これにより難い場合は，別途考慮する。
3. 均しコンクリートの厚さは，15cm 以下を標準としており，これにより難い場合は，別途考慮する。
4. 養生は，養生材の被覆，散水養生，被覆養生程度のものであり，保温養生等の特別な養生を必要とする場合は，養生費を「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。
5. ペーラインコンクリートが必要な場合は，「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.2 プレキャスト擁壁設置 代表機材規格一覧

プレキャスト 擁壁高さ	項目		代表機材規格	備考
0.5m 以上 2.0m 以下	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ） 吊能力 2.9t	賃料
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	土木一般世話役	
		R3	特殊作業員	
		R4	運転手（特殊）	
	材料	Z1	コンクリート擁壁（中地震対応型） 1000 型(L=2.0m)	プレキャスト擁壁 高さ 0.5m 以上 1.0m 以下の場合
			コンクリート擁壁（中地震対応型） 1600 型(L=2.0m)	プレキャスト擁壁 高さ 1.0m を超え 2.0m 以下の場合
		Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	
2.0m を超え 5.0m 以下	機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t 吊	賃料
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	土木一般世話役	
		R3	特殊作業員	
		R4	—	
	材料	Z1	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認 (q=10kN/m <sup>2</sup> ) 2500 型(L=2.0m)	プレキャスト擁壁 高さ 2.0m を超え 3.5m 以下の場合
			コンクリート擁壁（中地震対応型） ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m <sup>2</sup> ) 4250 型 (L=2.0m)	プレキャスト擁壁 高さ 3.5m を超え 5.0m 以下の場合
		Z2	—	
		Z3	—	
		Z4	—	
	市場単価	S	—	

## ⑦ 補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）（建地－E）

## 1. 適用範囲


本資料は，補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）において，コンクリート製壁面材（帯鋼補強土壁においては，薄型壁面材含む）によるものに適用する。なお，鋼製壁面材には適用しない。

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁の標準仕様を表1.1に示す。


表1.1 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁における壁面材・補強材の仕様

工 種	帯鋼補強土壁	アンカー補強土壁
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m (高さ×長さ)	1.0m×1.5～1.6m (高さ×長さ)
補 強 材	ストリップ幅：60～80mm	SS400 規格，SS490 規格
壁 面 材 強 度	コンクリート設計基準強度：21～30N/mm <sup>2</sup>	コンクリート設計基準強度：30N/mm <sup>2</sup> ，40N/mm <sup>2</sup>
盛 土	1層仕上り高さ：25cm	1層仕上り高さ：25cm

参考図. 各工種の標準壁面形状

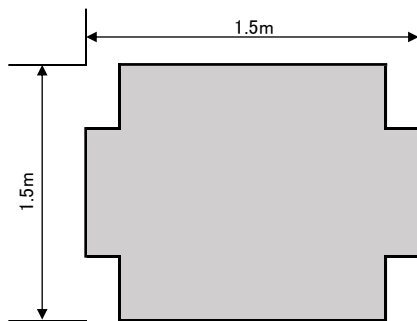

帯鋼補強土壁正面図

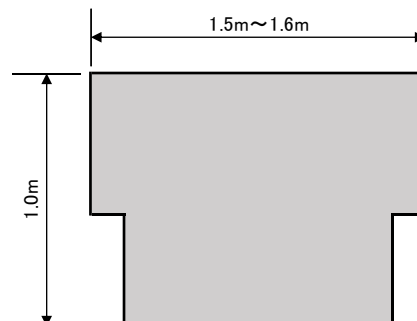

アンカー補強土壁 正面図

- (注)1. 参考図に示したのは，各工種の標準壁面形状である。  
 2. 本施工パッケージは，壁面最上段部（ハーフ），最下段部（ハーフ），コーナー部等の異形壁面材にかかわらず適用できる。

## 2. 施工概要

施工フローは下記を標準とする。

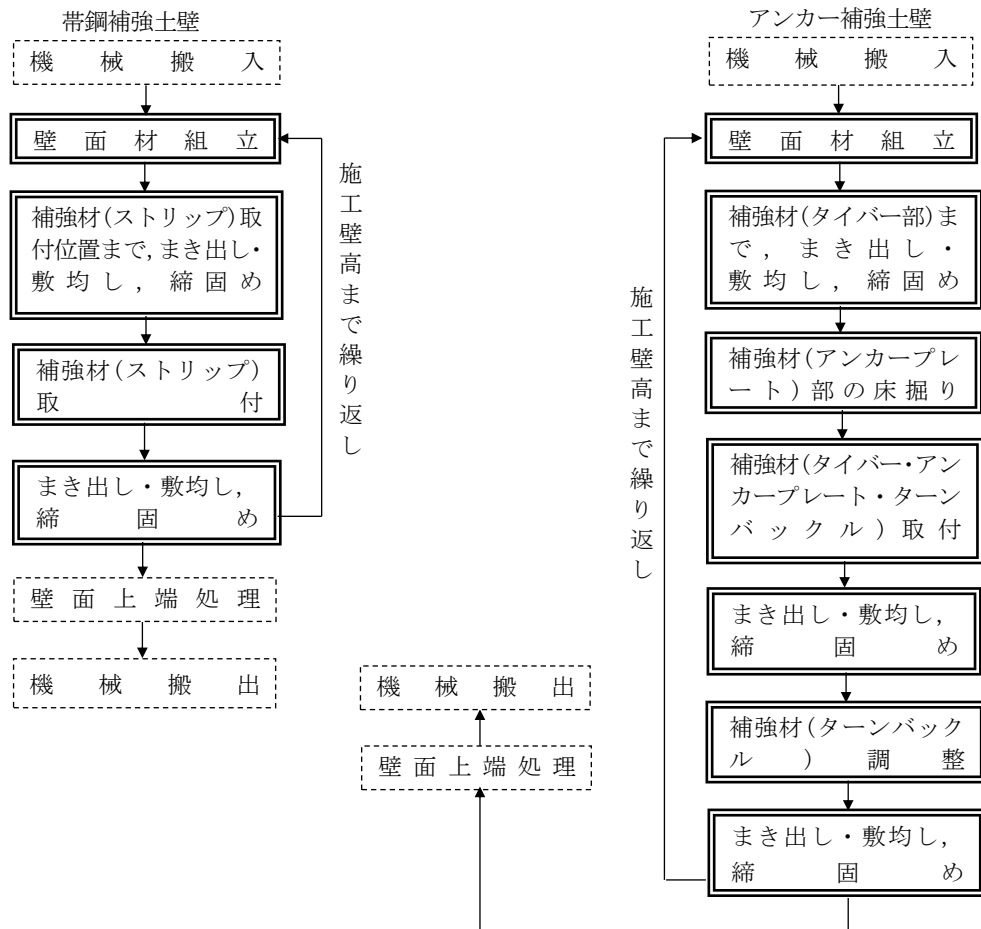


図2-1 施工フロー

(注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 補強土壁壁面材組立・設置（SCB222210）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 補強土壁壁面材組立・設置 積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>2</sup>）

工法区分
帯鋼補強土壁
アンカー補強土壁

- （注）1. 上表は、補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）の壁面材の組立・設置、水平目地材、透水防砂材、ボルト・ナットの設置の他、クランプ、定規、ワイヤ、吊金具、カップラー、くさび、スペーサー、角材、支柱等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、補強土壁壁面材（材料費）は含まない。
2. 補強土壁壁面材の材料費は別途計上する。
3. 基礎コンクリートについては、「第Ⅱ編第4章④コンクリート工」により別途計上する。
4. 現場条件により表3.2に示す代表機械の規格により難しい場合は、別途考慮する。
5. 排水管が必要な場合は別途計上する。
6. 足場が必要な場合は別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 補強土壁壁面材組立・設置 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 25t 吊	賃料
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m <sup>3</sup> （平積 0.4m <sup>3</sup> ） 吊能力 2.9t	賃料
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 補強土壁壁面材（材料費）

## (1) 条件区分

補強土壁壁面材（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、m<sup>2</sup>とする。

（注）材料費には、水平目地材、透水防砂材、ボルト・ナット等を含む。



## 3-3 補強材取付 (SCB222220)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.3 補強材取付 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

工法区分
帯鋼補強土壁
アンカー補強土壁

- (注) 1. 上表は、補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）の補強材の取付け、結合作業の他、アンカー補強土壁におけるターンバックルの設置・調整等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、補強材（材料費）は含まない。
2. 補強材の材料費は別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 補強材取付 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-4 補強材（材料費）

## (1) 条件区分

補強材（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、mとする。

(注) 材料費には、アングル、ターンバックル、アンカープレート等を含む。

## 3-5 まき出し・敷均し、締固め（SCB222230）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.5 まき出し・敷均し、締固め 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

工法区分
帯鋼補強土壁
アンカー補強土壁

- (注) 1. 上表は、補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）のまき出し、敷均し、締固めの他、振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）、タンパの運転経費等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 施工量の範囲は、壁面上端までと補強材後部までの盛土を対象とする（参考図参照）。
3. 現場条件により表 3.6 に示す代表機械の規格により難しい場合は、別途考慮する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.6 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型（第2次基準値）] 7t 級	賃料
	K2	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.5m <sup>3</sup> （平積 0.4m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K3	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・ 排出ガス対策型（第2次基準値）] 運転質量 3～4t	賃料
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-6 排水管敷設工

排水管敷設工を施工する場合は、「第Ⅱ編第2章⑩-1 排水構造物工」暗渠排水管により別途計上する。

## 3-7 壁面上端処理工

壁面上端処理を施工する場合は、下記による。

## (1) コンクリート工

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。


## (2) 型枠工

「第Ⅱ編第4章②-1型枠工」により別途計上する。

## (3) 鉄筋工

鉄筋工は「第Ⅵ編第1章①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。

[参考図]

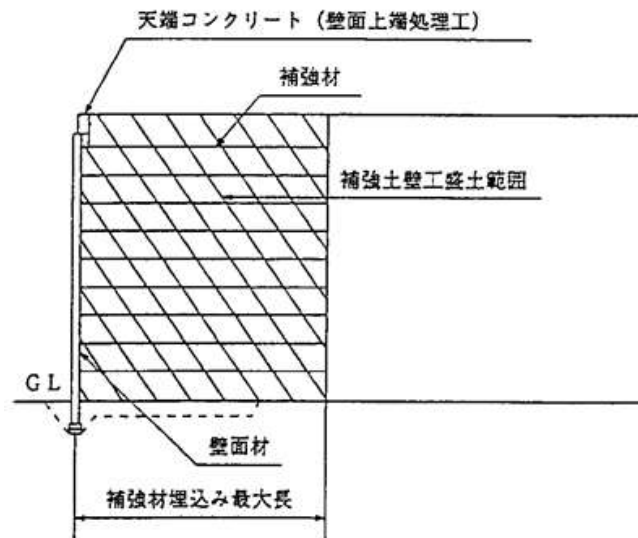

補強土壁工標準断面図

（注）天端コンクリート施工等の足場については、別途考慮する。

## ⑧ ジオテキスタイル工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、ジオテキスタイル（ジオグリッド、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強土壁工及び盛土補強工に適用する。ただし、軟弱地盤における敷設材工法及び盛土の補強工法は適用範囲外とする。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置

(1) 鋼製ユニットの場合

## 1-1-2 ジオテキスタイル敷設、まき出し・敷均し、締固め

(1) ジオテキスタイル工1段当りの施工高さが1.5mまでの場合

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置

(1) 壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合

## 1-2-2 ジオテキスタイル敷設、まき出し・敷均し、締固め

(1) 壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

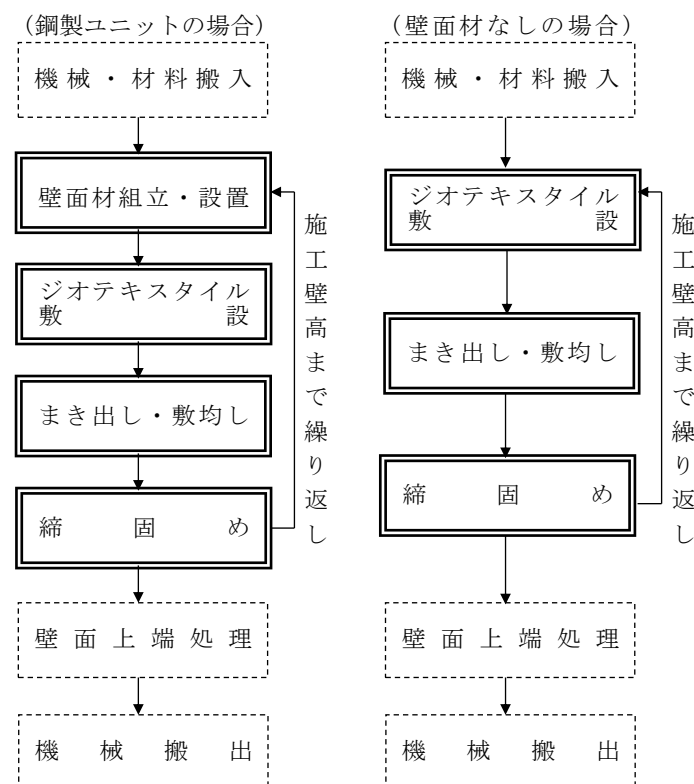


図2-1 施工フロー

（注）本施工パッケージに対応しているのは、二重実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置（SCB222240）

## (1) 条件区分

ジオテキスタイル壁面材組立・設置に積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^2$ とする。

- (注) 1. ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工の壁面材の組立・設置、吸出し防止材の設置等、その施工に要する全ての費用を含む。ただし、ジオテキスタイル壁面材（材料費）及び吸出し防止材の材料費は含まない。
2. ジオテキスタイル壁面材及び吸出し防止材の材料費は別途計上する。
3. 適用される壁面材の種類は、表 3. 2 のとおりとする。
4. 施工量は、直面積（壁高×施工延長）とする（図 3-1 参考図参照）。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 1 ジオテキスタイル壁面材組立・設置 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

表 3. 2 壁面材の種類

壁面材種類	規 格		備 考
	幅 (mm)	一層当り施工高	
鋼製ユニット	2,000	500mm 以下	タイプ A
	2,000	600mm 以下	タイプ B
	1,000	600mm 以下	タイプ C
	1,200	600mm 以下	タイプ D

(注) 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 3-2 ジオテキスタイル壁面材（材料費）

## (1) 条件区分

ジオテキスタイル壁面材（材料費）に積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^2$ とする。

(注) 壁面材の材料使用量は、「4. 参考資料」を参考に  $\text{m}^2$  当り数量を算出する。

## 3-3 ジオテキスタイル敷設 (SCB222260)

## (1) 条件区分

ジオテキスタイル敷設に積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^2$  とする。

(注) 1. ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工のジオテキスタイルの敷設（ジオテキスタイル巻込み作業含む）の他、ジオテキスタイル敷設に使用する杭、ハンマ、バール、結束線等、その施工に要する全ての費用を含む。ただし、ジオテキスタイル（材料費）は含まない。

2. ジオテキスタイルの材料費は別途計上する。

3. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式の通りとする。

$$\text{ジオテキスタイル敷設面積 (m}^2\text{)} = a_1 + a_2 + a_3 \cdots$$

$a_1, a_2, a_3 \cdots$  : ジオテキスタイル工1段当り敷設面積 ( $\text{m}^2$ ) (図3-1 参考図参照)

4. ジオテキスタイル工1段当り敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。

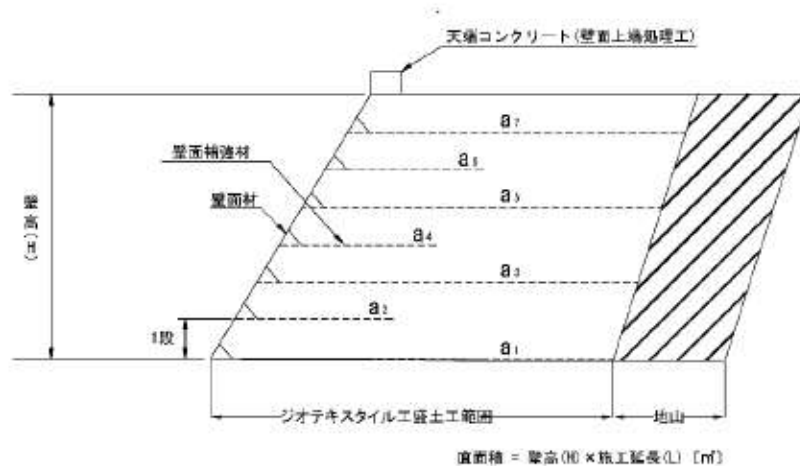


図3-1 ジオテキスタイル工標準断面図(参考図)

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.3 ジオテキスタイル敷設 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-4 まき出し・敷均し、締固め（SCB222270）

## (1) 条件区分

まき出し・敷均し、締固めに積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$ とする。

- (注) 1. ジオテキスタイルを用いた補強土壁工及び盛土補強工のまき出し、敷均し・締固め、水平排水材、層厚管理材の設置の他、振動ローラ（ハンドガイド式）、タンパ及びランマの運転経費等、その施工に要する全ての費用を含む。ただし、水平排水材、層厚管理材及び盛土材の材料費は含まない。
2. 水平排水材、層厚管理材の材料費は別途計上する。
3. ジオテキスタイル工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用する。
4. ジオテキスタイル盛土工範囲（図3-1 参考図参照）の盛土材については、必要に応じて別途計上する。
5. 現場発生土の粒径処理等が必要な場合は、別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 まき出し・敷均し、締固め 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 $0.5\text{m}^3$ （平積 $0.4\text{m}^3$ ）	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-5 ジオテキスタイル（材料費）

## (1) 条件区分

ジオテキスタイル（材料費）に積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^2$ とする。

(注) 施工量は、巻込み部、重ね合わせ等を含んだジオテキスタイル必要面積を計上する。

## 3-6 排水管敷設工

排水管敷設工を施工する場合は、暗渠排水管により別途計上する。


## 3-7 壁面上端処理工

壁面上端処理工を施工する場合は、下記による。


- (1) コンクリート工  
「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。
- (2) 型枠工  
「第Ⅱ編第4章②-1型枠工」により別途計上する。
- (3) 鉄筋工  
「第Ⅵ編第1章①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。
- (4) 足場工  
「第Ⅱ編第5章⑦-1足場工」により別途計上する。

## 4. 参考資料


## 4-1 施工法（工法）参考図

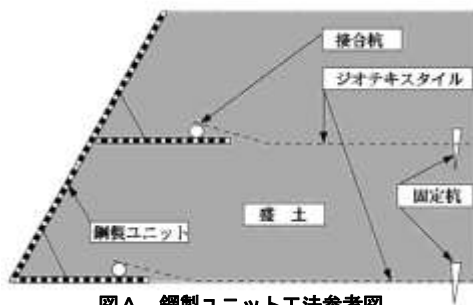

図A 鋼製ユニット工法参考図

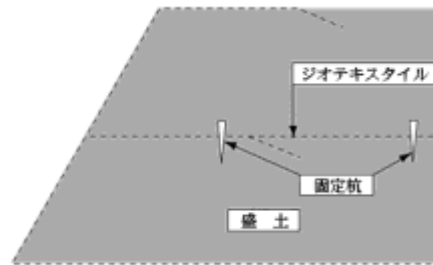

図B 巻込み工法（壁面材なし）参考図

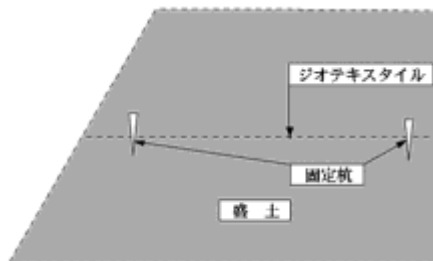

図C 普通敷設工法（壁面材なし）参考図

表 4. 1 施工法別施工パッケージ適用表

適用 施工法(工法)	壁面材設置・組立	ジオテキスタイル敷設 まき出し・敷均し、締固め
鋼製ユニット工法 図A	○	○
巻込み工法 (壁面材なし) 図B	×	○
普通敷設工法 (壁面材なし) 図C	×	○




## 4-2 壁面材使用量

壁面材の実面積（直面積）100m<sup>2</sup> 当り鋼製ユニット使用量は，次表を参考とする。

表 4. 2 鋼製ユニット標準使用量

(直面積) 100m<sup>2</sup> 当り

壁面材種類	タイプ	一層当り施工高	単位	数 量	標準図
鋼製ユニット	タイプ A	500mm 以下	個	100	図①
	タイプ B	600mm 以下		83	
	タイプ C	600mm 以下		167	
	タイプ D	600mm 以下		139	

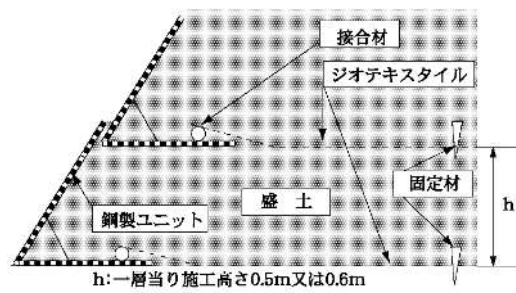

図① 鋼製ユニット施工数量標準図

## ⑨ 構造物補修工（建地－D）

## ⑨－1 構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））

## 1. 適用範囲

本資料は、コンクリート構造物のひび割れ補修における1構造物当りの充てん作業に適用する。  
なお、以下の条件は適用範囲外とする。

- ・水中部
- ・道路トンネル（覆道、道路ボックスカルバート等含む）

（注）1構造物とは、1橋梁や1樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

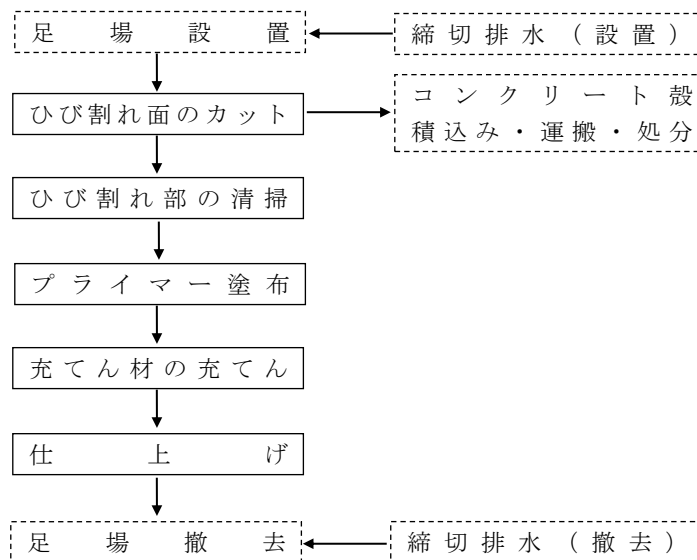


図2-1 施工フロー

（注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

2. 仕上げには養生を含む。

ただし、現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。

## 3. 施工歩掛

## 3-1 ひび割れ補修工（充てん工法）

ひび割れ補修工（充てん工法）の歩掛は、次表を標準とする。

表 3. 1 ひび割れ補修工（充てん工法）歩掛

[1 構造物当り補修延べ延長 20m 未満の場合]

名 称	単位	数量（D1） （1構造物当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	0.85
特 殊 作 業 員	〃	1.3
普 通 作 業 員	〃	1.1

表 3. 2 ひび割れ補修工（充てん工法）歩掛

[1 構造物当り補修延べ延長 20m 以上の場合]

名 称	単位	数量（D2） （10m当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	0.43
特 殊 作 業 員	〃	0.65
普 通 作 業 員	〃	0.57

- (注) 1. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。  
 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。  
 3. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は、別途計上する。  
 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。

## 3-2 諸雑費

諸雑費は、各作業に必要な器具（ディスクサンダー等）の費用、ディスクサンダーの替え刃の費用、プライマー材料費、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3. 3 諸雑費率 (%)

1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率
20m 未満の場合	17
20m 以上の場合	

## 3-3 材料使用数量

充てん材の材料使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (kg)} = \text{設計数量 (kg)} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式 3. 1}$$

K：ロス率

表 3. 4 ロス率(K)

ロス率	+0.20
-----	-------

## 4. 単価表

## (1) ひび割れ補修工（充てん工法）1 構造物当り単価表

補修延べ延長 20m 未満の場合

SWB229010

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	D1	表3.1
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
充 て ん 材 材 料 費		kg		式3.1
諸 雑 費		式	1	表3.3
計				

(注) D1 : 1 構造物当り施工数量

## (2) ひび割れ補修工（充てん工法）1 構造物当り単価表

補修延べ延長 20m 以上の場合

SWB229011

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	L/10×D2	表3.2
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
充 て ん 材 材 料 費		kg		式3.1
諸 雑 費		式	1	表3.3
計				

(注) 1. L : 1 構造物当り補修延べ延長(m)

2. D2 : 10m 当り施工数量

## ⑨-2 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））

## 1. 適用範囲

本資料は、コンクリート構造物のひび割れ補修における1構造物当りの低圧注入作業（圧縮空気、ゴムやバネの復元力などを利用して加圧できる専用器具を用いて注入を行うもの）に適用する。

なお、以下の条件は適用範囲外とする。

- ・ グリースポンプ等の手動ポンプを用いて手動で注入を行う場合
- ・ 足踏みポンプや電動ポンプ等の機械を用いて注入を行う場合
- ・ 水中部
- ・ 道路トンネル（覆道、道路ボックスカルバート等含む）

（注）1 構造物とは、1 橋梁や1 樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

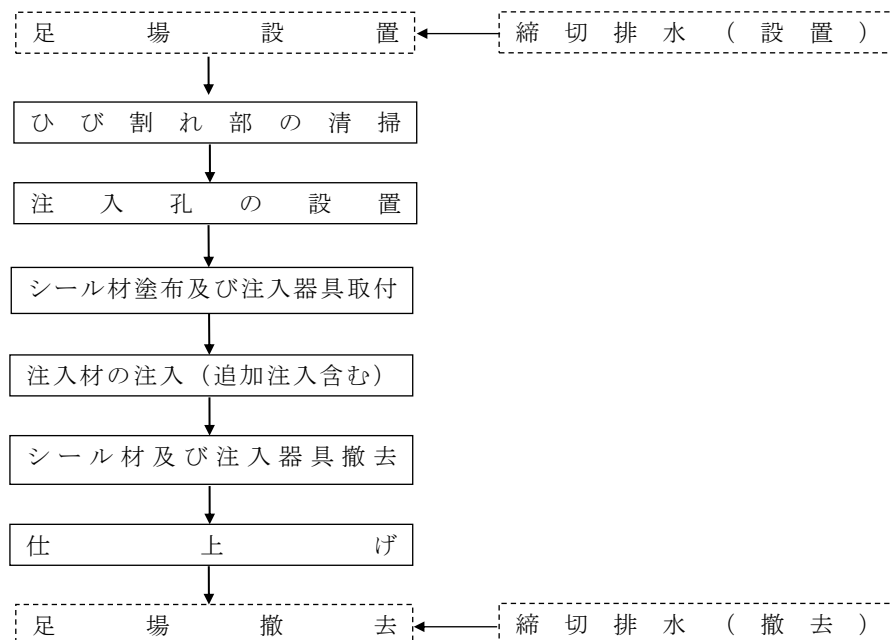


図2-1 施工フロー

- （注） 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 注入器具の種類によって作業の順序が前後する場合も適用することができる。

## 3. 施工歩掛

## 3-1 ひび割れ補修工（低圧注入工法）

ひび割れ補修工（低圧注入工法）の歩掛は、次表を標準とする。

表 3.1 ひび割れ補修工（低圧注入工法）歩掛  
[1 構造物当り補修延べ延長 25m 未満の場合]

名 称	単位	数量（D1） （1構造物当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	1.5
特 殊 作 業 員	〃	2.4
普 通 作 業 員	〃	1.8

表 3.2 ひび割れ補修工（低圧注入工法）歩掛  
[1 構造物当り補修延べ延長 25m 以上の場合]

名 称	単位	数量（D2） （10m当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	0.58
特 殊 作 業 員	〃	0.96
普 通 作 業 員	〃	0.71

- （注）1. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。  
 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。  
 3. コンクリート殻の積み・運搬及び処分費は、別途計上する。  
 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。

## 3-2 諸雑費

諸雑費は、各作業に必要な器具（ディスクサンダー等）の費用、ディスクサンダーの替え刃の費用、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3.3 諸雑費率（%）

1 構造物当り補修延べ延長	諸雑費率
25m 未満の場合	6
25m 以上の場合	

## 3-3 材料使用数量

シール材の材料使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (kg)} = \text{設計数量 (kg)} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式 3. 1}$$

K：ロス率

表 3.4 ロス率(K)

ロス率	+0.37
-----	-------

## 4. 単価表

## (1) ひび割れ補修工（低圧注入工法）1 構造物当り単価表

補修延べ延長 25m 未満の場合

SWB229110

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	D1	表3.1
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
注 入 材		kg		必要数量計上(注)1
シ ー ル 材		〃		式3.1
低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1
諸 雑 費		式	1	表3.3
計				

(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。

2. D1：1構造物当り施工数量

## (2) ひび割れ補修工（低圧注入工法）1 構造物当り単価表

補修延べ延長 25m 以上の場合

SWB229111

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	L/10×D2	表3.2
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
注 入 材		kg		必要数量計上(注)1
シ ー ル 材		〃		式3.1
低 圧 注 入 器 具		個		必要数量計上(注)1
諸 雑 費		式	1	表3.3
計				

(注) 1. 必要数量とは、材料ロス分を含む。

2. L：1構造物当り補修延べ延長(m)

3. D2：10m当り施工数量

## ⑨-3 構造物補修工（断面修復工（左官工法））

## 1. 適用範囲

本資料は、コンクリート構造物の断面修復における1構造物当りの左官作業に適用する。

なお、以下の条件は適用範囲外とする。

- ・水中部
- ・道路トンネル（覆道、道路ボックスカルバート等含む）

（注）1 構造物とは、1 橋梁や1 樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

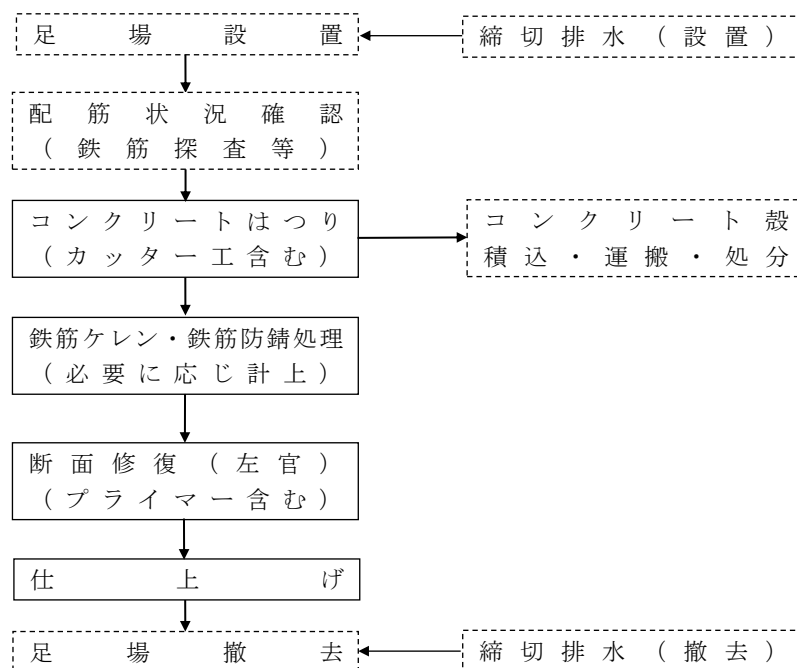


図2-1 施工フロー

（注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

2. 仕上げには養生を含む。

ただし、現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。

3. 構造物で鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む作業と含まない作業が混在する場合は、別途考慮する。



## 3. 施工歩掛

## 3-1 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む）

コンクリートはつり（カッター工含む）、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理、左官（プライマー含む）、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。

表 3. 1 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む）  
[1 構造物当り修復延べ体積 0.1m<sup>3</sup>未満]の場合

名 称	単位	数量（D1） （1 構造物当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	2.3
特 殊 作 業 員	〃	3.8
普 通 作 業 員	〃	2.5

表 3. 2 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む）  
[1 構造物当り修復延べ体積 0.1m<sup>3</sup>以上]の場合

名 称	単位	数量（D2） （0.1m <sup>3</sup> 当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	2.3
特 殊 作 業 員	〃	3.8
普 通 作 業 員	〃	2.5

- （注）1. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。  
 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。  
 3. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は、別途計上する。  
 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。

## 3-2 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない）

コンクリートはつり（カッター工含む）、左官（プライマー含む）、仕上げの歩掛は、次表を標準とする。

表 3. 3 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない）  
[1 構造物当り修復延べ体積 0.1m<sup>3</sup>未満]の場合

名 称	単位	数量（D3） （1 構造物当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	1.9
特 殊 作 業 員	〃	3.2
普 通 作 業 員	〃	2.1

表 3. 4 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない）  
[1 構造物当り修復延べ体積 0.1m<sup>3</sup>以上]の場合

名 称	単位	数量（D4） （0.1m <sup>3</sup> 当り）
土 木 一 般 世 話 役	人	1.9
特 殊 作 業 員	〃	3.2
普 通 作 業 員	〃	2.1

- （注）1. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。  
 2. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。  
 3. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は、別途計上する。  
 4. 仮締切・排水・足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。

## 3-3 材料の使用数量

断面修復材の使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量 (m}^3\text{)} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式 3. 1}$$

K：ロス率

表 3. 5 ロス率(K)

ロ ス 率	+0.18
-------	-------

## 3-4 諸雑費

諸雑費は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具（電動ピック、ディスクサンダー、替え刃等）、防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具（ディスクサンダー等）及び材料、左官作業に必要な器具（金コテ、ハンドミキサー等）、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。

表 3. 6 諸雑費率 (%)

条 件	1 構造物当り修復延べ体積	諸雑費率
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む	0.1m <sup>3</sup> 未満の場合	11
	0.1m <sup>3</sup> 以上の場合	11
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない	0.1m <sup>3</sup> 未満の場合	9
	0.1m <sup>3</sup> 以上の場合	9

## 4. 単価表

- (1) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む）1 構造物当り単価表  
修復延べ体積 0.1m<sup>3</sup>未満の場合

SWB229210

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	D1	表3.1
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
断 面 修 復 材		m <sup>3</sup>		式3.1
諸 雑 費		式	1	表3.6
計				

(注) D1：1 構造物当り施工数量

- (2) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む）1 構造物当り単価表  
修復延べ体積 0.1m<sup>3</sup>以上の場合

SWB229211

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	V/0.1×D2	表3.2
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
断 面 修 復 材		m <sup>3</sup>		式3.1
諸 雑 費		式	1	表3.6
計				

(注) 1. V：1 構造物当り修復延べ体積(m<sup>3</sup>)

2. D2：0.1m<sup>3</sup>当りの施工数量

- (3) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない）1 構造物当り単価表  
修復延べ体積  $0.1\text{m}^3$  未満の場合

SWB229212

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	D3	表3.3
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
断 面 修 復 材		$\text{m}^3$		式3.1
諸 雑 費		式	1	表3.6
計				

(注) D3 : 1 構造物当り施工数量

- (4) 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない）1 構造物当り単価表  
修復延べ体積  $0.1\text{m}^3$  以上の場合

SWB229213

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$V/0.1 \times D4$	表3.4
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
断 面 修 復 材		$\text{m}^3$		式3.1
諸 雑 費		式	1	表3.6
計				

(注) 1. V : 1 構造物当り修復延べ体積( $\text{m}^3$ )  
2. D4 :  $0.1\text{m}^3$  当りの施工数量

【参考】1 構造物について（橋梁）

1 構造物と考える場合（例）	1 構造物と考える場合（例）
<p>上部工又は下部工が分離しているが、一体として橋梁の構造を形成している場合は、1 構造物と考える。</p>	<p>上り線、下り線等、上部工と下部工が分離した構造の場合は、2 構造物と考える。</p>

## ⑩ 排水構造物工（建地－Ⅰ、B、C）

### ⑩－Ⅰ 排水構造物工

#### 1. 適用範囲

本資料は、プレキャスト製排水構造物の据付け、撤去、据付け・撤去作業に適用する。

##### 1－Ⅰ 適用できる範囲

###### 1－Ⅰ－Ⅰ ヒューム管（B形管）

- (1) ヒューム管，B形管（ソケット管）の据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) ヒューム管，B形管（ソケット管）を仮設に使用する場合

###### 1－Ⅰ－Ⅱ ボックスカルバート

- (1) 1ブロックを1部材で構成するプレキャスト製ボックスカルバート（内空断面が台形タイプの物を含む）の据付け，撤去，据付け・撤去の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅲ 暗渠排水管

- (1) 硬質塩化ビニル管，ポリエチレン管等の有孔・無孔管の据付け，撤去，据付け・撤去の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅳ フィルター材

- (1) 暗渠排水管の敷設に伴うフィルター材（クラッシュラン・単粒度碎石等）の敷設の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅴ 管（函）渠型側溝

- (1) 車道部，歩道部等の側溝を兼ねた排水構造物の据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) 製品長が2m/個以下かつ内径又は内空幅が200mm以上400mm以下の場合
- (3) 製品長が2m/個かつ内径又は内空幅が400mmを超え600mm以下の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅵ プレキャスト集水桝

- (1) プレキャスト製集水桝の据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) プレキャスト製集水桝の質量（蓋版除く）が50kg/基以上2,800kg/基以下の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅶ 鉄筋コンクリート台付管

- (1) 管断面の内側の形状が円形又は卵形であって，かつ，管断面の外側の下部もしくは上下部の一部がフラットになっている（管断面の外側の形状が方形もしくは六角形になっているものを含む）プレキャスト製鉄筋コンクリート台付管の据付け，撤去，据付け・撤去の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅷ プレキャストL形側溝

- (1) プレキャスト製L形側溝の据付け，撤去，据付け・撤去の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅸ プレキャストマンホール

- (1) プレキャスト製マンホールの据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) プレキャスト製マンホールの内径が1,500mm以下の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅹ P C管

- (1) P C管の据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) P C管を仮設に使用する場合

###### 1－Ⅰ－Ⅺ コルゲートパイプ

- (1) コルゲートパイプの据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) コルゲートパイプを仮設に使用する場合
- (3) 規格が「フランジ型円形」，「ラップ型円形」の場合

###### 1－Ⅰ－Ⅻ コルゲートフリューム

- (1) コルゲートフリュームの据付け，撤去，据付け・撤去の場合
- (2) コルゲートフリュームを仮設に使用する場合
- (3) 規格が「A型」の場合

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 ヒューム管（B形管）

- （1）巻きコンクリート（固定基礎）を含む撤去，据付け・撤去の場合

## 1-2-2 ボックスカルバート

- （1）グラウトを使用しないPCアンボンドケーブル等による施工の場合
- （2）製品長1.0m/個で縦締めを行う場合
- （3）曲線部における縦締め施工の場合
- （4）コンクリート養生で、特殊な養生を必要とする場合

## 1-2-3 暗渠排水管

- （1）持上げ高が2m以上の場合
- （2）埋設を行わない地上露出配管の敷設の場合

## 1-2-4 フィルター材

- （1）暗渠排水管の敷設を行わない場合

## 1-2-5 管（函）渠型側溝

- （1）土中に全体埋設される場合
- （2）内径又は内空幅が200mm未満又は600mmを超える場合
- （3）製品長が2mを超える場合

## 1-2-6 プレキャスト集水桝

- （1）プレキャスト製集水桝の質量（蓋版除く）が50kg/基未満及び2,800kg/基を超える場合
- （2）組立式プレキャスト製集水桝の場合

## 1-2-7 プレキャストマンホール

- （1）円形断面以外の基礎碎石の場合

## 1-2-8 PC管

- （1）巻きコンクリート（固定基礎）を含む撤去，据付け・撤去の場合
- （2）管径1,800mmを超えるPC管の据付け，据付け・撤去の場合

## 1-2-9 コルゲートパイプ

- （1）持上げ高が2m以上の場合
- （2）規格が「フランジ型円形」，「ラップ型円形」以外の場合
- （3）さや管工法（既設管路内設置）を行う場合

## 1-2-10 コルゲートフリューム

- （1）持上げ高が2m以上の場合
- （2）規格が「A型」以外の場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

## (1) ヒューム管（B形管）

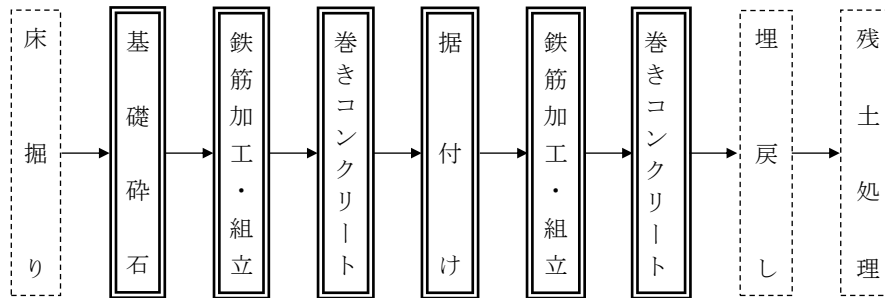


図2-1 ヒューム管（B形管） 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 基礎砕石、巻きコンクリートは、必要に応じて計上する。  
 3. コンクリートの養生は、特殊な養生にかかわらず、本施工パッケージを適用できる。  
 4. 鉄筋加工・組立は、巻きコンクリートが360°巻きの場合のみ計上する。

## (2) ボックスカルバート

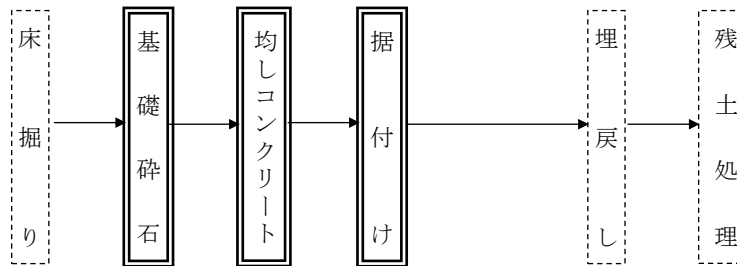


図2-2 ボックスカルバート 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 基礎砕石、均しコンクリートは、必要に応じて計上する。

## (3) 暗渠排水管、フィルター材

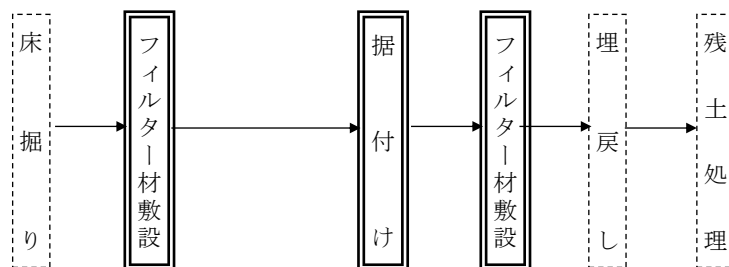


図2-3 暗渠排水管、フィルター材 施工フロー

- (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

(4) 管（函）渠型側溝，プレキャスト集水樹，プレキャストL型側溝，プレキャストマンホール

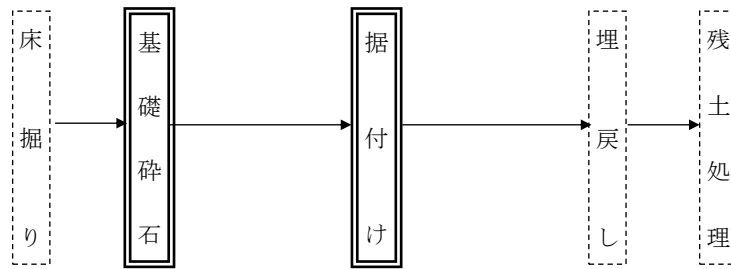


図2-4 管（函）渠型側溝，プレキャスト集水樹，プレキャストL型側溝，プレキャストマンホール 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは，二重実線部分のみである。  
 2. 基礎碎石は，必要に応じて計上する。  
 3. プレキャスト集水樹は，蓋版の有無にかかわらず，本施工パッケージを適用できる。

(5) 鉄筋コンクリート台付管

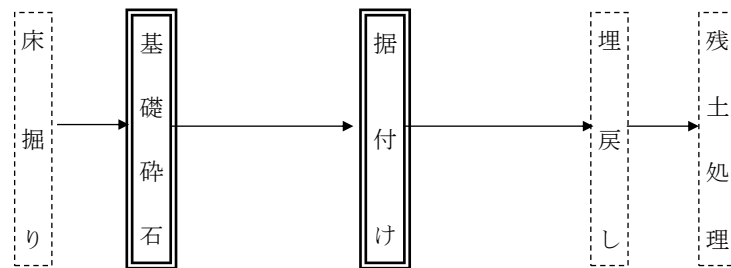


図2-5 鉄筋コンクリート台付管 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは，二重実線部分のみである。  
 2. 基礎碎石の有無にかかわらず，本施工パッケージを適用できる。

## (6) PC管

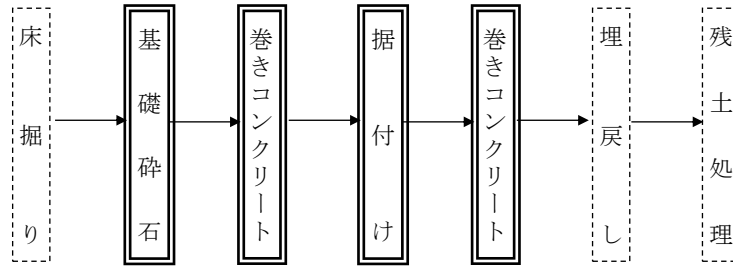


図2-6 PC管 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 巻きコンクリートは、必要に応じて計上する。  
 3. 基礎砕石の有無にかかわらず、本施工パッケージを適用できる。

## (7) コルゲートパイプ, コルゲートフリューム

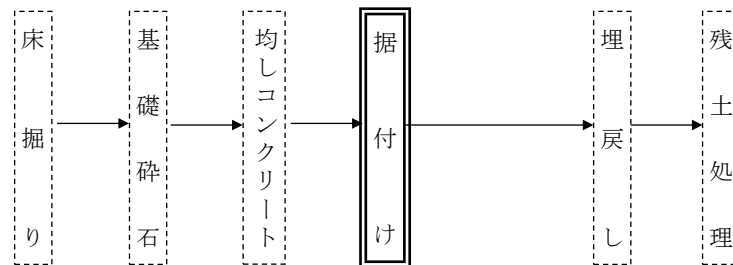


図2-7 コルゲートパイプ, コルゲートフリューム 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 基礎砕石, 均しコンクリートは、必要に応じて計上する。



## 3. 施工パッケージ

## 3-1 ヒューム管（B形管）（SCB222860）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 ヒューム管(B形管) 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	管径	固定基礎	基礎碎石の有無	規格	生コンクリート規格
据付	(表 3. 2)	90° 巻き	(表3. 4)	外圧管 1 種	(表3. 5)
				外圧管 2 種	
				各種	
		180° 巻き		外圧管 1 種	
				外圧管 2 種	
				各種	
		360° 巻き		外圧管 1 種	
				各種	
				無し	
	外圧管 2 種				
	各種				
	(表 3. 3)	90° 巻き	(表3. 4)	外圧管 1 種	(表3. 5)
				外圧管 2 種	
				各種	
		180° 巻き		外圧管 1 種	
				外圧管 2 種	
				各種	
		無し	—	外圧管 1 種	—
外圧管 2 種					
各種					
撤去	(表 3. 2) (表 3. 3)	—	—	—	—
据付・撤去	(表 3. 2) (表 3. 3)	—	—	外圧管 1 種	—
				外圧管 2 種	
				各種	

- (注) 1. 上表は、ヒューム管の設置、基礎碎石、鉄筋、ヒューム管の運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬、コンクリートの 15m 以下の現場内小運搬、巻きコンクリート、型枠（はく離材塗布及びケレン作業を含む）の他、緊結用器具、コンクリートカッタ運転、目地モルタルの費用、ヒューム管損失分の費用、カッタブレードの損耗費、レバーブロック損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 碎石、鉄筋、コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は、鉄筋が+0.03、コンクリートが+0.06 とする。
3. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
4. 基礎碎石は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
5. 固定基礎無しは、基礎碎石を含まないため必要な場合は別途計上する。
6. 撤去作業、据付・撤去作業は、ヒューム管のみを対象としている。
7. コンクリートの養生は、一般養生及び特殊養生にかかわらず適用できる。
8. 基面整正は含まない。

表 3. 2 管径①

積算条件	区分
管径	200mm
	250mm
	300mm
	350mm
	400mm
	450mm
	500mm
	600mm
	700mm
	800mm
	900mm
	1,000mm

表 3. 3 管径②

積算条件	区分
管径	1,100mm
	1,200mm
	1,350mm

表 3. 4 基礎碎石の有無

積算条件	区分
基礎碎石の有無	有り
	無し

表 3. 5 生コンクリート規格

積算条件	区分
生コンクリート規格	18-8-40（高炉）
	18-12-40（高炉）
	18-8-25(20)（高炉）
	18-12-25(20)（高炉）
	18-8-40（普通）
	18-12-40（普通）
	各種

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.6 ヒューム管(B形管) 代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]25t 吊	・賃料 ・管径が 1,100～1,350mm の場合
		バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	管径が 200～1,000mm の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	作業区分が据付で、固定基礎が有りの場合
		運転手(特殊)	上記以外の場合
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 200mm×長さ 2,000mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 200mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 250mm×長さ 2,000mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 250mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 300mm×長さ 2,000mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 300mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 350mm×長さ 2,000mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 350mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 400mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 400mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 450mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 450mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 500mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 500mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 600mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 600mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 700mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 700mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 800mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 800mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 900mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 900mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 1,000mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 1,000mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 1,100mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 1,100mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 1,200mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 1,200mm の場合
		ヒューム管 外圧管 B形 1種 径 1,350mm×長さ 2,430mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、 管径が 1,350mm の場合
	Z2	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	作業区分が据付で、固定基礎が無し以外の場合
	Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	管径が 200～1,000mm の場合
	Z4	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	作業区分が据付で固定基礎が 360° 巻きの場合
市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	作業区分が据付で固定基礎が 360° 巻きの場合

## 3-2 ボックスカルバート（SCB222880）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.7 ボックスカルバート 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め
据付	1.0m/個	1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m	(表3.8)	—
		2.5m<B≤3.75m 1.25m≤H≤ 2.5m		
	1.5m/個	1.25m<B≤ 2.5m 0m<H≤1.25m	(表3.8)	(表3.9)
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		
		2.5m<B≤3.75m 1.25m≤H≤ 2.5m		
		2.5m≤B≤3.75m 2.5m<H≤3.75m		
	2.0m/個	0m<B≤1.25m 0m<H≤1.25m	(表3.8)	(表3.9)
		1.25m<B≤ 2.5m 0m<H≤1.25m		
		0m<B≤1.25m 1.25m<H≤ 2.5m		
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		
撤去	1.0m/個	1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m	—	—
		2.5m<B≤3.75m 1.25m≤H≤ 2.5m		
	1.5m/個	1.25m<B≤ 2.5m 0m<H≤1.25m	—	(表3.9)
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		
		2.5m<B≤3.75m 1.25m≤H≤ 2.5m		
		2.5m≤B≤3.75m 2.5m<H≤3.75m		
	2.0m/個	0m<B≤1.25m 0m<H≤1.25m	—	(表3.9)
		1.25m<B≤ 2.5m 0m<H≤1.25m		
		0m<B≤1.25m 1.25m<H≤ 2.5m		
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		

作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め
据付・撤去	1.0m/個	1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m	(表3.8)	—
		2.5m<B≤3.75m 1.25m≤H≤ 2.5m		
	1.5m/個	1.25m<B≤ 2.5m 0m<H≤1.25m	(表3.8)	(表3.9)
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		
		2.5m<B≤3.75m 1.25m≤H≤ 2.5m		
		2.5m≤B≤3.75m 2.5m<H≤3.75m		
		0m<B≤1.25m 0m<H≤1.25m		
		1.25m<B≤ 2.5m 0m<H≤1.25m		
	2.0m/個	0m<B≤1.25m 1.25m<H≤ 2.5m	(表3.8)	(表3.9)
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		
		1.25m<B≤ 2.5m 1.25m<H≤ 2.5m		

- (注) 1. 上表は、ボックスカルバートの設置、PC鋼材による縦締め、基礎材、均しコンクリート、型枠（剥離材塗布及びケレン作業を含む）、養生、敷モルタル、目地モルタル、グラウト、運搬距離30m程度までの現場内小運搬、レバーブロック、油圧ジャッキ（ポンプを含む）、グラウトポンプ、ミキサーの損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、PC鋼材材料費、定着金具材料費は含まない。
2. 対象としている製品は、1ブロックを1部材で構成するボックスカルバートである。
3. 内空断面が台形タイプの場合やインバート形状の場合の内空高、内空幅は最大値とする。
4. PC鋼材、定着金具は、必要数量を別途計上する。
5. 縦締めは、直線部にのみ適用する。
6. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
7. 基礎碎石、均しコンクリートの材料は、種別・規格にかかわらず適用できる。
8. 撤去作業の場合、基礎碎石は含まない。
9. 製品長が1個当り1.0mの場合、PC鋼材による縦締めの費用は含まない。
10. 基面整正は含まない。

表 3.8 基礎材種別

積算条件	区分
基礎材種別	基礎碎石＋均しコンクリート
	基礎碎石
	均しコンクリート
	無し

表 3.9 PC鋼材による縦締め

積算条件	区分
PC鋼材による縦締め	無し
	有り

図 3-1 ボックスカルバート内空幅・内空高区分

内空幅・内空高区分															
内空高：H (m)	3.75														
									⑥ 2.5 ≤ B ≤ 3.75 2.5 < H ≤ 3.75						
	2.50	③ 0 < B ≤ 1.25 1.25 < H ≤ 2.5				④ 1.25 < B ≤ 2.5 1.25 < H ≤ 2.5				⑤ 2.5 < B ≤ 3.75 1.25 ≤ H ≤ 2.5					
	1.25	① 0 < B ≤ 1.25 0 < H ≤ 1.25				② 1.25 < B ≤ 2.5 0 < H ≤ 1.25									
0	1.25				2.50				3.75						
内空幅：B (m)															

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3. 10 ボックスカルバート 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格		備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 25t 吊	・ 賃料 ・ 内空高 2.5m 以下の場合
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 45t 吊	・ 賃料 ・ 内空高 2.5m 超の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	ボックスカルバート R C B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が1.0m/個で、内空幅・内空高が1.25m<B≤2.5m, 1.25m≤H≤2.5mの場合
		ボックスカルバート R C B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が1.0m/個で、内空幅・内空高が2.5m<B≤3.75m, 1.25m<H≤2.5mの場合
		ボックスカルバート R C B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が1.5m/個で、内空幅・内空高が1.25m<B≤2.5m, 0m<H≤1.25mの場合
		ボックスカルバート R C B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が1.5m/個で、内空幅・内空高が1.25m<B≤2.5m, 1.25m<H≤2.5mの場合
		ボックスカルバート R C B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が1.5m/個で、内空幅・内空高が2.5m<B≤3.75m, 1.25m≤H≤2.5mの場合
		ボックスカルバート R C B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が1.5m/個で、内空幅・内空高が2.5m≤B≤3.75m, 2.5m<H≤3.75mの場合
		ボックスカルバート R C B600×H600×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が2.0m/個で、内空幅・内空高が0m<B≤1.25m, 0m<H≤1.25mの場合
		ボックスカルバート R C B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が2.0m/個で、内空幅・内空高が1.25m<B≤2.5m, 0m<H≤1.25mの場合
		ボックスカルバート R C B1000×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が2.0m/個で、内空幅・内空高が0m<B≤1.25m, 1.25m<H≤2.5mの場合
		ボックスカルバート R C B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0.2～3.0m	作業区分が据付又は据付・撤去で、製品長が2.0m/個で、内空幅・内空高が1.25m<B≤2.5m, 1.25m<H≤2.5mの場合
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 暗渠排水管（SCB222770）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 11 暗渠排水管 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	管種別	呼び径	継手材料費
据付	直管	50 ～ 150mm	—
		200 ～ 400mm	
	波状管及び網状管	50 ～ 150mm	要
			不要
		200 ～ 400mm	要
			不要
		450 ～ 600mm	要
			不要
撤去	直管	50 ～ 150mm	—
		200 ～ 400mm	
	波状管及び網状管	50 ～ 150mm	
		200 ～ 400mm	
		450 ～ 600mm	
据付・撤去	直管	50 ～ 150mm	—
		200 ～ 400mm	
	波状管及び網状管	50 ～ 150mm	要
			不要
		200 ～ 400mm	要
			不要
		450 ～ 600mm	要
			不要

- (注) 1. 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の敷設、継手の取付（波状管及び網状管の場合のみ）、運搬距離 100m 程度までの現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 暗渠排水管の敷設であり、埋設を行わない地上露出配管の敷設は別途考慮する。
3. 暗渠排水管の切断ロスを含む。（標準ロス率は、+0.01）
4. 波状管及び網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。
5. 継手材料費は継手接合（形状は問わない）の場合であり、継手を必要としない場合及び排水管価格に含む場合は計上しない。
6. 基面整正は含まない。



## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 暗渠排水管 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	暗渠排水管 直管 呼び径 75mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 直管 呼び径 300mm ポリエチレン吸水管	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が直管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 50～150mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 200～400mm の場合
		暗渠排水管 波状管 呼び径 500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	作業区分が据付又は据付・撤去で、管種別が波状管及び網状管、呼び径が 450～600mm の場合
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-4 フィルター材（SCB222780）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.13 フィルター材 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

フィルター材の種類	
クラッシャラン	C 80
〃	C 40
〃	C 30
粒度調整碎石	M 40
〃	M 30
〃	M 25
コンクリート用骨材	碎石 40-5
単粒度碎石 4号	30-20
再生クラッシャラン	RC 80
〃	RC 40
〃	RC 30
各 種	

(注) 1. 上表は、暗渠排水管敷設に伴うフィルター材（クラッシャラン及び単粒度碎石等）の設置、締固め、運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. フィルター材の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.20）

3. 基面整正は含まない。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.14 フィルター材 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	再生クラッシャラン RC-40	
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-5 管（函）渠型側溝（SCB222790）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.15 管（函）渠型側溝 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎碎石の有無
据付	200mm以上300mm以下	(表3.4)
	300mmを超え400mm以下	
	400mmを超え600mm以下	
撤去	200mm以上300mm以下	—
	300mmを超え400mm以下	
	400mmを超え600mm以下	
据付・撤去	200mm以上300mm以下	(表3.4)
	300mmを超え400mm以下	
	400mmを超え600mm以下	

- (注) 1. 上表は、プレキャスト製管（函）渠型側溝の設置、基礎材、運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬の他、コンクリートカット運転経費、目地モルタル、敷モルタルの費用、カットブレードの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
3. 撤去作業の場合、基礎碎石は含まない。
4. 基礎碎石は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
5. 基面整正は含まない。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.16 管（函）渠型側溝 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）] 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	・賃料 ・内径又は内空幅が 200mm 以上 400mm 以下の場合
		バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）] 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・内径又は内空幅が 400mm を超え 600mm 以下の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	円形側溝 縦断用 内径 250mm T-25	作業区分が据付又は据付・撤去で、内径又は内空幅が 200mm 以上 300mm 以下の場合
		円形側溝 縦断用 内径 350mm T-25	作業区分が据付又は据付・撤去で、内径又は内空幅が 300mm を超え 400mm 以下の場合
		円形側溝 縦断用 内径 500mm T-25	作業区分が据付又は据付・撤去で、内径又は内空幅が 400mm を超え 600mm 以下の場合
	Z2	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-6 プレキャスト集水桝（SCB222800）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 17 プレキャスト集水桝 積算条件区分一覧

(積算単位：基)

作業区分	製品質量(kg/基)	基礎碎石の有無
据付	(表3.18)	(表3.4)
撤去		—
据付・撤去		(表3.4)

- (注) 1. 上表は、プレキャスト集水桝（蓋版を含む）の設置、基礎材、敷砂又は敷モルタル、運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、集水桝（材料費）は含まない。
2. 蓋版の有無にかかわらず適用できる。
3. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
4. 撤去作業の場合、基礎碎石は含まない。
5. 基礎碎石は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
6. 集水桝の材料費は、別途計上する。
7. 基面整正は含まない。

表 3. 18 製品質量

積算条件	区分
製品質量 (kg/基)	50kg 以上 80kg 以下
	80kg を超え 200kg 以下
	200kg を超え 400kg 以下
	400kg を超え 600kg 以下
	600kg を超え 800kg 以下
	800kg を超え 1,200kg 以下
	1,200kg を超え 1,600kg 以下
	1,600kg を超え 2,200kg 以下
	2,200kg を超え 2,800kg 以下

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 19 プレキャスト集水桝 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	・賃料 ・製品質量が 1,200kg/基以下の 場合
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・製品質量が 1,200kg/基超えの 場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	製品質量が 800kg/基以下の場合
		普通作業員	製品質量が 800kg/基超えの場合
	R2	普通作業員	製品質量が 800kg/基以下の場合
		運転手（特殊）	製品質量が 800kg/基超えの場合
	R3	土木一般世話役	
材料	R4	特殊作業員	
	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-7 プレキャスト集水桝（材料費）

## (1) 条件区分

プレキャスト集水桝（材料費）における積算条件区分はない。  
積算単位は、基とする。

## 3-8 鉄筋コンクリート台付管（SCB222850）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 20 鉄筋コンクリート台付管 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	管 径
据 付	(表3.21)
撤 去	
据付・撤去	

- (注) 1. 上表は、鉄筋コンクリート台付管の設置、基礎砕石、運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬、緊結用器具、コンクリートカッタ運転、目地モルタル、コンクリートカッタブレードの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 断面が卵形の場合の管径は内幅とする。
3. 基礎砕石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
4. 撤去作業の場合、基礎砕石は含まない。
5. 基礎砕石は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
6. 基面整正は含まない。
7. 敷モルタルは含まない。

表 3. 21 管径

積算条件	区分	積算条件	区分
管 径	200mm	管 径	600mm
	250mm		700mm
	300mm		800mm
	350mm		900mm
	400mm		1,000mm
	450mm		1,100mm
	500mm		1,200mm

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 22 鉄筋コンクリート台付管 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	・賃料 ・管径が900～1,200mmの場合
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）吊能力2.9t	管径が200～800mmの場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	運転手（特殊）	管径が200～800mmの場合
材料	Z1	鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管） 管径300mm×長さ2,000mm	・1m当たり0.5本 ・作業区分が据付又は据付・撤去で、管径が200～300mmの場合
		鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管） 管径450mm×長さ2,500mm	・1m当たり0.4本 ・作業区分が据付又は据付・撤去で、管径が350～500mmの場合
		鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管） 管径600mm×長さ2,500mm	・1m当たり0.4本 ・作業区分が据付又は据付・撤去で、管径が600～800mmの場合
		鉄筋コンクリート台付管（パイコン台付管） 管径1,000mm×長さ2,500mm	・1m当たり0.4本 ・作業区分が据付又は据付・撤去で、管径が900～1,200mmの場合
	Z2	軽油1.2号 パトロール給油	管径が200～800mmの場合
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-9 プレキャストL形側溝（SCB222710）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 23 プレキャストL形側溝 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類
据 付	(表3. 4)	(表3. 24)
撤 去	—	—
据付・撤去	(表3. 4)	(表3. 24)

- (注) 1. 上表は、プレキャスト製品によるL型側溝の設置、基礎砕石、運搬距離30m程度までの現場内小運搬の他、コンクリートカッタ運転経費、目地モルタル、敷モルタルの費用、コンクリートカッタブレードの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 基礎砕石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
3. 撤去作業の場合、基礎砕石は含まない。
4. 基礎砕石は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
5. 基面整正は含まない。
6. L型側溝の標準使用量は、16.5個/10mとする。

表 3. 24 プレキャストL形側溝の種類

積算条件	区分	
	呼び名	種類
L形側溝の種類	C250A	コンクリートL形(350×175×600)
	C250B	コンクリートL形(450×175×600)
	250A	鉄筋コンクリートL形(350×155×600)
	250B	鉄筋コンクリートL形(450×155×600)
	300	鉄筋コンクリートL形(500×155×600)
	350	鉄筋コンクリートL形(550×155×600)
	500A	鉄筋コンクリートL形(665×270×600)
	500B	鉄筋コンクリートL形(700×320×600)
	500C	鉄筋コンクリートL形(705×370×600)
	—	各種

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 25 プレキャストL形側溝 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	鉄筋コンクリート L 形 300（500×155×600）	作業区分が据付又は据付・撤去の場合
	Z2	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-10 プレキャストマンホール（SCB222840）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 26 プレキャストマンホール 積算条件区分一覧

（積算単位：基）

作業区分	製品質量	基礎碎石
据 付	2,000kg/基以下	有り(円形断面)
		無し又は円形断面以外
	2,000kg/基を超え 4,000kg/基以下	有り(円形断面)
		無し又は円形断面以外
撤 去	2,000kg/基以下	—
	2,000kg/基を超え 4,000kg/基以下	—
据付・撤去	2,000kg/基以下	有り(円形断面)
		無し又は円形断面以外
	2,000kg/基を超え 4,000kg/基以下	有り(円形断面)
		無し又は円形断面以外

- (注) 1. 上表は、マンホール及び蓋の設置、基礎碎石、運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬の他、敷砂又は敷モルタル等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難い場合は別途考慮する。
3. 撤去作業の場合、基礎碎石は含まない。
4. 基礎碎石は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
5. 基面整正は含まない。



## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 27 プレキャストマンホール 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ） 吊能力 2.9t	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	下記の材料を各1個ずつ組み合わせて1つの代表材料とする。 ・下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25 ・調整リング 600×50 ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁 600×750×300mm） ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁 750×300mm） ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁 750×600mm） ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）	作業区分が据付又は据付・撤去、製品質量が2,000kg/基以下の場合
		下記の材料を各1個ずつ組み合わせて1つの代表材料とする。 ・下水道用マンホールふた φ600mm 浮上防止型かぎ付 T-25 ・調整リング 600×150 ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（斜壁 600×750×600mm） ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（直壁 750×1800mm） ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（管取付け壁 750×1800mm） ・下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種（底版）	作業区分が据付又は据付・撤去、製品質量が2,000kg/基を超え4,000kg/基以下の場合
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
	S	—	
	市場単価	—	

## 3-11 PC管 (SCB222760)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 28 PC管 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	管 径	固定基礎	生コンクリート規格
据 付	(表 3. 29)	90° 巻き	(表 3. 5)
		180° 巻き	
		無し	—
撤 去		—	—
据付・撤去		—	—

- (注) 1. 上表は、PC管の設置、基礎碎石、巻きコンクリート（コンクリート、型枠）、運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 撤去作業、据付・撤去作業は、PC管のみを対象としている。
3. 基面整正は含まない。
4. コンクリート、基礎碎石の材料ロスを含む。標準ロス率は、コンクリートが+0.07、基礎碎石が+0.20 とする。
5. 作業区分が据付又は据付・撤去の場合、管径 2,000mm は適用できない。
6. PC管の材料費は、別途計上する。

表 3. 29 管径

積算条件	区分	積算条件	区分
管 径	600mm	管 径	1,200mm
	700mm		1,350mm
	800mm		1,500mm
	900mm		1,650mm
	1,000mm		1,800mm
	1,100mm		2,000mm

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 30 PC管 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t 吊	・賃料 ・管径が 600mm の場合
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕16t 吊	・賃料 ・管径が 700mm～1,350mm の場合
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t 吊	・賃料 ・管径が 1,500mm～1,650mm の場合
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25t 吊	・賃料 ・管径が 1,800mm の場合
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕35t 吊	・賃料 ・作業区分が撤去、管径が 2,000mm の場合
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	・賃料 ・作業区分が据付の場合
	K3	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・管径が 1,350mm～1,800mm, 固定基礎が 180° 巻きの場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	固定基礎が有る場合
		運転手（特殊）	上記以外の場合
	R3	土木一般世話役	
材料	R4	特殊作業員	
	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20)W/C 60%	固定基礎が有る場合
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z3	—	
市場単価	Z4	—	
	S	—	

## 3-12 PC管（材料費）

## (1) 条件区分

PC管（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、m とする。

## 3-13 コルゲートパイプ（SCB222890）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 31 コルゲートパイプ 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	規格	パイプ径
(表 3. 32)	フランジ型	800mm 以上 1,200mm 以下
		1,200mm を超え 1,800mm 以下
	ラップ型	2,000mm 以上 2,500mm 以下
		2,500mm を超え 3,000mm 以下
		3,000mm を超え 3,500mm 以下
		3,500mm を超え 4,500mm 以下

- (注) 1. 上表は、コルゲートパイプの設置、現場内小運搬組立（据付時）、解体（撤去時）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 床掘り、基礎（均しコンクリート、基礎砕石）、埋戻しは含まない。
3. パッキングの有無にかかわらず適用できる。ただし、パッキング材料費は含まれていないため、別途計上する。
4. パッキング以外のペービング、パイプ内足場等の補助工法については、必要な費用を別途計上する。

表 3. 32 作業区分

積算条件	区分
作業区分	据 付
	撤 去
	据付・撤去

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 33 コルゲートパイプ 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）吊能力2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手（特殊）	
	Z1	コルゲートパイプ 円形 1 形 1,000mm 板厚 2.7mm	作業区分が据付又は据付・撤去、規格がフランジ型、パイプ径が 800～1,200mm の場合
		コルゲートパイプ 円形 1 形 1,500mm 板厚 3.2mm	作業区分が据付又は据付・撤去、規格がフランジ型、パイプ径が 1,200 を超え 1,800mm 以下の場合
		コルゲートパイプ 円形 2 形 2,500mm 板厚 4.5mm	作業区分が据付又は据付・撤去、規格がラップ型、パイプ径が 2,000mm 以上 2,500mm 以下の場合
		コルゲートパイプ 円形 2 形 3,000mm 板厚 4.5mm	作業区分が据付又は据付・撤去、規格がラップ型、パイプ径が 2,500mm を超え 3,000mm 以下の場合
		コルゲートパイプ 円形 2 形 3,500mm 板厚 4.5mm	作業区分が据付又は据付・撤去、規格がラップ型、パイプ径が 3,000mm を超え 3,500mm 以下の場合
		コルゲートパイプ 円形 2 形 4,000mm 板厚 4.5mm	作業区分が据付又は据付・撤去、規格がラップ型、パイプ径が 3,500mm を超え 4,500mm 以下の場合
	Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-14 コルゲートフリューム (SCB222830)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.34 コルゲートフリューム 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	規格
(表 3.32)	350×350mm 以上 550×550mm 以下
	550×550mm を超え 750×750mm 以下

- (注) 1. 上表は、コルゲートフリュームの設置、現場内小運搬組立（据付時）、解体（撤去時）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 床掘り、基礎（均しコンクリート、基礎碎石）、埋戻しは含まない。
3. パッキングの有無にかかわらず適用できる。ただし、パッキング材料費は含まれていないため、別途計上する。
4. パッキング以外のすべり防止、止木壁、浮上り防止等の補助工法については、必要な費用を別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.35 コルゲートフリューム 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.45m <sup>3</sup> （平積 0.35m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	コルゲートU型フリュームA形 450×450mm 板厚 1.6mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、規格が 350×350 以上 550×550 以下の場合
		コルゲートU型フリュームA形 650×650mm 板厚 1.6mm	作業区分が据付又は据付・撤去で、規格が 550×550 を超え 750×750 以下の場合
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ⑩-2 排水構造物工（溶接金網及び埋設鋼板型枠）（建地-B）

## 1. 適用範囲

本資料は、溶接金網（現場打側溝蓋補強用）の据付作業、及び埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）の設置作業に適用する。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

## (1) 溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置




図 2-1 施工フロー

## (2) 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置




図 2-2 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

## 3. 施工歩掛

## 3-1 溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置歩掛

溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置歩掛は次表を標準とする。

なお、本歩掛は、側溝上で蓋板を現場製作する場合に蓋板内に補強のために入れる溶接金網の設置に適用する。

表 3.1 溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置歩掛（100m<sup>2</sup>当り）

名 称	単 位	数 量
普通作業員	人	0.2

（注）1. 側溝幅 50cm 程度に適用する。

2. 現場内小運搬・切断は上記歩掛に含まれる。

3. 持上高が 2m 以上の場合は別途考慮する。

4. 溶接金網の使用量は次式とする。

$$\text{使用量 (m}^2\text{)} = \text{設計数量 (m}^2\text{)} \times (1 + K_3)$$


表 3.2 ロス率(K<sub>3</sub>)

ロ ス 率	0.05
-------	------

## 3-2 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置歩掛

埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置歩掛は次表を標準とする。

なお、本歩掛は、側溝上で蓋板を現場打ちする場合に、底型枠として支保工を使用しない埋設鋼板型枠の設置に適用する。

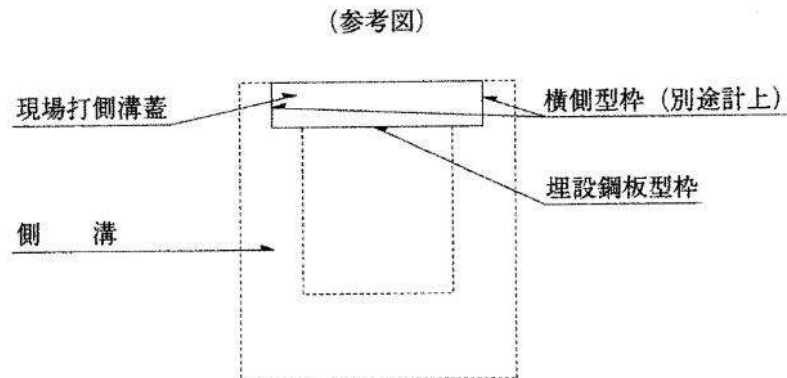表 3.3 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置歩掛 (100m<sup>2</sup>当り)

名 称	単 位	数 量
普通作業員	人	0.7

(注) 1. 現場内小運搬・切断は上記歩掛に含まれる。

2. 持上高が 2m 以上の場合は別途考慮する。

3. 鋼板型枠は厚さ 1.2mm 程度とし、使用量は次式とする。

$$\text{使用量 (m}^2\text{)} = \text{設計数量 (m}^2\text{)} \times (1 + K_4)$$

表 3.4 ロス率(K<sub>4</sub>)

ロ ス 率	0.05
-------	------

## 4. 単価表

(1) 溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置 100m<sup>2</sup>当り単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.2	表3.1
溶 接 金 網		m <sup>2</sup>	105	表3.2
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置 100m<sup>2</sup>当り単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.7	表3.3
埋 設 鋼 板 型 枠		m <sup>2</sup>	105	表3.4
諸 雑 費		式	1	
計				



## ⑩ー3 排水構造物工（現場打ち水路（本体）（建地－B）

## 1. 適用範囲

本資料は、現場打ちのU型側溝（本体）に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

(1) 現場打ちのU型側溝（落蓋型を含む）の設置

## 1-2 適用できない範囲

(1) プレキャスト製品の場合

(2) U型側溝（本体）の10m当りのコンクリート使用数量が3.0m<sup>3</sup>未満又は9.0m<sup>3</sup>を超える場合（無筋の場合）

(3) U型側溝（本体）の10m当りのコンクリート使用数量が3.6m<sup>3</sup>未満又は8.1m<sup>3</sup>を超える場合（有筋の場合）

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

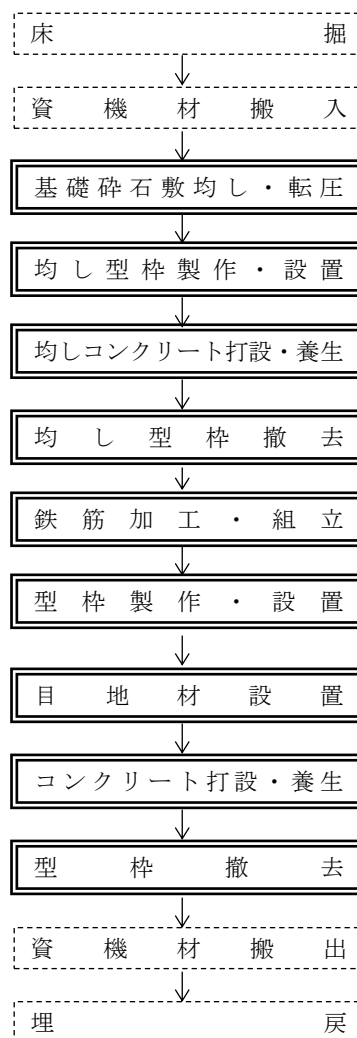


図2-1 施工フロー

(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。

2. 基礎砕石、均しコンクリート、目地材の有無にかかわらず適用できる。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 現場打ち水路（本体）（SCB222940）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 現場打ち水路（本体） 積算条件区分一覧

（積算単位：m）

コンクリート規格	鉄筋の有無	10m 当り コンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類
(表 3.2)	無し	(表 3.3)	(表 3.5)	一般養生・特殊養生(練炭)
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
				養生工無
	有り	(表 3.4)		一般養生・特殊養生(練炭)
				特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
				養生工無

- (注) 1. 上表は、現場打ちによるU型側溝のコンクリート打設、現場内小運搬（15m 以内）、シュートの架設・移動（人力打設の場合）、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助作業（バックホウ（クレーン機能付）打設の場合）、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業を含む）、鉄筋、基礎砕石、均しコンクリート、養生、目地材の施工の他、雑機械器具（シュート、コンクリートバケット、コンクリートパイプレータ、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離材、電気ドリル、電気ノコギリ、つき固め機械等）の損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. コンクリート打設工法の選定は、図 3-1 を標準とする。現場条件により図 3-1 により難しい場合は、別途考慮する。
3. コンクリート、鉄筋、基礎砕石の材料ロスを含む。標準ロス率は、コンクリートが+0.06、鉄筋が+0.03、基礎砕石が+0.20 とする。
4. 基礎砕石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
5. 雪寒仮囲いの養生が必要な場合は、「養生工無」を選択し別途計上する。
6. 蓋版は別途計上する。
7. 止水板が必要な場合は別途計上する。
8. 基面整正は含まない。
9. 鉄筋の径にかかわらず適用できる

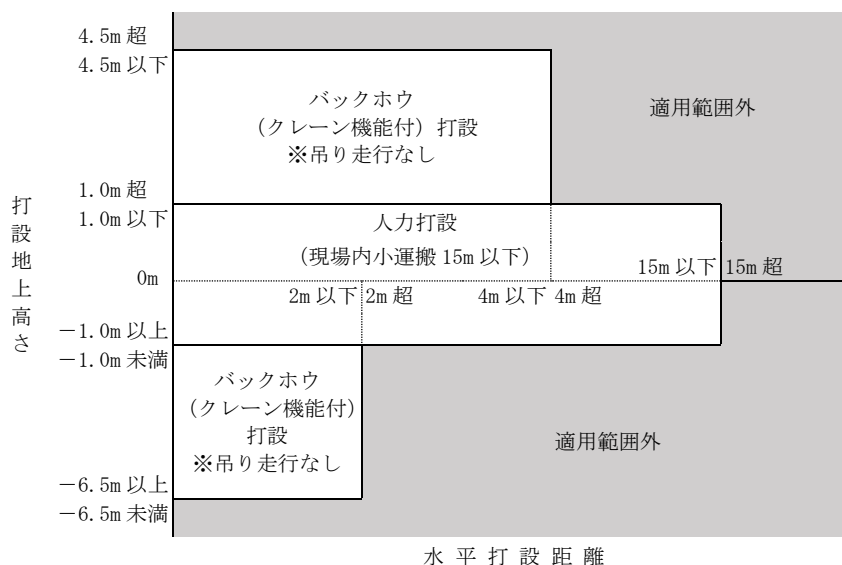


図 3-1 コンクリート打設工法の選定

表 3.2 コンクリート規格

積算条件	区分	
コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	24-12-25(20) (高炉)
	21-12-25(20) (普通)	18-8-40(高炉)
	24-8-25(20) (普通)	18-12-40(高炉)
	24-12-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)
	27-8-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)
	27-12-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)
	18-8-40(普通)	24-12-40(高炉)
	18-12-40(普通)	21-8-25 (早強)
	21-8-40(普通)	21-12-25 (早強)
	21-12-40(普通)	24-8-25 (早強)
	24-8-40(普通)	24-12-25 (早強)
	24-12-40(普通)	18-8-25(高炉)
	21-8-25(20) (高炉)	18-12-25(高炉)
	21-12-25(20) (高炉)	各種
	24-8-25(20) (高炉)	

表 3.3 コンクリート使用量(鉄筋無し)

積算条件	区分
10m当り コンクリート使用量	3.0m <sup>3</sup> /10m以上3.3m <sup>3</sup> /10m以下
	3.3m <sup>3</sup> /10mを超え3.6m <sup>3</sup> /10m以下
	3.6m <sup>3</sup> /10mを超え3.9m <sup>3</sup> /10m以下
	3.9m <sup>3</sup> /10mを超え4.2m <sup>3</sup> /10m以下
	4.2m <sup>3</sup> /10mを超え4.5m <sup>3</sup> /10m以下
	4.5m <sup>3</sup> /10mを超え4.8m <sup>3</sup> /10m以下
	4.8m <sup>3</sup> /10mを超え5.2m <sup>3</sup> /10m以下
	5.2m <sup>3</sup> /10mを超え5.6m <sup>3</sup> /10m以下
	5.6m <sup>3</sup> /10mを超え6.0m <sup>3</sup> /10m以下
	6.0m <sup>3</sup> /10mを超え6.4m <sup>3</sup> /10m以下
	6.4m <sup>3</sup> /10mを超え6.9m <sup>3</sup> /10m以下
	6.9m <sup>3</sup> /10mを超え7.4m <sup>3</sup> /10m以下
	7.4m <sup>3</sup> /10mを超え7.9m <sup>3</sup> /10m以下
	7.9m <sup>3</sup> /10mを超え8.4m <sup>3</sup> /10m以下
	8.4m <sup>3</sup> /10mを超え9.0m <sup>3</sup> /10m以下

表 3. 4 コンクリート使用量(鉄筋有り)

積算条件	区分
10m当り コンクリート使用量	3.6m <sup>3</sup> /10m 以上 3.8m <sup>3</sup> /10m 以下
	3.8m <sup>3</sup> /10m を超え 4.0m <sup>3</sup> /10m 以下
	4.0m <sup>3</sup> /10m を超え 4.2m <sup>3</sup> /10m 以下
	4.2m <sup>3</sup> /10m を超え 4.4m <sup>3</sup> /10m 以下
	4.4m <sup>3</sup> /10m を超え 4.6m <sup>3</sup> /10m 以下
	4.6m <sup>3</sup> /10m を超え 4.8m <sup>3</sup> /10m 以下
	4.8m <sup>3</sup> /10m を超え 5.0m <sup>3</sup> /10m 以下
	5.0m <sup>3</sup> /10m を超え 5.2m <sup>3</sup> /10m 以下
	5.2m <sup>3</sup> /10m を超え 5.5m <sup>3</sup> /10m 以下
	5.5m <sup>3</sup> /10m を超え 5.8m <sup>3</sup> /10m 以下
	5.8m <sup>3</sup> /10m を超え 6.1m <sup>3</sup> /10m 以下
	6.1m <sup>3</sup> /10m を超え 6.4m <sup>3</sup> /10m 以下
	6.4m <sup>3</sup> /10m を超え 6.7m <sup>3</sup> /10m 以下
	6.7m <sup>3</sup> /10m を超え 7.0m <sup>3</sup> /10m 以下
	7.0m <sup>3</sup> /10m を超え 7.3m <sup>3</sup> /10m 以下
	7.3m <sup>3</sup> /10m を超え 7.7m <sup>3</sup> /10m 以下
	7.7m <sup>3</sup> /10m を超え 8.1m <sup>3</sup> /10m 以下

表 3. 5 コンクリート打設工法

積算条件	区分
コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設
	人力打設

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 6 現場打ち水路(本体) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	賃料
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ） 吊能力 2.9t	・賃料 ・バックホウ（クレーン機能付）打設の場合
	K3	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	・賃料 ・特殊養生（ジェットヒータ）の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	
	Z2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	鉄筋有りの場合
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローラー	特殊養生（ジェットヒータ）の場合
	Z4	軽油 1.2号 パトロール給油	
市場単価	S	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	鉄筋有りの場合

## ⑩－4 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））（建地－B）

## 1. 適用範囲

本資料は、現場打ちの集水桝・街渠桝（本体）に適用する。

## 1－1 適用できる範囲

(1) 現場打ちの集水桝・街渠桝の設置

## 1－2 適用できない範囲

(1) プレキャスト製品の場合

(2) 集水桝・街渠桝（本体）の1箇所当りのコンクリート使用数量が0.20m<sup>3</sup>未満，又は3.42m<sup>3</sup>を超える場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

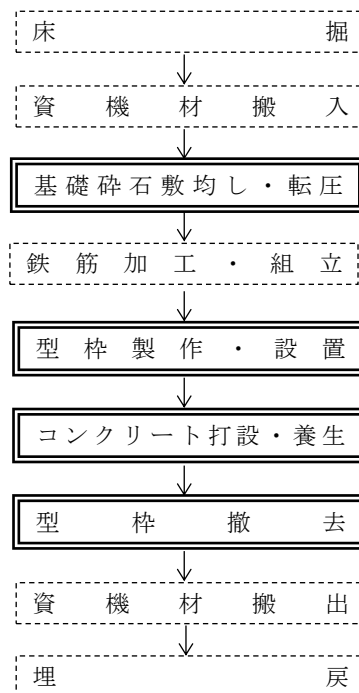


図2-1 施工フロー

(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。

2. 基礎碎石の有無にかかわらず適用できる。

3. 鉄筋加工・組立費が必要な場合は、「第Ⅵ編 第1章 市場単価 ①鉄筋工」より計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（SCB222950）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)積算条件区分一覧

(積算単位：箇所)

コンクリート規格	1箇所当り コンクリート使用量	コンクリート打設工法	養生工の種類
(表 3.2)	(表 3.3)	(表 3.4)	一般養生・特殊養生(練炭)
			特殊養生(ジェットヒータ)
			養生工無

- (注) 1. 上表は、現場打ちによる集水桝・街渠桝のコンクリート打設、現場内小運搬（15m 以内）、シュートの架設・移動（人力打設の場合）、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助作業（バックホウ（クレーン機能付）打設の場合）、型枠（はく離剤塗布及びケレン作業を含む）、基礎砕石、養生の施工の他、雑機械器具（シュート、コンクリートバケット、コンクリートパイプレータ、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離材、電気ドリル、電気ノコギリ、つき固め機械等）の損料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. コンクリート打設工法の選定は、図 3-1 を標準とする。現場条件により図 3-1 により難しい場合は、別途考慮する。
3. コンクリート、基礎砕石の材料ロスを含む。標準ロス率は、コンクリート使用量が  $1.03\text{m}^3$  以下/箇所の場合+0.06、 $1.03\text{m}^3$  超え/箇所の場合+0.07、また基礎砕石が+0.20 とする。
4. 基礎砕石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
5. 雪寒仮囲いの養生が必要な場合は、「養生工無」を選択し別途計上する。
6. 蓋版は別途計上する。
7. 足掛け金物は別途計上する。ただし、集水桝コンクリート打設時に足掛け金物を先付けするタイプの場合、足掛け金物の設置手間は上表に含む。
8. 基面整正は含まない。
9. 鉄筋加工・組立費が必要な場合は、「第Ⅵ編 第1章 市場単価 ①鉄筋工」より計上する。

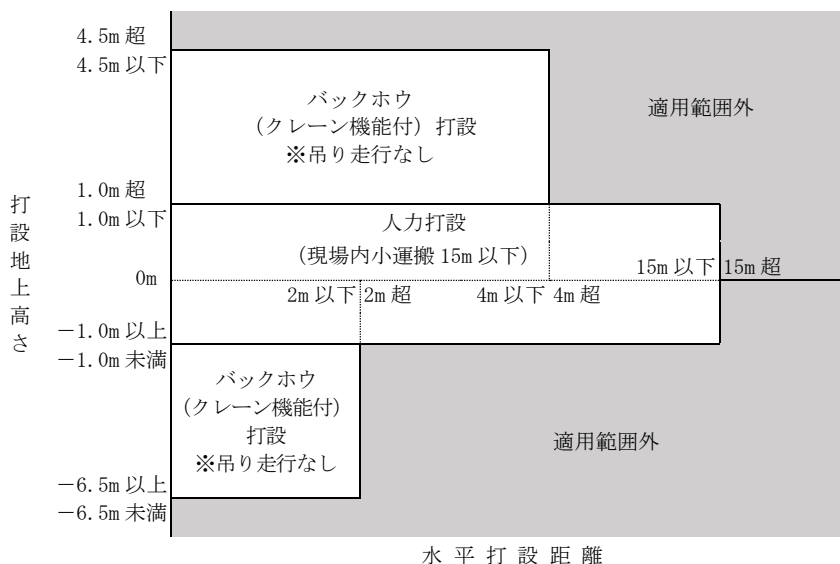
(注) コンクリート使用量が  $1.03\text{m}^3$  超え/箇所の場合、設計日打設量は  $10\text{m}^3$ /日未満とする。

図 3-1 コンクリート打設工法の選定

表 3.2 コンクリート規格

積算条件	区分
コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)
	24-8-25(20) (普通)
	27-8-25(20) (普通)
	18-8-40(普通)
	21-8-40(普通)
	24-8-40(普通)
	21-8-25(20) (高炉)
	24-8-25(20) (高炉)
	18-8-40(高炉)
	21-8-40(高炉)
	24-8-40(高炉)
	21-8-25 (早強)
	24-8-25 (早強)
	18-8-25(高炉)
	各種

表 3.3 1箇所当りコンクリート使用量

積算条件	区分	積算条件	区分
1箇所当り コンクリート 使用量	0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下	1箇所当り コンクリート 使用量	0.92m <sup>3</sup> を超え0.97m <sup>3</sup> 以下
	0.22m <sup>3</sup> を超え0.24m <sup>3</sup> 以下		0.97m <sup>3</sup> を超え1.03m <sup>3</sup> 以下
	0.24m <sup>3</sup> を超え0.26m <sup>3</sup> 以下		1.03m <sup>3</sup> を超え1.09m <sup>3</sup> 以下
	0.26m <sup>3</sup> を超え0.28m <sup>3</sup> 以下		1.09m <sup>3</sup> を超え1.15m <sup>3</sup> 以下
	0.28m <sup>3</sup> を超え0.30m <sup>3</sup> 以下		1.15m <sup>3</sup> を超え1.22m <sup>3</sup> 以下
	0.30m <sup>3</sup> を超え0.32m <sup>3</sup> 以下		1.22m <sup>3</sup> を超え1.29m <sup>3</sup> 以下
	0.32m <sup>3</sup> を超え0.34m <sup>3</sup> 以下		1.29m <sup>3</sup> を超え1.36m <sup>3</sup> 以下
	0.34m <sup>3</sup> を超え0.36m <sup>3</sup> 以下		1.36m <sup>3</sup> を超え1.44m <sup>3</sup> 以下
	0.36m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下		1.44m <sup>3</sup> を超え1.52m <sup>3</sup> 以下
	0.38m <sup>3</sup> を超え0.40m <sup>3</sup> 以下		1.52m <sup>3</sup> を超え1.61m <sup>3</sup> 以下
	0.40m <sup>3</sup> を超え0.43m <sup>3</sup> 以下		1.61m <sup>3</sup> を超え1.70m <sup>3</sup> 以下
	0.43m <sup>3</sup> を超え0.46m <sup>3</sup> 以下		1.70m <sup>3</sup> を超え1.80m <sup>3</sup> 以下
	0.46m <sup>3</sup> を超え0.49m <sup>3</sup> 以下		1.80m <sup>3</sup> を超え1.90m <sup>3</sup> 以下
	0.49m <sup>3</sup> を超え0.52m <sup>3</sup> 以下		1.90m <sup>3</sup> を超え2.00m <sup>3</sup> 以下
	0.52m <sup>3</sup> を超え0.55m <sup>3</sup> 以下		2.00m <sup>3</sup> を超え2.11m <sup>3</sup> 以下
	0.55m <sup>3</sup> を超え0.58m <sup>3</sup> 以下		2.11m <sup>3</sup> を超え2.23m <sup>3</sup> 以下
	0.58m <sup>3</sup> を超え0.61m <sup>3</sup> 以下		2.23m <sup>3</sup> を超え2.35m <sup>3</sup> 以下
	0.61m <sup>3</sup> を超え0.65m <sup>3</sup> 以下		2.35m <sup>3</sup> を超え2.48m <sup>3</sup> 以下
	0.65m <sup>3</sup> を超え0.69m <sup>3</sup> 以下		2.48m <sup>3</sup> を超え2.62m <sup>3</sup> 以下
	0.69m <sup>3</sup> を超え0.73m <sup>3</sup> 以下		2.62m <sup>3</sup> を超え2.77m <sup>3</sup> 以下
	0.73m <sup>3</sup> を超え0.77m <sup>3</sup> 以下		2.77m <sup>3</sup> を超え2.92m <sup>3</sup> 以下
	0.77m <sup>3</sup> を超え0.82m <sup>3</sup> 以下		2.92m <sup>3</sup> を超え3.08m <sup>3</sup> 以下
	0.82m <sup>3</sup> を超え0.87m <sup>3</sup> 以下		3.08m <sup>3</sup> を超え3.25m <sup>3</sup> 以下
	0.87m <sup>3</sup> を超え0.92m <sup>3</sup> 以下		3.25m <sup>3</sup> を超え3.42m <sup>3</sup> 以下

表 3.4 コンクリート打設工法

積算条件	区分
コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設
	人力打設

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	賃料
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ） 吊能力 2.9t	・賃料 ・バックホウ（クレーン機能付）打設の場合
	K3	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h） 油種 灯油	・賃料 ・特殊養生（ジェットヒータ）の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	型わく工	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20） W/C 60%	
	Z2	軽油 1.2号 バトロール給油	
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	特殊養生（ジェットヒータ）の場合
	Z4	ー	
市場単価	S	ー	



## ⑪ 軟弱地盤処理工

## ⑪-1 サンドマット工（建地-B）

## 1. 適用範囲

本資料は、軟弱地盤処理工のサンドマット工に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、以下を標準とする。




図 2-1 施工フロー

- （注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 土木安定シート・ネットの施工が必要な場合は、別途計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 サンドマット（SCB223030）

## （1）条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 サンドマット 積算条件区分一覧

（積算単位：m<sup>3</sup>）

砂材料費の有無
有り
無し

- （注）1. 上表は、サンドマットの敷均し、補助労務等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
2. 土量は締固め（敷均し）後土量とする。  
3. 砂の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.16）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 2 サンドマット 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ブルドーザ〔湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕7t級	
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）	
	K3	—	
労務	R1	運転手（特殊）	
	R2	普通作業員	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z2	砂 再生砂	砂材料費有りの場合
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 対象体積，対象面積

サンドマット用砂量の設計体積は、次式による。

$$V_m = A \times L$$

$V_m$ ：サンドマット用砂の設計体積（m<sup>3</sup>）

$A$ ：設計断面積（m<sup>2</sup>）

$L$ ：設計延長（m）

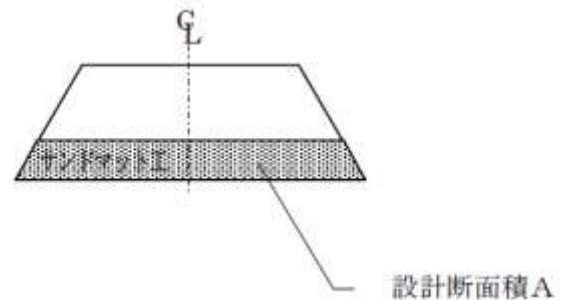


図 3-1 施工図

## ⑪-2 粉体噴射攪拌工（DJM工法）（建地-B）

## 1. 適用範囲

本資料は、粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う粉体噴射攪拌工（改良材がセメント系及び石灰系の場合）に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 粉体噴射攪拌

以下のいずれかの条件に該当する場合

- (1) 杭径 1,000mm, 打設長が 3m を超え 33m 以下で軸間距離 800mm から 1,500mm の二軸施工の場合
- (2) 杭径 1,000mm, 打設長が 3m を超え 20m 以下で下記条件のいずれかに該当する単軸施工の場合
  - ・作業面積が狭く、二軸施工機の移動が困難な場合、又は二軸用改良材供給プラントの設置が困難な場合
  - ・杭の配列により二軸施工が困難な場合
  - ・地盤条件により二軸施工が困難な場合

## 1-1-2 粉体噴射攪拌（移設）

以下のいずれかの条件に該当する場合

- (1) 施工範囲が改良材供給機を中心に半径約 75m を超え、改良材供給設備を移設しなければならない場合
- (2) 同一現場内に施工箇所が 2 箇所以上あり、改良材供給設備を移設しなければならない場合

## 1-1-3 粉体噴射攪拌（軸間変更）

- (1) 二軸施工の場合に同一現場において、粉体噴射攪拌機の軸間変更を必要とする場合

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

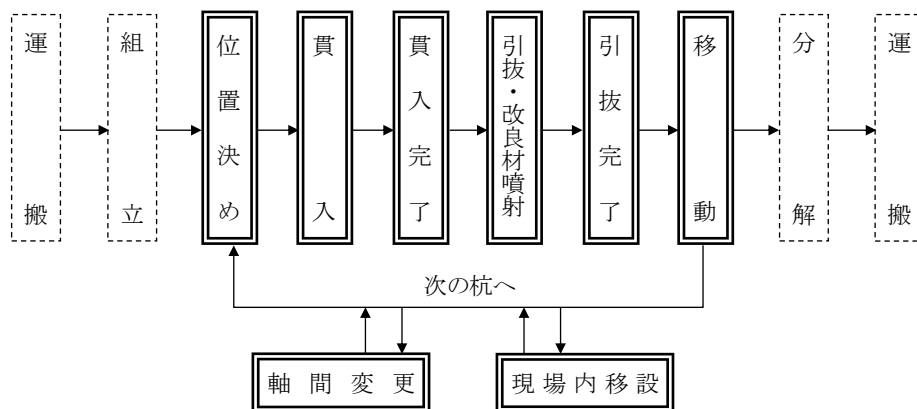


図 2-1 施工フロー

（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 粉体噴射攪拌（SCB223110）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 粉体噴射攪拌 積算条件区分一覧

(積算単位：本)

現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量
有り	3m を超え 6m 未満	2m 未満	実数入力 (t/m)
		2m 以上 3m 未満	
		3m 以上 4m 未満	
		4m 以上 5m 未満	
		5m 以上 6m 未満	
	6m 以上 10m 未満	4m 以上 5m 未満	
		5m 以上 6m 未満	
		6m 以上 7m 未満	
		7m 以上 8m 未満	
		8m 以上 9m 未満	
		9m 以上 10m 未満	
	10m 以上 14m 未満	8m 以上 9m 未満	
		9m 以上 10m 未満	
		10m 以上 12m 未満	
		12m 以上 14m 未満	
	14m 以上 17m 未満	12m 以上 14m 未満	
		14m 以上 15m 未満	
		15m 以上 17m 未満	
	17m 以上 20m 以下	15m 以上 17m 未満	
		17m 以上 20m 以下	
無し	3m を超え 6m 未満	2m 未満	実数入力 (t/m)
		2m 以上 3m 未満	
		3m 以上 4m 未満	
		4m 以上 5m 未満	
		5m 以上 6m 未満	
	6m 以上 10m 未満	4m 以上 5m 未満	
		5m 以上 6m 未満	
		6m 以上 7m 未満	
		7m 以上 8m 未満	
		8m 以上 9m 未満	
		9m 以上 10m 未満	
	10m 以上 15m 未満	8m 以上 9m 未満	
		9m 以上 10m 未満	
		10m 以上 12m 未満	
		12m 以上 14m 未満	
		14m 以上 15m 未満	
	15m 以上 20m 以下	12m 以上 14m 未満	
		14m 以上 15m 未満	
		15m 以上 17m 未満	
		17m 以上 20m 以下	
	20m を超え 27m 未満	17m 以上 20m 以下	
		20m を超え 23m 未満	
		23m 以上 27m 未満	
	27m 以上 33m 以下	23m 以上 27m 未満	
		27m 以上 32m 未満	
		32m 以上 33m 以下	

- (注) 1. 上表は、粉体改良材の噴射攪拌による改良柱の形成、施工機械用及び改良材供給設備用足場材（敷鉄板）の設置・撤去、改良後の整地、足場材賃料、空気圧縮機の賃料及び運転経費、特許使用料、電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等）を含む。
2. 攪拌翼が貫入できない場合や引抜きに障害となる転石等の除去は、掘削の施工パッケージを別途計上する。
3. 現場制約の有無について  
 有り：下記の条件のいずれかに該当する場合に選択  
 ・作業面積が狭く、二軸施工機の移動が困難な場合、又は二軸用改良材供給プラントの設置が困難な場合  
 ・杭の配列により二軸施工が困難な場合  
 ・地盤条件により二軸施工が困難な場合
4. 打設長（m）は次式による。  
 打設長（m）＝空打部長さ＋杭長
5. 安定処理工（土木用安定シートも含む）の施工経費は、別途計上する。
6. 改良材使用量  
 改良材は、セメント系、石灰系を標準とし、現場条件により決定する。なお、改良材のロス（損失＋杭頭・着底部処理を含む）を含んでいるので、改良材使用量は実数量（ロスによる割増をしない数量）とする。（標準ロス率は、＋0.15）
7. 施工本数は杭間の移動、位置決め、貫入、引抜き（改良材噴射）までの一連の作業のものである。
8. 二軸施工の杭施工本数は、1軸当り1本とする。
9. 現場内移設に伴い、粉体噴射攪拌機本体の分解・組立が必要となった場合は、分解・組立費を別途計上する。
10. 改良材供給設備の現場内移設は、3-2 粉体噴射攪拌（移設）より別途計上する。
11. 軸間変更を行う場合は、3-3 粉体噴射攪拌（軸間変更）より別途計上する。

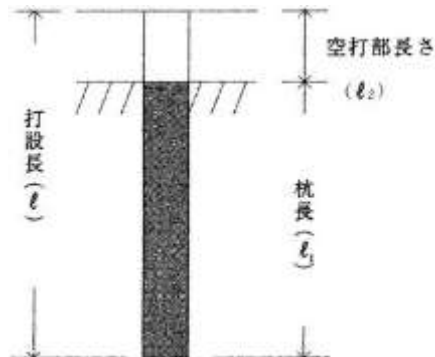


図 3-1 施工図

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 粉体噴射攪拌 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	粉体噴射攪拌機 〔単軸（油圧）・スキッド式〕攪拌モータ トルク 19.6kN・m×1 台 最大改良深度 20m	現場制約有りの場合
		粉体噴射攪拌機 〔二軸（電動）・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2 台 最大改良深度 26m	現場制約無し (打設長 20m 以下)の場合
		粉体噴射攪拌機 〔二軸（電動）・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2 台 最大改良深度 33m	現場制約無し (打設長 20m を超える)の 場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	普通作業員	
材料	Z1	セメント 高炉B	
	Z2	軽油 1.2 号 パトロール給油	現場制約無しの場合
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 粉体噴射攪拌（移設）（SCB223130）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.3 粉体噴射攪拌(移設) 積算条件区分一覧 （積算単位：回）

施工方法
単軸施工
二軸施工

(注) 上表は粉体噴射攪拌における改良材供給機、改良材貯蔵槽、発動発電機、空気圧縮機、圧縮空気除湿機、空気槽、制御室、ホース及びケーブル等の設備の移設、制御室移設後の調整費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等）を含む。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 粉体噴射攪拌(移設) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型(第1次基準値) 油圧伸縮ジブ型 25t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	普通作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 粉体噴射攪拌（軸間変更）（SCB223140）

## (1) 条件区分

軸間変更における積算条件区分はない。

積算単位は、回とする。

（注）粉体噴射攪拌における粉体噴射攪拌機の軸間変更等, その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等）を含む。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 5 粉体噴射攪拌(軸間変更) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型(第1次基準値) 油圧伸縮ジブ型 25t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ⑪-3 スラリー攪拌工（建地-B）

## 1. 適用範囲

本資料は、粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行うセメント及び石灰によるスラリー攪拌工の陸上施工に適用する。

変位低減型（排土式）のうち、複合噴射攪拌式は除くものとする。

杭径及び打設長は以下のとおりとする。なお、軸の継足しがある場合は、適用外とする。

- (1) 単軸施工：打設長3mを超え10m以下 杭径 800mm～1,200mm
- (2) 単軸施工：打設長10mを超え30m以下 杭径1,000mm～1,600mm
- (3) 単軸施工：打設長3mを超え27m以下 杭径1,800mm, 2,000mm
- (4) 二軸施工：打設長3mを超え40m以下 杭径1,000mm
- (5) 二軸施工（変位低減型）：打設長3mを超え40m以下 杭径1,000mm
- (6) 二軸施工（変位低減型）：打設長3mを超え36m以下 杭径1,600mm

また、単軸施工、二軸施工の選定にあたっては、下記条件等を考慮する。

- (1) 杭の配列
- (2) 作業面積及び施工箇所のトラフィカビリティ

## 2. 施工概要

## 2-1 施工内容

スラリー攪拌工は、地盤中にセメント及び石灰系固化材をスラリー状（セメントミルク又はモルタル）で圧送・注入し、攪拌翼で原地盤と攪拌・混合することにより均一な混合処理改良体（コラム）を造成する工法である。

変位低減型（排土式）は、周辺地盤や近接構造物に影響を与える恐れがある場合に適用する。

## 2-2 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

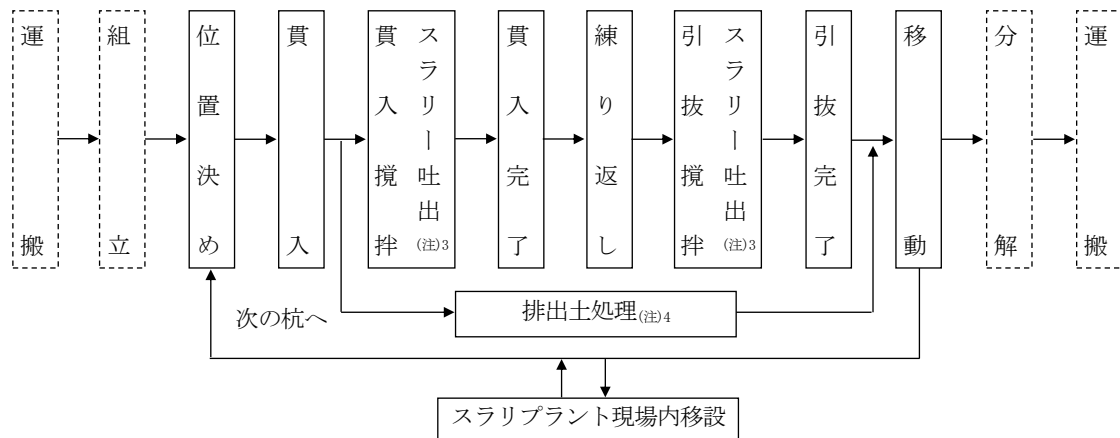


図2-1 施工フロー

- （注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. スラリプラントの現場内移設は必要に応じて計上する。  
 3. スラリー吐出は、工法及び施工管理方法により、貫入攪拌時又は引抜攪拌時に行う。  
 4. 変位低減型の場合に、排出土処理作業を計上する。



## 3. 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3. 1 機種を選定

機械名	規 格	単 位	単 軸 施 工			二 軸 施 工			摘要
			φ 800mm～ φ 1,200mm	φ 1,000mm～ φ 1,600mm	φ 1,800mm φ 2,000mm	φ 1,000mm			
			打設長(L) 3mを超え 10m以下	打設長(L) 10mを超え 30m以下	打設長(L) 3mを超え 27m以下	打設長(L) 3mを超え 10m以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 40m以下	
深 層 混 合 処 理 機 (スラリー式)	単軸式 小型地盤改良機 27.4kN・m	台	1	—	—	—	—	—	
	単軸式 90～ 110kW×1	〃	—	1	—	—	—	—	
	単軸式 90kW× 2	〃	—	—	1	—	—	—	
	二軸式 45kW× 2	〃	—	—	—	1	—	—	
	二軸式 55～ 60kW×2	〃	—	—	—	—	1	—	
	二軸式 90kW× 2	〃	—	—	—	—	—	1	
スラリプラント (全 自 動)	能力10m³/h	基	1	—	—	—	—	—	
	能力20m³/h	〃	—	1	1	1	1	1	

(注) 1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。

2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ及びスラリプラント制御盤を含む。

表3. 2 機種を選定

機 械 名	規 格	単位	二軸施工（変位低減型）				摘要
			φ 1,000mm				
			打設長(L) 3mを超え 10m以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 30m以下	打設長(L) 30mを超え 40m以下	
深 層 混 合 処 理 機 (スラリー式)	二軸式 45kW×2	台	1	—	—	—	
	二軸式 55～60kW×2	〃	—	1	—	—	
	二軸式 75～90kW×2	〃	—	—	1	—	
	二軸式 90kW×2	〃	—	—	—	1	
スラリプラント (全自動)	能力20m³/h	基	1	1	1	1	

(注) 1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。

2. スラリプラントには、スクリュコンベア、セメントサイロ、水槽、ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ及びスラリプラント制御盤を含む。

表3. 3 機種を選定

機 械 名	規 格	単 位	二軸施工（変位低減型）				摘要
			φ 1, 600mm				
			打設長(L) 3mを超え 10m以下	打設長(L) 10mを超え 20m以下	打設長(L) 20mを超え 26m以下	打設長(L) 26mを超え 36m以下	
深 層 混 合 処 理 機 (スラリー式)	二軸式 90kW×2 最大施工深度10m	台	1	—	—	—	
	二軸式 90kW×2 最大施工深度20m	〃	—	1	—	—	
	二軸式 90kW×2 最大施工深度26m	〃	—	—	1	—	
	二軸式 90kW×2 最大施工深度36m	〃	—	—	—	1	
スラリプラント (全 自 動)	能力40m³/h	基	1	1	1	1	

(注) 1. 深層混合処理機には、施工管理計、システム管理計を含む。

2. スラリプラントには、スクリュコンベヤ、セメントサイロ、水槽、ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ及びスラリプラント制御盤を含む。

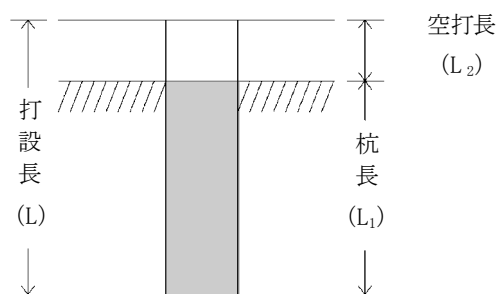


図3-1 施工図

#### 4. 編成人員

スラリー攪拌工の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4. 1 日当り編成人員 (人/日)

工 法	土木一般世話役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員
単 軸 施 工	1	2	1
二 軸 施 工 ( 変 位 低 減 型 )	1	3	1

(注) 1. 編成人員には、スラリプラントの管理運転労務を含む。

2. 深層混合処理機の運転労務歩掛は、「第Ⅰ編第7章①建設機械運転労務」による。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 杭施工本数

1日当り杭施工本数は、次表を標準とする。

表5. 1 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	単軸施工 (杭径 $\phi$ 800mm $\sim$ $\phi$ 1,200mm)
3mを超え 4m未満	21
4m以上 5m未満	18
5m以上 6m未満	15
6m以上 7m未満	14
7m以上 8m未満	12
8m以上 9m未満	11
9m以上 10m以下	10

表5. 2 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	単軸施工 (杭径 $\phi$ 1,000mm $\sim$ $\phi$ 1,600mm)
10mを超え 12m未満	7
12m以上 14m未満	6
14m以上 19m未満	5
19m以上 25m未満	4
25m以上 30m以下	3

表5. 3 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	単軸施工 (杭径 $\phi$ 1,800mm)
3mを超え 4m未満	11
4m以上 5m未満	10
5m以上 6m未満	9
6m以上 7m未満	8
7m以上 8m未満	7
8m以上 12m未満	6
12m以上 16m未満	5
16m以上 21m未満	4
21m以上 25m未満	3
25m以上 27m以下	2

表5.4 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	単軸施工 (杭径 $\phi$ 2,000mm)
3mを超え 4m未満	10
4m以上 5m未満	9
5m以上 6m未満	8
6m以上 7m未満	7
7m以上 9m未満	6
9m以上 13m未満	5
13m以上 17m未満	4
17m以上 22m未満	3
22m以上 27m以下	2

- (注) 1. 施工本数は杭間の移動(敷鉄板の設置・撤去含む), 位置決め, 貫入, 攪拌, 繰り返し, 引抜きまでの一連の作業のものである。  
 2. 現場内移設に伴い, 処理機本体の分解・組立が必要となった場合は, 分解・組立費を別途計上する。  
 3. スラリプラントの現場内移設は, 「5-4 スラリプラント現場内移設歩掛」により別途計上する。  
 4. 攪拌翼の貫入, 引抜きに障害となる転石等の除去については, 「5-5 その他(1)」により別途計上する。  
 5. 安定処理工が必要な場合は, 別途計上する。

表5.5 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	二軸施工 (杭径 $\phi$ 1,000mm)
3mを超え 4m未満	14
4m以上 5m未満	13
5m以上 6m未満	12
6m以上 7m未満	11
7m以上 9m未満	10
9m以上 10m未満	9
10m以上 12m未満	8
12m以上 15m未満	7
15m以上 18m未満	6
18m以上 22m未満	5
22m以上 30m未満	4
30m以上 40m以下	3

- (注) 1. 施工本数は杭間の移動(敷鉄板の設置・撤去含む), 位置決め, 貫入, 攪拌, 繰り返し, 引抜きまでの一連の作業のものである。  
 2. 現場内移設に伴い, 処理機本体の分解・組立が必要となった場合は, 分解・組立費を別途計上する。  
 3. スラリプラントの現場内移設は, 「5-4 スラリプラント現場内移設歩掛」により別途計上する。  
 4. 攪拌翼の貫入, 引抜きに障害となる転石等の除去については, 「5-5 その他(1)」により別途計上する。  
 5. 安定処理工が必要な場合は, 別途計上する。  
 6. 二軸施工の改良断面図は, 下図を標準とする。




図5-1 改良断面図

表5.6 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	二軸施工（変位低減型） （杭径 φ 1,000mm）
3mを超え 3.5m未満	12
3.5m以上 4.5m未満	11
4.5m以上 5.5m未満	10
5.5m以上 7m未満	9
7m以上 9m未満	8
9m以上 11m未満	7
11m以上 14m未満	6
14m以上 19m未満	5
19m以上 26m未満	4
26m以上 39m未満	3
39m以上 40m以下	2

- (注) 1. 施工本数は杭間の移動(敷鉄板の設置・撤去含む), 位置決め, 貫入, 攪拌, 練り返し, 引抜きまでの一連の作業のものである。また, 排出土処理作業を含む。
2. 現場内移設に伴い, 処理機本体の分解・組立が必要となった場合は, 分解・組立費を別途計上する。
3. スラリプラントの現場内移設は, 「5-4 スラリプラント現場内移設歩掛」により別途計上する。
4. 攪拌翼の貫入, 引抜きに障害となる転石等の除去については, 「5-5 その他 (1)」により別途計上する。
5. 安定処理工が必要な場合は, 別途計上する。
6. 二軸施工の改良断面図は, 下図を標準とする。




図5-2 改良断面図

表5.7 1日当り杭施工本数(N) (本/日)

打設長 L (m)	二軸施工 (変位低減型)	
	ラップ式	杭式
3mを超え 4m未満	11	22
4m以上 5m未満	10	20
5m以上 6m未満	9	18
6m以上 7m未満	8	16
7m以上 9m未満	7	14
9m以上 11.5m未満	6	12
11.5m以上 15m未満	5	10
15m以上 20.5m未満	4	8
20.5m以上 30m未満	3	6
30m以上 36m以下	2	4

- (注) 1. 施工本数は杭間の移動(敷鉄板の設置・撤去含む), 位置決め, 貫入, 攪拌, 練り返し, 引抜きまでの一連の作業のものである。また, 排出土処理作業を含む。
2. 現場内移設に伴い, 処理機本体の分解・組立が必要となった場合は, 分解・組立費を別途計上する。
3. スラリプラントの現場内移設は, 「5-4 スラリプラント現場内移設歩掛」により別途計上する。
4. 攪拌翼の貫入, 引抜きに障害となる転石等の除去については, 「5-5 その他(1)」により別途計上する。
5. 安定処理工が必要な場合は, 別途計上する。
6. 二軸施工の改良断面図は, 下図を標準とする。
7. 二軸施工の1日当り杭施工本数は, ラップ式で2軸当たり1本, 杭式で1軸当たり1本とする。




図5-3 改良断面図

## 5-2 改良材使用量

改良材は, セメント系, 石灰系を標準とし, 現場条件により決定する。なお, 使用量は次式による。

$$V = v \times L_1 \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式5.1}$$

V : 1本当り改良材使用量 (t/本)

v : 杭長1m当り改良材使用量 (t/m)

L<sub>1</sub> : 杭長 (m)

K : ロス率

表5.8 ロス率(K)

ロ	ス	率	+0.1
---	---	---	------

## 5-3 諸雑費

諸雑費は、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する費用、電力に関する経費等であり労務費、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

なお、変位低減型の場合は、諸雑費率に排土・排出土処理（現場内仮置き）に関する費用を含む。

表5. 9 諸雑費率 (%)

工 法	杭 径	打設長 L (m)	諸 雑 費 率
単 軸 施 工	φ 800mm～φ 1,200mm	3mを超え10m以下	21
	φ 1,000mm～φ 1,600mm	10mを超え30m以下	20
	φ 1,800mm φ 2,000mm	3mを超え27m以下	31
二 軸 施 工	φ 1,000mm	3mを超え40m以下	26
二 軸 施 工 ( 変 位 低 減 型 )	φ 1,000mm	3mを超え40m以下	27
	φ 1,600mm	3mを超え36m以下	33

## 5-4 スラリプラント現場内移設歩掛

スラリプラントを中心に施工位置が半径約100mを超える場合、又は同一現場内に施工箇所が2箇所以上ある等、スラリプラントを移設しなければならない場合は、次表を標準とする。

表5. 10 スラリプラント現場内移設歩掛 (1回当り)

名 称	規 格	単 位	単 軸 施 工 二 軸 施 工 二軸施工(変位低減型)
土木一般世話役		人	1.0
特 殊 作 業 員		〃	2.9
普 通 作 業 員		〃	1.4
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	1.4

(注) 1. 移設するスラリプラントはスクリーコンベア、セメントサイロ、水槽、ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ、スラリプラント制御盤及び発動発電機とする。

2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 5-5 その他

(1) 次の条件等により攪拌翼が貫入できない場合は、バックホウによる先掘りを行うものとし、「[第Ⅱ編 第1章②土工](#)」による。

- 1) 表層安定処理等を行った地盤
- 2) 表層に転石等が多い地盤
- 3) 表層に障害物等のある地盤

(2) 汚泥土の処分が必要な場合は、別途計上する。

(3) 注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

(4) スラリー攪拌工は、特許を有する工法の場合もあるので、特許料が必要な場合は別途計上する。

## 6. 単価表

(1) スラリー攪拌工杭長〇〇m1本当り単価表

SWB223210

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{1}{N} \times 1$	表4.1 表5.1～表5.7
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{1}{N} \times 2(3)$	表4.1 表5.1～表5.7
普 通 作 業 員		〃	$\frac{1}{N} \times 1$	表4.1 表5.1～表5.7
改 良 材		t	V	式5.1, 表5.8
深層混合処理機運転		日	$\frac{1}{N}$	表3.1～表3.3 表5.1～表5.7 機械損料
スラリプラント運転		〃	$\frac{1}{N}$	表3.1～表3.3 表5.1～表5.7 機械損料
諸 雑 費		式	1	表5.9
特 許 料 金		〃	1	必要に応じて計上
計				

(注) N：1日当り杭施工本数（本/日）

V：1本当り改良材使用量（t/本）

（ ）書き：二軸施工（変位低減型）の場合に適用する。

(2) スラリプラント現場内移設1回当り単価表

SWB223230

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.10
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表5.10 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				



## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
深層混合処理機 (スラリー式)	表3.1	機-18	単軸 運転労務数量→1.00 燃料消費量 → 27.4kN・m →34 →110kw×1 20m →62 →110kw×1 30m →72 → 90kw×2 →62 機械損料数量→1.59
			二軸 運転労務数量→1.00 燃料消費量 →45kw×2 →35 →60kw×2 →38 →90kw×2 →56 機械損料数量→1.59
深層混合処理機 (スラリー式) 変位低減型	表3.2, 表3.3	機-18	二軸 運転労務数量→1.00 燃料消費量 →45kw×2 →33 →60kw×2 →36 →75kw×2 →52 →90kw×2 →52 →L≤10m機 →53 →L≤20m機 →53 →L≤26m機 →66 →L≤36m機 →53 機械損料数量→1.59
スラリプラント	表3.1～表3.3	機-25	機械損料数量→1.59

## ⑪-4 高圧噴射攪拌工（建地-B）

## 1. 適用範囲

本資料は、粘性土及び砂質土等の地盤を対象として行う高圧噴射攪拌工のうち単管工法、二重管工法、三重管工法に適用する。

なお、単管工法は杭径 700～1,100mm、二重管工法は杭径 1,000mm～3,000mm、三重管工法は杭径 1,800mm～2,000mm とし、いずれも杭（杭心）間隔は 3m 以下を標準とする。

ただし、機械攪拌併用方式・変異低減型・先行掘削併用方式及びプレジェット併用方式は含まない。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工内容

高圧噴射攪拌工は、安定材等を地盤中に高圧で噴射しながら切削・攪拌することにより地盤を改良する工法であり、ロッドの違いにより次の3工法に分けられる。

## (1) 単管工法

単管を使用し、硬化材で切削・攪拌を行う。

## (2) 二重管工法

二重管を使用し、硬化材とエアで切削・攪拌を行う。

## (3) 三重管工法

三重管を使用し、切削を水とエアで行いながら、ロッドの下部から硬化材を噴射し、攪拌する。

## 2-2 施工フロー

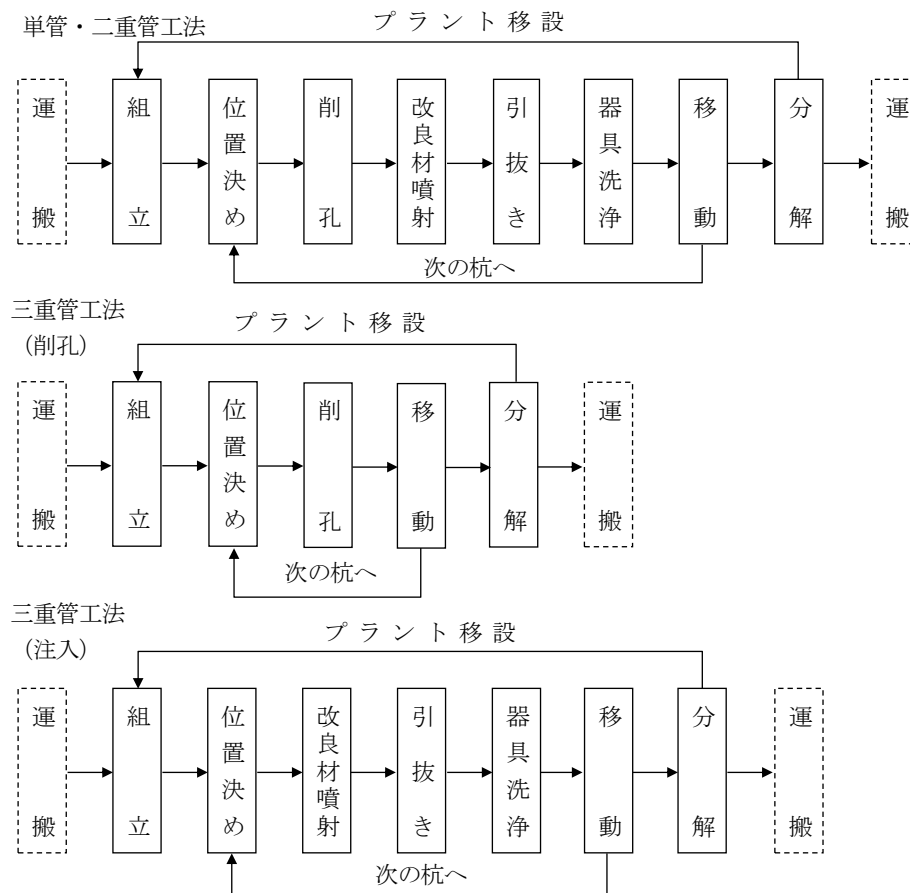


図2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応している部分は、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

次表の各工法の機械セット数と異なる場合は別途考慮する。

表 3.1 単管工法の機種の選定

機 種	規 格	単位	杭 径		摘 要
			700mm 以上 800mm 以下	800mm を超え 1,100mm 以下	
ボーリングマシン	油圧式 5.5kW 級	台	4	2	
高圧噴射攪拌式 地盤改良機	超高压ポンプ 19.6MPa 20～100ℓ/min	〃	4	—	
	超高压ポンプ 39.2MPa 100～130ℓ/min	〃	—	2	

(注) 上表は、杭径が 700mm 以上 800mm 以下の場合は 4 セットを標準とし、800mm を超え 1,100mm 以下の場合は 2 セットを標準とした数量である。

表 3.2 二重管工法の機種の選定

機 械 名	規 格	単位	杭 径		摘 要
			1,000mm 以上 2,000mm 以下	2,000mm を超え 3,000mm 以下	
高 圧 噴 射 攪 拌 式 地 盤 改 良 機	二重管専用型 11kW	台	1	1	
	超高压ポンプ 19.6MPa 20～100ℓ/min	〃	1	—	
	超高压ポンプ 40.0MPa 200ℓ/min	〃	—	1	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・ 排出ガス対策型（第 1 次基準値） 吐出量 5m³/min 吐出圧力 0.7MPa	〃	1	—	
	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 （低騒音型）・排出ガス対策型（第 3 次 基準値）吐出量 15m³/min 吐出圧力 1.05MPa	〃	—	1	
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊	〃	1	1	

(注) 1. 上表は、1 セットを標準とした数量である。

2. 空気圧縮機、トラッククレーンは、賃料とする。

表 3.3 三重管工法の機種の選定

機 種	規 格	単位	数 量		摘 要
			削 孔	注 入	
高圧噴射攪拌式地盤改良機	掘削専用型（油圧式） 内径 148mm 11kW	台	1	—	
	三重管専用型 11kW	〃	—	1	
	超高压ポンプ 39.2MPa 14～70ℓ/min	〃	—	1	
グ ラ ウ ト ポ ン プ	横型二連複動ピストン式 吐出量 200ℓ /min	〃	—	1	
	横型二連複動ピストン式 吐出量 37～100ℓ /min	〃	1	—	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・ 排出ガス対策型（第 1 次基準値） 吐出量 5m³/min 吐出圧力 0.7MP	〃	—	1	
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値） 20t 吊	〃	—	1	

(注) 1. 上表は、削孔時及び注入時ともに 1 セットを標準とした数量である。

2. 空気圧縮機、ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

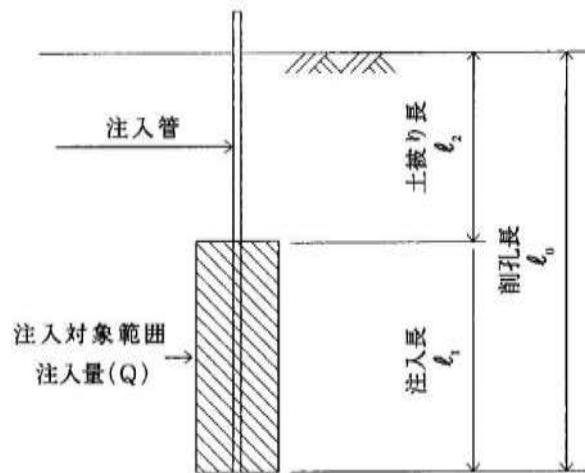


図 3-1 施工図

## 4. 編成人員

高圧噴射攪拌工の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表 4.1 日当り編成人員

(人/日)

工法		職種	土木一般 世話役	特殊作業員	普通作業員
単管工法	杭 径	700mm 以上 800mm 以下	1	8	4
		800mm を超え 1,100mm 以下	1	5	4
二重管工法	杭 径	1,000mm 以上 2,000mm 以下	1	3	3
		2,000mm を超え 3,000mm 以下	1	3	3
三重管工法	削 孔 時		1	1	1
	注 入 時		1	4	3

(注) 上表は、単管工法の杭径 700mm 以上 800mm 以下は 4 セット分、800mm を超え 1,100mm 以下は 2 セット分、二重管工法及び三重管工法は 1 セット分の人員である。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 単管工法

5-1-1 1 本当り施工時間 ( $T_T$ )

単管工法における 1 本当り施工時間は、次式による。

$$T_T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$T_T$ : 単管工法 1 本当り施工時間 (min)

$T_1$ : 機械準備時間 (min)

$T_2$ : 削孔時間 (min)

$T_3$ : 注入時間 (min)

$T_4$ : 土被り部引抜時間 (min)

(1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び注入後の器具洗浄時間であり、13 分とする。

(2) 削孔時間 ( $T_2$ )

$$T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times \ell_0)$$

 $\gamma_1$  : 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

 $\ell_0$  : 各土質毎の削孔長 (m)
表 5.1 削孔の単位作業時間( $\gamma_1$ ) (min/m)

土 質	砂 質 土	粘 性 土	
	$N \leq 13$	$N < 1$	$1 \leq N \leq 4$
$\gamma_1$	3.2	2.4	2.8

(注) 1. N : 各土質毎の削孔対象地盤の最大N値。  
 2. 上表は、無水で削孔を行う場合であり、これにより難い場合は別途考慮する。  
 3. ロッド接続時間を含む。

(3) 注入時間 ( $T_3$ )

$$T_3 = \Sigma \{(\gamma_2 + \gamma_3) \times \ell_1\}$$

 $\gamma_2$  : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

 $\gamma_3$  : ロッド切断の単位作業時間 (min/m)

 $\ell_1$  : 各土質毎の注入長 (m)
表 5.2 注入の単位作業時間( $\gamma_2$ ) (min/m)

土 質	砂 質 土	粘 性 土	
	$N \leq 13$	$N < 1$	$1 \leq N \leq 4$
$\gamma_2$	2.7	2.7	3.2

(注) N : 各土質毎の改良対象地盤の最大N値。

表 5.3 ロッド切断の単位作業時間( $\gamma_3$ ) (min/m)

$\gamma_3$	0.7
------------	-----

(4) 土被り部引抜時間 ( $T_4$ )

$$T_4 = \gamma_4 \times \ell_2$$

 $\gamma_4$  : 土被り部引抜きの単位作業時間 (min/m)

 $\ell_2$  : 土被り長 (m)
表 5.4 土被り部引抜の単位作業時間( $\gamma_4$ ) (min/m)

$\gamma_4$	2
------------	---

## 5-1-2 注入材料使用量

単管工法に必要な注入材料使用量は、次式による。

$$Q_T = \Sigma \{(\ell_1 \times \gamma_2) \times q \times (1+K)\} \dots\dots\dots \text{式 5.1}$$

 $Q_T$  : 単管工法の1本当り注入量 ( $\text{m}^3$ )

 $\ell_1$  : 各土質毎の注入長 (m)

 $\gamma_2$  : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

 $q$  : 単管工法の注入材の吐出量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

 $K$  : ロス率
表 5.5 単管工法の注入材の吐出量( $q$ ) ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

杭 径	700mm 以上 800mm 以下	800mm を超え 1,100mm 以下
	0.08	0.10
$q$		

表 5.6 ロス率(K)

ロス率	+0.19
-----	-------

## 5-1-3 1日当り施工本数

単管工法における1日当り施工本数は、次式による。

$$N = \frac{60 \times H}{T_T} \times 2 \quad (4)$$

N : 2 (4) セット1日当り施工本数 (本/日)

H : 単管工法設備の1日当り実作業時間で6.7時間とする。

$T_T$  : 1本当り施工時間 (min)

## 5-1-4 諸雑費

単管工法の1本当り諸雑費は、付属機器固化材サイロ、集中プラントミキサ、工事用水中モータポンプ、水槽(一般工用)、グラウト流量・圧力測定装置の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費及び機械損料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5.7 単管工法の諸雑費率 (%)

諸 雑 費 率	30
---------	----

## 5-1-5 損耗材料費

## (1) 削孔損耗材料費

単管工法の削孔損耗材料費は、ロッド、ロッドカップリング、メタルクラウン、スィベル等の費用を計上する。

## (2) 注入損耗材料費

単管工法の注入損耗材料費は、モニター、ノズル、高圧ホース等の費用を計上する。

## 5-2 二重管工法

5-2-1 1本当り施工時間 ( $T_N$ )

二重管工法における1本当り施工時間は、次式による。

$$T_N = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$T_N$  : 二重管工法1本当り施工時間 (min)

$T_1$  : 機械準備時間 (min)

$T_2$  : 削孔時間 (min)

$T_3$  : 注入時間 (min)

$T_4$  : 土被り部引抜時間 (min)

(1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び注入後の器具洗浄時間であり、25分とする。

(2) 削孔時間 ( $T_2$ )

## ① 1,000mm以上2,000mm以下

$$T_2 = \sum (\gamma_1 \times \ell_0)$$

$\gamma_1$  : 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

$\ell_0$  : 各土質毎の削孔長 (m)

表 5.8 削孔の単位作業時間 ( $\gamma_1$ )

(min/m)

土 質	レキ質土	砂 質 土		粘 性 土
		$N \leq 30$	$N > 30$	
$\gamma_1$	45	9	13	7

(注) 1. N : 各土質毎の削孔対象地盤の最大N値。

2. ロッド接続時間を含む。

## ② 2,000mm を超え 3,000mm 以下

$$T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times \ell_0)$$

 $\gamma_1$  : 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

 $\ell_0$  : 各土質毎の削孔長 (m)
表 5.9 削孔の単位作業時間( $\gamma_1$ ) (min/m)

土 質	砂 質 土		粘 性 土
	$N \leq 30$	$N > 30$	
$\gamma_1$	15	18	9

(注) 1. N : 各土質毎の削孔対象地盤の最大N値。

2. ロッド接続時間を含む。

(3) 注入時間 ( $T_3$ )

## ① 1,000mm 以上 2,000mm 以下

$$T_3 = \Sigma \{ (\gamma_2 + \gamma_3) \times \ell_1 \}$$

 $\gamma_2$  : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

 $\gamma_3$  : ロッド切断の単位作業時間 (min/m)

 $\ell_1$  : 各土質毎の注入長 (m)
表 5.10 注入の単位作業時間( $\gamma_2$ ) (min/m)

杭 径 (mm)		2,000	1,800	1,600	1,400	1,200	1,000
$\gamma_2$	砂 質 土	$N \leq 10$	$10 < N \leq 20$	$20 < N \leq 30$	$30 < N \leq 35$	$35 < N \leq 40$	$40 < N \leq 50$
		38		28		19	
	粘 性 土	$N < 1$	$N = 1$	$N = 2$	$N = 3$	$N = 4$	—
		29		22		16	—

(注) N : 各土質毎の改良対象地盤の最大N値。

表 5.11 ロッド切断の単位作業時間( $\gamma_3$ ) (min/m)

$\gamma_3$	2
------------	---

## ② 2,000mm を超え 3,000mm 以下

$$T_3 = \Sigma \{ (\gamma_2 + \gamma_3) \times \ell_1 \} + T_0$$

 $\gamma_2$  : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

 $\gamma_3$  : ロッド切断の単位作業時間 (min/m)

 $\ell_1$  : 各土質毎の注入長 (m)

 $T_0$  : 定置噴射時間 (3分を標準とする)
表 5.12 削孔の単位作業時間( $\gamma_2$ ) (min/m)

杭径(mm)		3,000	2,500	2,300
$\gamma_2$	砂 質 土	$N \leq 30$	$N \leq 30$	$N \leq 50$
		15	9	
	粘 性 土	$N \leq 3$	$N \leq 3$	$N \leq 5$
		15	9	

(注) 1. N : 各土質毎の改良対象地盤の最大N値。

表 5.13 ロッド切断の単位作業時間( $\gamma_3$ )

$\gamma_3$	2
------------	---

(4) 土被り引抜時間 ( $T_4$ )

$$T_4 = \gamma_4 \times \ell_2$$

 $\gamma_4$  : 土被り部引抜きの単位作業時間 (min/m)

 $\ell_2$  : 土被り長 (m)
表 5. 14 土被り部引抜の単位作業時間 ( $\gamma_4$ ) (min/m)

$\gamma_4$	2
------------	---

## 5-2-2 注入材料使用量

## ① 1,000mm 以上 2,000mm 以下

二重管工法に必要な注入材料使用量は、次式による。

$$Q_N = \Sigma \{ (\ell_1 \times \gamma_2) \times q \times (1+K) \} \dots\dots\dots \text{式 5. 2}$$

 $Q_N$  : 二重管工法の 1 本当り注入量 ( $\text{m}^3$ )

 $\ell_1$  : 各土質毎の注入長 (m)

 $\gamma_2$  : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

 $q$  : 二重管工法の注入材の吐出量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

 $K$  : ロス率
表 5. 15 二重管工法の注入材の吐出量 ( $q$ ) ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

$q$	0.06
-----	------

表 5. 16 ロス率 ( $K$ )

ロス率	+0.06
-----	-------

## ② 2,000mm を超え 3,000mm 以下

二重管工法に必要な注入材料使用量は、次式による。

$$Q_N = \Sigma \{ (\ell_1 \times \gamma_2) \times q \times (1+K) \} + T_0 \times q \times (1+K) \dots\dots\dots \text{式 5. 3}$$

 $Q_N$  : 二重管工法の 1 本当り注入量 ( $\text{m}^3$ )

 $\ell_1$  : 各土質毎の注入長 (m)

 $\gamma_2$  : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

 $q$  : 二重管工法の注入材の吐出量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

 $T_0$  : 定置噴射時間 (3 分を標準とする)

 $K$  : ロス率
表 5. 17 二重管工法の注入材の吐出量 ( $q$ ) ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

$q$	0.19
-----	------

表 5. 18 ロス率 ( $K$ )

ロス率	+0.06
-----	-------

## 5-2-3 1 日当り施工本数

二重管工法における 1 日当り施工本数は、次式による。

$$N = \frac{60 \times H}{T_N}$$

 $N$  : 1 セット 1 日当り施工本数 (本/日)

 $H$  : 二重管工法設備の 1 日当り実作業時間で 6.7 時間とする。

 $T_N$  : 1 本当り施工時間 (min)



## 5-2-4 諸雑費

二重管工法の1本当たり諸雑費は、付属機器固化材サイロ、集中プラントミキサ、工事用水中モータポンプ、水槽（一般工用）、グラウト流量・圧力測定装置の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5. 19 二重管工法の諸雑費率 (%)

諸 雑 費 率	杭 径	
	1,000mm 以上 2,000mm 以下	2,000mm を超え 3,000mm 以下
	28	46

## 5-2-5 損耗材料費

## (1) 削孔損耗材料費

二重管工法の削孔損耗材料費は、スイベル、ロッド、モニター、超高压ホース、ビット等の費用を計上する。

## (2) 注入損耗材料費

二重管工法の注入損耗材料費は、超高压ホース、耐圧ホース、二重管、スイベル、モニター、ノズル等の費用を計上する。

## 5-3 三重管工法

5-3-1 1本当たり削孔施工時間 ( $T_s$ )

三重管工法における1本当たり削孔施工時間は次式による。

$$T_s = T_1 + T_2$$

$T_s$  : 三重管工法1本当たり削孔時間 (min)

$T_1$  : 機械準備時間 (min)

$T_2$  : 削孔時間 (min)

(1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付時間であり、22分とする。

(2) 削孔時間 ( $T_2$ )

$$T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times \ell_0)$$

$\gamma_1$  : 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

$\ell_0$  : 各土質毎の削孔長 (m)

表 5. 20 削孔の単位作業時間 ( $\gamma_1$ ) (min/m)

土 質	レキ質土		砂質土		粘性土
	$N \leq 50$	$N > 50$	$N \leq 50$	$N > 50$	
$\gamma_1$	38	58	24	30	18

(注) 1.  $N$  : 各土質毎の削孔対象地盤の最大 $N$ 値。

2. ロッド接続時間を含む。

5-3-2 1本当たり注入施工時間 ( $T_A$ )

三重管工法における1本当たり注入施工時間は、次式による。

$$T_A = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$T_A$  : 三重管工法1本当たり注入時間 (min)

$T_1$  : 機械準備時間 (〃)

$T_2$  : 注入準備時間 (〃)

$T_3$  : 注入時間 (〃)

$T_4$  : 土被り部引抜時間 (〃)

(1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び注入後の器具洗浄時間であり、30分とする。

(2) 注入準備時間 ( $T_2$ )

注入準備時間は、三重管セット及びケーシングパイプ引抜時間であり、次式とする。

$$T_2 = \gamma_1 \times \ell_0$$

$\gamma_1$ : 注入準備の単位作業時間 (min/m)

$\ell_0$ : 削孔長 (m)

表 5. 21 注入準備の単位作業時間 ( $\gamma_1$ ) (min/m)

$\gamma_1$	2
------------	---

(3) 注入時間 ( $T_3$ )

$$T_3 = \Sigma \{ (\gamma_2 + \gamma_3) \times \ell_1 \}$$

$\gamma_2$ : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

$\gamma_3$ : ロッド切断の単位作業時間 (min/m)

$\ell_1$ : 各土質毎の注入長 (m)

表 5. 22 注入の単位作業時間 ( $\gamma_2$ ) (min/m)

土 質	砂 質 土			粘 性 土	
	$N \leq 30$	$30 < N \leq 50$	$50 < N \leq 100$	$N \leq 3$	$3 < N \leq 5$
杭径 (mm)	2000		1800	2000	1800
$\gamma_2$	16	20			

(注) N: 各土質毎の改良対象地盤の最大N値。

表 5. 23 ロッド切断の単位作業時間 (min/m)

$\gamma_3$	2
------------	---

(4) 土被り部引抜時間 ( $T_4$ )

$$T_4 = \gamma_4 \times \ell_2$$

$\gamma_4$ : 土被り部引抜きの単位作業時間 (min/m)

$\ell_2$ : 土被り長 (m)

表 5. 24 土被り部引抜の単位作業時間 ( $\gamma_4$ ) (min/m)

$\gamma_4$	2
------------	---

## 5-3-3 注入材料使用量

三重管工法に必要な注入材料使用量は、次式による。

$$Q_A = \Sigma \{ (\ell_1 \times \gamma_2) \times q \times (1+K) \} \dots\dots\dots \text{式 5. 3}$$

$Q_A$ : 三重管工法の1本当り注入量 ( $\text{m}^3$ )

$\ell_1$ : 各土質毎の注入長 (m)

$\gamma_2$ : 各土質毎の注入の単位作業時間 (min/m)

$q$ : 三重管工法の注入材の吐出量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

K: ロス率

表 5. 25 三重管工法の注入材の吐出量 ( $q$ ) ( $\text{m}^3/\text{min}$ )

$q$	0.18
-----	------

表 5. 26 ロス率(K)

ロス率	+0.06
-----	-------

## 5-3-4 1日当り施工本数

三重管工法における削孔，注入の1日当り施工本数は次式とする。

## (1) 削孔

$$N_s = \frac{60 \times H}{T_s}$$

$N_s$  : 1セット1日当り削孔施工本数（本/日）

$H$  : 削孔設備の1日当り実作業時間で6.7時間とする。

$T_s$  : 1本当り削孔時間（min）

## (2) 注入

$$N_A = \frac{60 \times H}{T_A}$$

$N_A$  : 1セット1日当り注入施工本数（本/日）

$H$  : 注入設備の1日当り実作業時間で6.7時間とする。

$T_A$  : 1本当り注入時間（min）

## 5-3-5 諸雑費

## (1) 削孔

三重管工法の削孔1本当り諸雑費は，工事用水中モータポンプ，水槽（一般工事用）の損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費及び機械損料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5. 27 三重管工法の削孔諸雑費率 (%)

削 孔	11
-----	----

## (2) 注入

三重管工法の注入1本当り諸雑費は，付属機器固化材サイロ，集中プラントミキサ，工事用水中モータポンプ，水槽（一般工事用），グラウト流量・圧力測定装置の損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費，賃料，機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5. 28 三重管工法の注入諸雑費率 (%)

注 入	24
-----	----

## 5-3-6 損耗材料費

## (1) 削孔損耗材料費

三重管工法の削孔損耗材料費は，メタルクラウン，スタビライザ，ケーシングパイプ等の費用を計上する。

## (2) 注入損耗材料費

三重管工法の注入損耗材料費は，超高压ホース，高压圧入ホース，耐圧エアホース，三重管，スィベル，モニター，ノズル等の費用を計上する。

## 5-4 注入設備の据付・解体及び移設

注入設備の据付・解体の歩掛は、次表とする。なお、注入範囲が注入設備を中心に半径 50m（単管は約 100m）を超える場合は、移設費として 1 回当たり次表の労務費、ラフテレーンクレーン賃料の合計額の 50%を必要回数計上する。

表 5. 29 据付・解体歩掛

(1 現場当り)

名称	単位	規格	単管工法		二重管工法		三重管工法
			杭径		杭径		
			700mm 以上 800mm 以下	800mm を超え 1,100mm 以下	1,000mm 以上 2,000mm 以下	2,000mm を超え 3,000mm 以下	
土木一般世話役	人		3	3	3		6
特 殊 作 業 員	〃		24	15	9		15
普 通 作 業 員	〃		12	12	9		12
ラフテレーン クレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準 値)・25t 吊	2	2	2		2

(注) 1. 作業日数は、各工法とも据付け 2 日、解体 1 日とする。

2. 上表は、単管工法の杭径 700mm 以上 800mm 以下は 4 セット分、800mm を超え 1,100mm 以下は 2 セット分、二重管工法、三重管工法は 1 セット分である。

3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 5-5 地盤整備費

排泥処理のためピット等を掘削する場合及び地盤改良後の整地が必要な場合は、「第Ⅱ編第 1 章②土工 3-1 掘削」、「第Ⅱ編第 1 章②土工 3-3 整地」により、別途計上する。

## 5-6 排水汚泥土処理設備費

排水及び汚泥土処理に要する設備が必要な場合は、別途計上する。

## 5-7 汚泥土処理費

汚泥土の産廃処理が必要な場合は、別途計上する。

## 5-8 足場工

仮設足場が必要な場合は、別途計上する。

## 5-9 水道用水費

削孔用水、注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

## 5-10 その他

- (1) 単管工法、二重管工法及び三重管工法における注入時間が、土質条件等により本歩掛により難しい場合は、別途考慮する。
- (2) 単管工法、二重管工法及び三重管工法におけるセット数については、あらかじめ十分検討しておく。
- (3) 単管工法、二重管工法及び三重管工法は、特許を有する工法の場合もあるので、特許料が必要な場合は別途計上する。

## 6. 単価表

## (1) 単管工法 1 本当り単価表

SWB223310

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_T / (6.7 \times 60) \times a / c$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$T_T / (6.7 \times 60) \times a / c$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_T / (6.7 \times 60) \times a / c$	〃
注 入 材 料		m <sup>3</sup>	$Q_T$	式5.1
損 耗 材 料 費		式	1	
ボーリングマシン運転	油圧式5.5kW級	日	$T_T / (6.7 \times 60) \times b / c$	表3.1 機械損料
高 圧 噴 射 攪 拌 式 地 盤 改 良 機 運 転	超高压ポンプ19.6MPa 20～100ℓ/min	〃	$T_T / (6.7 \times 60) \times b / c$	〃
〃	超高压ポンプ39.2MPa 100～130ℓ/min	〃	$T_T / (6.7 \times 60) \times b / c$	〃
諸 雑 費		式	1	表5.7
特 許 料 金		〃	1	必要に応じ 計上
計				

(注) 1.  $T_T$ : 1 本当り施工時間 (min)2.  $a$ : 編成人員3.  $b$ : 施工台数4.  $c$ : セット数5.  $Q_T$ : 単管工法の 1 本当り注入量 (m<sup>3</sup>)

## (2) 二重管工法 1 本当り単価表

## ① 1,000mm 以上 2,000mm 以下

SWB223320

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_N / (6.7 \times 60) \times 1$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$T_N / (6.7 \times 60) \times 3$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_N / (6.7 \times 60) \times 3$	〃
注 入 材 料		m <sup>3</sup>	$Q_N$	式5.2
損 耗 材 料 費		式	1	
高圧噴射攪拌用地盤改良機運	二重管専用型 11kW	日	$T_N / (6.7 \times 60)$	表3.2 機械損料
〃	超高压ポンプ19.6MPa 20～100ℓ/min	〃	$T_N / (6.7 \times 60)$	〃
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 吐出量5m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa	〃	$T_N / (6.7 \times 60)$	表3.2 機械賃料
トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	〃	$T_N / (6.7 \times 60)$	〃
諸 雑 費		式	1	表5.19
特 許 料 金		〃	1	必要に応じ 計上
計				

(注) 1.  $T_N$ : 1 本当り施工時間 (min)2.  $Q_N$ : 二重管工法の 1 本当り注入量 (m<sup>3</sup>)

## ② 2,000mm を超え 3,000mm 以下

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_N / (6.7 \times 60) \times 1$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$T_N / (6.7 \times 60) \times 3$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_N / (6.7 \times 60) \times 3$	〃
注 入 材 料 費		m <sup>3</sup>	$Q_N$	式5.3
損 耗 材 料 費		式	1	
高 圧 噴 射 攪 拌 式 地 盤 改 良 機 運 転	二重管専用型 11kw	日	$T_N / (6.7 \times 60)$	表3.2 機械損料
高 圧 噴 射 攪 拌 式 地 盤 改 良 機 運 転	超高压ポンプ 40.0MPa 200ℓ/min	〃	$T_N / (6.7 \times 60)$	表3.2 機械損料
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型（低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準 値）低騒音型 吐出量15m <sup>3</sup> /min 吐出圧力1.05MPa	〃	$T_N / (6.7 \times 60)$	表3.2 機械損料
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃	$T_N / (6.7 \times 60)$	表3.2 機械損料
諸 雑 費		式	1	表5.19
特 許 料 金		〃	1	必要に応じて 計上
計				

(注) 1.  $T_N$  : 1本当り施工時間 (min)2.  $Q_N$  : 二重管工法の1本当り注入量 (m<sup>3</sup>)

## (3) 三重管工法削孔1本当り単価表

SWB223330

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_s / (6.7 \times 60) \times 1$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$T_s / (6.7 \times 60) \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_s / (6.7 \times 60) \times 1$	〃
損 耗 材 料 費		式	1	
高 圧 噴 射 攪 拌 用 地 盤 改 良 機 運 転	掘削専用型(油圧式) 内径148mm 11kW	日	$T_s / (6.7 \times 60)$	表3.3 機械損料
グ ラ ウ ト ポ ン プ 損 料	横型二連複動ピストン式 吐出量37～100ℓ/min	〃	$T_s / (6.7 \times 60)$	〃
諸 雑 費		式	1	表5.27
計				

(注)  $T_s$  : 1本当り削孔時間 (min)

(4) 三重管工法注入1本当り単価表

SWB223340

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_A / (6.7 \times 60) \times 1$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$T_A / (6.7 \times 60) \times 4$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_A / (6.7 \times 60) \times 3$	〃
注 入 材 料		m <sup>3</sup>	$Q_A$	式5.4
損 耗 材 料 費		式	1	
高圧噴射攪拌用地盤改良機 運 転	三重管専用型 11kW	日	$T_A / (6.7 \times 60)$	表3.3 機械損料
〃	超高压ポンプ39.2MPa 14～70ℓ/min	〃	$T_A / (6.7 \times 60)$	〃
グ ラ ウ ト ポ ン プ 運 転	横型二連複動ピストン式 吐出量200ℓ/min	〃	$T_A / (6.7 \times 60)$	〃
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・ 排出ガス対策型（第1次基準値） 吐出量5m <sup>3</sup> /min 吐出圧力0.7MPa	〃	$T_A / (6.7 \times 60)$	表3.3 機械賃料
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 2次基準値）20t 吊	〃	$T_A / (6.7 \times 60)$	〃
諸 雑 費		式	1	表5.28
特 許 料 金		〃	1	必要に応 じて計上
計				

(注) 1.  $T_A$ : 1本当り施工時間 (min)2.  $Q_A$ : 三重管工法の1本当り注入量 (m<sup>3</sup>)

(5) 注入設備据付・解体1現場当り及び移設1回当り単価表

(据付・解体)SWB223370

(移設)SWB223380

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.29
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2 次基準値）25t吊	日		表 5.29 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適 用 単 価 表	指 定 事 項
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・ 排出ガス対策型（第1次基準値） 吐出量 5m <sup>3</sup> /min 吐出圧力 0.7MPa	機－16	燃料消費量→47 機械賃料数量 二重管工法→1.40 三重管工法→1.75
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 （低騒音型）・排出ガス対策型（第3 次基準値）低騒音型 吐出量 15m <sup>3</sup> /min 吐出圧力 1.05MPa	機－16	燃料消費量→147 機械賃料数量→1.3

## ⑪-5 中層混合処理工（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う中層混合処理工に適用する。

施工方式はスラリー噴射方式の機械攪拌混合とする。

改良形式は全面改良とし、改良深度2mを超え13m以下の陸上施工に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

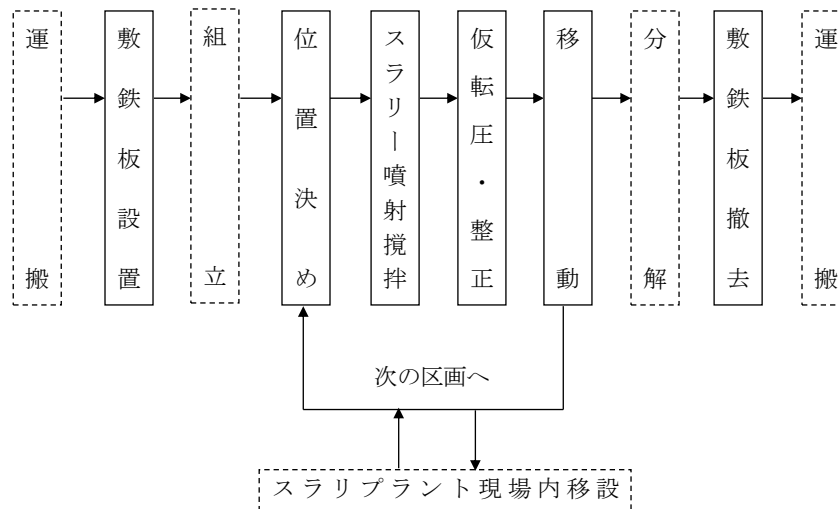


図 2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。



## 3. 機種の選定

機種・規格は、次表を標準とする。

表 3. 1 機種の選定

機 械 名	規 格	単 位	数 量			
			改良深(L) 2m<L≤5m	改良深(L) 5m<L≤8m	改良深(L) 8m<L≤10m	改良深(L) 10m<L≤13m
中層混合処理機 トレンチャ式	[ヘースマシン]20t(山積0.8m³)級 バックホウ [攪拌混合装置]改良深度 (標準)5m [施工管理装置]1ヒースフーム用	台	1	—	—	—
	[ヘースマシン]30t(山積1.4m³)級 バックホウ [攪拌混合装置]改良深度 (標準)8m [施工管理装置]1ヒースフーム用	〃	—	1	—	—
	[ヘースマシン]40t(山積1.9m³)級 バックホウ [攪拌混合装置]改良深度 (標準)10m [施工管理装置]1ヒースフーム用	〃	—	—	1	—
	[ヘースマシン]40t(山積1.9m³)級 バックホウ(ツートースフーム) [攪拌混合装置]改良深度 (標準)13m [施工管理装置]2ヒースフーム用	〃	—	—	—	1
深層混合処理機 (スラリー式)	スラリプラント(全自動) 能力20m³/h	〃	1			

## 4. 編成人員

中層混合処理工の日当たり編成人員は、次表を標準とする。

表 4. 1 編成人員 (人/日)

工 法	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員
中層混合処理工	1	1	2

(注) 編成人員には、スラリプラントの管理運転労務を含む。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 日当り作業量

1日当たり作業量は、次表を標準とする

表 5.1 標準日当り作業量(D) (m³/日)

改良深度 (L) m	日当り作業量 (m³/日)
2m < L ≤ 5m	225
5m < L ≤ 8m	274
8m < L ≤ 10m	314
10m < L ≤ 13m	354

(注) 1. 日当り作業量は、中層混合処理機の移動（敷鉄板の設置・撤去含む）、位置決め、スラリー噴射攪拌、仮転圧・整正までの一連の作業のものである。

2. 1工事当りの施工規模が 1,000m³ 未満の場合は、標準日当り作業量に下記補正係数を乗じるものとする。

表 5.2 日当り作業量の補正係数

施工規模 1,000m³ 未満	0.8
-----------------	-----

## 5-2 改良材使用量

改良材はセメント系固化剤を標準とし、現場条件により決定する。なお、使用量は次式による。

$$V = v \times (1 + K) / 1000 \quad \cdots \text{(式 5.1)}$$

V : 1m³ 当りの改良材使用量 (t/m³)

v : 1m³ 当りの改良材添付量 (kg/m³)

K : ロス率

表 5.3 ロス率(K)

ロス率	+0.06
-----	-------

## 5-3 諸雑費

諸雑費は、足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設に要する費用（バックホウ運転費用）、攪拌混合装置の損耗材料費（チェーン、攪拌翼、切削刃、ガイドローラ、スプロケット、アイドラーの各部品費）、空気圧縮機の賃料及び運転経費、電力に関する経費等の費用及び改良後の整地に要する費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5.4 諸雑费率(%)

諸 雑 費 率 ( % )	改良深度 L (m)	諸雑费率
	2m < L ≤ 5m	34
	5m < L ≤ 8m	22
	8m < L ≤ 10m	21
	10m < L ≤ 13m	19

## 5-4 その他

- (1) 次の条件等により攪拌翼が貫入できない場合は、バックホウによる先掘りを行うものとし、「第Ⅱ編 1章②土工」による。
- 1) 表層に転石等が多い地盤
  - 2) 表層に障害物等のある地盤
- (2) 中層混合処理工は、特許を有する工法の場合もあるので、特許料が必要な場合は別途計上する。
- (3) 中層混合処理機の分解・組立及び輸送については、「第Ⅰ編第2章②間接工事費2-2運搬費(5) 重建設機械分解・組立」を適用する。
- (4) スラリプラントを中心に半径約200mを超える場合、揚程が5mを超える場合、又は同一現場内に施工箇所が2箇所以上あり、スラリプラントを移設しなければならない場合は、「⑪ 軟弱地盤処理工 ⑪-3 スラリー攪拌工」の「5-4 スラリプラント現場内移設歩掛」を適用する。
- (5) 汚泥土の処分が必要な場合は、別途計上する。
- (6) 注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等必要な場合は、別途計上する。

## 6. 単価表

(1) 中層混合処理工 100m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB223410

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{100}{D} \times 1$	表4.1 表5.1
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{100}{D} \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{100}{D} \times 2$	〃
改 良 材		t	$V \times 100$	式5.1
中層混合処理機運転		日	$\frac{100}{D}$	表3.1 表5.1 機械損料
スラリプラント運転		〃	$\frac{100}{D}$	〃
諸 雑 費		式	1	表5.4
特 許 料 金		〃	1	必要に応じて 計上
計		式	1	

(注) D : 1日当り作業量 (m<sup>3</sup>/日)V : 1m<sup>3</sup>当りの改良材使用量 (t/m<sup>3</sup>)

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
中層混合処理機 トレンチャ式	[ベースマシン] 20t(山積0.8m <sup>3</sup> )級バックホウ [攪拌混合装置] 改良深度(標準)5m [施工管理装置] 1tベースフレーム用	機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→118 機械損料数量1(ベースマシン)→1.53 機械損料数量2(攪拌混合装置)→1.53 機械損料数量3(施工管理装置)→1.53
中層混合処理機 トレンチャ式	[ベースマシン] 30t(山積1.4m <sup>3</sup> )級バックホウ [攪拌混合装置] 改良深度(標準)8m [施工管理装置] 1tベースフレーム用	機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→195 機械損料数量1(ベースマシン)→1.53 機械損料数量2(攪拌混合装置)→1.53 機械損料数量3(施工管理装置)→1.53
中層混合処理機 トレンチャ式	[ベースマシン] 40t(山積1.9m <sup>3</sup> )級バックホウ [攪拌混合装置] 改良深度(標準)10m [施工管理装置] 1tベースフレーム用	機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→251 機械損料数量1(ベースマシン)→1.53 機械損料数量2(攪拌混合装置)→1.53 機械損料数量3(施工管理装置)→1.53
中層混合処理機 トレンチャ式	[ベースマシン] 40t(山積1.9m <sup>3</sup> )級バックホウ (ツートベースフレーム) [攪拌混合装置] 改良深度(標準)13m [施工管理装置] 2tベースフレーム用	機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→251 機械損料数量1(ベースマシン)→1.53 機械損料数量2(攪拌混合装置)→1.53 機械損料数量3(施工管理装置)→1.53
深層混合処理機 (スラリー式)	スラブリラント(全自動) 能力20m <sup>3</sup> /h	機-25	機械損料数量→1.53

## ⑫ 薬液注入工（建地－B）

## 1. 適用範囲

本資料は、粘土、シルト及び砂質土等の地盤に薬液を注入し「地盤の透水性を減少」又は「地盤の強度（固結度）を増加」させる薬液注入工のうち、二重管ストレーナ工法（単相方式及び複相方式）及び二重管ダブルパッカー工法を対象とし、鉛直方向施工にのみ適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

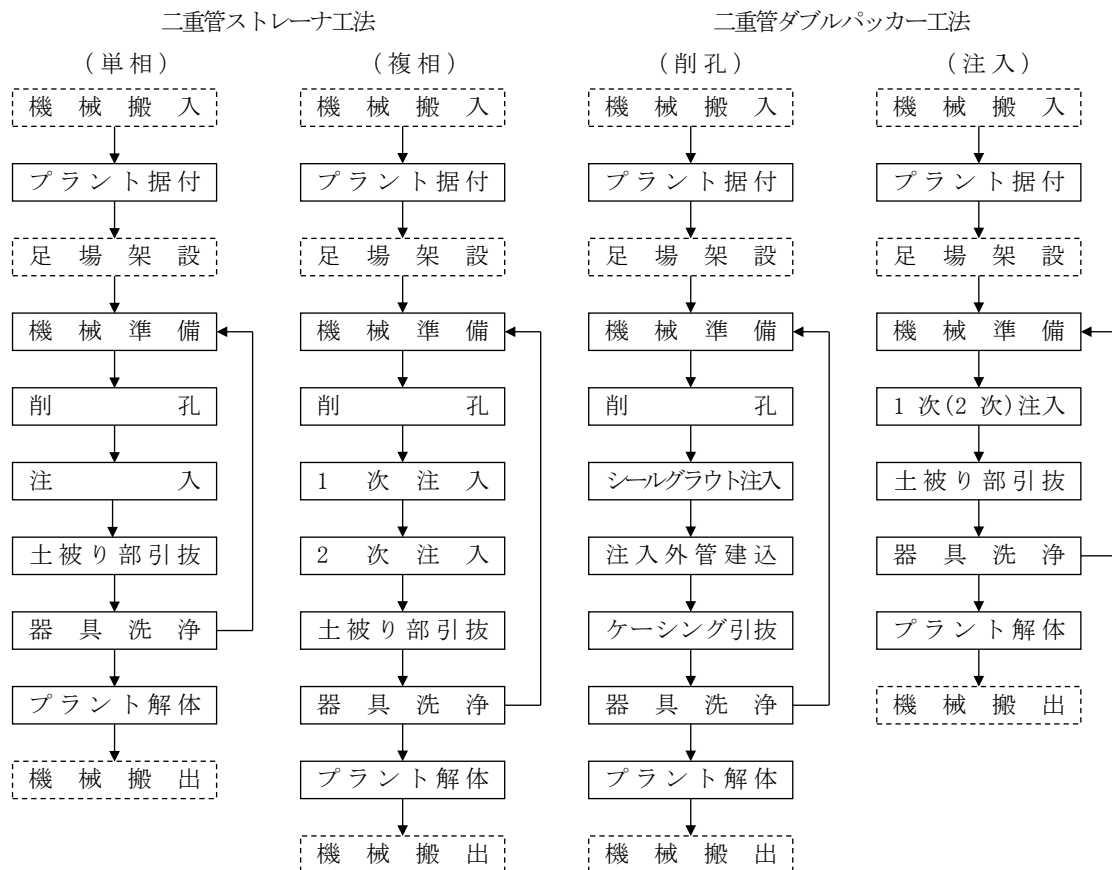


図2-1 施工フロー図

（注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

2. プラントとは、グラウトミキサ、薬液ミキサ、送水ポンプ、送液ポンプ、グラウトポンプ、薬液注入ポンプ、貯水槽、貯液槽、グラウト流量・圧力測定装置、水ガラス積算流量計、ボーリングマシン等、注入工に要する設備全般を示す。

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 3. 1 二重管ストレナ工法の機種の選定

機 種	規 格	単位	数 量				摘要
			単 相 方 式		複 相 方 式		
			2 セット	4 セット	2 セット	4 セット	
ボーリングマシン	油圧式 5.5kW 級	台	2	4	2	4	
薬液注入ポンプ	吐出量 5～20ℓ/min×2 (圧力 9.8MPa)	〃	2	4	2	4	
水ガラス積算流量計	0～50ℓ/min	〃	(1)	(1)	(1)	(1)	(注)2

(注)1. 施工本数が 100 本未満の場合は 2 セット, 100 本以上の場合は 4 セットを標準とする。

2. 水ガラス積算流量計は、総注入量 500kℓ 以上の場合に計上する。

表 3. 2 二重管ダブルパッカー工法の機種の選定

機 種	規 格	単 位	数 量					摘 要
			削 孔		一次注入	二次注入		
					セメント ベントナイト注入	溶 液 型 有機系注入	溶 液 型 無機系注入	
			1セツト	2セツト	4セツト	4セツト	4セツト	
ボーリングマシン	ロータリーパーカッション式 クローラ型 81kW 級	台	1	2	—	—	—	
薬液注入ポンプ	吐出量 0～20ℓ/min×2 (圧力 9.8MPa)	〃	—	—	2	2	2	
ゲルミキサ	300ℓ×1 槽	〃	—	—	—	1	—	
ミキシング プラント	3,000ℓ/h	〃	—	—	—	—	1	
水ガラス積算流量計	0～50ℓ/min	〃	—	—	—	(1)	(1)	(注)2

(注)1. 削孔は施工本数が 200 本未満の場合は 1 セット, 200 本以上の場合は 2 セットを標準とする。

2. 水ガラス積算流量計は、総注入量 500kℓ 以上の場合に計上する。

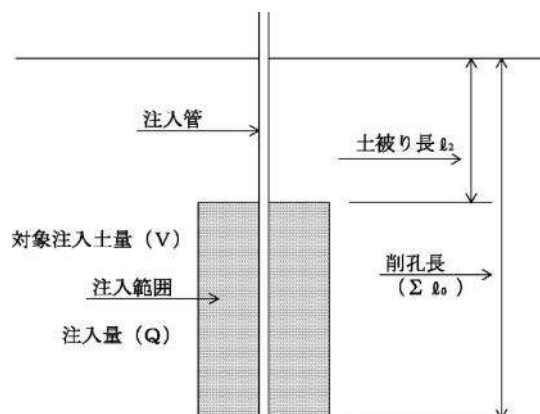


図 3-1 施工図(二重管ストレナ工法)

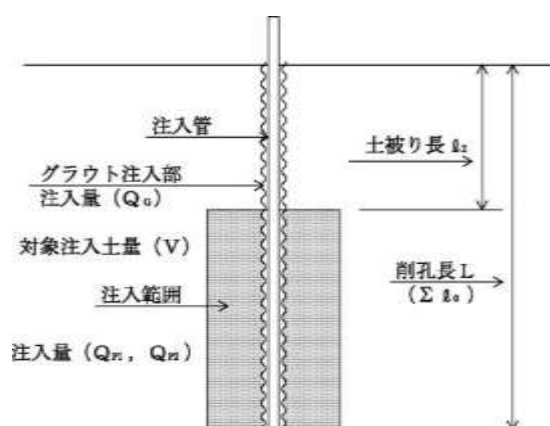


図 3-2 施工図(二重管ダブルパッカー工法)

#### 4. 編成人員

薬液注入工の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表 4. 1 二重管ストレーナ工法の日当り編成人員 (人/日)

工 法	セット数	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員
単相方式	2セット	1	3	2
	4セット	1	6	2
複相方式	2セット	1	3	2
	4セット	1	6	2

表 4.2 二重管ダブルパッカー工法の日当り編成人員 (人/日)

条 件	セット数	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員
削 孔 時	1 セット	1	3	1
	2 セット	1	5	2
一次注入時	4 セット	1	5	2
二次注入時	4 セット	1	5	2

(注)1. 上表は削孔時1セット,2セット分,一次注入時及び二次注入時は4セット分の人員である。

2. 注入材等の混合に要する労務を含む。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 二重管ストレーナ工法

(1) 1本当り施工時間（ $T_s$ ）

二重管ストレーナ工法における1本当り施工時間は、次式による。

$$T_s = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$T_s$ ：二重管ストレーナ工法1本当り施工時間（min）

$T_1$ ：機械準備時間（min）

$T_2$ ：削孔時間（min）

$T_3$ ：注入時間（min）

$T_4$ ：土被り部引抜時間（min）

1) 機械準備時間（ $T_1$ ）

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び注入後の器具洗浄時間であり14分とする。

なお、打設間隔は1mを標準とする。

2) 削孔時間（ $T_2$ ）

$$T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times \ell_0)$$

$\gamma_1$ ：各土質の削孔の単位作業時間（min/m）

$\ell_0$ ：各土質毎の削孔長（m）

表 5.1 削孔の単位作業時間（ $\gamma_1$ ）（min/m）

土 質	レ キ 質 土	砂 質 土	粘 性 土
$\gamma_1$	8.0	5.0	4.0

3) 注入時間（ $T_3$ ）

$$T_3 = Q_s / q_s$$

$Q_s$ ：二重管ストレーナ工法の1本当り注入量（ $\ell$ ）

$q_s$ ：単位時間当り注入量（ $\ell/\text{min}$ ）

表 5.2 単位時間当り注入量（ $q_s$ ）（ $\ell/\text{min}$ ）

工 法 名	単 相 方 式	複 相 方 式
$q_s$	18	16

4) 土被り部引抜時間（ $T_4$ ）

$$T_4 = \gamma_2 \times \ell_2$$

$\gamma_2$ ：土被り部引抜の単位作業時間（min/m）

$\ell_2$ ：土被り長（m）

表 5.3 土被り部引抜の単位作業時間（ $\gamma_2$ ）（min/m）

$\gamma_2$	2.0
------------	-----

## (2) 注入材使用量

二重管ストレーナ工法に必要な使用量は、次式による。

$$Q_s = V \times \lambda \times 1,000 \cdots \cdots \text{式 5.1}$$

$Q_s$ ：二重管ストレーナ工法の1本当り注入量（ $\ell$ ）

$V$ ：二重管ストレーナ工法の1本当り対象注入土量（ $\text{m}^3$ ）

$\lambda$ ：注入率

## (3) 1日当り施工本数

二重管ストレーナ工法における1日当り施工本数は、次式による。

$$N = 60 \times H / T_s \times 2 \quad (4)$$

$N$ ：2（4）セット1日当り施工本数（本/日）

$H$ ：注入設備の1日当り実作業時間で6.3時間とする。

$T_s$ ：1本当り施工時間（min）



## (4) 諸雑費

二重管ストレーナ工法の1本当り諸雑費は、グラウト流量・圧力測定装置、薬液ミキサ、グラウトミキサ、送水ポンプ、送液ポンプ、貯水槽、貯液槽の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額（水ガラス積算流量計は除く）に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5.4 二重管ストレーナ工法の諸雑费率 (%)

工 法	セット数	諸雑费率
単 相 方 式	2	20
	4	19
複 相 方 式	2	21
	4	20

## 5-2 二重管ダブルパッカー工法

(1) 1本当り削孔施工時間 ( $T_D$ )

二重管ダブルパッカー工法における1本当り削孔施工時間は、次式による。

$$T_D = T_1 + T_2 + T_3$$

$T_D$  : 二重管ダブルパッカー工法1本当り削孔時間 (min)

$T_1$  : 機械準備時間 (min)

$T_2$  : 削孔時間 (min)

$T_3$  : 薬液注入管準備時間 (min)

1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び器具洗浄時間であり14分とする。

なお、打設間隔は1mを標準とする。

2) 削孔時間 ( $T_2$ )

各土質における削孔時間は、次式とする。

$$T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times \ell_0)$$

$\gamma_1$  : 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

$\ell_0$  : 各土質毎の削孔長 (m)

表 5.5 削孔の単位作業時間 ( $\gamma_1$ ) (min/m)

土 質	レキ質土	砂質土	粘性土
$\gamma_1$	6.0	5.0	3.0

3) 薬液注入管準備時間 ( $T_3$ )

薬液注入管準備時間は、グラウト注入、薬液注入管建込及びケーシング引抜時間であり、次式とする。

$$T_3 = \gamma_2 \times L$$

$\gamma_2$  : 薬液注入管準備の単位作業時間 (min/m)

$L$  : 削孔長 (m)

表 5.6 薬液注入管準備の単位作業時間 ( $\gamma_2$ ) (min/m)

$\gamma_2$	3.0
------------	-----

(2) 1本当り一次注入施工時間 ( $T_{P1}$ )

二重管ダブルパッカー工法における一次注入の1本当り注入施工時間は、次式による。

$$T_{P1} = T_1 + T_2 + T_3$$

$T_{P1}$  : 二重管ダブルパッカー工法一次注入の1本当り注入時間 (min)

$T_1$  : 機械準備時間 (min)

$T_2$  : 注入時間 (min)

$T_3$  : 土被り部引抜時間 (min)

1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び器具洗浄時間であり13分とする。

2) 注入時間 ( $T_2$ )

$$T_2 = Q_{P1} / q_{P1}$$

$Q_{P1}$  : 二重管ダブルパッカー工法の一次注入の1本当り注入量 ( $\ell$ )

$q_{P1}$  : 単位時間当り注入量 ( $\ell/\text{min}$ )

表 5. 7 単位時間当り注入量( $q_{P1}$ ) ( $\ell/\text{min}$ )

$q_{P1}$	8
----------	---

3) 土被り部引抜時間 ( $T_3$ )

$$T_3 = \gamma_3 \times \ell_2$$

$\gamma_3$  : 土被り部引抜の単位作業時間 ( $\text{min}/\text{m}$ )

$\ell_2$  : 土被り長 ( $\text{m}$ )

表 5. 8 土被り部引抜の単位作業時間( $\gamma_3$ ) ( $\text{min}/\text{m}$ )

$\gamma_3$	1.0
------------	-----

(3) 1本当り二次注入施工時間 ( $T_{P2}$ )

二重管ダブルパッカー工法における二次注入の1本当り注入施工時間は、次式による。

$$T_{P2} = T_1 + T_2 + T_3$$

$T_{P2}$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入時間 ( $\text{min}$ )

$T_1$  : 機械準備時間 ( $\text{min}$ )

$T_2$  : 注入時間 ( $\text{min}$ )

$T_3$  : 土被り部引抜時間 ( $\text{min}$ )

1) 機械準備時間 ( $T_1$ )

機械準備時間は、機械移動、機械据付及び器具洗浄時間であり13分とする。

2) 注入時間 ( $T_2$ )

$$T_2 = Q_{P2} / q_{P2}$$

$Q_{P2}$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入量 ( $\ell$ )

$q_{P2}$  : 単位時間当り注入量 ( $\ell/\text{min}$ )

表 5. 9 単位時間当り注入量( $q_{P2}$ ) ( $\ell/\text{min}$ )

$q_{P2}$	9
----------	---

3) 土被り部引抜時間 ( $T_3$ )

$$T_3 = \gamma_4 \times \ell_2$$

$\gamma_4$  : 土被り部引抜の単位作業時間 ( $\text{min}/\text{m}$ )

$\ell_2$  : 土被り長 ( $\text{m}$ )

表 5. 10 土被り部引抜の単位作業時間( $\gamma_4$ ) ( $\text{min}/\text{m}$ )

$\gamma_4$	1.0
------------	-----

## (4) 注入材料使用量

二重管ダブルパッカー工法における注入材料使用量は、次式による。

## 1) グラウト注入材料

$$Q_6 = \gamma_5 \times L \cdots \cdots \text{式 5. 2}$$

$Q_6$  : グラウト材注入の1本当り注入量 ( $\ell$ )

$\gamma_5$  : グラウト材注入の単位使用量 ( $\ell/\text{m}$ )

$L$  : 削孔長 ( $\text{m}$ )

表 5. 11 グラウト材注入の単位使用量( $\gamma_5$ ) ( $\ell/\text{m}$ )

$\gamma_5$	12
------------	----

## 2) 一次注入材料

$$Q_{P1} = V \times \lambda \times 1,000 \cdots \cdots \text{式 5.3}$$

$Q_{P1}$  : 二重管ダブルパッカー工法の一次注入の1本当り注入量 (ℓ)

$V$  : 二重管ダブルパッカー工法の一次注入の1本当り注入対象土量 (m<sup>3</sup>)

$\lambda$  : 注入率

## 3) 二次注入材料

$$Q_{P2} = V \times \lambda \times 1,000 \cdots \cdots \text{式 5.4}$$

$Q_{P2}$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入量 (ℓ)

$V$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入対象土量 (m<sup>3</sup>)

$\lambda$  : 注入率

## (5) 1日当り施工本数

二重管ダブルパッカー工法における削孔、一次注入、二次注入の1日当り施工本数は、次式とする。

## 1) 削孔

$$N = 60 \times H / T_D (\times 2)$$

$N$  : 1 (2) セット1日当り削孔施工本数 (本/日)

$H$  : 削孔設備の1日当り実作業時間で、6.5時間とする。

$T_D$  : 1本当り削孔時間 (min)

## 2) 一次注入

$$N = 60 \times H / T_{P1} \times 4$$

$N$  : 4セット1日当り注入施工本数 (本/日)

$H$  : 注入設備の1日当り実作業時間で、7.3時間とする。

$T_{P1}$  : 1本当り注入時間 (min)

## 3) 二次注入

$$N = 60 \times H / T_{P2} \times 4$$

$N$  : 4セット1日当り注入施工本数 (本/日)

$H$  : 注入設備の1日当り実作業時間で、7.3時間とする。

$T_{P2}$  : 1本当り注入時間 (min)

## (6) 諸雑費

二重管ダブルパッカー工法削孔時の諸雑費は、グラウトポンプ・グラウトミキサ・送水ポンプ・貯水槽の損料及び電力に関する経費等の費用であり、一次注入及び二次注入時の諸雑費は、グラウト流量・圧力測定装置、グラウトミキサ・パッカー加圧ポンプ・送水ポンプ・送液ポンプ、貯水槽・貯液槽の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額（水ガラス積算流量計は除く）に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5.12 二重管ダブルパッカー工法の諸雑费率 (%)

条 件	セット数	諸雑费率
削 孔	1	9
	2	6
一 次 注 入	4	27
二 次 注 入 有 機 系	4	26
二 次 注 入 無 機 系	4	21

## 5-3 消耗材料費

## 5-3-1 消耗材料量

## (1) 二重管ストレナ工法

## 1) 削孔材料消耗量

表 5.13 削孔材料消耗量 (削孔径 φ40.5mm 削孔長 1.0m 当り)

品 名	単位	レキ質土		砂質土		粘性土	
		単 相	複 相	単 相	複 相	単 相	複 相
二重管ボーリングロッド	m	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02
メタルクラウン φ41mm	個	0.30	0.30	0.04	0.04	0.03	0.03
単相用グラウトモニタ φ40.5mm	〃	0.005	—	0.003	—	0.002	—
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	〃	—	0.005	—	0.003	—	0.002
そ の 他 雑 品	%	15	11	23	17	23	16

- (注) 1. 本歩掛は鉛直方向への削孔のみに適用する。  
 2. 二重管ボーリングロッドは 3.0m/本とする。  
 3. その他雑品には、ロッドカップリング、圧力計、パイプレンチ、ペンチ、ドライバー、カッター、スラントルール、水切りモップ等を含み、上記合計額に率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2) 注入材料消耗量

表 5.14 注入材料消耗量 (注入量 1,000ℓ 当り)

品 名	単位	単 相	複 相	備 考
グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.02	—	単相用
グラウトモニタ φ40.5mm	〃	—	0.02	複相用
注入ホース類 φ12mm	組	0.005	—	P=4.9MPa (50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2
注入ホース類 φ12mm	〃	—	0.005	P=4.9MPa (50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3
サクションホース φ38mm	〃	0.003	—	L=3m×2
サクションホース φ38mm	〃	—	0.003	L=3m×3
その他雑品	%	42	25	

- (注) その他雑品には、二重管スイベル、スイベルカバー、継手類、ホース、ポンプ、流量計、分流バルブ、圧力計、パイプレンチ、ペンチ、ウェス、スコップ、土のう等を含み、上記合計額に率を乗じた金額を上限として計上する。

## (2) 二重管ダブルパッカー工法

## 1) 削孔材料消耗量

表 5.15 削孔材料消耗量 (ケーシング削孔径 96mm 削孔長 1.0m 当り)

品 名	単位	レキ質土	砂質土	粘性土
ケーシング φ96mm (カップリング付)	個	0.0167	0.0055	0.0040
ウォータースイベル φ96mm	〃	0.0028	0.0009	0.0007
シャ ン ク ロ ッ ド	〃	0.0083	0.0030	0.0025
そ の 他 雑 品	%	41	49	55

- (注) 1. 本歩掛は鉛直方向への削孔にのみ適用する。  
 2. その他雑品には、シャンクアダプタ、リングビット等が含まれており、上記合計額に率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2) 注入材料消耗量

表 5.16 注入材料消耗量 (注入量 1,000ℓ あたり)

品 名	単位	ダブルパッカー	備 考
二重管ホース φ12mm	本	0.01	P=21MPa (210kgf/cm <sup>2</sup> ) L=20m
シールパッカーセット	個	0.02	
シ ー ル セ ッ ト	〃	0.20	
注 入 用 部 品 類	%	56	

- (注) 注入用部品類は、上記合計額に率を乗じた金額を上限として計上する。

## 5-3-2 消耗材料費

## (1) 二重管ストレーナ工法

## 1) 削孔用消耗材料費（削孔径 φ40.5mm）

二重管ストレーナ工法の削孔用消耗材料費（削孔径 φ40.5mm）は、二重管ボーリングロッド、メタルクラウン（φ41mm）、グラウトモニタ（φ40.5mm）等の費用を計上する。

## 2) 注入用消耗材料費

二重管ストレーナ工法の注入用消耗材料費は、グラウトモニタ（φ40.5mm）、注入ホース類（φ12mm）、サクションホース（φ38mm）等の費用を計上する。

## (2) 二重管ダブルパッカー工法

## 1) 削孔用消耗材料費（削孔径 φ96mm）

二重管ダブルパッカー工法の削孔用消耗材料費（φ90mm 用）は、ドリルパイプ φ90mm 用（1.5m）、ウオータスイベル（φ90mm 用二重管用）、ジャンクロッド等の費用を計上する。

## 2) 注入用消耗材料費

二重管ダブルパッカー工法の注入用消耗材料費は、二重管ホース（φ12mm）、シールパッカーセット、シールセット等の費用を計上する。

## 5-4 注入設備の据付・解体及び移設

## (1) 注入設備据付解体歩掛

注入設備の据付・解体（搬入・搬出時）の歩掛は、次表を標準とする。

表 5. 17 注入設備据付・解体歩掛

(1 現場当り)

名 称	規格	単位	二重管ストレーナ工法		二重管ダブルパッカー工法		
			2 セット	4 セット	削 孔		注 入
					1 セット	2 セット	4 セット
土 木 一 般 世 話 役		人	2.2	2.7	1.5	1.5	3.1
特 殊 作 業 員		〃	8.2	13.3	4.6	6.2	11.6
普 通 作 業 員		〃	3.4	5.6	1.5	2.3	3.9
ト ラ ッ ク (クレーン装置付)	ベーストラック 4t 級・吊能力 2.9t	h	13	17	6	6	19

## (2) 注入設備移設歩掛

注入範囲が注入設備を中心に半径 50m を超える場合、又は同一現場内に施工箇所が 2 箇所以上あり、注入設備を移設しなければならない場合は次表を標準とする。

表 5. 18 注入設備移設歩掛

(1 回当り)

名 称	規格	単位	二重管ストレーナ工法		二重管ダブルパッカー工法		
			2 セット	4 セット	削 孔		注 入
					1 セット	2 セット	4 セット
土 木 一 般 世 話 役		人	1.3	2.0	1.0	1.0	2.0
特 殊 作 業 員		〃	5.5	8.5	3.0	4.0	7.5
普 通 作 業 員		〃	2.2	3.5	1.0	1.5	2.5
ト ラ ッ ク (クレーン装置付)	ベーストラック 4t 級・吊能力 2.9t	h	8	11	4	4	12

## 5-5 排水汚泥土処理費

注入排水，排土などのための処理設備が必要な場合は，次表を標準とする。

表 5.19 排水汚泥土処理費

(1日当たり)

名 称	単位	規 格	数 量
普 通 作 業 員	人		0.8
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	日	普通型(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 20m	1.0
ア ル カ リ 水 中 和 装 置	h	炭酸ガス式 処理量 6m³/h	6.8
水 槽	供用日	5m³	1.5
諸 雑 費 率	%		22

- (注)1. 本工種以外における工事で濁水処理施設を設け，かつ，その施設で本工種で発生した削孔水等の濁水を処理する場合は計上しない。
2. 諸雑費は電力に関する経費等の費用であり，労務費及び機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 現場における中和剤材料費，排泥運搬のための汚泥吸排車及び処理費は，別途計上する。
4. 上表は二重管ストレーナ工法 4 セットまで，二重管ダブルパッカー工法削孔 2 セット，注入 4 セットまでとする。

## 5-6 足場工

足場が必要な場合は，別途計上する。

## 5-7 その他

- (1) 本工法は，特許を有する工法の場合もあるので，特許料が必要な場合は別途計上する。
- (2) 用水費については，現場条件を確認の上，必要に応じて別途計上する。

## 6. 単価表

(1) 二重管ストレーナ工法 1 本当り単価表

SWB223710

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$1/N \times a$	表 4.1
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
注 入 材 料		ℓ	$Q_s$	式 5.1
ボ ー リ ン グ マ シ ン	油圧式 5.5kW 級	日	$1/N \times b$	表 3.1 機械損料
薬 液 注 入 ポ ン プ	吐出量 5~20ℓ/min×2 (圧力 9.8MPa)	〃	〃	〃
水 ガ ラ ス 積 算 流 量 計	0~50ℓ/min	〃	〃	〃 (注)5
削 孔 消 耗 材 料 費		式	1	表 5.13
注 入 消 耗 材 料 費		〃	1	表 5.14
諸 雑 費		〃	1	表 5.4
特 許 料 金		〃	1	必要に応じて計上
計				

(注)1. N : 1 日当り施工本数

2. a : 編成人員

3. B : 施工台数

4.  $Q_s$  : 二重管ストレーナ工法の 1 本当り注入量 (ℓ)

5. 水ガラス積算流量計損料は、総注入量 500kℓ 以上の場合に計上する。

(2) 二重管ダブルパッカー工法削孔 1 本当り単価表

SWB223720

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$1/N \times a$	表 4.2
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
グ ラ ウ ト 材		ℓ	$Q_G$	式 5.2
薬 液 注 入 管		m		
ボ ー リ ン グ マ シ ン 運 転	ロータリーパーカッション式 クローラ型 81kW 級	日	$1/N \times b$	表 3.2 機械損料
削 孔 消 耗 材 料 費		式	1	表 5.15
諸 雑 費		〃	1	表 5.12
計				

(注)1. N : 1 日当り施工本数

2. a : 編成人員

3. b : 施工台数

4.  $Q_G$  : グラウト注入の 1 本当り注入量 (ℓ)

## (3) 二重管ダブルパッカー工法一次注入1本当り単価表

SWB223730

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$1/N \times a$	表 4.2
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
注 入 材 料		ℓ	$Q_{P1}$	式 5.3
薬 液 注 入 ポ ン プ	吐出量 0～20ℓ/min×2 (圧力 9.8MPa)	日	$1/N \times b$	表 3.2 機械損料
注 入 消 耗 材 料 費		式	1	表 5.16
諸 雑 費		〃	1	表 5.12
特 許 料 金		〃	1	必要に応じて計上
計				

(注)1. N : 1日当り施工本数

2. a : 編成人員

3. b : 施工台数

4.  $Q_{P1}$  : 二重管ダブルパッカー工法の一次注入の1本当りの注入量 (ℓ)

## (4) 二重管ダブルパッカー工法二次注入1本当り単価表

SWB223740

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$1/N \times a$	表 4.2
特 殊 作 業 員		〃	〃	〃
普 通 作 業 員		〃	〃	〃
注 入 材 料		ℓ	$Q_{P2}$	式 5.4
薬 液 注 入 ポ ン プ	吐出量 0～20ℓ/min×2 (圧力 9.8MPa)	日	$1/N \times b$	表 3.2 機械損料
ゲ ル ミ キ サ	300ℓ×1 槽	〃	〃	〃 (注)5
ミ キ シ ン グ プ ラ ン ト	3,000ℓ/h	〃	〃	〃 (注)6
水 ガ ラ ス 積 算 流 量 計	0～50ℓ/min	〃	〃	〃 (注)7
注 入 消 耗 材 料 費		式	1	表 5.16
諸 雑 費		〃	1	表 5.12
特 許 料 金		〃	1	必要に応じて計上
計				

(注)1. N : 1日当り施工本数

2. a : 編成人員

3. b : 施工台数

4.  $Q_{P2}$  : 二重管ダブルパッカー工法の二次注入の1本当り注入量 (ℓ)

5. ゲルミキサは、溶液型有機系注入時に計上する。

6. ミキシングプラントは、溶液型無機系注入時に計上する。

7. 水ガラス積算流量計損料は、総注入量 500kℓ 以上の場合に計上する。



## (5) 注入設備据付・解体1現場当り単価表

SWB223750

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.17
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
トラック（クレーン装置付） 運 転	ベーストラック 4t 級・ 吊能力 2.9t	h		表 5.17 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (6) 注入設備移設1回当り単価表

SWB223760

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.18
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
トラック（クレーン装置付） 運 転	ベーストラック 4t 級・ 吊能力 2.9t	h		表 5.18 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (7) 排水汚泥土処理1日当り単価表

SWB223770

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.8	表 5.19
工事用水中モータポンプ	普通型(潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 20m	日	1.0	表 5.19 機械損料
アルカリ水中和装置	炭酸ガス式 処理量 6m³/h	h	6.8	〃
水 槽（一 般 工 事 用）	鋼板製簡易水槽 5m³	供用日	1.5	〃
諸 雑 費		式	1	表 5.19
計				

## (8) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
ボ ー リ ン グ マ シ ン	ロータリーパーカッション式 クローラ型 81kw 級	機-12	燃料消費量 → 81ℓ/日
トラック（クレーン装置付） 運 転	ベーストラック 4t 級・吊能力 2.9t	機-1	

## ⑬ アンカー工（ロータリーパーカッション式）（建地－H）

## 1. 適用範囲

本資料は、ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより削孔を行い、アンカー鋼材にて引張力を地盤に伝達し、長期に供用するグラウンドアンカー工法に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 削孔（アンカー）

- (1) ボーリングマシンによるアンカー孔の削孔，ドリルパイプの引抜き，横移動作業  
なお，積算においては，土質毎に積上げを行うこととする。

## 1-1-2 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）

- (1) アンカー鋼材の現地加工，組立から孔内挿入までの作業及び工場で組立・加工する場合のアンカー鋼材挿入作業  
(2) 緊張ジャッキで所定の緊張力（荷重）をかけ，クサビ及びナット等で定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）を行う作業

## 1-1-3 グラウト注入（アンカー）

- (1) アンカー孔内へのグラウト注入の作業

## 1-1-4 ボーリングマシン移設（アンカー）

- (1) スキッド型ボーリングマシンの据付け・撤去及び上下移動（移設）作業  
ただし，横移動は，削孔工に含む。

## 1-1-5 足場（アンカー）

- (1) スキッド型ボーリングマシン据付の架台となる足場材の設置及び撤去作業

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 足場（アンカー）

- (1) 足場工の足場材の設置及び撤去作業で，クローラ型ボーリングマシンを選定する場合

## 2. 施工概要

施工フローは，下記を標準とする。

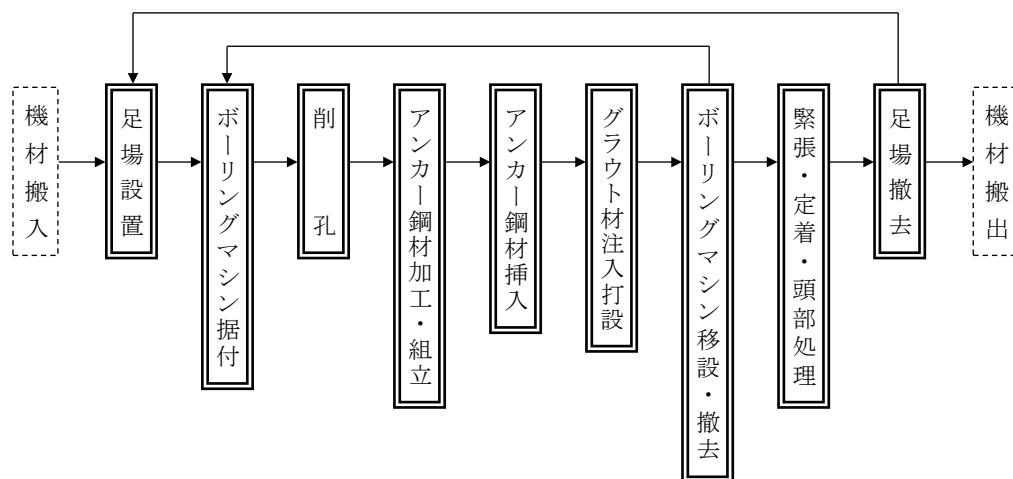


図2-1 施工フロー

（注）1. 本施工パッケージで対応しているのは，二重実線部分のみである。

2. ロータリーパーカッション式ボーリングマシンをクローラ型とするとときは，足場設置・撤去及びボーリングマシン据付・移設・撤去は対象外となる。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 削孔（アンカー）（SCB223910）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 削孔（アンカー） 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

足場工の有無	方式	呼び径	土質
有り (スキッド型)	単管方式	90mm	(表 3. 2)
		115mm	
		135mm	
	二重管方式	90mm	(表 3. 3)
		115mm	
		135mm	
		146mm	
無し (クローラ型)	単管方式	90mm	(表 3. 2)
		115mm	
		135mm	
	二重管方式	90mm	(表 3. 3)
		115mm	
		135mm	
		146mm	

(注) 1. 上表はアンカー孔の削孔，ドリルパイプの引抜き，ボーリングマシン横移動作業，削孔材料損耗品費の他，削孔水用ポンプ，給水用ポンプ，排水用ポンプ，水槽損料，電力に関する経費等，その施工に要する全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 呼び径とは，ドリルパイプ外径（mm）をいう。

3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は，別途考慮する。

4. 泥水処理が必要な場合は，別途計上する。

表 3. 2 土質（単管方式）

積算条件	区分
土質	粘性土・砂質土
	レキ質土
	玉石混り土

表 3. 3 土質（二重管方式）

積算条件	区分
土質	粘性土・砂質土
	レキ質土
	玉石混り土
	軟岩
	硬岩

(注) 硬岩はコンクリートを含む

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.4 削孔(アンカー) 代表機材規格一覧

方式	項目		代表機材規格	備考
単管	機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW 級	足場工有りの場合
			ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW 級	足場工無しの場合
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	土木一般世話役	
		R3	特殊作業員	
		R4	—	
	材料	Z1	リングビット φ90mm 用	呼び径 90mm の場合
			リングビット φ115mm 用	呼び径 115mm の場合
			リングビット φ135mm 用	呼び径 135mm の場合
		Z2	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)	呼び径 90mm の場合
			ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)	呼び径 115mm の場合
			ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)	呼び径 135mm の場合
		Z3	シャンクロッド φ90mm 用	呼び径 90mm の場合
			シャンクロッド φ115mm 用	呼び径 115mm の場合
			シャンクロッド φ135mm 用	呼び径 135mm の場合
		Z4	打込アダプタ φ90mm 用	呼び径 90mm の場合
			打込アダプタ φ115mm 用	呼び径 115mm の場合
			打込アダプタ φ135mm 用	呼び径 135mm の場合
	市場単価	S	—	
二重管	機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW 級	足場工有りの場合
			ボーリングマシン [ロータリパーカッション式] クローラ型 81kW 級	足場工無しの場合
		K2	—	
		K3	—	
	労務	R1	普通作業員	
		R2	土木一般世話役	
		R3	特殊作業員	
		R4	—	
	材料	Z1	インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)	呼び径 90mm の場合
			インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)	呼び径 115mm の場合
			インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)	呼び径 135mm の場合
			インナーロッド φ146mm 用 (1.5m)	呼び径 146mm の場合
		Z2	インナービット φ90mm 用	呼び径 90mm の場合
			インナービット φ115mm 用	呼び径 115mm の場合
			インナービット φ135mm 用	呼び径 135mm の場合
			インナービット φ146mm 用	呼び径 146mm の場合
		Z3	リングビット φ90mm 用	呼び径 90mm の場合
			リングビット φ115mm 用	呼び径 115mm の場合
			リングビット φ135mm 用	呼び径 135mm の場合
			リングビット φ146mm 用	呼び径 146mm の場合
		Z4	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)	呼び径 90mm の場合
			ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)	呼び径 115mm の場合
			ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)	呼び径 135mm の場合
			ドリルパイプ φ146mm 用 (1.5m)	呼び径 146mm の場合
	市場単価	S	—	

## 3-2 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）（SCB223920）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.5 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 積算条件区分一覧  
(積算単位：本)

防食方式	アンカー鋼材	削孔長	設計荷重 (f)	頭部処理の有無
二重防食	PC 鋼線より線	(表 3.6)	(表 3.7)	(表 3.8)
	PC 鋼線より線（工場組立）	—		
	複合 PC 鋼線より線束	(表 3.6)	f < 400kN	
	PC 鋼棒		400 ≦ f < 1,300kN	
簡易防食	PC 鋼線より線	(表 3.6)	(表 3.7)	
	PC 鋼線より線（工場組立）	—		
	PC 鋼棒	(表 3.6)	f < 400kN	
			400 ≦ f < 1,300kN	

- (注) 1. 上表は、アンカー鋼材の現地加工・組立(シース、防錆材、止水部、スペーサの取付け)、孔内挿入、現場内小運搬、緊張ジャッキによる緊張、クサビ及びナット等での定着及び頭部処理(頭部背面処理を含む)の他、切断機、緊張ジャッキ、油圧ポンプ損料及び電力に関する経費等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。ただし、アンカー(材料費)は含まない。また、PC 鋼線より線を全て工場で組立・加工する場合は、アンカー鋼材の現地加工・組立は含まない。
2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。
3. PC 鋼線より線及び PC 鋼棒の現地加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付けである。
4. 複合 PC 鋼線より線束の現地加工・組立は、スペーサの取付けである。
5. アンカーの材料費は別途計上する。

表 3.6 削孔長

積算条件	区分
削孔長	10m 以内
	10m を超える

表 3.7 設計荷重

積算条件	区分
設計荷重	f < 400kN
	400 ≤ f < 1,300kN
	1,300 ≤ f < 2,000kN

表 3.8 頭部処理の有無

積算条件	区分
頭部処理の有無	有り
	無し

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 9 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価		S	—

## 3-3 グラウト注入（アンカー）（SCB223940）

## (1) 条件区分

グラウト注入(アンカー)における積算条件区分はない。

積算単位は、m<sup>3</sup>とする。

(注) アンカー孔内へのグラウト注入打設、注入材料の他、グラウトミキサ、グラウトポンプ、工事用水中モータポンプ、水槽損料、電力に関する経費等、その他の施工に要する全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

グラウトの使用量は、次式を参考とする。

$$V = \frac{D^2 \times \pi}{4 \times 10^6} \times L \times (1 + K)$$

V：注入量（m<sup>3</sup>）

D：ドリルパイプの外径（mm）

L：削孔長（m）

K：補正係数

(注) 設計における補正係数は、2.2を標準とする。ただし、過去の実績や土質条件等により本係数を使用することが不合理である場合は、別途考慮する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 10 グラウト注入(アンカー) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	普通ポルトランドセメント 25kg 袋入	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価		S	—

## 3-4 ボーリングマシン移設（アンカー）（SCB223950）

## (1) 条件区分

ボーリングマシン移設（アンカー）における積算条件区分はない。

積算単位は、回とする。

（注）1. スキッド型ボーリングマシンの据付・撤去及び上下移動（移設）等，その他の施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 横移動は，3-1 削孔（アンカー）に含む。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 11 ボーリングマシン移設(アンカー) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-5 足場（アンカー）（SCB223970）

## (1) 条件区分

足場（アンカー）における積算条件区分はない。

積算単位は、空  $\text{m}^3$  とする。

- (注) 1. アンカー施工時の足場の設置・撤去作業の他、パイプ、クランプ、足場板、ベース等、その他の施工に要する全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。  
2. 作業面の足場幅は、4.5m を標準とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 12 足場（アンカー）代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕25t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	とび工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-6 アンカー（材料費）

## (1) 条件区分

アンカー（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、式とする。



## ⑭ 構造物とりこわし工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、河川、海岸、砂防、道路工事の既設コンクリート構造物のはつり作業及びとりこわしコンクリート殻積込に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 コンクリートはつり

- (1) 平均はつり厚が6cm以下の場合

## 1-1-2 積込み(コンクリート殻)

- (1) コンクリートはつりにより生じた破砕片の積込み

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 石積とりこわし

- (1) 石積のとりこわしの場合

## 1-2-2 コンクリートはつり

- (1) 沓座拡幅工等のように、はつり（チッピング）作業が含まれている場合  
 (2) 建築物及び舗装版のとりこわしの場合  
 (3) ブロック施工による旧橋の撤去の場合  
 (4) 平均はつり厚が6cmを超える場合  
 (5) 橋梁補修工、道路維持修繕工等で標準歩掛が設定されている工種の場合  
 (6) 上方、水平方向に対するはつり作業の場合

## 1-2-3 積込（コンクリート殻）

- (1) 代表機械より小型の機械を使用する場合

## 2. 施工概要

## 2-1 コンクリートはつり

施工フローは、下記を標準とする。




図 2-1 コンクリートはつり 施工フロー

（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 コンクリートはつり（SCB224250）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 コンクリートはつり 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

平均はつり厚
3cm 以下
3cm を超え 6cm 以下

(注) 1. 上表は、既設のコンクリート構造物表面部のはつり作業、破砕片の除去の他、コンクリートブレーカの賃料、チゼルの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. コンクリート殻の運搬車への積み込み、運搬は含まない。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 コンクリートはつり 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）] 5.0m <sup>3</sup> /min	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 積込み(コンクリート殻) (SCB224260)

## (1) 条件区分

積込み(コンクリート殻)の積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$ とする。

- (注) 1. 構造物とりこわしで生じたとりこわし殻等の積込費用等, その施工に必要な機械・労務・材料を含む。
2. 施工量はとりこわし構造物の破砕前の体積とする。
3. 表 3. 5 の代表機械より小型の機械を使用する場合は別途考慮する。
4. 殻運搬については、「第Ⅱ編第2章共通工㊟殻運搬」により、別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 3 積込(コンクリート殻) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積 $0.8\text{m}^3$ (平積 $0.6\text{m}^3$ )	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	運転手（特殊）	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

(注) 上表の機械は「第Ⅱ編第1章土工㊟土工㊟-1 土工 3-7 積込 (レーズ)」による。

## ⑮ コンクリート削孔工 （建地-D）

## 1. 適用範囲

本資料は、コンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、防護柵類、排水穴等）作業に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

(1) 削孔機械における適用削孔径及び削孔深が表 1-1 及び図 1-1 に該当する場合

表 1-1 削孔機械別適用範囲

削孔機械	削孔径	削孔深
電動ハンマドリル	10mm 以上 30mm 未満	30mm 以上 400mm 以下
さく岩機（ハンドドリル）	30mm 以上 60mm 未満	100mm 以上 1,100mm 以下
コンクリート穿孔機 （電動式コアボーリングマシン）	60mm 以上 100mm 未満	50mm 以上 1,100mm 以下
	100mm 以上 200mm 以下	50mm 以上 400mm 以下

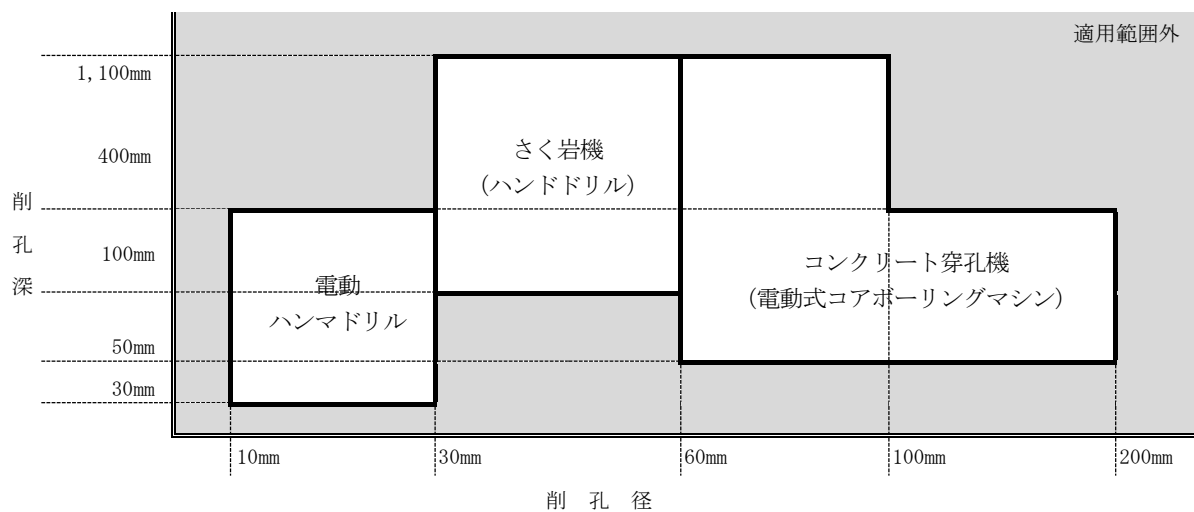


図 1-1 削孔機械の選定

## 1-2 適用できない範囲

(1) 落橋防止に伴う橋台、橋脚の削孔である場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

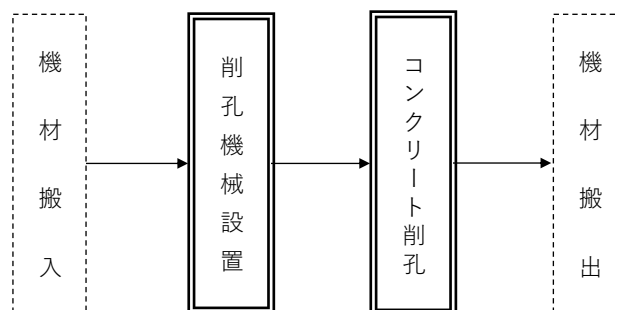


図 2-1 施工フロー

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 コンクリート削孔（電動ハンマドリル）（SCB224410）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 積算条件区分一覧

(積算単位：孔)

削孔深さ
30mm 以上 200mm 未満
200mm 以上 400mm 以下

- (注) 1. 電動ハンマドリルによるコンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、防護柵類、排水穴等）作業の他、ビットの費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 不達孔（削孔ロス）を含み、不達孔の有無に関わらず適用できる。ただし、不達孔の補修にかかる費用は含まないため、必要に応じて別途考慮する。
3. 足場が必要な場合は、別途計上する。
4. 鉄筋を切断しないように事前に鉄筋位置の確認を行う場合には、共通仮設費の技術管理費にて別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2kVA	賃料
	K2	電動ハンマドリル 穴あけ能力 $\phi 38 \sim 40\text{mm}$	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	ガソリン レギュラー スタンド	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 コンクリート削孔（さく岩機）（SCB224420）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.3 コンクリート削孔(さく岩機) 積算条件区分一覧

(積算単位：孔)

削孔深さ
100mm 以上 200mm 未満
200mm 以上 300mm 未満
300mm 以上 400mm 未満
400mm 以上 600mm 未満
600mm 以上 800mm 未満
800mm 以上 1,000mm 未満
1,000mm 以上 1,100mm 以下

- (注) 1. 上表は、さく岩機によるコンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、防護柵類、排水穴等）作業の他、ロッド、ビットの費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 不達孔（削孔ロス）を含み、不達孔の有無に関わらず適用できる。ただし、不達孔の補修にかかる費用は含まないため、必要に応じて別途考慮する。
3. 足場が必要な場合は、別途計上する。
4. 鉄筋を切断しないように事前に鉄筋位置の確認を行う場合には、共通仮設費の技術管理費にて別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 コンクリート削孔(さく岩機) 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（低騒音型）・排出ガス対策型（第1次基準値）〕3.5～3.7m <sup>3</sup> /min	賃料
	K2	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕質量15kg級	
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	軽油1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（SCB224430）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.5 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）積算条件区分一覧

（積算単位：孔）

削孔径	削孔深さ
60mm 以上 64mm 未満	(表 3.6)
64mm 以上 77mm 未満	
77mm 以上 90mm 未満	
90mm 以上 100mm 未満	
100mm 以上 110mm 未満	(表 3.7)
110mm 以上 128mm 未満	
128mm 以上 160mm 未満	
160mm 以上 180mm 未満	
180mm 以上 200mm 以下	

- (注) 1. 上表は、コンクリート穿孔機によるコンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、防護柵類、排水穴等）作業の他、コンクリート穿孔機固定用のアンカー打込に必要な費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. コンクリート穿孔機の適用削孔径に対する使用ビット径は、表 3. 8 を標準とする。
3. 不達孔（削孔ロス）を含み、不達孔の有無に関わらず適用できる。ただし、不達孔の補修にかかる費用は含まないため、必要に応じて別途考慮する。
4. 足場が必要な場合は、別途計上する。
5. 鉄筋を切断しないように事前に鉄筋位置の確認を行う場合には、共通仮設費の技術管理費にて別途計上する。

表 3. 6 削孔深さ（削孔径 60mm 以上 100mm 未満）

積算条件	区分
削孔深さ	50mm 以上 200mm 未満
	200mm 以上 400mm 未満
	400mm 以上 600mm 未満
	600mm 以上 800mm 未満
	800mm 以上 1,100mm 以下

表 3. 7 削孔深さ（削孔径 100mm 以上 200mm 以下）

積算条件	区分
削孔深さ	50mm 以上 200mm 未満
	200mm 以上 400mm 以下

表 3. 8 適用削孔径と使用ビット径

適用削孔径 (mm)	60 以上 64 未満	64 以上 77 未満	77 以上 90 未満	90 以上 110 未満	110 以上 128 未満	128 以上 160 未満	160 以上 180 未満	180 以上 200 以下
使用ビット径 (mm)	64.7	77.4	90.8	110.0	128.5	160.0	180.0	204.0

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.9 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径 $\phi$ 25cm	
	K2	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA	賃料
	K3	—	
労務	R1	特殊作業員	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	ダイヤモンドビット $\phi$ 64.7mm	削孔径 60mm 以上 64mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 77.4mm	削孔径 64mm 以上 77mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 90.8mm	削孔径 77mm 以上 90mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 110mm	削孔径 90mm 以上 110mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 128.5mm	削孔径 110mm 以上 128mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 160mm	削孔径 128mm 以上 160mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 180mm	削孔径 160mm 以上 180mm 未満の場合
		ダイヤモンドビット $\phi$ 204mm	削孔径 180mm 以上 200mm 以下の場合
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	




## ⑩ ガス切断工 （建地－E）

## 1. 適用範囲

本歩掛は、鋼管杭（φ400～φ600）、H鋼杭（H300～H400）、鋼矢板（Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅵ型、Ⅱw型、Ⅲw型、Ⅳw型、10H型、25H型）を現場で、ガス切断する場合に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

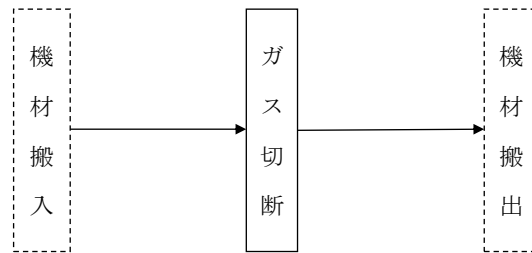

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図 2-1 施工フロー

## 3. 施工歩掛

ガス切断工の施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 施工歩掛

(1箇所当り)

名 称	編成人員		ガス消費量		諸雑費率 (%)
	溶接工 (人)	普通作業員 (人)	酸素 (m <sup>3</sup> )	アセチレン (kg)	
鋼 管 杭	0.25	0.05	2.98	1.19	0.1
H 鋼 杭	0.13	0.07	0.76	0.34	0.2
鋼 矢 板	0.13	0.04	0.63	0.26	0.1

（注）1. 諸雑費は、ガス切断機、ガス調整器の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 防災シート設置等の養生は準備作業であるため、施工歩掛には含まれない。

## 4. 単価表

(1) ガス切断 1 箇所当り単価表

SWB224540

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
溶 接 工		人		表 3.1
普 通 作 業 員		〃		〃
酸 素	ボンベ	m <sup>3</sup>		〃
アセチレン	ボンベ	kg		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## ⑰ 吸出し防止材設置工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、吸出し防止材を設置する作業に適用する。なお、施工方法は表 1. 1 を標準とする

## 1-1 適用できる範囲

(1) 吸出し防止材を施工場所全面に設置する場合

## 1-2 適用できない範囲

(1) 他工種の歩掛や施工パッケージに吸出し防止材設置が含まれている場合

(2) 吸出し防止材を点在で設置する場合

表 1. 1 施工方法の定義

施工方法	区分
全面	ロール状の吸出し防止材を斜面や平面に全面で設置する。
点在	吸出し防止材を構造物の形状に合わせ、切り出し・整形し、吸出し防止する箇所に貼り付け等を行うもの。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。




図 2-1 施工フロー

（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 吸出し防止材設置（SCB224720）

## (1) 条件区分

吸出し防止材設置における積算条件区分はない。積算単位は、 $m^2$ とする。

吸出し防止材の設置、現場内小運搬等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料等を含む）を含む。

重ね合せ等による吸出し防止材の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.08）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 2. 2 吸出し防止材設置 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	—
	K2	—
	K3	—
労務	R1	普通作業員
	R2	土木一般世話役
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	吸出し防止材 合繊不織布 $t=10mm$ 9.8kN/m
	Z2	—
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## ⑱ 目地・止水板設置工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、目地板、止水板を設置する作業に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 目地板

(1) 目地板（厚さ 10～20mm）を水門、樋門、樋管、水路、ボックスカルバート、擁壁等に設置する場合

## 1-1-2 止水板

(1) 止水板（幅 100～300mm）を水門、樋門、樋管、水路、ボックスカルバート、擁壁等に設置する場合

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 目地板

(1) 現場打擁壁工（1）、共同溝工（1）・（2）、ボックスカルバートのうち函渠工（1）の場合

## 1-2-2 止水板

(1) 共同溝工（1）・（2）、ボックスカルバートのうち函渠工（1）、砂防ダムの場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

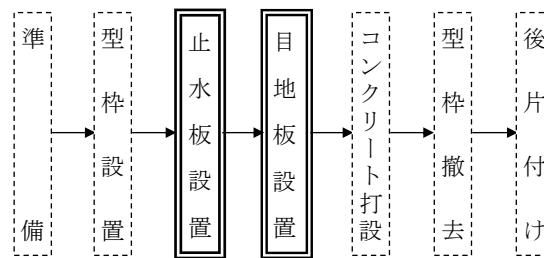


図 2-1 施工フロー

（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 目地板（SCB224710）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 目地板 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>2</sup>)

目地板の種類
瀝青質目地板 t=10mm
瀝青繊維質目地板 t=10mm
樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm
樹脂発泡体(30倍発泡) t=10mm
ゴム発泡体 t=10mm
発泡スチロール t=10mm
瀝青質目地板 t=20mm
瀝青繊維質目地板 t=20mm
樹脂発泡体(15倍発泡) t=20mm
樹脂発泡体(30倍発泡) t=20mm
ゴム発泡体 t=20mm
発泡スチロール t=20mm
各種

(注) 1. 上表は、コンクリート構造物の継目に対する目地板の設置等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等含む）を含む。

2. 目地板の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.12）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 2 目地板 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	
	K2	
	K3	
労務	R1	普通作業員
	R2	土木一般世話役
	R3	
	R4	
材料	Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ 10mm
	Z2	
	Z3	
	Z4	
市場単価	S	

## 3-2 止水板（SCB224810）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.3 止水板 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

止水板の種類
幅 FF200×厚さ 5mm
幅 FC200×厚さ 5mm
幅 CF200×厚さ 5mm
幅 CC200×厚さ 5mm
幅 UC300×厚さ 7mm
幅 S. R200×厚さ 5mm
幅 S. SF200×厚さ 5mm
各種

(注) 1. 上表は、水門、樋門・樋管、水路、ボックスカルバート、擁壁等における止水板の設置等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等含む）を含む。

2. 止水板の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.04）

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 止水板 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	—
	K2	—
	K3	—
労務	R1	普通作業員
	R2	土木一般世話役
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	塩ビ止水板 CF 幅 200×厚さ 5mm
	Z2	—
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## 4. 参考図（塩ビ止水板）

FF（フラット型フラット）



FC（フラット型コルゲート）




CF（センターバルブ型フラット）




CC（センターバルブ型コルゲート）



UC（アンカット型コルゲート）



S.R（特殊型）



S.SF（特殊型）



**⑱ 旧橋撤去工（建地－E）****1. 適用範囲**

本資料は、鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための床版1次破碎と撤去及び桁材撤去と床版2次破碎までの一連作業による撤去工に適用する。

なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。

**1-1 適用できる範囲****1-1-1 高欄撤去**

- (1) 高欄（鋼製、橋梁用ガードレール、アルミ）をガス切断し、運搬車両へ積込む場合
- (2) RC橋及びPC橋

**1-1-2 アスファルト舗装版破碎・積込み**

- (1) 大型ブレーカによりアスファルト舗装版を破碎し、破碎後のアスファルト塊を運搬車両へ積込む場合
- (2) 破碎後のアスファルト塊の大きさがバックホウにより掘削・積込みが可能な場合
- (3) RC橋及びPC橋

**1-1-3 床版1次破碎・撤去**

- (1) 桁下へのコンクリート落下が不可能な場合
- (2) 大型ブレーカによる床版（コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄）を含む）の破碎で床版分割ブロックをクレーン作業半径内における1次仮置き場に仮置きする、もしくは直接積込む場合
- (3) 床版分割撤去の1ブロック当りの大きさがおおよそ2m×5m程度の場合

**1-1-4 床版1次及び2次破碎・撤去**

- (1) 桁下へのコンクリート落下が不可能な場合
- (2) 1-1-3に示す床版1次破碎作業と1次破碎後の床版を、おおよそ30cm×30cm程度まで2次破碎し、運搬車両へ積込む場合

**1-1-5 桁1次切断・撤去**

- (1) 受入れ施設等にて主桁（桁長が12m以下）を2次切断せずに持込みが可能な場合

**1-1-6 桁1次及び2次切断・撤去**

- (1) クレーン作業半径内に2次切断のためのヤードが確保でき、1次切断で主桁を切断せずに撤去が可能な場合
- (2) (1)が不可能な場合で、ベントの設置および切断した主桁（桁長12m以下）の運搬車への積載が可能で別途、2次切断のためのヤードが確保できる場合

**1-1-7 アスファルト塊運搬**

- (1) 旧橋撤去工により発生したアスファルト塊の運搬の場合

**1-1-8 床版運搬**

- (1) 床版1次破碎・撤去後における運搬の場合  
なお、DID（人口集中地区）区間を通過する場合も適用できる。

**1-2 適用できない範囲****1-2-1 高欄撤去**

- (1) コンクリート高欄（壁高欄含む）の場合

**1-2-2 アスファルト舗装版破碎・積込み**

- (1) バックホウ以外の方法により積込むことを前提として特に大きく分割する場合

**1-2-3 床版1次破碎・撤去**

- (1) 桁下へのコンクリート落下が可能な場合
- (2) 2次破碎を実施する必要がある場合
- (3) 床版撤去は橋の上、又は橋台の背面に配置したクレーンでの作業であり、撤去部材長さ、質量、作業半径及び現場条件等により代表機労材規格一覧（表3.3）に示す機械・規格により難しい場合

## 1-2-4 床版1次及び2次破碎・撤去

- (1) 1次破碎における床版撤去は橋の上，または橋台の背面に配置したクレーンでの作業であり，撤去部材長さ，質量，作業半径及び現場条件等により代表機労材規格一覧（表3.4）に示す機械・規格により難しい場合

## 1-2-5 桁1次切断・撤去

- (1) 2次切断を実施する必要がある場合

## 1-2-6 桁1次及び2次切断・撤去

- (1) 2次破碎のためのヤードが確保できない場合
- (2) 現場条件等によりベントの設置が出来ず主桁の切断が不可能な場合
- (3) 現場条件等により切断後の主桁の運搬車への積載が不可能な場合

## 1-2-7 アスファルト塊運搬

- (1) 自動車専用道路を利用する場合
- (2) 運搬距離が60kmを超える場合

## 1-2-8 床版運搬

- (1) 床版2次破碎後のコンクリート塊における運搬の場合
- (2) 自動車専用道路を利用する場合
- (3) 運搬距離が60kmを超える場合



## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

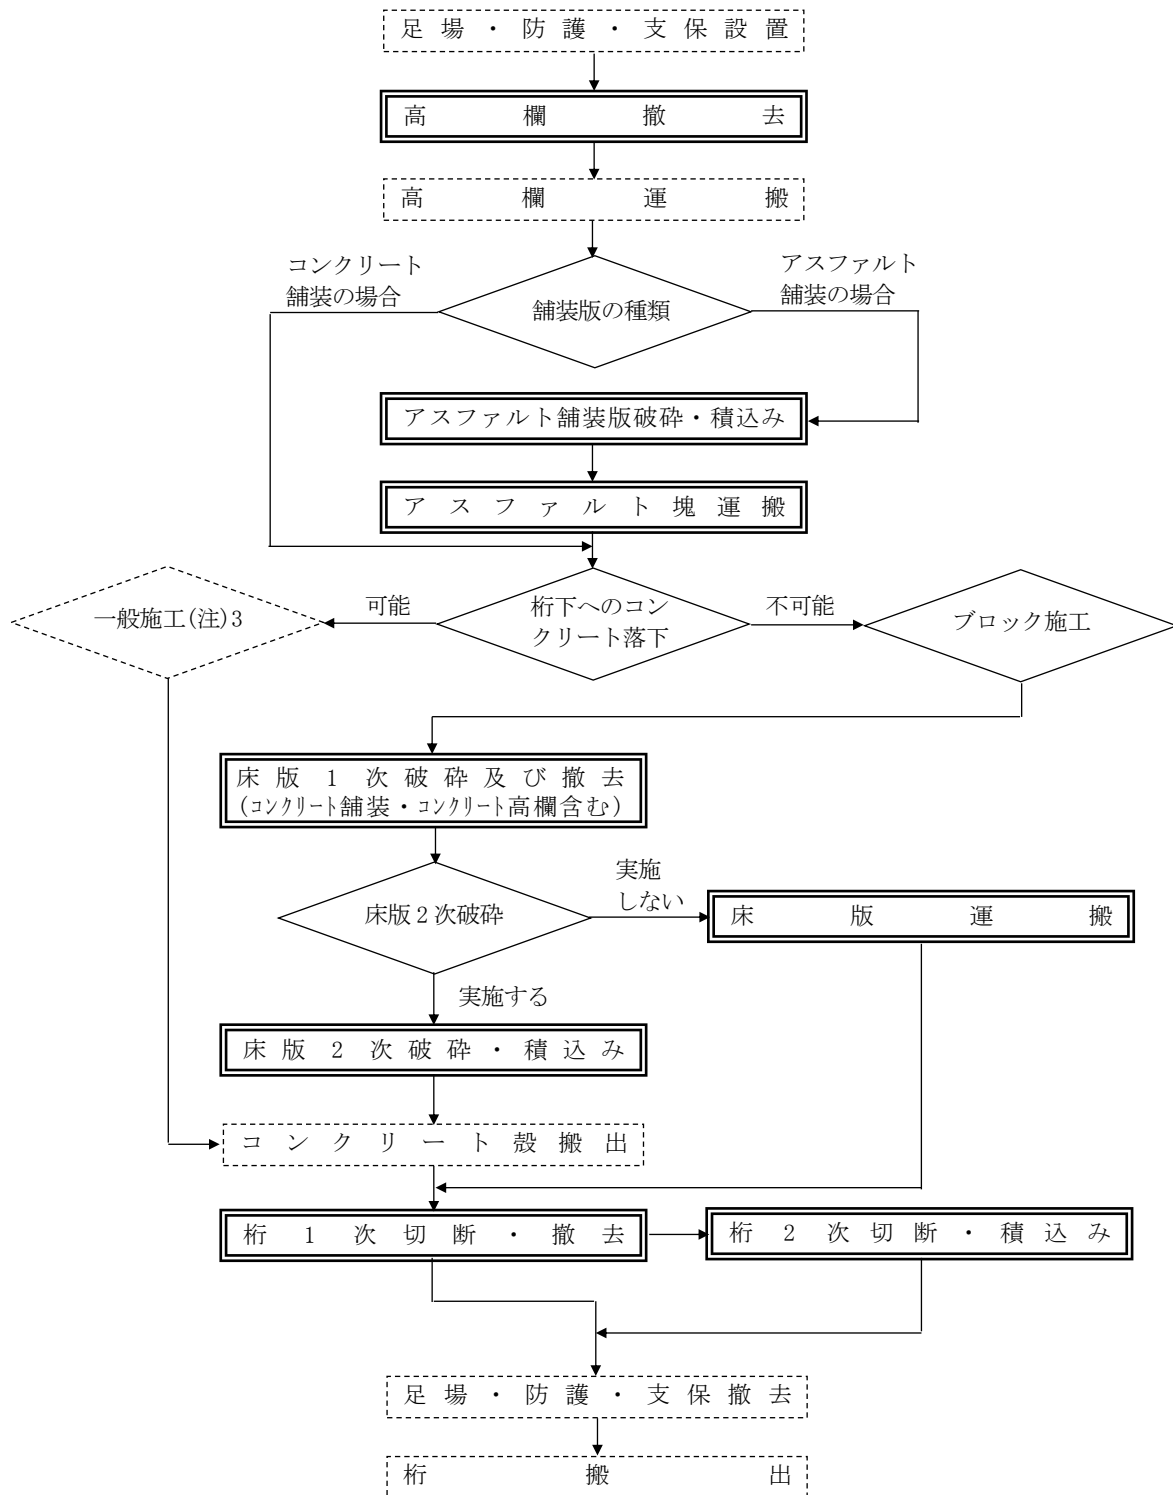


図2-1 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。  
 2. 足場・防護・ベントが必要な場合は、「第Ⅳ編第4章橋梁工③鋼橋架設工」による。  
 3. 一般施工は、「第Ⅱ編第2章④構造物とりこわし工」により別途計上する。

※桁切断の工法選定について、参考として以下を示す。

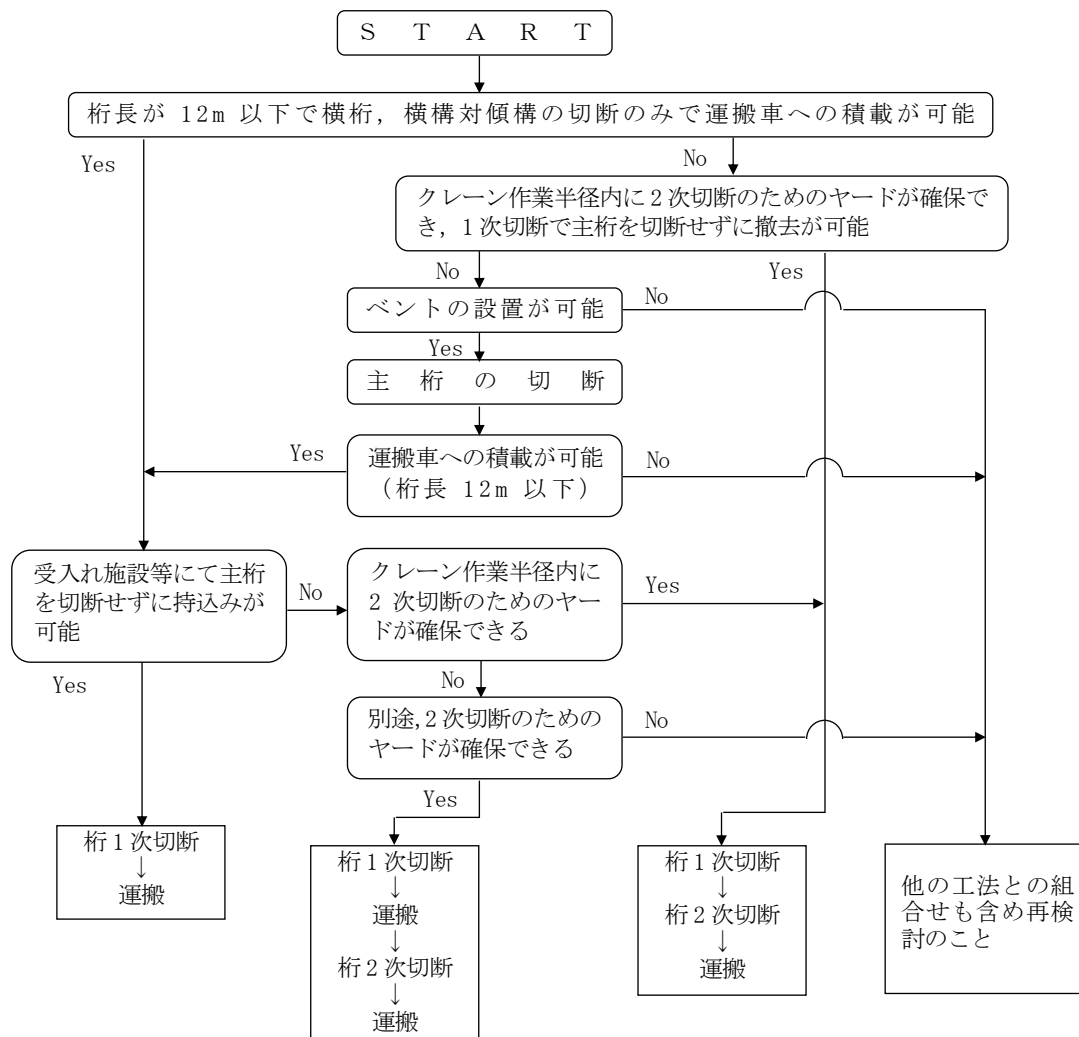


図 2-2 桁切断 工法選定フロー

### 3. 施工パッケージ

#### 3-1 高欄撤去 (SCB224910)

##### (1) 条件区分

高欄撤去における積算条件区分はない。

積算単位は、m とする。

- (注) 1. 旧橋撤去における高欄（鋼製、橋梁用ガードレール、アルミ）の切断から運搬車両への積み込みまでの費用の他、高欄等の切断に必要なガス切断機損料、酸素・アセチレン、玉掛作業に必要なワイヤーロープ等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 設計数量は、高欄撤去の総延長であり、両車線の総撤去延長である。
3. コンクリート高欄（壁高欄含む）は床版 1 次破碎に含む。
4. 高欄撤去で生じた現場発生品の運搬については、別途計上する。
5. 高欄撤去で生じた現場発生品については、別途適正に処理する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.1 高欄撤去 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4t 級 吊能力 2.9t	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	溶接工	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 アスファルト舗装版破碎・積込み（SCB224920）

## (1) 条件区分

アスファルト舗装版破碎・積込みにおける積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$  とする。

- (注) 1. 旧橋撤去における大型ブレーカによるアスファルト舗装版の破碎から運搬車両への積込みの他、チゼルの損耗費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 設計数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。
3. アスファルト塊の積込みは、大型ブレーカのベースマシンであるバックホウによるものであり、大型ブレーカからバケットに付替える方法を標準とする。
4. アスファルト舗装版破碎で生じた、アスファルト塊の運搬は「[3-7 アスファルト塊運搬](#)」により、別途計上する。
5. アスファルト塊処理費は、別途考慮する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 アスファルト舗装版破碎・積込み 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 $0.8\text{m}^3$ （平積 $0.6\text{m}^3$ ）	
	K2	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級	
	K3	—	
労務	R1	土木一般世話役	
	R2	運転手（特殊）	
	R3	普通作業員	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 床版1次破碎・撤去（SCB224930）

## (1) 条件区分

床版1次破碎・撤去における積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^3$ とする。

- (注) 1. 床版をブロック状（1ブロック当りの大きさは、およそ $2m \times 5m$ 程度）に1次破碎後、鉄筋をガス切断したのちクレーンで吊上げて、床版分割ブロックを作業半径内における1次仮置場に仮置きする、もしくは直接積込む作業の他、チゼルの損耗費及び鉄筋切断に必要なガス切断機損料、酸素・アセチレン、玉掛作業に必要なワイヤーロープ等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 設計数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても設計数量に含む。
3. コンクリート殻の積込みは、大型ブレーカのベースマシンであるバックホウによるものであり、大型ブレーカからバケットに付替える方法を標準とする。
4. 床版1次破碎・撤去後における運搬については「3-8 床版運搬」により、別途計上する。
5. 床版1次破碎で生じたコンクリート殻処理費は、別途計上する。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.3 床版1次破碎・撤去 代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t 吊	賃料
	K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 $0.8m^3$ （平積 $0.6m^3$ ）	
	K3	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量600～800kg 級	
労務	R1	溶接工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-4 床版1次及び2次破碎・撤去（SCB224970）

## (1) 条件区分

床版1次及び2次破碎・撤去における積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^3$ とする。

- (注) 1. 1次破碎作業（作業内容は「3-3 床版1次破碎・撤去」（注）1. 参照）の後、その床版分割ブロックをおおよそ $30cm \times 30cm$ 程度まで破碎（2次破碎）及び積込む作業の他、チゼルの損耗費及び鉄筋切断に必要なガス切断機損料、酸素・アセチレン、玉掛作業に必要なワイヤーロープ等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 設計数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても設計数量に含む。
3. コンクリート殻の積込みは、大型ブレーカのベースマシンであるバックホウによるものであり、大型ブレーカからバケットに付替える方法を標準とする。
4. 床版1次破碎・撤去で生じたコンクリート殻の運搬については「3-8 床版運搬」により、別途計上する。
5. 床版2次破碎・撤去で生じたコンクリート殻の運搬については「第Ⅱ編第2章共通工⑤殻運搬」により、別途計上する。
6. 床版2次破碎までに生じたコンクリート殻の処理費は、別途計上する。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.4 床版 1 次及び 2 次破碎・撤去 代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値)] 25t 吊	賃料
	K2	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第 2 次基準値)] 山積 0.8m³ (平積 0.6m³)	
	K3	大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式] 質量 600～800kg 級	
労務	R1	溶接工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	特殊作業員	
材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-5 桁 1 次切断・撤去 (SCB224940)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.5 桁 1 次切断・撤去 積算条件区分一覧

(積算単位：t)

クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格
(表 3.6)	有り	(表 3.6)
	無し	—

- (注) 1. 上表は、桁材の撤去及び積み込みの他、切断作業に必要なガス切断機損料、酸素・アセチレン、玉掛作業に必要なワイヤーロープ等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。  
 2. 撤去部材の大きさと現場条件に応じてクレーンの機種・規格を決定する。  
 3. 桁材の運搬については別途計上する。  
 4. 桁 1 次切断・撤去で生じた現場発成品については、別途適正に処理する。

表 3.6 クレーン規格(相吊クレーン規格)

積算条件	区分
クレーン規格 (相吊クレーン規格)	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t 吊
	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 35t 吊
	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 45t 吊
	ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 50t 吊
	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t 吊
	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t 吊
	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t 吊
	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t 吊
	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t 吊

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.7 桁1次切断・撤去 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格		備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t 吊	賃料
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t 吊	賃料
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t 吊	賃料
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t 吊	賃料
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t 吊	賃料
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t 吊	賃料
	K2	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t 吊(相吊)	・賃料 ・相吊クレーン無しの場合を除く
	K3	—	
労務	R1	溶接工	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	普通作業員	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-6 桁1次及び2次切断・撤去（SCB224980）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.8 桁1次及び2次切断・撤去 積算条件区分一覧（積算単位：t）

クレーン規格	相吊クレーンの有無	相吊クレーン規格
(表 3.6)	有り	(表 3.6)
	無し	—

- (注) 1. 上表は、1次切断による桁材の撤去及び積込みと2次切断による桁の切断、積込みの他、切断作業に必要なガス切断機損料、酸素・アセチレン、玉掛作業に必要なワイヤーロープ等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 撤去部材の大きさと現場条件に応じてクレーンの機種・規格を決定する。
3. 桁材の運搬については別途計上する。
4. 桁切断・撤去で生じた現場発生品については、別途適正に処理する。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3.9 桁1次及び2次切断・撤去 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t 吊
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t 吊
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t 吊
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t 吊
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t 吊
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t 吊
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t 吊
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t 吊
	K2	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 25t 吊(相吊)
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 35t 吊(相吊)
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 45t 吊(相吊)
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 50t 吊(相吊)
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 100t 吊(相吊)
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 120t 吊(相吊)
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 160t 吊(相吊)
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 200t 吊(相吊)
		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 360t 吊(相吊)
	K3	—
労務	R1	溶接工
	R2	特殊作業員
	R3	土木一般世話役
	R4	普通作業員
材料	Z1	—
	Z2	—
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## 3-7 アスファルト塊運搬（SCB224990）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 10 アスファルト塊運搬 積算条件区分一覧

(積算単位：m³)

DID 区間の有無	運搬距離
無し	(表 3. 11)
有り	(表 3. 12)

- (注) 1. 上表は、アスファルト舗装版破砕で生じたアスファルト塊の運搬の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。  
 2. 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む。  
 3. タイヤ損耗の「良好」「普通」「不良」にかかわらず適用できる。  
 4. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。  
 5. 自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。  
 6. D I D（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものである。  
 7. 運搬距離が 60km を超える場合は、別途考慮する。

表 3. 11 運搬距離(1)

積算条件	区分
運搬距離	0. 3km 以下
	0. 5km 以下
	1. 0km 以下
	1. 5km 以下
	2. 0km 以下
	3. 0km 以下
	4. 0km 以下
	5. 5km 以下
	6. 5km 以下
	7. 5km 以下
	9. 5km 以下
	11. 5km 以下
	15. 5km 以下
	22. 5km 以下
	49. 5km 以下
	60. 0km 以下

表 3. 12 運搬距離(2)

積算条件	区分
運搬距離	0. 3km 以下
	0. 5km 以下
	1. 0km 以下
	1. 5km 以下
	2. 0km 以下
	3. 0km 以下
	3. 5km 以下
	5. 0km 以下
	6. 0km 以下
	7. 0km 以下
	8. 5km 以下
	11. 0km 以下
	14. 0km 以下
	19. 5km 以下
	31. 5km 以下
	60. 0km 以下



## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 13 アスファルト塊運搬 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手 (一般)	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-8 床版運搬 (SCB225000)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 14 床版運搬 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

運搬距離
0.7km 以下
2.2km 以下
5.0km 以下
7.9km 以下
12.1km 以下
17.8km 以下
25.0km 以下
34.9km 以下
47.8km 以下
60.0km 以下

- (注) 1. 上表は、床版 1 次破碎後のコンクリート殻の運搬の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。
2. 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理に掛かる費用を含む。
3. タイヤ損耗の「良好」「普通」「不良」にかかわらず適用できる。
4. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。
5. 自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。
6. DID (人口集中地区) 区間の通過にかかわらず適用できる。
7. 運搬距離が 60km を超える場合は、別途考慮する。
8. 床版 2 次破碎後における運搬については「第Ⅱ編第 2 章共通工⑤殻運搬」により、別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。


表 3. 15 床版運搬 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手 (一般)	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2 号 バトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## (参考)

ブロック施工（床版分割施工）とは、コンクリート殻を桁下に落とすことが出来ず、ある程度のブロック状に1次破碎後、鉄筋をガス切断したのちクレーン等でブロックを吊上げて、撤去する工法である。

なお、「床版 1 次破碎・ブロック塊撤去」から「桁 1 次切断・撤去」の作業順序は、下記のとおりである。



作業順は、①の斜線部を大型ブレーカで1次破碎後、鉄筋をガス切断、②のブロック塊をラフテレーンクレーンで撤去し、③の桁材切断・撤去を行う。

## ⑳ かご工（建地-F）

## 1. 適用範囲


本資料は、じゃかご（径 45, 60cm）及びふとんかご（パネル式、高さ 40～60cm、幅 120cm）の施工に適用する。

なお、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における場合には本資料は適用せず、「第Ⅲ編第4章地すべり防止工 ①-5 地すべり防止工（かご工）」による。

## 2. 施工概要


施工フローは、下記を標準とする。

## (1) じゃかご




- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。

## (2) ふとんかご（スロープ式）



- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。

## (3) ふとんかご（階段式）

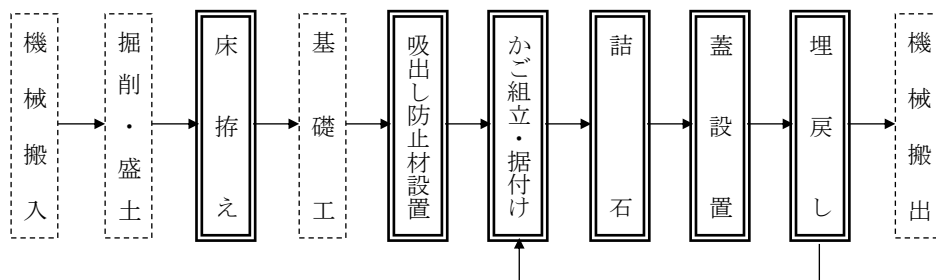

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。

図 2-1 施工フロー

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 ジャかご (SCB225010)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 ジャかご 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	ジャかご径
設置	径 45cm
	径 60cm
撤去	径 45cm
	径 60cm

- (注) 1. 上表は、ジャかご据付のための法面整形、床拵え、吸出し防止材の設置、かご組立・据付け、詰石、かご緊結、埋戻し及び現場内小運搬（平均運搬距離 30m 程度まで）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。
2. 吸出し防止材は全面設置、厚さは 10mm を標準とする。
3. 止杭を必要とする場合は、「3-3 止杭打込」を別途計上すること。
4. 吸出し防止材、詰石材の材料ロスを含む。標準ロス率は、吸出し防止材が +0.07、詰石材が -0.05 とする。
5. 詰石の標準使用量は、径 45cm の場合 1.5m<sup>3</sup>/10m、径 60cm の場合 2.7m<sup>3</sup>/10m とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 ジャかご 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	運転手（特殊）	
	R4	土木一般世話役	
材料	Z1	軽油 1.2号 バトロール給油	
	Z2	詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く
	Z3	鉄線ジャかご 円筒形ジャかご GS-7 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径 45cm	・撤去は除く ・ジャかご径 45cm の場合
		鉄線ジャかご 円筒形ジャかご GS-3 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径 60cm	・撤去は除く ・ジャかご径 60cm の場合
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 ふとんかご (SCB225030)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.3 ふとんかご 積算条件区分一覧

(積算単位：m)

作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格
設置	スロープ式	40cm×120cm
		50cm×120cm
		60cm×120cm
	階段式	40cm×120cm
		50cm×120cm
		60cm×120cm
撤去	スロープ式	40cm×120cm
		50cm×120cm
		60cm×120cm
	階段式	40cm×120cm
		50cm×120cm
		60cm×120cm

- (注) 1. 上表は、ふとんかご据付のための床拵え、吸出し防止材の設置、かご組立・据付け、詰石、蓋設置、埋戻し（階段式のみ）及び現場内小運搬（平均運搬距離 30m 程度まで）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。
2. 吸出し防止材は全面設置、厚さは 10mm を標準とする。本パッケージはふとんかご（階段式）の段数によらず適用できる。
3. 吸出し防止材、詰石材の材料ロスを含む。標準ロス率は、吸出し防止材が+0.07、詰石材が-0.05 とする。
4. 詰石の標準使用量は、40cm×120cm が 4.6m<sup>3</sup>/10m、50cm×120cm が 5.7m<sup>3</sup>/10m、60cm×120cm が 6.8m<sup>3</sup>/10m とする。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.4 ふとんかご 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	運転手（特殊）	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 40cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 40cm×120cm の場合
		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 50cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 50cm×120cm の場合
		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0mm(#8) 網目 13cm 60cm×120cm	・撤去は除く ・ふとんかご規格 60cm×120cm の場合
	Z3	詰石 割ぐり石 150～200mm	撤去は除く
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 止杭打込 (SCB225020)

## (1) 条件区分

止杭打込における条件区分はない。

積算単位は、本とする。

(注) 1. じゃかごの据付けのための止杭打込等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等含む）を含む。

2. 止杭は1本当り松丸太末口9cm、長さ1.5mを標準とする。

## (2) 代表機労材規格


下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 止杭打込 代表機労材規格一覧


項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	杭丸太(松) 長さ1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 4. かご工（じゃかご、ふとんかご）参考図


## (1) じゃかご

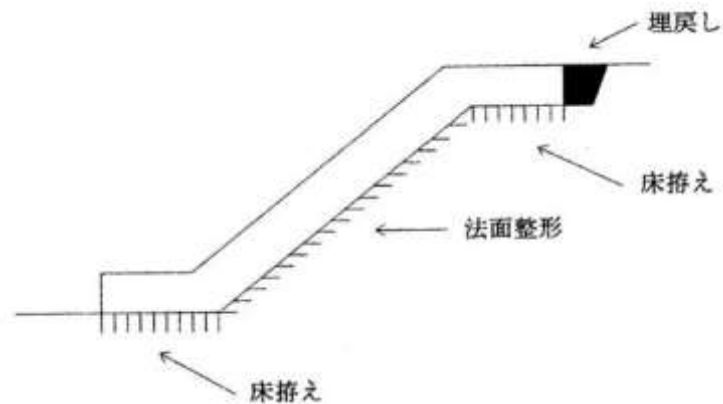

## (2) ふとんかご（階段式）

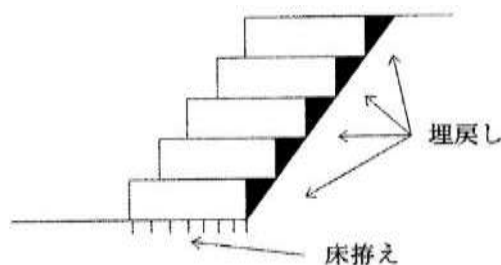

## (3) ふとんかご（スロープ式）



## ②① 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、超軽量材としての発泡スチロール材を盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する発泡スチロール工を人力で施工する場合に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 発泡スチロール設置

- (1) 作業スペース狭隘，施工場所点在等による施工障害が無い場合

## 1-1-2 コンクリート床版

- (1) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が 150m 以下の場合  
(2) 圧送コンクリートのスランプ値が 8～12cm，粗骨材の最大寸法が 40mm 以下の場合

## 1-1-3 支柱設置

- (1) ベースプレート式H形鋼支柱を基礎コンクリートにアンカーボルトで固定する工法を標準とし，H形鋼規格がH300mm×300mm 以下，長さ 9m 以下の場合

## 1-1-4 壁面材設置

- (1) 壁面材 1 枚当りの規格が，長さ 2.5m 以下，幅 0.6m 以下，質量 170kg 以下の場合

## 2. 施工概要

施工フローは，下記を標準とする。

## 2-1 壁面材有り

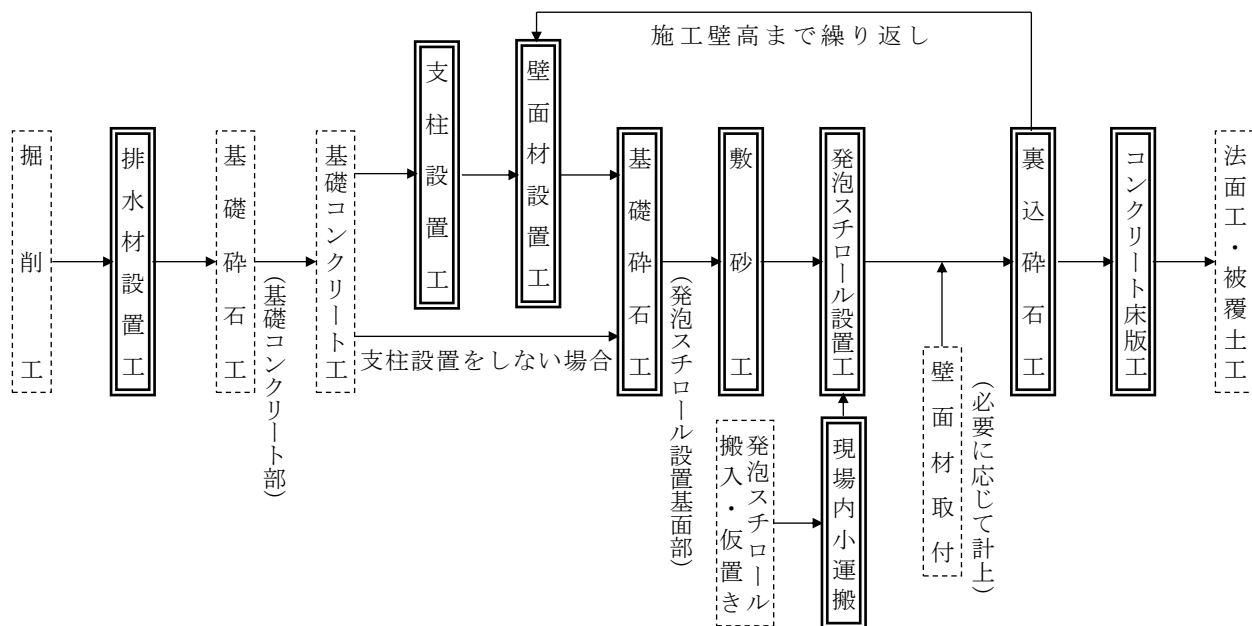


図2-1 壁面材有り 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。  
2. 排水材設置工，基礎砕石工（発泡スチロール設置基面部），敷砂工，裏込砕石工及びコンクリート床版工は，必要に応じて計上する。  
3. 支柱設置工を必要としない場合は，発泡スチロール設置後の壁面材取付費を必要に応じて計上する。

## 2-2 壁面材無し

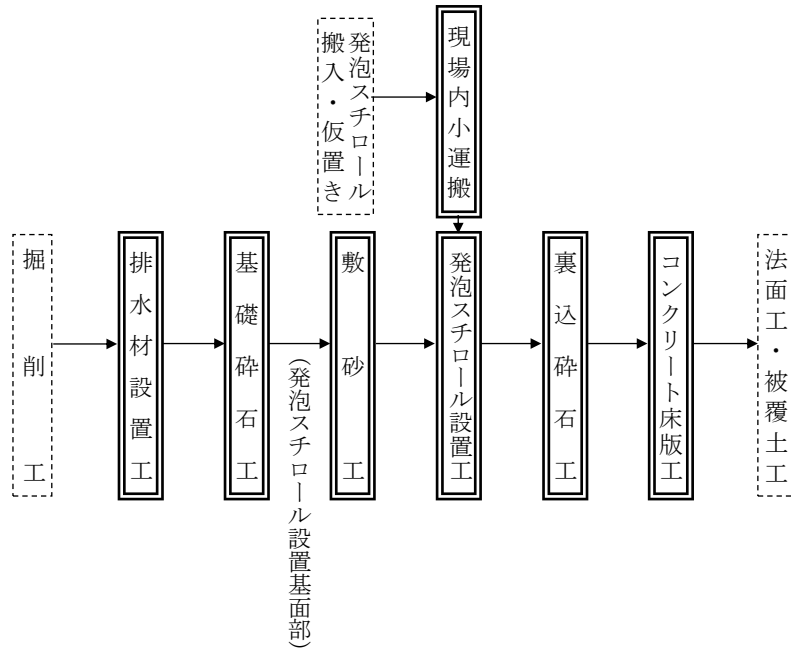


図2-2 壁面材無し 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは二重実線部分のみである。
2. 排水材設置工，基礎砕石工（発泡スチロール設置基面部），敷砂工，裏込砕石工及びコンクリート床版工は，必要に応じて計上する。



## 3. 施工パッケージ

## 3-1 発泡スチロール設置 (SCB225110)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 発泡スチロール設置 積算条件区分一覧  
(積算単位：m³)

雑工種
排水材+基礎碎石+敷砂
排水材+基礎碎石
排水材+敷砂
基礎碎石+敷砂
排水材
基礎碎石
敷砂
無し

- (注) 1. 上表は、発泡スチロールを用いた盛土作業で、発泡スチロールブロックの設置、緊結金具の設置、発泡スチロールブロックの加工、排水材（不織布）の設置、発泡スチロール設置基面部の基礎材（基礎碎石・敷砂）の敷設及び転圧の他、発泡スチロールブロックの加工に用いる電気切断機、電力に関する経費及び発泡スチロールブロックの人力小運搬（運搬距離 200m 程度）の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、発泡スチロール（材料費）及び緊結金具（材料費）は含まない。
2. 発泡スチロールブロック及び緊結金具の材料費は別途計上する。
3. 排水材については、厚さ 10mm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途計上する。
4. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途計上する。なお、基礎碎石工の対象箇所は発泡スチロールブロック設置基面部であり、基礎コンクリート打設基面における基礎碎石工については、別途基礎コンクリート工にて計上する。
5. 敷砂の敷均し厚は、10cm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途計上する。
6. 雑工種における材料は、種別・規格にかかわらず適用できる。
7. 発泡スチロールブロックの固定のために L 型ピンの設置が必要な場合は別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 2 発泡スチロール設置 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 発泡スチロール（材料費）

## (1) 条件区分

発泡スチロール（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^3$  とする。

（注）発泡スチロールのロス率は、次表を標準とする。

表 3. 3 ロス率

材 料	ロ ス 率
発 泡 ス チ ロ ー ル	+ 0. 04

## 3-3 緊結金具（材料費）

## (1) 条件区分

緊結金具（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、個とする。

（注）発泡スチロール同士を結合するために用いる、緊結金具の発泡スチロール  $1\text{m}^3$  当りの使用数量は、ロスを含み次表を標準とする。

また、緊結金具の使用量は下記個数を標準としており、現場条件（より強固な安定性の確保が必要）等により下表により難しい場合は、別途考慮する。

表 3. 4 緊結金具（個/発泡スチロール  $1\text{m}^3$ ）

材 料	数 量
緊 結 金 具	2. 3

## 3-4 コンクリート床版（SCB225120）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.5 コンクリート床版 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

生コンクリート規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格
(表 3.6)	一般養生	延長無し	10cm	(表 3.7)
			15cm	
		50m 未満	10cm	
			15cm	
		50m 以上 100m 未満	10cm	
			15cm	
		100m 以上 150m 以下	10cm	
			15cm	
	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	10cm	
			15cm	
		50m 未満	10cm	
			15cm	
		50m 以上 100m 未満	10cm	
			15cm	
		100m 以上 150m 以下	10cm	
			15cm	

- (注) 1. 上表は、発泡スチロールを用いた軽量盛土のコンクリート床版のコンクリート打設、圧送管の組立・撤去、コンクリート打設におけるホースの筒先作業等を行う機械付補助労務、型枠製作設置・撤去、型枠はく離剤塗布及びケレン作業、金網又は鉄筋設置及びコンクリートの一般養生、H形鋼支柱とコンクリート床版を結合するアンカーの設置労務の他、スペーサー、目地材、型枠材、型枠はく離剤、養生シート、養生マット、角材、パイプ、コンクリートパイプレタ損料、散水等に使用する機械の損料、電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、支柱結合アンカー(材料費)は含まない。
2. 支柱結合アンカーの材料費は別途計上する。
3. コンクリート床版にグラウンドアンカー等を結合する場合は、グラウンドアンカー設置費用を別途計上する。
4. コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が150mを超える場合は、別途考慮する。
5. 作業範囲(30m)を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を50m未満、50m以上100m未満、100m以上150m以下から該当する区分を選択する。
6. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.04)
7. 溶接金網の材料ロスを含む。なお、標準使用量は、床版厚さ10cmの場合101m<sup>2</sup>/10m<sup>3</sup>、床版厚さ15cmの場合69m<sup>2</sup>/10m<sup>3</sup>とする。
8. 溶接金網を標準とするが、鉄筋を使用する場合は必要量計上する。その場合の、鉄筋の切断ロス率は、+1.03とする。

表 3.6 生コンクリート規格

積算条件	区 分	
生コンクリート規格	24-8-25(20) (普通)	18-8-40 (高炉)
	24-12-25(20) (普通)	18-12-40 (高炉)
	18-8-40 (普通)	24-8-25 (早強)
	18-12-40 (普通)	24-12-25 (早強)
	24-8-25(20) (高炉)	各 種
	24-12-25(20) (高炉)	

表 3.7 溶接金網規格

積算条件	区 分
溶接金網規格	G3551 線径 6.0×網目 150×150mm
	各 種

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 8 コンクリート床版 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 65～85m³/h	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	型わく工	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%	
	Z2	丸鉄線溶接金網 G3551 線径 6.0×網目 150×150mm	
	Z3	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-5 支柱結合アンカー（材料費）

## (1) 条件区分

支柱結合アンカー（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、m³とする。

（注）使用数量は、コンクリート床版 m³ 当りの必要数量を計上する。

## 3-6 コンクリート工

基礎コンクリート部におけるコンクリート工については、「[第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工](#)」により別途計上する。

## 3-7 型枠工

基礎コンクリート部における型枠工については、「[第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1 型枠工](#)」により別途計上する。

## 3-8 鉄筋工

基礎コンクリート部における鉄筋工については、「[第Ⅵ編第1章市場単価①-1 鉄筋工（太径鉄筋含む）](#)」により別途計上する。

## 3-9 基礎砕石工

基礎コンクリート部における基礎砕石工については、「[第Ⅱ編第2章共通工②基礎・裏込砕石工](#)」により別途計上する。

## 3-10 支柱設置（SCB225140）

## (1) 条件区分

支柱設置における積算条件区分はない。

積算単位は、本とする。

- (注) 1. ベースプレート式H形鋼支柱(H形鋼規格はH300mm×300mm以下、長さ9m以下)を基礎コンクリートにアンカーボルトで固定する作業の他、アンカーボルトにかかわる労務・材料費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、支柱（材料費）は含まない。
2. 支柱の材料費は別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.9 支柱設置 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕25t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-11 支柱（材料費）

## (1) 条件区分

支柱（材料費）における積算条件区分はない。

積算単位は、本とする。

## 3-12 壁面材設置（SCB225150）

## (1) 条件区分

壁面材設置における積算条件区分はない。

積算単位は、㎡とする。

- (注) 1. 壁面材(壁面材1枚当りの規格が、長さ2.5m以下、幅0.6m以下、重量170kg以下)の設置作業、壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付作業の他、支柱と壁面材との緩衝材、壁面材の継目材、天端目隠しプレート、天端目隠しプレート用ボルト・ナットの材料費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、壁面材（材料費）は含まない。
2. 壁面材の材料費は別途計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 10 壁面材設置 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)・〕25t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	特殊作業員	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-13 壁面材（材料費）

## (1) 条件区分

壁面材（材料費）に条件区分はない。

積算単位は、 $\text{m}^2$ とする。

（注）壁面材(材料費)は壁面材の他、壁面固定金具を含む。

## 3-14 裏込碎石（軽量盛土）（SCB225160）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 11 裏込碎石（軽量盛土）積算条件区分一覧（積算単位：m<sup>3</sup>）

盛土高	付帯工の割合	碎石の種類
6m 以下	-	(表 3. 12)
6m 超え (付帯工有り)	0.1 以下	
	0.1 を超え 0.2 以下	
	0.2 を超え 0.3 以下	
	0.3 を超え 0.4 以下	
	0.4 を超え 0.5 以下	
	0.5 を超え 0.6 以下	
	0.6 を超え 0.7 以下	
	0.7 を超え 0.8 以下	
	0.8 を超え 0.9 以下	
	0.9 を超え 1.0 以下	

(注) 1. 上表は、発泡スチロールを用いた軽量盛土の裏込碎石の施工の他、コンクリートバケットの費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. 付帯工の割合は次式にて算出し、表 3. 11 より選択する。

$$\text{付帯工の割合} = \frac{\text{裏込碎石工の盛土高 6m を超える部分の設計数量 (m}^3\text{)}}{\text{裏込碎石工全体の設計数量 (m}^3\text{)}} \times 100$$

設計数量(m<sup>3</sup>)：ロスを含まない数量

3. 碎石の材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.20)

表 3. 12 碎石の種類

積算条件	区分
碎石の種類	再生クラッシャラン RC-80
	再生クラッシャラン RC-40
	クラッシャラン C-80
	クラッシャラン C-40
	各種

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。


表 3. 13 裏込碎石（軽量盛土）代表機材規格一覧

項目	代表機材規格	備考
機械	K1 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 25t 吊	・賃料 ・盛土高が 6m 以下を除く
	K2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	賃料
	K3	
労務	R1 普通作業員	
	R2 特殊作業員	
	R3 運転手 (特殊)	
	R4 土木一般世話役	
材料	Z1 再生クラッシャラン RC-40	
	Z2 軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z3	
	Z4	
市場単価	S	


## 4. 参考図

## 4-1 壁面材有り

- ・支柱設置工が必要な場合




片側壁図

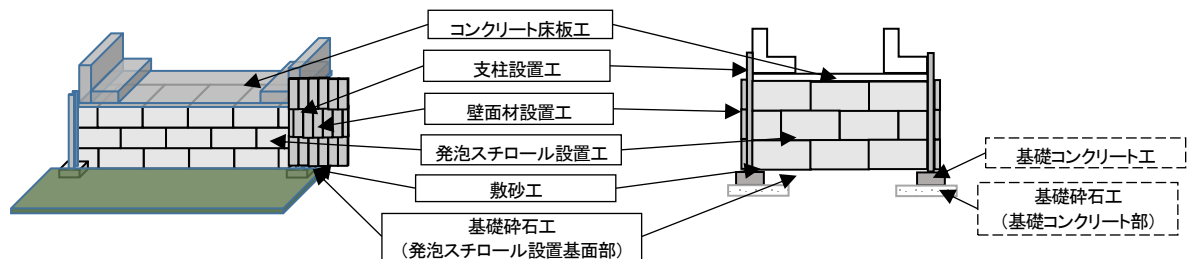


両側壁図

- ・支柱設置工が必要無い場合



壁面材一体型

## 4-2 壁面材無し



橋台裏込

盛土

※本施工パッケージで対応しているのは、実線部分のみである。



## ②② 骨材再生工（自走式）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、自走式破碎機によるコンクリート殻（鉄筋有無）の破碎作業で骨材粒度0～40mmの骨材再生工（自走式）に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

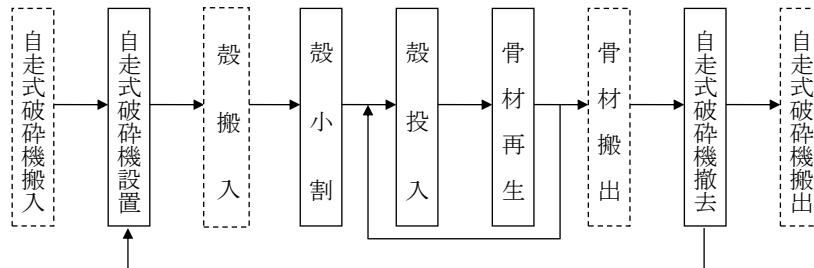


図2-1 施工フロー

- （注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 殻小割が必要な場合は別途計上とする。  
 3. 殻搬入・骨材搬出は現場条件で異なるため別途計上とする。  
 4. 現場で発生した鉄屑の積込み・運搬は別途計上とする。  
 5. 現場内で移動する場合は、自走式破碎機設置・撤去工を計上する。  
 6. 骨材の品質確認が必要な場合は、試験費を別途計上する。

## 3. 自走式破碎機設置・撤去工

## 3-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量
自走式破碎機設置・撤去	自走式破碎機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	台	1
	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃	1

- （注）1. トラッククレーンは、賃料とする。  
 2. 現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。

## 3-2 施工歩掛

自走式破碎機設置・撤去工における施工歩掛は、次表を標準とする。

表3.2 施工歩掛 (1台1回当たり)

名称	単位	設置	撤去
土木一般世話役	人	0.29	0.29
特殊作業員	〃	0.29	0.29
自走式破碎機運転	日	0.29	0.29
トラッククレーン運転	〃	0.17	0.17

## 3-3 諸雑費

諸雑費は、自走式破碎機付属機（磁力式選別機、振動ふるい機、ベルトコンベヤ）等の費用であり、労務費、機械賃料、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表3.3 諸雑費率 (%)

諸雑費率	8
------	---

## 4. 骨材再生工

骨材再生工は、殻小割、殻投入、骨材再生までの作業とする。

## 4-1 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表4. 1 機種を選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量
殻小割	大型ブレーカ	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕質量600～800kg級 バックハウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.6m <sup>3</sup> （平積0.5m <sup>3</sup> ）	台	1
殻投入	バックハウ （クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積1.0m <sup>3</sup> （平積0.7m <sup>3</sup> ）	〃	1
骨材再生	自走式破砕機	ジョークラッシュャ 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×925mm	〃	1

（注）1. 殻小割工は、投入殻寸法が600mmを超える場合に計上する。

2. 現場状況により上表により難しい場合は、別途考慮する。

殻小割：大型ブレーカによりコンクリート殻を破砕する作業

殻投入：自走式破砕機のホッパに破砕殻を投入する作業

骨材再生：バックハウにより投入された破砕殻を自走式破砕機により粒度0～40mmに破砕し、磁力式選別機で鉄屑を除去し、振動ふるい機、ベルトコンベヤで粒度40mm以上の破砕殻を振り分けし、再投入する。

## 4-2 編成人員

骨材再生作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4. 2 日当り編成人員 (人)

土木一般世話役	特殊作業員
1	1

## 4-3 日当り施工量

骨材再生工における日当り施工量は、次表を標準とする。

表4. 3 日当り施工量 (m<sup>3</sup>/日)

骨材再生工	86
-------	----

（注）1. 上表は、破砕前の殻処理量で鉄筋有無にかかわらず同一とする。

2. 変化率は、次のとおりとする。

$$\frac{\text{破砕後の骨材体積}}{\text{破砕前の殻体積}} = 1.0$$

## 4-4 諸雑費

諸雑費は、自走式破砕機付属機（磁力式選別機、振動ふるい機、ベルトコンベヤ）等の費用であり、労務費、賃料、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表4. 4 諸雑费率 (%)

諸雑费率	6
------	---

## 5. 単価表

(1) 自走式破砕機設置（撤去）1台1回当り単価表

SWB225300

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人		表3.2
特殊作業員		〃		〃
自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	日		表3.2 機械損料
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃		表3.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表3.3
計				

(2) 骨材再生工100m<sup>3</sup>当り単価表

SWB225310

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3
特殊作業員		〃	1×100/D	〃
大型ブレーカ運転	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕質量600～800kg級 バックハウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.6m <sup>3</sup> （平積0.5m <sup>3</sup> ）	日	100/D	表4.3 必要に応じて計上 機械損料
バックハウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積1.0m <sup>3</sup> （平積0.7m <sup>3</sup> ）	〃	100/D	表4.3 機械損料
自走式破砕機運転	ジョークラッシャ 機械質量30t級	〃	100/D	表4.3 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.4
計				

(注) D：日当り施工量

(3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
大 型 ブ レ ー カ	バックハウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積0.6m <sup>3</sup> （平積0.5m <sup>3</sup> ）	機－20	機 械 損 料 1 → バックハウ 運転労務数量 → 1.00 燃 料 消 費 量 → 72 機 械 損 料 数 量 → 1.15
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） 〔油圧式〕質量600～800kg級		機 械 損 料 2 → 大型ブレーカ 機械損料数量 → 1.15
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ）	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値） 山積1.0m <sup>3</sup> （平積0.7m <sup>3</sup> ）	機－18	運転労務数量 → 1.00 燃 料 消 費 量 → 110 機 械 損 料 数 量 → 1.12
自 走 式 破 砕 機	ジョークラッシャ 機械質量30t級 供給口開×幅 450×925mm	機－24	燃 料 消 費 量 → 169 機 械 損 料 数 量 → 1.69

(注) 自走式破砕機の運転歩掛は施工歩掛に含まれている。

## ②③ 函渠工

## ②③-1 函渠工（1）（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、函渠工（現場打カルバート工）の施工に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

1-1-1 函渠工(以下のいずれかの条件に該当する場合)

- (1) 土被り範囲 9m 以下で 1 層の現場打ちボックスカルバート（アーチ・門型等形状は問わない）
- (2) 土被り範囲 9m 以下で 1 層 2 連の現場打ちボックスカルバート
- (3) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が 340m 以下の場合

## 1-2 適用できない範囲

- (1) 河川工事で施工する樋門・樋管、水路等
- (2) アーチ型の場合で、支保にセントルを使用する場合

また、本項の適用を外れる現場打カルバート工については、[函渠工（2）](#)を適用する。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。



図 2-1 施工フロー

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 基礎材敷均し・転圧、均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生、目地材設置、止水板設置は、必要に応じて計上する。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 函渠（SCB225410）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3.1 函渠 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

コンクリート 規格	内空寸法 (幅×高さ)m	養生工の 種類	基礎碎石 の有無	均しコンクリート の有無	目地・止水板 の有無	圧送管延長距離区分
(表 3. 2)	(表 3. 3)	一般養生・特殊 養生 (練炭・ ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				無し	無し	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
			無し	有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
			無し	無し	無し	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
			無し	有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
			無し	無し	無し	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下

(積算単位: m<sup>3</sup>)

コンクリート 規格	内空寸法 (幅×高さ)m	養生工の 種類	基礎碎石 の有無	均しコンクリート の有無	目地・止水板 の有無	圧送管延長距離区分
(表 3. 2)	(表 3. 3)	特別な 養生 (仮囲い内 ジェットヒータ)	有り	有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				無し	無し	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				無し	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
			無し	有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				無し	無し	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				有り	有り	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下
				無し	無し	延長無し
						110m 未満
						110m 以上 220m 未満
						220m 以上 340m 以下

- (注) 1. 上表は、現場打函渠(ボックスカルバートの1層2連まで、土被りが9m以下)のコンクリート打設、基礎碎石、手摺先行型枠組足場、支保、型枠(はく離剤塗布及びケレン作業含む)、養生(一般養生、特殊養生(練炭)、特殊養生(ジェットヒータ)、仮囲い内ジェットヒータ養生)、圧送管の組立・撤去、目地材、止水板等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。ただし、化粧型枠、冬期の施工での雪寒仮囲い等の特別な足場は含まない。
2. 設計数量は、ウイング、段落ち防止用枕を含む本体コンクリートの数量とする。
3. 基礎形式は、直接基礎・杭基礎のいずれも適用できる。
4. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.02)
5. 「特別な養生(仮囲い内ジェットヒータ)」の場合には「手摺先行型枠組足場」費用は含んでいない。手摺先行型枠組足場が必要な場合は、別途計上する。
6. 基礎碎石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。
7. 化粧型枠を使用する場合は、加算費用を、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1型枠工3-2化粧型枠」により別途計上する。
8. 基礎碎石、均しコンクリートの材料は、種類・規格にかかわらず適用できる。ただし、目地・止水板についてはI型を標準としており、I型以外の構造の目地・止水板を使用する場合は、別途計上する。
9. 可とう継手、取替式止水板及びグラウト管等を施工する場合は、別途計上する。
10. 防水工・防水層保護工を施工する場合は、別途計上する。
11. 手摺先行型枠組足場には、二段手摺及び幅木の機能を有している。
12. 作業範囲(30m)を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を110m未満、110m以上220m未満、220m以上340m以下から該当する区分を選択する。


表 3. 2 コンクリート規格

積算条件	区分	
コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	24-12-25(20) (高炉)
	21-12-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)
	24-8-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)
	24-12-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)
	21-8-40(普通)	24-12-40(高炉)
	21-12-40(普通)	21-8-25(早強)
	24-8-40(普通)	21-12-25(早強)
	24-12-40(普通)	24-8-25(早強)
	21-8-25(20) (高炉)	24-12-25(早強)
	21-12-25(20) (高炉)	各種
	24-8-25(20) (高炉)	

表 3. 3 内空寸法

積算条件	区分	
内空寸法 (幅×高さ)	①	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満
	②	幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満
	③	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下
	④	幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下
	⑤	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満
	⑥	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満
	⑦	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満
	⑧	幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満
	⑨	幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下
	⑩	幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下
	⑪	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下
	⑫	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下

図 3-1 函渠工内空寸法区分

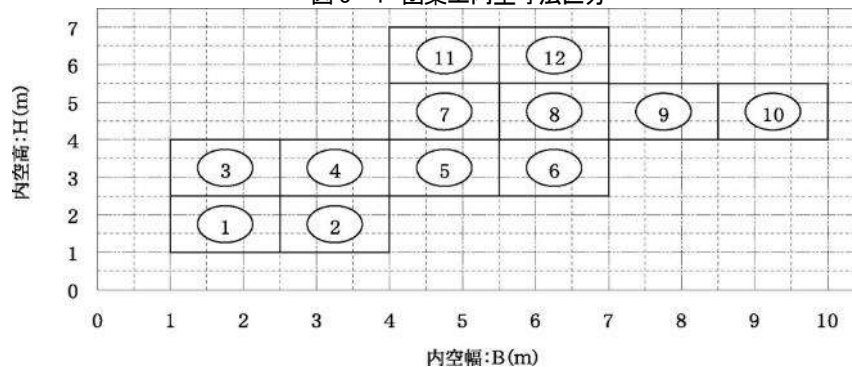

1 層 2 連の場合の考え方は、下表のとおりである。

表 3. 4 1 層 2 連の場合

	適用する積算条件区分
同一断面の場合	1連分の B, H で決定
異形断面の場合	大きい断面の B, H で決定

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.5 函渠 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力 90～110m³/h	
	K2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	・仮囲い内ジェットヒータの場合 ・賃料
	K3	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータの場合
労務	R1	型わく工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	とび工	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24－12－25(20) W/C 55%	
	Z2	軽油 1.2号 バトロール給油	
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	仮囲い内ジェットヒータの場合
	Z4	－	
市場単価	S	－	

## 3-2 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章市場単価①鉄筋工」により別途計上する。



## ②3-2 函渠工（2）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、「第Ⅱ編第2章共通工②-1 函渠工（1）」の適用範囲を外れた函渠工コンクリート打設に適用する。

表 1.1 函渠工(1)の適用範囲を外れた函渠工

河川工事で施工する函渠	道路工事で施工する函渠
・樋門・樋管(函渠(門柱等含む), 翼壁, 水叩), ボックス形式の水路等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボックスカルバート以外の函渠</li> <li>・1層又は1層2連以外の函渠</li> <li>・土被りが9mを超える函渠</li> <li>・「②3-1函渠工(1), 図3-1函渠工内空寸法区分」の適用範囲 を外れる函渠</li> </ul>

## 1-1 適用できる範囲

- (1) コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が 340m 以下の場合
- (2) 圧送コンクリートのスランプ値が 8～12cm, 粗骨材の最大寸法が 40mm 以下の場合

## 2. 施工パッケージ

## 2-1 コンクリート（場所打函渠）（SCB225510）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 2.1 コンクリート(場所打函渠) 積算条件区分一覧

(積算単位: m<sup>3</sup>)

生コンクリート規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分
(表 2.2)	一般養生	延長無し
		110m 未満
		110m 以上 220m 未満
		220m 以上 340m 以下
	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し
		110m 未満
		110m 以上 220m 未満
		220m 以上 340m 以下
	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し
		110m 未満
		110m 以上 220m 未満
		220m 以上 340m 以下

- (注) 1. 上表は、場所打函渠のコンクリート打設、ホースの筒先作業等を行う機械付補助労務、養生、圧送管組立・撤去の他、コンクリートパイプレータ損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 設計数量は、ウイング、段落ち防止用枕を含む本体コンクリートの数量とする。
3. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.02）
4. 仮囲い内ジェットヒータ養生の場合は、足場費を別途計上する。
5. 作業範囲（30m）を超えて圧送管を延長する場合は、超えた部分の延長距離を 110m 未満、110m 以上 220m 未満、220m 以上 340m 以下から該当する区分を選択する。

表 2.2 生コンクリート規格

積算条件	区分	
生コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	21-8-40(高炉)
	21-12-25(20) (普通)	21-12-40(高炉)
	24-8-25(20) (普通)	24-8-40(高炉)
	24-12-25(20) (普通)	24-12-40(高炉)
	21-8-40(普通)	21-8-25 (早強)
	21-12-40(普通)	21-12-25 (早強)
	24-8-40(普通)	24-8-25 (早強)
	24-12-40(普通)	24-12-25 (早強)
	21-8-25(20) (高炉)	各種
	21-12-25(20) (高炉)	
	24-8-25(20) (高炉)	
	24-12-25(20) (高炉)	

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 2.3 コンクリート(場所打函渠) 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m³/h	
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	・ 賃料 ・ 一般養生を除く
	K3	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 定格容量 (50/60Hz) 2.7/3kVA	仮囲い内ジェットヒータ養生の場合
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手 (特殊)	
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	
	Z2	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	一般養生を除く
	Z3	軽油 1.2 号 パトロール給油	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 2-2 型枠工

型枠工は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②型枠工」により別途計上する。

## 2-3 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章市場単価①鉄筋工」により別途計上する。

## 2-4 足場工

足場工は、「第Ⅱ編第5章仮設工⑦-1足場工」により別途計上する。

## 2-5 支保工

支保工は、「第Ⅱ編第5章仮設工⑦-2支保工」により別途計上する。

## 2-6 その他

上記以外に必要なものについては、該当する各工種により別途計上する。

## ②3-3 函渠工（3） 大型プレキャストボックスカルバート工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、プレキャスト製大型プレキャストボックスカルバートの設置に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 2分割の大型プレキャストボックスカルバート設置

(1) 大型プレキャストボックスカルバートの製品長 1.0m, 1.5m, 2.0m

① 大型プレキャストボックスカルバートの内空幅が 3.75m 超え 5.0m 以下、内空高が 1.5m 以上 4.0m 以下の  
場合

## 1-1-2 4分割の大型プレキャストボックスカルバート設置

(1) 大型プレキャストボックスカルバートの製品長 1.0m 及び 1.5m

① 内空幅が 3.75m 以上 5.0m 以下、内空高が 4.0m 超え 6.0m 以下の場合

② 内空幅が 5.0m 超え 8.0m 以下、内空高が 4.0m 以上 6.0m 以下の場合

③ 内空幅が 8.0m 超え 10.0m 以下、内空高が 5.0m 以上 6.0m 以下の場合

(2) 大型プレキャストボックスカルバートの製品長 2.0m

① 内空幅が 3.75m 以上 5.0m 以下、内空高が 4.0m 超え 6.0m 以下の場合

② 内空幅が 5.0m 超え 8.0m 以下、内空高が 4.0m 以上 6.0m 以下の場合

## 1-1-3 止水シート設置

(1) 漏水等が懸念される箇所

(2) 大型プレキャストボックスカルバートの外側に止水シート幅 250mm～300mm の場合

## 1-2 適用できない範囲

(1) 製品長が 1.0m, 1.5m, 2.0m 以外の場合

(2) 1ブロックを1部材で構成するボックスカルバート

(3) 3分割の大型プレキャストボックスカルバート

(4) 頂版又は底版が場所打コンクリートタイプの場合

(5) プレキャスト製の門型、アーチカルバート及び2連分割タイプの場合

(6) 大型プレキャストボックスカルバートの線形が曲線の場合

(7) グラウトを使用しないPCアンボンドケーブル等による施工の場合

(8) 横引き工法の場合

## 2. 施工概要

2-1 施工フローは、下記を標準とする。


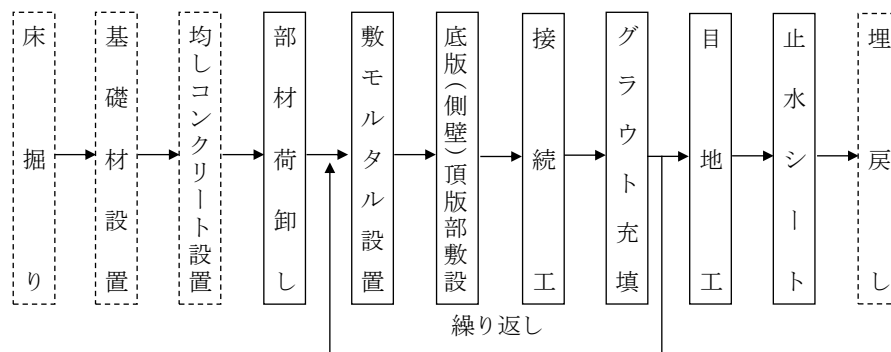


図2-1 施工フロー


（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 2-2 参考図等

## ①標準タイプ

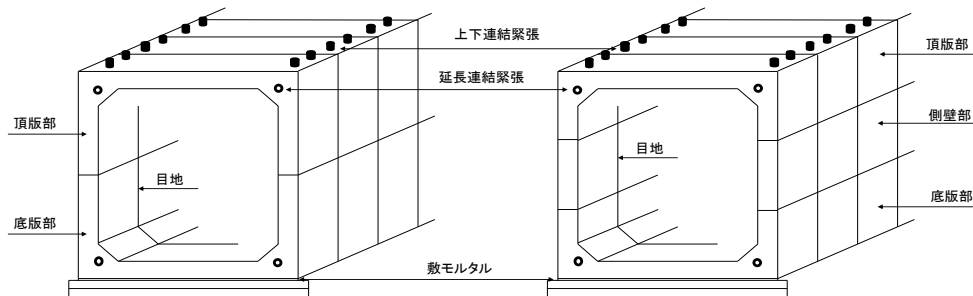

## ②止水シートがある場合

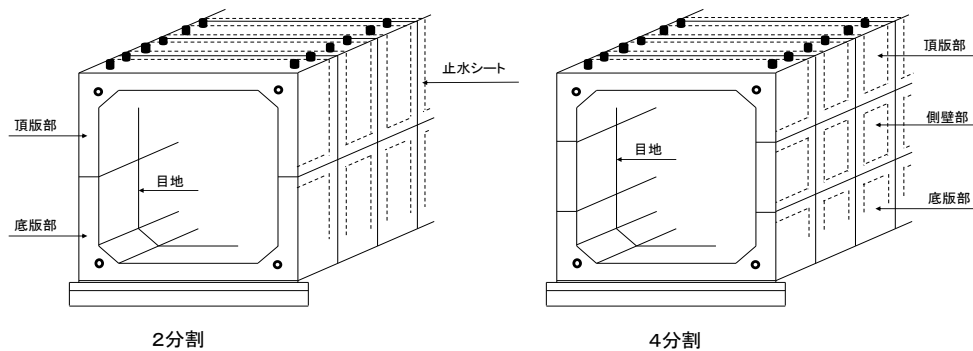

(注) 止水シートは、漏水等が懸念される箇所に設置した延べ延長を計上する。

## 3. 機種の選定

## 3-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	最大部材質量	単位	数量
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	5t以下	台	1
	油圧伸縮ジブ型 35t吊	5tを超え6t以下		
	油圧伸縮ジブ型 45t吊	6tを超え8.5t以下		
	油圧伸縮ジブ型 60t吊	8.5tを超え10t以下		
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t吊	10tを超え11t以下		
	油圧伸縮ジブ型 160t吊	11tを超え18t以下		
	油圧伸縮ジブ型 200t吊	18tを超え27t以下		

(注) 1. クレーンの作業半径について、ラフテレーンクレーンは約12mまで、トラッククレーンは約22mまでを標準とする。

2. 現場条件により、上表により難しい場合は、クレーンの機種・規格を別途選定する。その際にも本歩掛を適用できる。

3. クレーンは、賃料とする。

## 3-2 付属機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.2 付属機種の選定

機 械 名	規 格	単位	数量
高所作業車	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	台	2


(注) 高所作業車は、賃料とする。

## 4. 施工歩掛

## 4-1 施工歩掛

## (1) 歩掛区分

大型プレキャストボックスカルバートの歩掛区分は、次図のとおりとする。

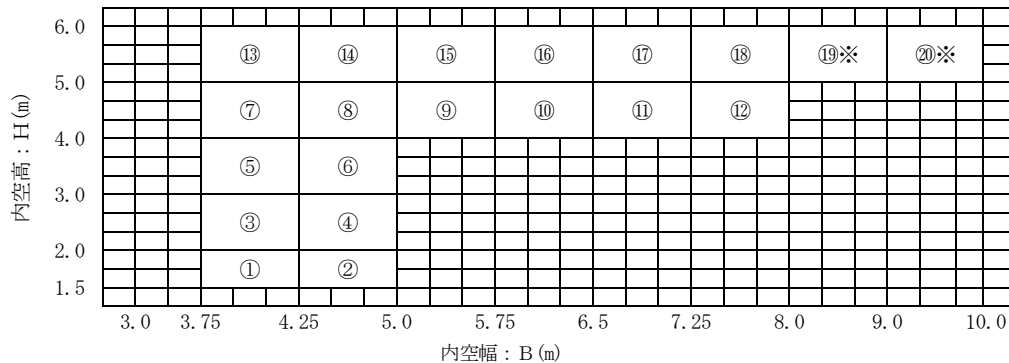

- ① 2分割  $3.75 < B \leq 4.25$ ,  $1.5 \leq H \leq 2.0$       ② 2分割  $4.25 < B \leq 5.0$ ,  $1.5 \leq H \leq 2.0$   
 ③ 2分割  $3.75 < B \leq 4.25$ ,  $2.0 < H \leq 3.0$       ④ 2分割  $4.25 < B \leq 5.0$ ,  $2.0 < H \leq 3.0$   
 ⑤ 2分割  $3.75 < B \leq 4.25$ ,  $3.0 < H \leq 4.0$       ⑥ 2分割  $4.25 < B \leq 5.0$ ,  $3.0 < H \leq 4.0$   
 ⑦ 4分割  $3.75 \leq B \leq 4.25$ ,  $4.0 < H \leq 5.0$       ⑧ 4分割  $4.25 < B \leq 5.0$ ,  $4.0 < H \leq 5.0$   
 ⑨ 4分割  $5.0 < B \leq 5.75$ ,  $4.0 \leq H \leq 5.0$       ⑩ 4分割  $5.75 < B \leq 6.5$ ,  $4.0 \leq H \leq 5.0$   
 ⑪ 4分割  $6.5 < B \leq 7.25$ ,  $4.0 \leq H \leq 5.0$       ⑫ 4分割  $7.25 < B \leq 8.0$ ,  $4.0 \leq H \leq 5.0$   
 ⑬ 4分割  $3.75 \leq B \leq 4.25$ ,  $5.0 < H \leq 6.0$       ⑭ 4分割  $4.25 < B \leq 5.0$ ,  $5.0 < H \leq 6.0$   
 ⑮ 4分割  $5.0 < B \leq 5.75$ ,  $5.0 < H \leq 6.0$       ⑯ 4分割  $5.75 < B \leq 6.5$ ,  $5.0 < H \leq 6.0$   
 ⑰ 4分割  $6.5 < B \leq 7.25$ ,  $5.0 < H \leq 6.0$       ⑱ 4分割  $7.25 < B \leq 8.0$ ,  $5.0 < H \leq 6.0$   
 ⑲ 4分割  $8.0 < B \leq 9.0$ ,  $5.0 \leq H \leq 6.0$  ※      ⑳ 4分割  $9.0 < B \leq 10.0$ ,  $5.0 \leq H \leq 6.0$  ※

※ 製品長 L=2.0m は除く

図4-1 大型プレキャストボックスカルバートの歩掛区分

(2) 大型プレキャストボックスカルバート歩掛は、次表を標準とする。

表 4. 1 2分割大型プレキャストボックスカルバート歩掛 (10m 当り)

製品長		2.0m/個						1.5m/個					
名称	単位	①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④	⑤	⑥
土木一般世話役	人	1.7	1.9	2.1	2.2	2.5	2.7	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1
とび工	〃	1.6	1.8	2.0	2.1	2.4	2.6	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9
特殊作業員	〃	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1
普通作業員	〃	4.0	4.3	4.7	5.1	5.7	6.2	4.5	4.8	5.3	5.7	6.4	7.0
高所作業車	日	3.4	3.8	4.2	4.4	5.0	5.4	4.0	4.2	4.6	5.0	5.6	6.2
諸雑費率	%	25						23					

製品長		1.0m/個					
名称	単位	①	②	③	④	⑤	⑥
土木一般世話役	人	2.2	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4
とび工	〃	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2
特殊作業員	〃	2.9	3.1	3.5	3.7	4.2	4.6
普通作業員	〃	5.0	5.3	5.9	6.4	7.1	7.8
高所作業車	日	4.4	4.6	5.2	5.6	6.2	6.8
諸雑費率	%	22					

- (注) 1. 上記歩掛は、部材荷卸し、敷モルタル、底版部・頂版部敷設、P C 鋼棒等接続・緊張・グラウト充填、切欠部充填及び目地設置等を含む。
2. 諸雑費は、油圧ジャッキ（ポンプ含む）・レバーブロック・グラウトポンプ・ミキサーの損料・発動発電機の賃料及び運転経費、電力に関する経費、足場工・敷モルタル材等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表4.2 4分割大型プレキャストボックスカルバート歩掛 (10m当り)

製 品 長		2.0m/個											
名 称	単位	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
土木一般世話役	人	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.2
と び 工	〃	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	2.4	2.6	3.0	3.3	3.7	4.0
特殊作業員	〃	2.9	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	3.3	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7
普通作業員	〃	4.9	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	5.7	6.4	7.2	8.0	8.9	9.7
高所作業車	日	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	5.0	5.6	6.4	7.0	7.8	8.4
諸 雑 費 率	%	37											

製 品 長		1.5m/個													
名 称	単位	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
土木一般世話役	人	2.8	3.1	3.5	3.9	4.2	4.6	3.2	3.6	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.6
と び 工	〃	2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	3.0	3.4	3.8	4.3	4.7	5.2	5.7	6.3
特殊作業員	〃	3.7	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	4.3	4.8	5.4	6.0	6.7	7.3	8.0	8.9
普通作業員	〃	6.3	7.0	7.9	8.8	9.6	10.5	7.3	8.2	9.3	10.3	11.4	12.5	13.7	15.1
高所作業車	日	5.6	6.2	7.0	7.8	8.4	9.2	6.4	7.2	8.2	9.0	10.0	11.0	12.0	13.2
諸 雑 費 率	%	31													

製 品 長		1.0m/個													
名 称	単位	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
土木一般世話役	人	3.4	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7	4.0	4.4	5.0	5.6	6.2	6.8	7.4	8.2
と び 工	〃	3.2	3.6	4.0	4.5	4.9	5.4	3.7	4.2	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.8
特殊作業員	〃	4.5	5.1	5.7	6.3	6.9	7.6	5.3	5.9	6.7	7.5	8.2	9.0	9.9	10.9
普通作業員	〃	7.7	8.7	9.7	10.8	11.8	13.0	9.0	10.1	11.4	12.8	14.1	15.4	16.9	18.7
高所作業車	日	6.8	7.6	8.6	9.6	10.4	11.4	8.0	8.8	10.0	11.2	12.6	13.6	14.8	16.4
諸 雑 費 率	%	27													

(注) 1. 上記歩掛は、部材荷卸し、敷モルタル、底版部・側壁部・頂版部敷設、P C鋼棒等接続・緊張・グラウト充填、切欠部充填及び目地設置等を含む。

2. 諸雑費は、油圧ジャッキ（ポンプ含む）・レバーブロック・グラウトポンプ・ミキサーの損料・発動発電機の賃料及び運転経費、電力に関する経費、足場工・敷モルタル材等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

(3) 止水シート歩掛は、次表を標準とする。

表4.3 止水シート歩掛 (10m当り)

名 称	規 格	単位	数量
土木一般世話役		人	0.1
特 殊 作 業 員		〃	0.2
普 通 作 業 員		〃	0.4
高 所 作 業 車	クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m	日	0.2
諸 雑 費 率		%	5

(注) 1. 上記歩掛は、施工箇所の清掃及び止水シート設置等を含む。

2. 諸雑費は、ホウキ・コテ・ハケ・ローラ・養生テープ等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3. 止水シートの使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m)} = \text{設計数量 (m)} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式4. 1}$$

K : ロス率 (+0.02)

## 4-2 日当り作業量

(1) 大型プレキャストボックスカルバート1日当り作業量は、次表を標準とする。

表4.4 大型プレキャストボックスカルバート標準日当り作業量(D) (m/日)

歩掛区分		製品長	2.0m	1.5m	1.0m
2分割	①	$3.75 < B \leq 4.25, 1.5 \leq H \leq 2.0$	5.9	5.0	4.5
	②	$4.25 < B \leq 5.0, 1.5 \leq H \leq 2.0$	5.3	4.8	4.3
	③	$3.75 < B \leq 4.25, 2.0 < H \leq 3.0$	4.8	4.3	3.8
	④	$4.25 < B \leq 5.0, 2.0 < H \leq 3.0$	4.5	4.0	3.6
	⑤	$3.75 < B \leq 4.25, 3.0 < H \leq 4.0$	4.0	3.6	3.2
	⑥	$4.25 < B \leq 5.0, 3.0 < H \leq 4.0$	3.7	3.2	2.9
4分割	⑦	$3.75 \leq B \leq 4.25, 4.0 < H \leq 5.0$	4.8	3.6	2.9
	⑧	$4.25 < B \leq 5.0, 4.0 < H \leq 5.0$	4.2	3.2	2.6
	⑨	$5.0 < B \leq 5.75, 4.0 \leq H \leq 5.0$	3.7	2.9	2.3
	⑩	$5.75 < B \leq 6.5, 4.0 \leq H \leq 5.0$	3.3	2.6	2.1
	⑪	$6.5 < B \leq 7.25, 4.0 \leq H \leq 5.0$	3.0	2.4	1.9
	⑫	$7.25 < B \leq 8.0, 4.0 \leq H \leq 5.0$	2.8	2.2	1.8
	⑬	$3.75 \leq B \leq 4.25, 5.0 < H \leq 6.0$	4.0	3.1	2.5
	⑭	$4.25 < B \leq 5.0, 5.0 < H \leq 6.0$	3.6	2.8	2.3
	⑮	$5.0 < B \leq 5.75, 5.0 < H \leq 6.0$	3.1	2.4	2.0
	⑯	$5.75 < B \leq 6.5, 5.0 < H \leq 6.0$	2.9	2.2	1.8
	⑰	$6.5 < B \leq 7.25, 5.0 < H \leq 6.0$	2.6	2.0	1.6
	⑱	$7.25 < B \leq 8.0, 5.0 < H \leq 6.0$	2.4	1.8	1.5
	⑲	$8.0 < B \leq 9.0, 5.0 \leq H \leq 6.0$	-	1.7	1.4
	⑳	$9.0 < B \leq 10.0, 5.0 \leq H \leq 6.0$	-	1.5	1.2

(注) この日当り作業量は、部材荷卸し、足場工、敷モルタル、底版部・(側壁部)・頂版部敷設、P C鋼棒等接続・緊張・グラウト充填、切欠部充填及び目地設置までの一連の作業のものである。

## 5. 基礎材

基礎材が必要な場合は、「第Ⅱ編2章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。

## 6. 均しコンクリート

均しコンクリートが必要な場合は、「第Ⅱ編4章①コンクリート工、②型枠工」により別途計上する。

## 7. 単価表

(1) 大型プレキャストボックスカルバート 10m 当り単価表

SWB225710

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4. 1, 表 4. 2
と び 工		〃		〃
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
高 所 作 業 車 運 転	クローラ式 ブーム型 作業床高 6. 8m	日		〃 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 4. 1, 表 4. 2
計				

(2) 大型プレキャストボックスカルバート据付 10m 当り単価表

SWB225720

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ラフテレーンクレーン運転 又は トラッククレーン運転		日	10/D	表 3. 1, 機械賃料 表 4. 4
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) D : 標準日当り作業量

(3) 材料費（大型プレキャストボックスカルバート） 10m 当り単価表

SWB225730

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
大型プレキャストボック スカルバート材料費		個		
諸 雑 費		式	1	
計				

(4) 止水シート 10m 当り単価表

SWB225740

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4. 3
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
高 所 作 業 車 運 転	クローラ式 ブーム型 作業床高 6. 8m	日		〃 機械賃料
止 水 シ ー ト 材 料 費		m		式 4. 1
諸 雑 費		式		表 4. 3
計				

(注) 止水シートの材料は、シート及びプライマー等を含む。

(5) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
高 所 作 業 車	クローラ式 ブーム型 作業床高 6. 8m	機-16	燃 料 消 費 量 → 26 機 械 賃 料 数 量 → 1. 37



## ②④ 現場取卸費（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、鋼桁等（鋼桁、門扉）、PC桁及び鋼管杭の現場取卸に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

## 1-1-1 現場取卸（鋼桁）

(1) クレーン規格が200t吊以下の場合

## 1-1-2 現場取卸（PC桁）

(1) クレーン規格が200t吊以下の場合

## 1-1-3 現場取卸（鋼管杭）

(1) クレーン規格が20t吊の場合

## 1-2 適用できない範囲

## 1-2-1 現場取卸（PC桁）

(1) 直接架設する場合は原則として現場取卸費は計上しない。

ただし、PC桁を仮置きする必要がある場合は必要に応じて現場取卸（PC桁）を計上する。

## 2. 施工パッケージ

## 2-1 現場取卸（鋼桁）（SCB225210）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 2.1 現場取卸（鋼桁） 積算条件区分一覧

（積算単位：t）

クレーン規格
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t 吊

(注) 1. 上表は、鋼桁の現場取卸等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

2. 規格は最大部材質量等により決定する。

3. 直接工事費に計上する。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 2. 2 現場取卸(鋼桁) 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格		備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]100t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]120t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]160t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]200t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	とび工	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 2-2 現場取卸(P C 桁) (SCB225220)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 2. 3 現場取卸(PC 桁) 積算条件区分一覧

(積算単位：本)

クレーン規格
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t 吊
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t 吊
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t 吊

- (注) 1. 上表は、P C 桁の現場取卸等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。  
 2. 規格は最大部材質量等により決定する。  
 3. 直接工事費に計上する。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 2.4 現場取卸(PC 桁) 代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t 吊	賃料
		ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]100t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]120t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]160t 吊	賃料
		トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]200t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	とび工	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 2-3 現場取卸（鋼管杭）（SCB225230）

## (1) 条件区分

現場取卸（鋼管杭）の積算条件区分はない。

積算単位は、t とする。

（注）鋼管杭の現場取卸等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 2.5 現場取卸（鋼管杭）代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]20t 吊	賃料
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	土木一般世話役	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ②⑤ 殻運搬（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、構造物撤去工における殻運搬に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

- (1) 既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（鉄筋・無筋）の運搬の場合
- (2) コンクリート舗装版，アスファルト舗装版，コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破碎作業により発生した殻の運搬の場合
- (3) バックホウを用いて行う平均施工幅 1m 未満の舗装版破碎（舗装厚 5cm 以内）により発生した殻の運搬の場合
- (4) モルタルの吹付法面のとりこわし作業により発生した殻の運搬の場合

## 1-2 適用できない範囲

- (1) 路面切削作業で発生したアスファルト殻の運搬
- (2) 電線共同溝におけるアスファルト舗装版の破碎作業により発生した殻の運搬
- (3) 自動車専用道路を利用する場合
- (4) 運搬距離が 60km を超える場合
- (5) 既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（鉄筋・無筋）を人力で積み込む場合

## 2. 施工パッケージ

## 2-1 殻運搬（SCB227010）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 2.1 殻運搬 積算条件区分一覧

(積算単位：m <sup>3</sup> )			
殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離
コンクリート （無筋） 構造物とりこわし	機械積込	無し	1. 6km 以下
			3. 3km 以下
			5. 7km 以下
			8. 0km 以下
			10. 9km 以下
			14. 4km 以下
			18. 5km 以下
			23. 2km 以下
			28. 4km 以下
			34. 3km 以下
			41. 3km 以下
			49. 4km 以下
			58. 8km 以下
			60. 0km 以下

穀発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離
コンクリート (無筋) 構造物とりこわし	機械積込	有り	1. 6km 以下
			3. 3km 以下
			5. 7km 以下
			8. 0km 以下
			10. 9km 以下
			14. 4km 以下
			18. 5km 以下
			23. 2km 以下
			28. 4km 以下
			34. 3km 以下
			41. 3km 以下
			49. 4km 以下
			58. 8km 以下
			60. 0km 以下
コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし	機械積込	無し	1. 6km 以下
			3. 3km 以下
			5. 7km 以下
			8. 0km 以下
			10. 9km 以下
			14. 4km 以下
			18. 5km 以下
			23. 2km 以下
			28. 4km 以下
			34. 3km 以下
			41. 3km 以下
			49. 4km 以下
			58. 8km 以下
			60. 0km 以下
		有り	1. 6km 以下
			3. 3km 以下
			5. 7km 以下
			8. 0km 以下
			10. 9km 以下
			14. 4km 以下
			18. 5km 以下
			23. 2km 以下
			28. 4km 以下
			34. 3km 以下
			41. 3km 以下
			49. 4km 以下
			58. 8km 以下
			60. 0km 以下

穀発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離
舗装版破碎	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 超) 又は (騒音対策必要)	無し	0.5km 以下
			1.0km 以下
			2.0km 以下
			2.5km 以下
			3.5km 以下
			4.5km 以下
			6.0km 以下
			7.5km 以下
			10.0km 以下
			13.5km 以下
			19.5km 以下
			39.0km 以下
			60.0km 以下
		有り	0.5km 以下
			1.0km 以下
			1.5km 以下
			2.0km 以下
			3.0km 以下
			4.0km 以下
			5.5km 以下
			7.0km 以下
			9.0km 以下
			12.0km 以下
			17.5km 以下
			28.5km 以下
			60.0km 以下
	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 以下)	無し	0.3km 以下
			1.5km 以下
			3.5km 以下
			6.5km 以下
			11.5km 以下
			22.0km 以下
			60.0km 以下
		有り	0.3km 以下
			1.5km 以下
			3.5km 以下
			6.0km 以下
			10.5km 以下
			19.5km 以下
			60.0km 以下

殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離
舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し	0.3km 以下
			1.0km 以下
			1.5km 以下
			2.5km 以下
			3.0km 以下
			3.5km 以下
			4.5km 以下
			5.5km 以下
			7.0km 以下
			9.0km 以下
			12.0km 以下
			17.0km 以下
			28.5km 以下
			60.0km 以下
		有り	0.3km 以下
			1.0km 以下
			1.5km 以下
			2.5km 以下
			3.0km 以下
			3.5km 以下
			4.5km 以下
			5.0km 以下
			6.5km 以下
			8.0km 以下
			11.0km 以下
			15.0km 以下
			24.0km 以下
			60.0km 以下

殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離
吹付法面とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	0.5km 以下
			1.0km 以下
			1.5km 以下
			2.0km 以下
			2.5km 以下
			3.5km 以下
			4.5km 以下
			6.0km 以下
			7.0km 以下
			8.5km 以下
			9.0km 以下
			10.5km 以下
			13.5km 以下
			18.0km 以下
			27.5km 以下
			60.0km 以下
		有り	0.5km 以下
			1.0km 以下
			1.5km 以下
			2.0km 以下
			2.5km 以下
			3.5km 以下
			4.0km 以下
			5.0km 以下
			6.0km 以下
			7.0km 以下
			8.0km 以下
			9.0km 以下
			12.0km 以下
			16.0km 以下
			23.0km 以下
			43.0km 以下
			60.0km 以下

- (注) 1. 上表は、既設構造物等のとりこわし、舗装版の破碎によって発生するコンクリート殻又はアスファルト殻、モルタルの吹付法面のとりこわしによって発生した殻の運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。なお、積込作業は含まない。
2. 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む。
3. タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用できる。
4. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は、平均値とする。
5. 有料道路を利用する場合には、別途考慮する。
6. D I D（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。
7. 運搬距離が60kmを超える場合は、別途考慮する。
8. 設計数量は、構造物をとりこわす前の体積とする。



## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 2.2 殻運搬 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	・下記以外の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級	・積込工法区分が機械積込（小規模土工）の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級	・賃料 ・殻発生作業が吹付法面取壊し（モルタル）の場合
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	運転手（一般）	
	R2	—	
	R3	—	
	R4	—	
材料	Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 第3章 基礎工

① 鋼管・既製コンクリート杭打工……………Ⅱ-3-①- 1	②-2 リバースサーキュレーション工…………Ⅱ-3-②- 8
①-1 パイルハンマ工……………Ⅱ-3-①- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-3-②- 8
1 適用範囲……………Ⅱ-3-①- 1	2 機種の選定……………Ⅱ-3-②- 9
2 施工概要……………Ⅱ-3-①- 1	3 編成人員……………Ⅱ-3-②- 9
3 機種の選定……………Ⅱ-3-①- 2	4 施工歩掛……………Ⅱ-3-②- 9
4 編成人員……………Ⅱ-3-①- 3	5 杭1本当たりコンクリート使用量…………Ⅱ-3-②-12
5 施工歩掛……………Ⅱ-3-①- 3	6 鉄筋工……………Ⅱ-3-②-12
6 諸雑費……………Ⅱ-3-①- 5	7 掘削土及び泥水処理……………Ⅱ-3-②-12
7 単価表……………Ⅱ-3-①- 6	8 諸雑費……………Ⅱ-3-②-12
①-2 中掘工……………Ⅱ-3-①- 8	9 単価表及び内訳書……………Ⅱ-3-②-13
1 適用範囲……………Ⅱ-3-①- 8	②-3 アースオーガ工・硬質地盤用アースオーガ工
2 施工概要……………Ⅱ-3-①- 8	……………Ⅱ-3-②-15
3 機種の選定……………Ⅱ-3-①-10	1 適用範囲……………Ⅱ-3-②-15
4 編成人員……………Ⅱ-3-①-10	2 施工概要……………Ⅱ-3-②-15
5 施工歩掛……………Ⅱ-3-①-10	3 機種の選定……………Ⅱ-3-②-15
6 単価表……………Ⅱ-3-①-14	4 編成人員……………Ⅱ-3-②-16
①-3 鋼管ソイルセメント杭工……………Ⅱ-3-①-16	5 施工歩掛……………Ⅱ-3-②-16
1 適用範囲……………Ⅱ-3-①-16	6 材料使用量……………Ⅱ-3-②-18
2 施工概要……………Ⅱ-3-①-17	7 鉄筋工……………Ⅱ-3-②-18
3 機種の選定……………Ⅱ-3-①-19	8 諸雑費……………Ⅱ-3-②-18
4 編成人員……………Ⅱ-3-①-19	9 単価表……………Ⅱ-3-②-19
5 施工歩掛……………Ⅱ-3-①-19	②-4 大口径ボーリングマシン工……………Ⅱ-3-②-21
6 材料使用量……………Ⅱ-3-①-22	1 適用範囲……………Ⅱ-3-②-21
7 諸雑費……………Ⅱ-3-①-23	2 施工概要……………Ⅱ-3-②-21
8 単価表……………Ⅱ-3-①-24	3 機種の選定……………Ⅱ-3-②-22
①-4 回転杭工……………Ⅱ-3-①-25	4 編成人員……………Ⅱ-3-②-22
1 適用範囲……………Ⅱ-3-①-25	5 施工歩掛……………Ⅱ-3-②-22
2 施工概要……………Ⅱ-3-①-26	6 杭1本当たりモルタル及びコンクリート使用量
3 機種の選定……………Ⅱ-3-①-27	……………Ⅱ-3-②-25
4 編成人員……………Ⅱ-3-①-27	7 やぐらの設置・撤去……………Ⅱ-3-②-25
5 施工歩掛……………Ⅱ-3-①-27	8 ビット等損耗費……………Ⅱ-3-②-26
6 単価表……………Ⅱ-3-①-29	9 諸雑費……………Ⅱ-3-②-27
①-5 杭頭処理工……………Ⅱ-3-①-30	10 泥水(ベントナイト)の処理費……………Ⅱ-3-②-27
1 適用範囲……………Ⅱ-3-①-30	11 単価表……………Ⅱ-3-②-28
2 施工歩掛……………Ⅱ-3-①-30	②-5 ダウンザホールハンマ工……………Ⅱ-3-②-30
3 単価表……………Ⅱ-3-①-30	1 適用範囲……………Ⅱ-3-②-30
② 場所打杭工……………Ⅱ-3-②- 1	2 施工概要……………Ⅱ-3-②-31
②-1 全回転式オールケーシング工…………Ⅱ-3-②- 1	3 機種の選定……………Ⅱ-3-②-35
1 適用範囲……………Ⅱ-3-②- 1	4 編成人員……………Ⅱ-3-②-37
2 施工概要……………Ⅱ-3-②- 1	5 施工歩掛……………Ⅱ-3-②-37
3 機種の選定……………Ⅱ-3-②- 2	6 杭1本当たりモルタル・コンクリート及び
4 編成人員……………Ⅱ-3-②- 3	購入土(砂)使用量……………Ⅱ-3-②-41
5 施工歩掛……………Ⅱ-3-②- 3	7 やぐらの設置・撤去……………Ⅱ-3-②-42
6 単価表……………Ⅱ-3-②- 6	8 諸雑費……………Ⅱ-3-②-43

9 掘削土の処理費……………Ⅱ-3-②-43	⑦ 木杭及び矢板打工(人力、ドロップハンマ工) ……………Ⅱ-3-⑦- 1
10 単価表……………Ⅱ-3-②-45	1 人力木杭打工……………Ⅱ-3-⑦- 1
③ 深礎工……………Ⅱ-3-③- 1	2 単価表……………Ⅱ-3-⑦- 1
③-1 深礎工……………Ⅱ-3-③- 1	⑧ 泥水運搬工……………Ⅱ-3-⑧- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-3-③- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-3-⑧- 1
2 施工概要……………Ⅱ-3-③- 1	2 施工概要……………Ⅱ-3-⑧- 1
3 機種の選定……………Ⅱ-3-③- 2	3 機種の選定……………Ⅱ-3-⑧- 1
4 編成人員……………Ⅱ-3-③- 2	4 汚泥吸排車の運搬作業……………Ⅱ-3-⑧- 1
5 施工歩掛……………Ⅱ-3-③- 3	5 単価表……………Ⅱ-3-⑧- 2
6 内訳書及び単価表……………Ⅱ-3-③- 6	
③-2 コンクリート工(深礎工)……………Ⅱ-3-③- 9	
1 適用範囲……………Ⅱ-3-③- 9	
2 施工概要……………Ⅱ-3-③- 9	
3 コンクリート打設工法の選定……………Ⅱ-3-③- 9	
4 施工パッケージ……………Ⅱ-3-③-11	
④ ニューマチックケーソン工……………Ⅱ-3-④- 1	
1 適用範囲……………Ⅱ-3-④- 1	
2 施工概要……………Ⅱ-3-④- 1	
3 掘削工法及び艀装の選定……………Ⅱ-3-④- 1	
4 機種の選定……………Ⅱ-3-④- 2	
5 編成人員……………Ⅱ-3-④- 4	
6 作業時間等……………Ⅱ-3-④- 4	
7 設備等の供用日数……………Ⅱ-3-④- 5	
8 施工歩掛……………Ⅱ-3-④- 5	
9 仮設備工……………Ⅱ-3-④-10	
10 参考資料……………Ⅱ-3-④-11	
11 単価表……………Ⅱ-3-④-17	
⑤ 基礎工(鋼管矢板基礎工)……………Ⅱ-3-⑤- 1	
⑤-1 打撃工法……………Ⅱ-3-⑤- 1	
1 適用範囲……………Ⅱ-3-⑤- 1	
2 施工概要……………Ⅱ-3-⑤- 1	
3 機種の選定……………Ⅱ-3-⑤- 2	
4 施工歩掛……………Ⅱ-3-⑤- 3	
5 単価表……………Ⅱ-3-⑤-11	
⑤-2 中掘工法……………Ⅱ-3-⑤-17	
1 適用範囲……………Ⅱ-3-⑤-17	
2 施工概要……………Ⅱ-3-⑤-17	
3 機種の選定……………Ⅱ-3-⑤-18	
4 施工歩掛……………Ⅱ-3-⑤-19	
5 単価表……………Ⅱ-3-⑤-21	
⑥ ドロップハンマ杭打工……………Ⅱ-3-⑥- 1	
1 適用範囲……………Ⅱ-3-⑥- 1	
2 施工歩掛……………Ⅱ-3-⑥- 1	
3 単価表……………Ⅱ-3-⑥- 2	

## 第3章 基 礎 工

### ① 鋼管・既製コンクリート杭打工

#### ①-1 パイルハンマエ （建地-E）

##### 1. 適用範囲

本資料は、油圧パイルハンマによる鋼管杭及び既製コンクリート杭（PHC杭，RC杭，SC杭を含む）の杭打ち作業（直杭），ヤットコ使用時の穴埋作業，杭頭処理（鋼管杭のみ）に適用する。

斜杭については，別途考慮する。

##### 2. 施工概要

施工フローは，下記を標準とする。

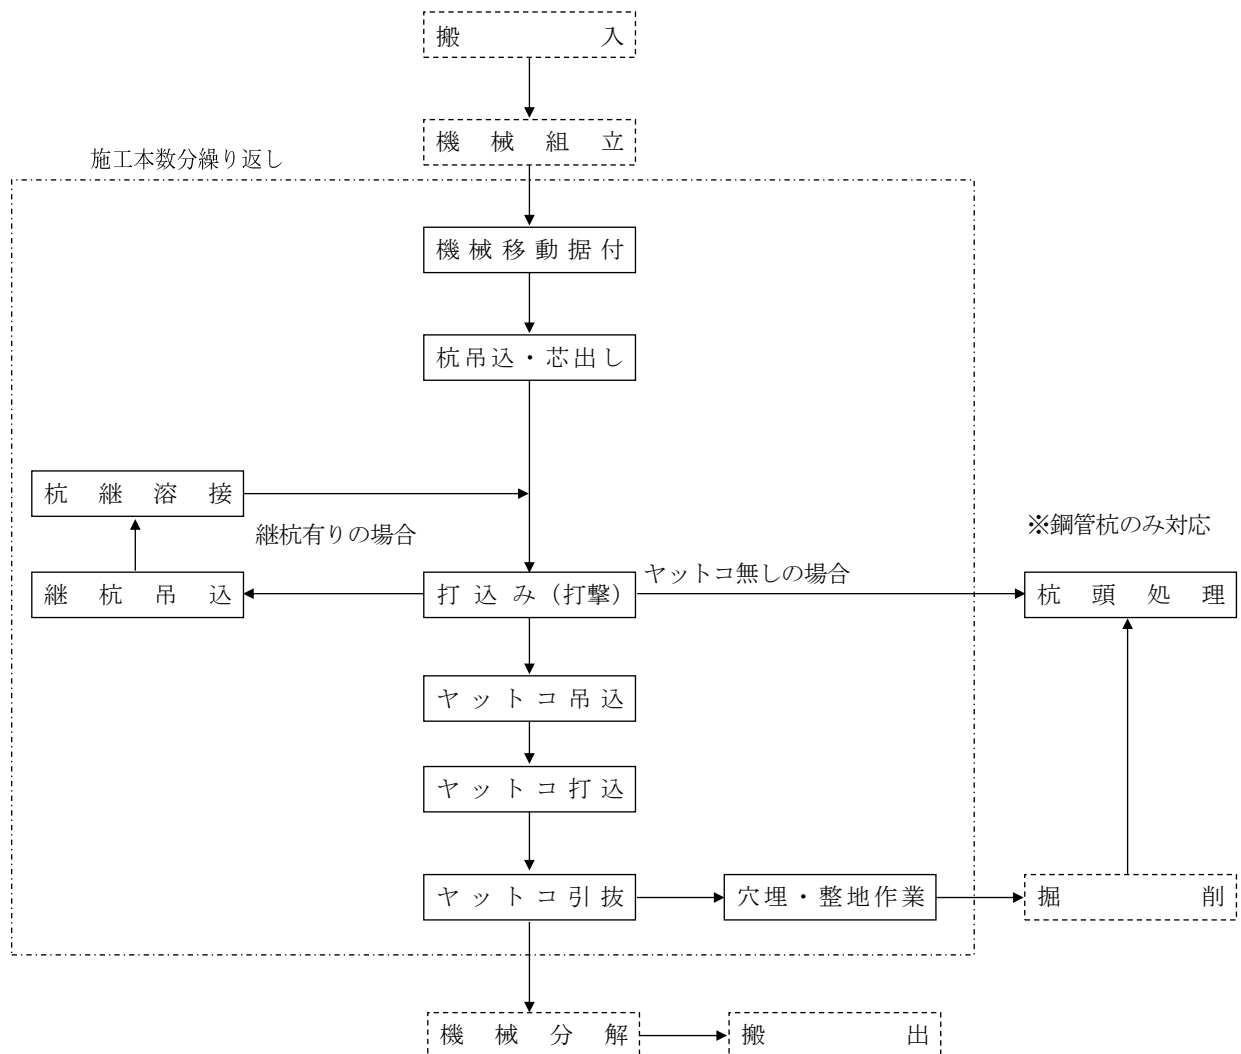


図2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
クローラ式杭打機	油圧ハンマ 直結三点支持式 ラム質量〇〇t	台	1	ヤットコ使用の場合計上する。
バックハウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	〃		
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 50～55t吊	〃		

(注) 1. バックハウは、ヤットコ使用時に発生する穴埋作業用であり、ヤットコ使用のある現場に適用する。

また、バックハウは賃料とする。

2. クローラクレーンは、下記条件により杭の吊込用として必要に応じて計上する。

① 杭打機の移動範囲内において杭打機リーダの真下に杭置き場の設置が不可能な場合。


(杭打機の移動範囲は最大30mまでとする。)

② 材料置場が施工基面(杭打機の作業面)より2m以上高い場所に設けられ、杭引込のとき杭打機に落ちかかる恐れのある場合。

## 3-1 油圧パイルハンマの選定

油圧パイルハンマの選定は、図3-1、図3-2による。

## (1) 鋼管杭の場合

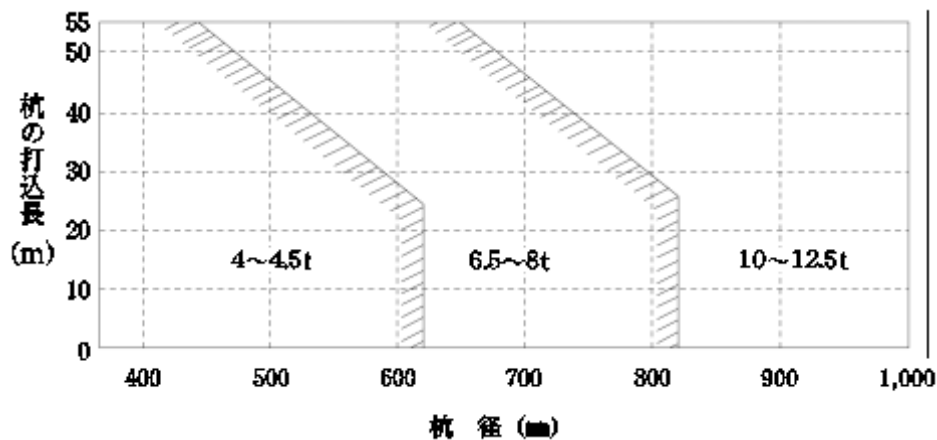

(注) 1. 杭の打込長15m以上で下記の条件の場合には、1ランク大きい規格を用いる。

① N値30以上で層厚3m以上の砂、砂レキの中間層を打抜く場合。


② N値15以上で層厚3m以上の粘性土を打抜く場合。

2. 杭の打込長（m）には、ヤットコ打込長（m）を含む。

3. N値は、掘削層の加重平均とする。

図3-1 鋼管杭打ちの油圧パイルハンマの選定

## (2) 既製コンクリート杭の場合

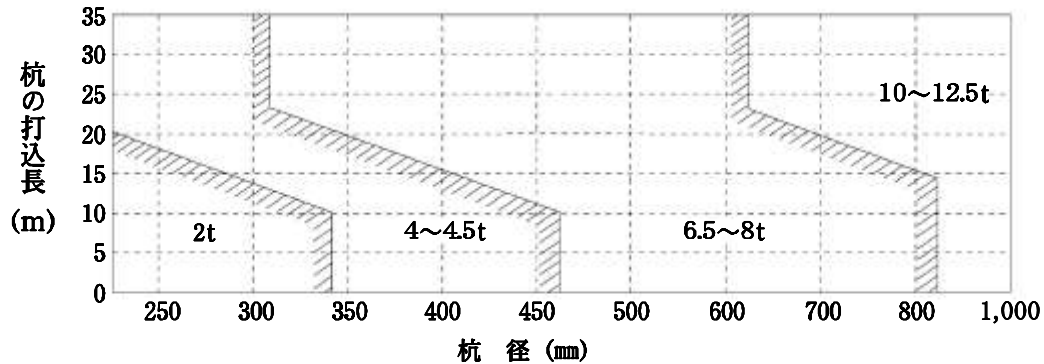

- (注) 1. 杭の打込長10m以上で下記の条件の場合には、1ランク大きい規格を用いる。  
 ① N値30以上で層厚3m以上の砂、砂レキの中間層を打抜く場合。  
 ② N値15以上で層厚3m以上の粘性土を打抜く場合。  
 2. 杭の打込長（m）には、ヤットコ打込長（m）を含む。  
 3. N値は、掘削層の加重平均とする。

図3-2 既製コンクリート杭打ちの油圧パイルハンマの選定

## 4. 編成人員

杭打機1台に対する編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員 (人)

杭の種類 \ 職種	土木一般 世話役	とび工	溶接工
鋼管杭	1	2	1 (2)
既製コンクリート杭	1	2	1

- (注) 1. 杭打機の運転労務は、「第Ⅰ編第7章①建設機械運転労務」による。  
 2. 継杭を施工しない場合には、溶接工は計上しない。  
 3. 鋼管杭径φ800mm以上の継杭施工における溶接工は、( )内の数値を計上する。

## 5. 施工歩掛

5-1 杭10本当り施工日数 ( $T_d$ )

杭10本当り施工日数は、次式による。

鋼管杭の場合

$$T_d = \alpha \cdot T_a \cdot \beta \quad (\text{日/10本})$$

既製コンクリート杭の場合

$$T_d = T_a \cdot \beta \quad (\text{日/10本})$$

$T_d$  : 杭10本当り施工日数 (日/10本)

$\alpha$  : 板厚係数

$T_a$  : 杭種、機種別施工日数 (ヤットコ打ちを含む) (日/10本)

$\beta$  : 作業係数 (ヤットコ使用の場合及び杭の打込長10m以下は、 $\beta = 1$ )

(1) 板厚係数 ( $\alpha$ )

鋼管杭で板厚の異なる継手の場合には、最小板厚の板厚係数とする。また、既製コンクリート杭の場合は計上しない。

表5.1 板厚係数( $\alpha$ )

杭の打込長 (m)	板 厚 (mm)			
	8～10	12	14	16
16m以下	1.00	1.00	1.00	1.00
16mを超え32m以下	1.00	1.14	1.29	1.48
32mを超え48m以下	1.00	1.18	1.37	1.63
48mを超え64m以下	1.00	1.22	1.45	1.73

(2) 杭種別施工日数 ( $T_a$ )

## ① 鋼管杭

表5.2 鋼管杭( $T_a$ )

(日/10本)

杭の打込長 (m)	杭 径 (mm)		
	$\phi$ 400mm以上 $\phi$ 500mm未満	$\phi$ 500mm以上 $\phi$ 800mm未満	$\phi$ 800mm以上 $\phi$ 1,200mm未満
16m以下	1.3	1.3	1.3
16mを超え32m以下	2.0	2.4	2.4
32mを超え48m以下	3.1	3.6	3.7
48mを超え64m以下	4.1	4.7	5.1

## ② 既製コンクリート杭

表5.3 既製コンクリート杭( $T_a$ )

(日/10本)

杭の打込長 (m)	杭 径 (mm)	
	$\phi$ 300mm以上 $\phi$ 600mm未満	$\phi$ 600mm以上 $\phi$ 1,000mm未満
16m以下	1.1	1.3
16mを超え32m以下	2.4	2.8
32mを超え36m以下	3.1	3.7

(3) 作業係数 ( $\beta$ )

ヤットコ使用しない場合は、下記の作業係数を計上する。

表5.4 作業係数( $\beta$ )

杭の打込長 (m)		板 厚 (mm)			
		8～10	12	14	16
鋼 管 杭	10mを超え16m以下	1.31	1.46	1.69	1.92
	16m超え	1.20	1.24	1.28	1.28
コンクリート杭	10mを超え16m以下	1.50			
	16m超え	1.12			

※ヤットコ使用の場合及び杭の打込長10m以下は、 $\beta=1$ とする。

## 5-2 杭頭処理

## 5-2-1 鋼管杭杭頭処理

鋼管杭と鉄筋及び鋼管杭とずれ止め及びストッパー等の現場溶接工歩掛は、次表を標準とする。

表5.5 鋼管杭杭頭処理溶接工歩掛 (溶接長10m当り)

鋼管杭板厚 (mm)	単位	8~10	12	14・16
溶 接 工	人	0.35	0.68	1.11
電 気 溶 接 機	日	0.39	0.65	1.12
諸 雑 費 率	%	14		

- (注) 1. 鉄筋加工・組立費は、「第Ⅵ編第1章市場単価①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。  
 2. 電気溶接機は、ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排出ガス対策型（第1次基準値）最大溶接電流300Aを標準とする。  
 3. 諸雑費は、溶接棒の材料費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 4. 鋼管杭とずれ止め及びストッパーの溶接長（ $L_y$ ）は、ずれ止め1箇所当り、 $L_y = \pi \times D$ （ $D$ ：杭径（m））を標準とする。

## 5-2-2 コンクリート杭の杭頭処理

コンクリート杭の杭頭処理（カットオフ工等）が必要な場合には、別途計上する。

## 5-3 中詰コンクリート打設

中詰コンクリート打設は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。

## 6. 諸雑費

諸雑費は、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に表6.1、表6.2の率を乗じた金額を条件として計上する。

## (1) 鋼管杭

鋼管杭打設による諸雑費は、裏当てリング及びストッパー、銅バンド、ずれ止め、ずれ止め用ストッパー、鋼管吊具、吊ワイヤー、先端補強バンド、ヤットコ、溶接機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費、溶接ワイヤー等の費用である。なお、ヤットコの有無及びずれ止め、ずれ止め用ストッパーの有無にかかわらず本諸雑費率を使用できる。

表6.1 諸雑費率(鋼管杭) (%)

継 杭 の 有 無	諸雑費率
継 杭 無 し	34
継 杭 有 り	16

## (2) 既製コンクリート杭

既製コンクリート杭打設による諸雑費は、吊ワイヤー、ヤットコ、溶接機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費、溶接ワイヤー等の費用である。なお、ヤットコの有無及び溶接機の有無にかかわらず本諸雑費率を使用できる。

表6.2 諸雑費率(既製コンクリート杭) (%)

諸 雑 費 率	3
---------	---



## 7. 単価表

(1) 鋼管・既製コンクリート杭打工10本当り単価表

SWB230010

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_d \times 1$	表4.1
と び 工		〃	$T_d \times 2$	〃
溶 接 工		〃	$T_d \times 1(2)$	表4.1 ※( )内は鋼管杭径800mm以上
杭		本	10	
クローラ式杭打機 運 転	油圧ハンマ・ 直結三点支持式 ラム質量〇〇t	日	$T_d$	表3.1, 図3-1, 図3-2 機械損料
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	〃	$T_d$	表3.1 ヤットコ使用時計上 機械賃料
クローラクレーン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排気ガス対策型(第2次基準値) 50～55t吊	〃	$T_d$	表3.1 必要に応じて計上 機械損料
諸 雑 費		式	1	表6.1, 表6.2
計				

(注)  $T_d$  : 杭10本当りの施工日数(日/10本)

(2) 鋼管杭杭頭処理溶接工10m当り単価表

SWB230050

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
溶 接 工		人		表5.5
電 気 溶 接 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 直流アーク式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 最大溶接電流300A	日		表5.5 機械損料
諸 雑 費		式	1	表5.5
計				

## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラ式杭打機	油圧ハンマ 直結三点支持式	機-18	運転労務数量→1.00 機械損料数量→1.75 燃料消費量 →下記のとおりとする。
			ラム質量      燃料消費量 (ℓ/日)
			2t      85
			4～4.5t      123
			6.5～8t      123
			10～12.5t      160
バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →3.8 機械賃料数量→1.6
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排気ガス対策型 (第2次基準値) 50～55t吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →27 機械損料数量→1.12

## (4) 鋼管杭杭頭処理用機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
電気溶接機	ディーゼルエンジン駆動・ 直流アーク式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 最大溶接電流300A	機-12	燃料消費量 →32

## ①-2 中掘工 （建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、中掘工（打撃又はグラウト注入（拡大根固め工法を含む）による打止め）による鋼管杭及び既製コンクリート杭（PHC杭、RC杭、SC+PHC杭）の施工に適用する。

なお、適用杭径は、次表を標準とする。

表1.1 適用杭径

工 法	杭 径 (mm)	摘 要
中 掘 工	φ 400～φ 1,000	鋼管杭
		既製コンクリート杭

掘削長については、次図を標準とする。また、現場条件により次図により難しい場合は、別途考慮する。

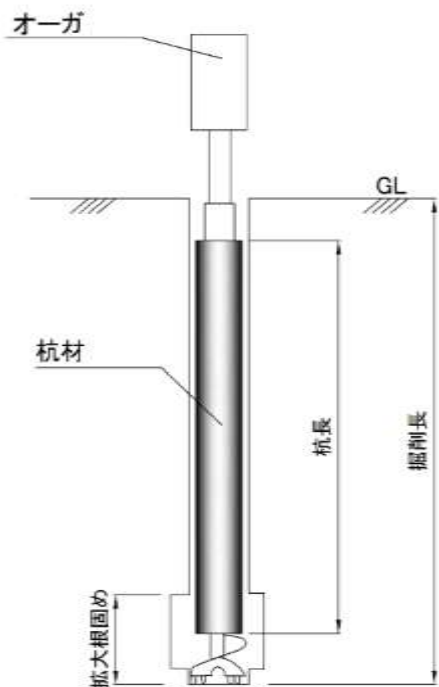


図1-1 施工図(グラウト注入)

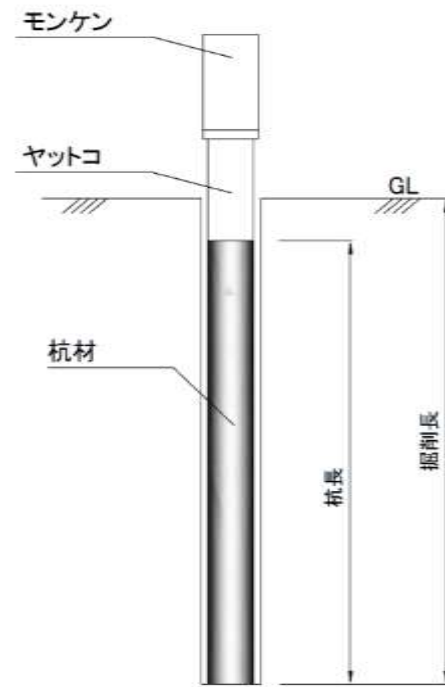


図1-2 施工図(打撃)

## 2. 施工概要

中掘工は、あらかじめ杭中空部にオーガスクリュを挿入、杭建込を行った後、削孔と同時に杭を圧入していく工法である。杭打設後は、杭の支持力低下を補うためにモンケンなどにより杭を打撃し、支持層に1.0から1.5m程度打込む方法と、グラウト材を支持層に注入し杭と一体化させる方法がある。

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

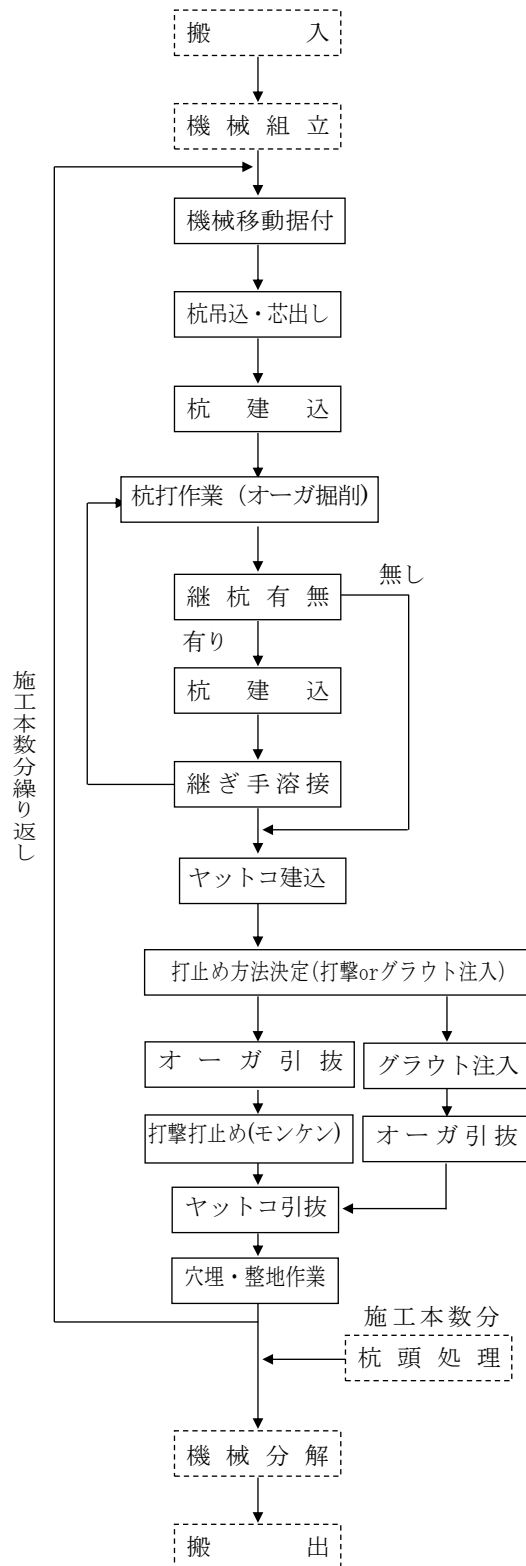


図2-1 施工フロー

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
2. ヤットコは必要により施工する。

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単位	杭 径 (mm)				摘 要
			杭径 φ 400以上 φ 800未満		杭径 φ 800以上 φ 1000未満	杭径 φ 1000	
			掘削長 32m以下	掘削長 32m超え			
クローラ式 アースオーガ	アースオーガ中掘機・直結三点支持式 オーガ出力55kW 公称杭径 φ 400～1,200mm リーダ長21～33m	台	1	－	－	－	打撃方式で施工 する場合のモン ケン10tを含む
	アースオーガ中掘機・直結三点支持式 オーガ出力90kW 公称杭径 φ 400～1,200mm リーダ長21～33m	〃	－	1	1	1	
クローラ クレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第2次基準値） 50～55t吊	〃	1		1	－	
	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型（第1次基準値） 80t吊	〃	－		－	1	
バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	〃	1		1	1	掘削土の処理作 業（穴埋作業及び 簡易な整正を含 む）

## 4. 編成人員

編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員 (人)

工法		職種	土 木 一 般 世 話 役	と び 工	特殊作業員	普通作業員	溶 接 工
中 掘 工	打 撃		1	1	—	1	1
	グラウト注入		1	1	1	1	1

(注) 継杭を施工しない場合は、溶接工は計上しない。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 杭10本当り施工日数 (Td)

杭10本当り施工日数は、次式による。

鋼管杭の場合

$$T_d = \alpha \cdot \beta \cdot T_a \text{ (日/10本)}$$

既製コンクリート杭の場合

$$T_d = \alpha \cdot T_a \text{ (日/10本)}$$

α : 土質係数

β : 板厚係数

T<sub>a</sub> : 杭種、機種別施工日数

(ヤットコの建込み及び引抜きを含むが、不要の場合でも使用できるものとする。)

## (1) 土質係数 (α)

表5.1 土質係数(α)

N 値 の 範 囲	20未満	20以上40未満	40以上
土 質 係 数	1.00	1.13	1.27

(注) N値は、掘削層の加重平均とする。

(2) 板厚係数 ( $\beta$ )

鋼管杭で板厚の異なる継杭の場合には、最小板厚の板厚係数とする。また、既製コンクリート杭の場合は計上しない。

表5.2 板厚係数( $\beta$ )

掘 削 長 (m)	板 厚 (mm)			
	9～10	11～12	13～14	15～16
16m以下	1.00	1.00	1.00	1.00
16mを超え32m以下	1.00	1.09	1.18	1.26
32mを超え48m以下	1.00	1.12	1.23	1.34
48mを超え64m以下	1.00	1.13	1.26	1.38

(3) 杭種, 施工方法別施工日数 ( $T_a$ )

## ① 鋼管杭 (グラウト方式)

表5.3 鋼管杭(グラウト方式)

(日/10本)

掘 削 長 (m)	杭 径 (mm)						
	$\phi$ 400以上 $\phi$ 500未満	$\phi$ 500以上 $\phi$ 600未満	$\phi$ 600以上 $\phi$ 700未満	$\phi$ 700以上 $\phi$ 800未満	$\phi$ 800以上 $\phi$ 900未満	$\phi$ 900以上 $\phi$ 1000未満	$\phi$ 1,000
16m以下	1.76	1.84	1.89	1.96	2.06	2.19	2.34
16mを超え32m以下	3.36	3.65	3.86	4.12	4.38	4.68	5.02
32mを超え48m以下	4.97	5.46	5.83	6.28	6.70	7.16	7.69
48mを超え64m以下	6.57	7.27	7.80	8.44	9.03	9.64	10.36

## ② 鋼管杭 (打撃方式)

表5.4 鋼管杭(打撃方式)

(日/10本)

掘 削 長 (m)	杭 径 (mm)						
	$\phi$ 400以上 $\phi$ 500未満	$\phi$ 500以上 $\phi$ 600未満	$\phi$ 600以上 $\phi$ 700未満	$\phi$ 700以上 $\phi$ 800未満	$\phi$ 800以上 $\phi$ 900未満	$\phi$ 900以上 $\phi$ 1,000未満	$\phi$ 1,000
16m以下	1.84	1.88	1.91	1.93	1.95	1.97	2.00
16mを超え32m以下	3.44	3.69	3.88	4.09	4.27	4.46	4.67
32mを超え48m以下	5.04	5.50	5.85	6.25	6.59	6.94	7.34
48mを超え64m以下	6.65	7.31	7.82	8.41	8.92	9.42	10.01

## ③ 既製コンクリート杭 (グラウト方式)

表5.5 既製コンクリート杭(グラウト方式)

(日/10本)

掘 削 長 (m)	杭 径 (mm)						
	$\phi$ 400以上 $\phi$ 500未満	$\phi$ 500以上 $\phi$ 600未満	$\phi$ 600以上 $\phi$ 700未満	$\phi$ 700以上 $\phi$ 800未満	$\phi$ 800以上 $\phi$ 900未満	$\phi$ 900以上 $\phi$ 1,000未満	$\phi$ 1,000
16m以下	1.75	1.85	1.90	1.97	2.07	2.19	2.34
16mを超え32m以下	3.44	3.69	3.87	4.07	4.27	4.53	4.87
32mを超え48m以下	5.13	5.53	5.84	6.18	6.48	6.87	7.40
48mを超え64m以下	6.82	7.37	7.82	8.28	8.69	9.21	9.93

## ④ 既製コンクリート杭（打撃方式）

表5. 6 既製コンクリート杭(打撃方式)

(日/10本)

掘 削 長 (m)	杭 径 (mm)						
	φ 400以上 φ 500未満	φ 500以上 φ 600未満	φ 600以上 φ 700未満	φ 700以上 φ 800未満	φ 800以上 φ 900未満	φ 900以上 φ 1,000未満	φ 1,000
16m以下	1.84	1.88	1.91	1.93	1.95	1.97	2.00
16mを超え32m以下	3.53	3.72	3.88	4.03	4.16	4.31	4.53
32mを超え48m以下	5.22	5.56	5.85	6.14	6.36	6.65	7.05
48mを超え64m以下	6.91	7.40	7.82	8.24	8.57	8.99	9.58

## 5-2 杭頭処理

杭頭処理については、「第Ⅱ編第3章①鋼管・既製コンクリート杭打工①-1パイルハンマ工及び①-5杭頭処理工」による。

## 5-3 諸雑費

諸雑費は、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に表5. 7～表5. 10の率を乗じた金額を上限として計上する。

## (1) 鋼管杭（打撃方式）

中掘工（打撃打止め）による鋼管杭打込の諸雑費は、溶接棒、現場溶接にて行う杭先端加工費（労務費、材料費を含む）、鋼管吊具、吊ワイヤー、裏当てリング及びブSTOPパー、銅バンド、ずれ止め、ずれ止め用STOPパー、オーガスクリュー、オーガヘッド、ヤットコ、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接機損料、空気圧縮機（排出ガス対策型）の運転、電力に関する経費等の費用である。なお、ヤットコの有無及びずれ止め、ずれ止め用STOPパーの有無にかかわらず本諸雑費率を適用できる。

表5. 7 諸雑費率(鋼管杭)

( % )

継 杭 の 有 無	諸 雑 費 率
継 杭 無 し	27
継 杭 有 り	29

(注) 杭先端加工費とは、周辺摩擦低減の為に杭先端内部に現場で加工する費用のことであり、杭の補強を目的とする費用は含まない。

## (2) 既製コンクリート杭（打撃方式）

中掘工（打撃打止め）による既製コンクリート杭打込の諸雑費は、溶接棒、吊ワイヤー、オーガスクリュー、オーガヘッド、ヤットコ、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接機損料、空気圧縮機（排出ガス対策型）の運転、電力に関する経費等の費用である。なお、ヤットコの有無にかかわらず本諸雑費率を適用できる。

表5. 8 諸雑費率(既製コンクリート杭)

( % )

継 杭 の 有 無	諸 雑 費 率
継 杭 無 し	9
継 杭 有 り	23

## (3) 鋼管杭（グラウト方式）

中掘工（グラウト注入）による鋼管打込の諸雑費は、グラウト材（セメントミルク）、溶接棒、現場溶接にて行う杭先端加工費（労務費、材料費を含む）、鋼管吊具、吊ワイヤー、裏当てリング及びストッパー、銅バンド、ずれ止め、ずれ止め用ストッパー、オーガスクリュ、オーガヘッド、ヤットコ、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接機損料、空気圧縮機（排出ガス対策型）、モルタルプラント運転及び電力に関する経費等の費用である。なお、ヤットコの有無及びずれ止め、ずれ止め用ストッパーの有無にかかわらず本諸雑費率を適用できる。

表5. 9 諸雑費率(鋼管杭) ( % )

継杭の有無	諸雑費率
継杭無し	52
継杭有り	38

- (注) 1. 拡大根固め工法も上表の率を適用する。  
2. 杭先端加工費とは、周辺摩擦低減の為に杭先端内部に現場で加工する費用のことであり、杭の補強を目的とする費用は含まない。

## (4) 既製コンクリート杭（グラウト方式）

中掘工（グラウト注入）による既製コンクリート杭打込の諸雑費は、グラウト材（セメントミルク）、溶接棒、吊ワイヤー、オーガスクリュ、オーガヘッド、ヤットコ、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、交流アーク溶接機損料、空気圧縮機（排出ガス対策型）、モルタルプラント運転及び電力に関する経費等の費用である。なお、ヤットコの有無にかかわらず本諸雑費率を適用出来る。

表5. 10 諸雑費率(既製コンクリート杭) ( % )

継杭の有無	諸雑費率
継杭無し	36
継杭有り	33

- (注) 拡大根固め工法も上表の率を適用する。



## 6. 単価表

(1) 中掘工（打撃打止め）による鋼管・既製コンクリート杭打込10本当り単価表

SWB230210

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_d \times 1$	表4.1
溶 接 工		〃	$T_d \times 1$	表4.1 必要に応じて計上する
と び 工		〃	$T_d \times 1$	表4.1
普 通 作 業 員		〃	$T_d \times 1$	〃
杭		本	10	
クローラ式アースオーガ	アースオーガ中掘機運転	日	$T_d$	表3.1 機械損料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第〇次基準値） 〇〇t吊	〃	$T_d$	表3.1 機械損料
バックホウ （クローラ型）運転	標準型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	〃	$T_d$	表3.1 機械損料
諸 雑 費		式	1	表5.7, 表5.8
計				

(注)  $T_d$  : 杭10本当り施工日数（日/10本）

(2) 中掘工（グラウト注入）による鋼管・既製コンクリート杭打込10本当り単価表

SWB230215

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_d \times 1$	表4.1
溶 接 工		〃	$T_d \times 1$	表4.1 必要に応じて計上する
特 殊 作 業 員		〃	$T_d \times 1$	表4.1
と び 工		〃	$T_d \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_d \times 1$	〃
杭		本	10	
クローラ式アースオーガ	アースオーガ中掘機運転	日	$T_d$	表3.1 機械損料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第〇次基準値） 〇〇t吊	〃	$T_d$	表3.1 機械損料
バックホウ （クローラ型）運転	標準型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	〃	$T_d$	表3.1 機械損料
諸 雑 費		式	1	表5.9, 表5.10
計				

(注)  $T_d$  : 杭10本当り施工日数（日/10本）


## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラ式アースオーガ	アースオーガ中掘機・直結三点支持式 オーガ出力55kW 公称杭径400～1,200mm リーダ長21～33m	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 →61 機械損料数量→ 1.50
	アースオーガ中掘機・直結三点支持式 オーガ出力90kW 公称杭径400～1,200mm リーダ長21～33m	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 →77 機械損料数量→ 1.50
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 50～55t吊	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 →51 機械損料数量→ 1.45
	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 80t吊	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 →66 機械損料数量→ 1.45
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	標準型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 →39 機械損料数量→ 1.50

## ①-3 鋼管ソイルセメント杭工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、鋼管ソイルセメント杭工法に適用する。杭径は900mmから1,500mm，掘進長の適用範囲は次図とする。

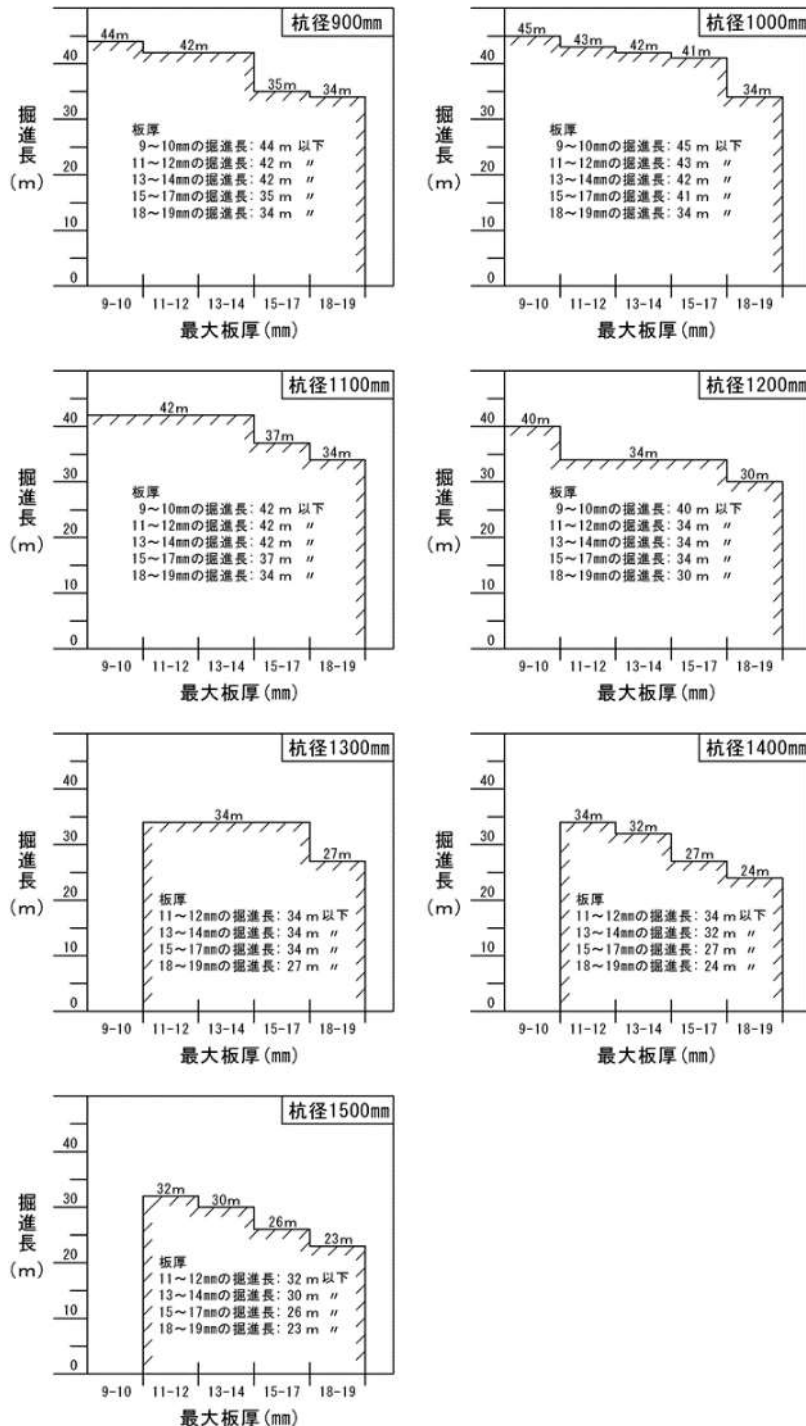


- (注) 1. 最大板厚は現場で行う継杭溶接の最大板厚とする。なお，異なる板厚を溶接する工場溶接は含まない。  
2. 現場で継杭溶接を行わない杭も適用できる。

図1-1 適用掘進長

## 2. 施工概要

## 2-1 施工内容

鋼管ソイルセメント杭工は、原地盤中にセメントミルクを注入し、攪拌混合して造成した固化体（ソイルセメント柱）に外面突起付鋼管を沈設し、両者を一体化させる杭工法である。なお、鋼管の沈設方式はソイルセメント柱を造成しながら沈設（同時沈設方式）と造成後に沈設（後沈設方式）がある。

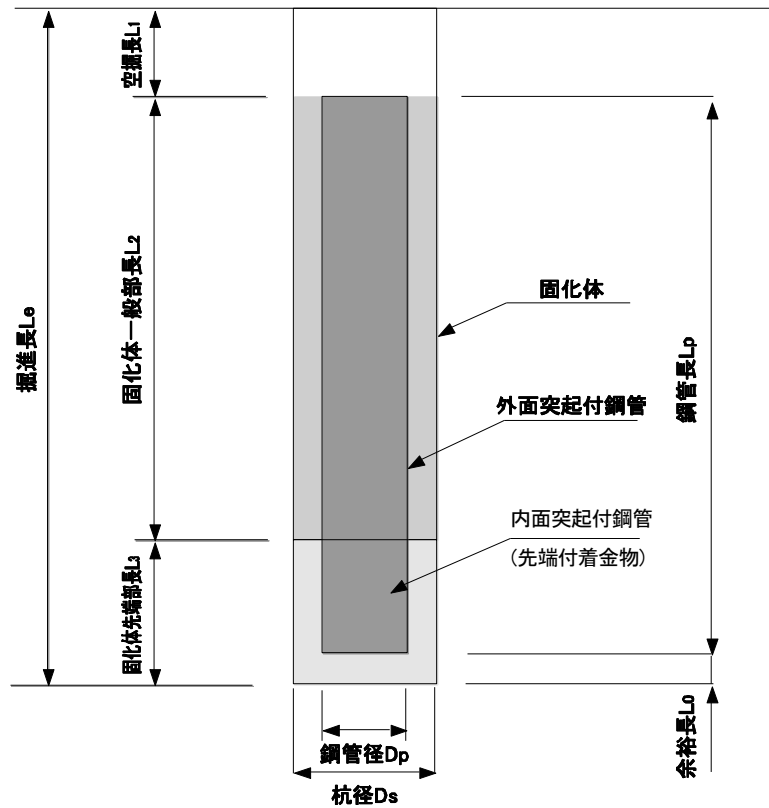

掘進長  $L_e = \text{空掘長 } L_1 + \text{固化体一般部長 } L_2 + \text{固化体先端部長 } L_3$

先端部長  $L_3 = 1.5D_p + 0.5D_s$

余裕長  $L_0 = 0.5D_s$

図2-1 鋼管ソイルセメント杭のモデル図

## 2-2 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

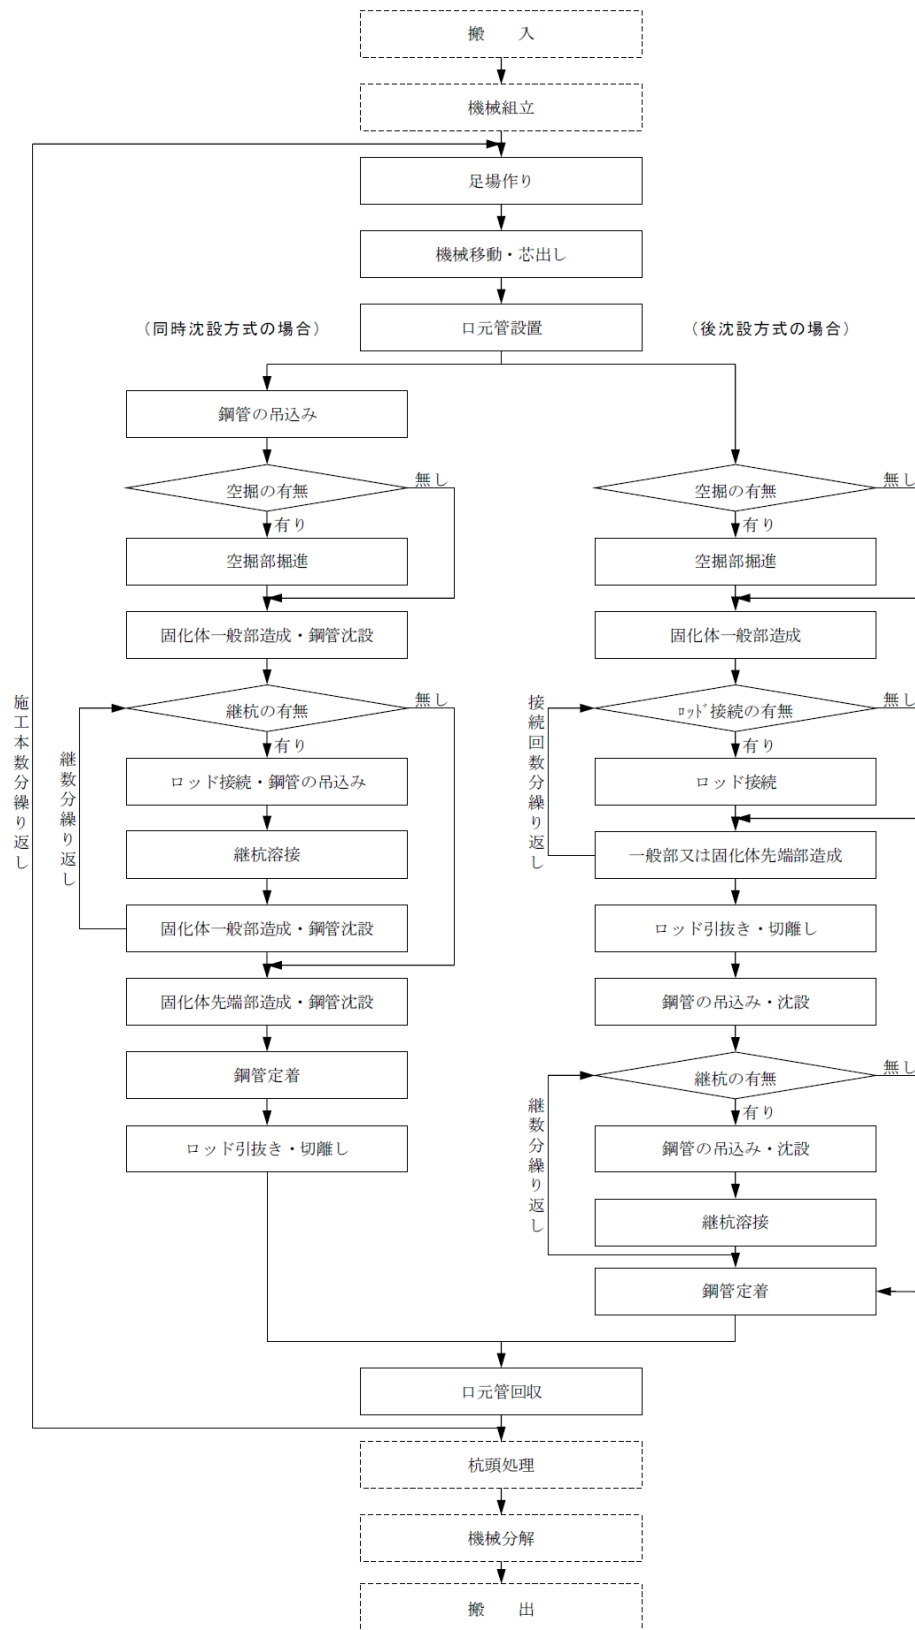


図2-2 施工フロー

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種を選定

機械・規格の選定は、次表を標準とする。

表 3. 1 機種を選定

機 械 名	規 格	単位	数量	継杭の有無		摘 要
				無し	有り	
クローラ式 杭 打 機	鋼管ソイルセメント杭打機 杭径 900～1,500mm 最大施工深度 70m オーガ出力 110～150kW	台	1	○	○	
クローラ クレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 60～65t 吊 排出ガス対策型（第1次基準値）	〃	1	○		
	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 90t 吊 排出ガス対策型（第3次基準値）	〃	1		○	
バックホウ （クローラ型）	標準型・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.5m <sup>3</sup> （平積 0.4m <sup>3</sup> ）	〃	1	○	○	
スラリプラント （全自動）	能力 40m <sup>3</sup> /h	〃	1	○	○	

（注）継杭とは、現場で行う継杭溶接とし、工場で行う継杭溶接は含めない。

## 4. 編成人員

編成人員は、次表を標準とする。

表4. 1 編成人員 （人）

土木一般世話役	と び 工	特 殊 作 業 員	溶 接 工
1	2	1	2 (1)

（注）1. 継杭を施工しない場合は、溶接工を計上しない。なお、現場で行う継杭溶接が1箇所/本の場合は溶接工を計上するが溶接時間は計上しないこととする。

2. 鋼管径が800mm未満については、（ ）内の数値を計上する。

## 5. 施工歩掛

杭1本当り施工時間（ $T_c$ ）は、次式による。

$$T_c = T_g + T_s + T_w$$

$T_c$ ：杭1本当り施工時間（min/本）

$T_g$ ： 〃 固化体部造成時間（min/本）

$T_s$ ： 〃 準備時間（min/本）

$T_w$ ： 〃 継杭溶接時間（min/本）

## 5-1 杭1本当りの固化体造成時間

$$T_g = T_{g1} + T_{g2} + T_{g3}$$

$T_g$ ：杭1本当り固化体造成時間（min/本）

$T_{g1}$ ：杭1本当り空掘部造成時間（min/本）

$T_{g2}$ ： 〃 一般部造成時間（min/本）

$T_{g3}$ ： 〃 先端部造成時間（min/本）

$T_{g1}$  : 杭1本当り空掘部造成時間 (min/本)

$$T_{g1} = L_1 / V_{g1}$$

$L_1$  : 空掘長 (m)

$V_{g1}$  : 空掘部掘進速度 (m/min) (表 5.1)

表 5.1 空掘部( $V_{g1}$ )の掘進速度 (m/min)

加重平均N値 杭径 (mm)	$N < 10$	$10 \leq N < 30$	$30 \leq N < 50$
900 ~ 1,400	0.50	0.45	0.41
1,500	0.47	0.43	0.39

(注) 1. 上表には、ロッド引抜き時間を含む。  
2. 加重平均N値は空掘部のN値を加重平均する。

$T_{g2}$  : 杭1本当り一般部造成時間 (min/本)

$$T_{g2} = L_2 / V_{g2}$$

$L_2$  : 一般部長 (m)

$V_{g2}$  : 一般部掘進速度 (m/min) (表 5.2)

表 5.2 一般部( $V_{g2}$ )の掘進速度 (m/min)

加重平均N値 杭径 (mm)	$N < 10$	$10 \leq N < 30$	$30 \leq N < 50$
900	0.50	0.45	0.41
1,000	0.46	0.41	0.38
1,100	0.41	0.37	0.33
1,200	0.37	0.33	0.30
1,300	0.33	0.30	0.26
1,400	0.29	0.25	0.22
1,500	0.26	0.22	0.20

(注) 1. 上表には、ロッド引抜き時間を含む。  
2. 加重平均N値は一般部のN値を加重平均する。

$T_{g3}$  : 杭1本当り先端部造成時間 (min/本)

$$T_{g3} = L_3 / V_{g3}$$

$L_3$  : 先端部長 (m)

$V_{g3}$  : 先端部掘進速度 (m/min) (表 5.3)

表 5.3 先端部( $V_{g3}$ )の掘進速度 (m/min)

加重平均N値 杭径 (mm)	$N < 40$	$40 \leq N < 50$	$50 \leq N < 60$	$60 \leq N < 80$
900 ~ 1,500	0.20	0.19	0.17	0.15

(注) 1. 上表には、ロッド引抜き時間を含む。  
2. 対象地盤の最大N値が50を超えるものについては、次式により換算N値を求めた上で適用する。

$$\text{換算N値} = \frac{1,500}{\text{落下50回当り貫入量 (cm)}}$$

3. 加重平均N値は先端部のN値を加重平均する。

## 5-2 杭1本当り準備時間

杭1本当り準備時間は、足場作り、機械の据付及び移動、口元管設置・回収、芯出し、鋼管の吊込み、鋼管キャップ取付け、鋼管定着、ロッド接続・切離し等の時間であり、次式による。なお、ロッド接続・切離し時間については、掘進長24m以下は計上しない。

$$T_s : \text{杭1本当りの準備時間 (min/本)}$$

$$T_s = 110 + L_p \times 0.3 + n_s \times 21$$

$$L_p : \text{鋼管長 (m)}$$

$$n_s : \text{ロッド接続回数 (回) (表 5.4)}$$

表 5.4 ロッド接続回数( $n_s$ )

掘進長	24m 以下	24m 超え 42m 以下	42m 超え 45m 以下
回数	0 回	1 回	2 回

## 5-3 杭1本当りの継杭溶接時間

継杭溶接時間は、次のとおりとする。なお、継杭溶接1箇所目は、準備及び固化体造成時間内に溶接作業を行うため、2箇所目以降計上する。

$$T_w = \Sigma (twi \times \alpha)$$

$$T_w : \text{杭1本当りの継杭溶接時間 (min/本)}$$

$$twi : \text{1箇所目を除き2箇所目以降の継杭1箇所当りの溶接時間 (min/箇所) (表 5.5)}$$

$$\alpha : \text{鋼管板厚補正係数 (表 5.6)}$$

表 5.5 継杭1箇所当りの溶接時間 (min/箇所)

鋼管径 (mm)	1箇所当りの溶接時間
700	59
800~900	46
1,000~1,100	57
1,200	65

(注) 鋼管径φ800mm以上は、溶接機2台を使用する溶接時間である。

表 5.6 鋼管板厚補正係数( $\alpha$ )

鋼管板厚 (mm)	9~10	11~12	13~14	15~17	18~19
係数	0.61	0.79	1.00	1.37	1.82



(例)

鋼管径 1,000mm, 3 箇所目の継杭溶接の場合（「下杭」「中杭①」「中杭②」「上杭」）

- 1 箇所目（「下杭」「中杭①」） 板厚 10mm・・・準備・固化体造成時間内に溶接作業を行うため計上しない。  
 2 箇所目（「中杭①」「中杭②」） 板厚 10mm・・・ $tw1$   
 3 箇所目（「中杭②」「上杭」） 板厚 10mm・・・ $tw2$

$$tw1 \times \alpha = 57 \times 0.61 = 34.77 \approx 35 \text{min (小数点第1位を四捨五入する)}$$

$$tw2 \times \alpha = 57 \times 0.61 = 34.77 \approx 35 \text{min (小数点第1位を四捨五入する)}$$

$$T_w = tw1 + tw2 = 35 \text{min} + 35 \text{min} = 70 \text{min}$$

図 5-1 継杭溶接箇所(参考図)



## 6. 材料使用量

使用するセメント使用量，添加材使用量は，次式を標準とする。

## 6-1 セメント使用量

図6-1に表わす部位毎に，セメント量を計上し，各部位の使用量合計が杭1本当りのセメント使用量となる。なお，高炉セメントB種を標準とする。

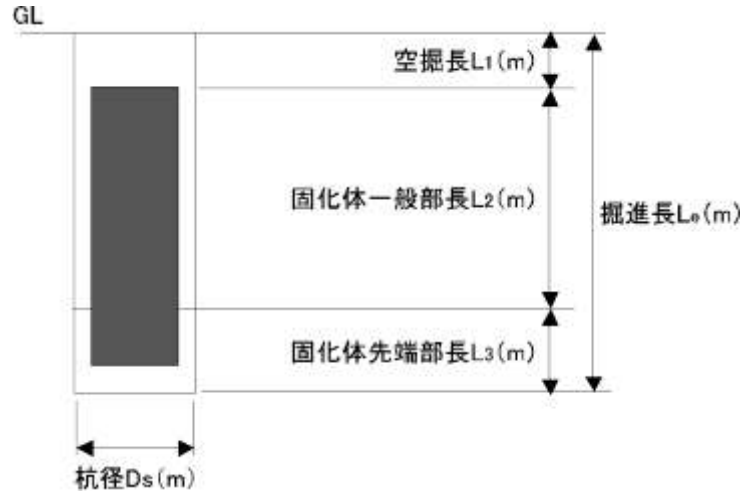


図6-1 施工した杭の部位名

$$Q_1 = C_1 + C_2 + C_3 \cdots \cdots \text{式6.1}$$

$Q_1$ ：杭1本当りセメント使用量（t/本）

$C_1$ ：空掘部セメント使用量（t/本）

$C_2$ ：固化体一般部セメント使用量（t/本）

$C_3$ ：固化体先端部セメント使用量（t/本）

（注） $C_3$ のセメント使用量には，引上げ注入時のセメントも含まれる。

$C_1$ ：空掘部セメント使用量

$$C_1 = D_s^2 \times \pi / 4 \times L_1 \times 0.15 \times (1 + K_1)$$

$D_s$ ：杭径

$L_1$ ：空掘部長

$K_1$ ：ロス率（表6.2）

$C_2$ ：固化体一般部セメント使用量

$$C_2 = D_s^2 \times \pi / 4 \times L_2 \times (q / 1,000) \times (1 + K_1)$$

$D_s$ ：杭径

$L_2$ ：固化体一般部長

$q$ ：土1m<sup>3</sup>当り固化材添加量（kg/m<sup>3</sup>）（表6.1）

$K_1$ ：ロス率（表6.2）

$C_3$ ：固化体先端部セメント使用量

$$C_3 = D_s^2 \times \pi / 4 \times L_3 \times 1.5 \times (1 + K_1)$$

$D_s$ ：杭径

$L_3$ ：固化体先端部長

$K_1$ ：ロス率（表6.2）

表6.1 固化体一般部の土1m<sup>3</sup>当り固化材添加量(q) (kg/m<sup>3</sup>)

固化材添加量	300	350	400
--------	-----	-----	-----

表6.2 ロス率( $K_1$ )

ロス率	+0.15
-----	-------

## 6-2 添加材使用量

図6-1に表わす部位毎に、添加材使用係数をセメント量に乗じて部位毎使用量を計上し、その使用量の合計が、杭1本当りの添加材使用量となる。なお、硬化遅延剤を標準とする。

$$Q_2 = Q_1 \times 1,000 \times K_2 \cdots \cdots \text{式 6.2}$$

$Q_2$  : 添加材使用量 (kg/本)

$Q_1$  : 杭 1 本当りセメント使用量 (t/本)

$K_2$  : 添加材使用係数 (表 6.3)

表6.3 添加材使用係数( $K_2$ )

掘進長 (Le)	0～10m未満	10～20m未満	20～30m未満	30～45m以下
添加材使用係数	0.005	0.01	0.02	0.03

(注) 掘進長 (Le) とは、図6-1の  $L_1 + L_2 + L_3$  とする。

## 7. 諸雑費

諸雑費は、電力に関する経費、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、溶接機と付属機材及び溶接材料の費用、口元管、ヤットコ、掘削攪拌ヘッド及びロッド、鋼管キャップ・カラー、ロッドスタビライザ、スタビライザブラケット、下部振れ止め、ロッド吊金具、高圧洗浄機等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 7.1 諸雑費率 (%)

継杭の有無	諸雑費率
継杭無し	27
継杭有り	28

## 8. 単価表

(1) 鋼管ソイルセメント杭1本当り単価表

SWB232110

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{T_c}{(60 \times T)} \times 1$	表4.1
溶 接 工		〃	$\frac{T_c}{(60 \times T)} \times 2(1)$	継杭の場合に計上 鋼管径800mm未満は (注)による
と び 工		〃	$\frac{T_c}{(60 \times T)} \times 2$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{T_c}{(60 \times T)} \times 1$	〃
クローラ式杭打機 運 転	鋼管ソイルセメント杭打機 杭径 900～1,500mm 最大施工深度 70m オーガ出力 110～150kW	h	$\frac{T_c}{60}$	表3.1 機械損料
クローラクレーン 運 転	油圧駆動式ウインチ ラチスジブ型 ○○t吊 排出ガス対策型 (第○次基準値)	〃	$\frac{T_c}{60}$	表3.1 機械損料
バックホウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	〃	$\frac{T_c - T_w}{60}$	表3.1 機械損料
スラプラント (全自動)	能力40m <sup>3</sup> /h	〃	$\frac{T_c - T_w}{60}$	表3.1 機械損料
諸 雑 費		式	1	表7.1
セメント材料費	高炉セメントB種	t	Q <sub>1</sub>	式6.1, 表6.1, 表6.2
添加材料費		kg	Q <sub>2</sub>	式6.2, 表6.3
鋼 管 杭	突起(リブ)付	本	1	
計				

- (注) 1. T＝鋼管ソイルセメント杭打機運転日当り運転時間は、5.8h/日とする。  
 2. 鋼管径が800mm未満については、( )の人工を計上する。

(2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラ式杭打機	鋼管ソイルセメント杭打機 杭径 900～1,500mm 最大施工深度 70m オーガ出力 110～150kW	機-1	運転労務数量→0.19 燃料消費量→13
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 60～65t吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)	機-1	運転労務数量→0.17 燃料消費量→12
	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 90t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	機-1	運転労務数量→0.17 燃料消費量→18
バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	機-1	運転労務数量→0.16 燃料消費量→9.8

## ①-4 回転杭工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、杭径800～1,200mmの胴体回転方式にて施工される掘削長7m以上48m以下の羽根外径が杭径の1.5倍である回転杭（開口タイプ、開端タイプ）に適用する。

なお、以下の条件は適用範囲外とする。

- ・鋼管長が7m未満の杭
- ・斜杭



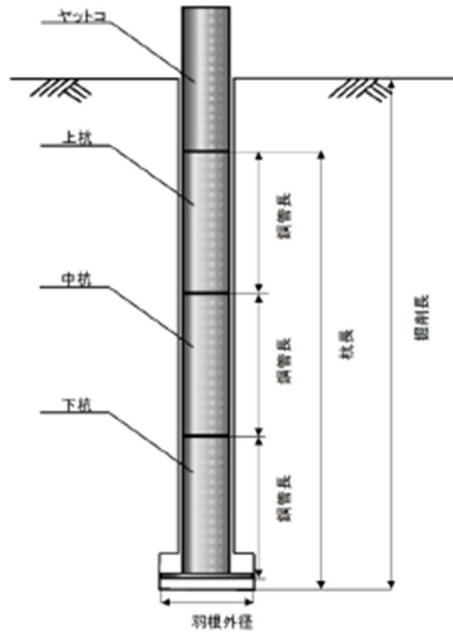


図1-1 施工図





$$D_w = D_p \times 1.5$$

$D_w$  : 羽根外径 (mm)

$D_p$  : 杭径 (鋼管径) (mm)

図1-2 羽根の概要図(開口タイプ)

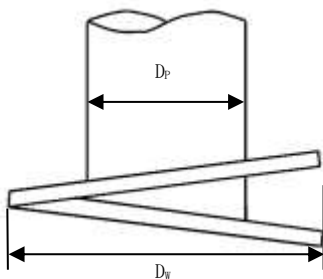

$$D_w = D_p \times 1.5$$

$D_w$  : 羽根外径 (mm)

$D_p$  : 杭径 (鋼管径) (mm)

図1-3 羽根の概要図(開端タイプ)

## 2. 施工概要

回転杭工は、先端部に羽根を有する鋼管杭に全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）（回転貫入機）により回転力を付与して、地中に貫入させる工法である。施工フローは、下記を標準とする。

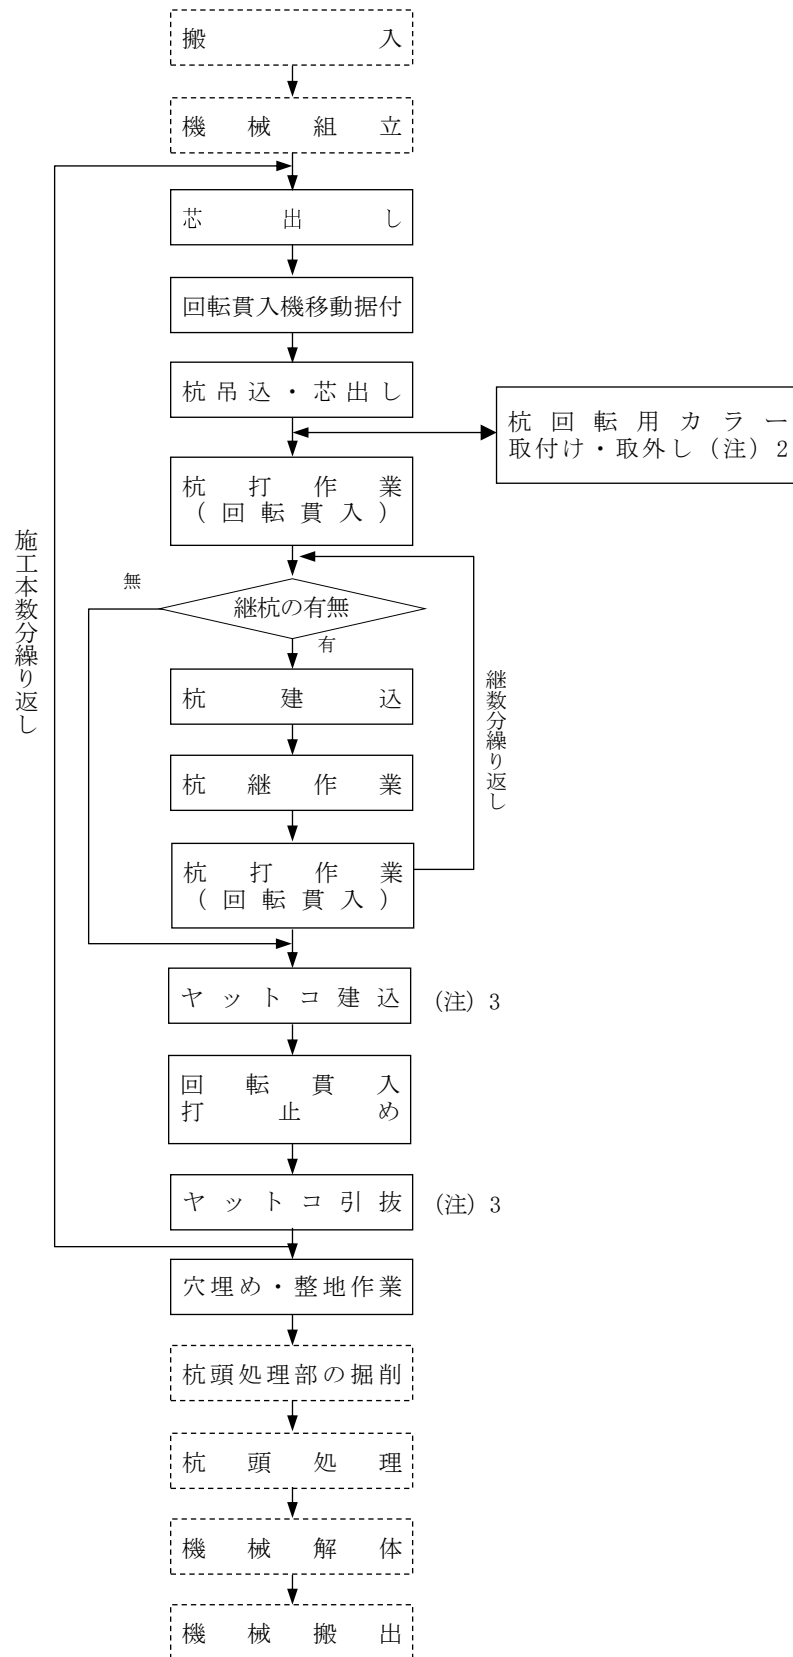


図 2-1 施工フロー

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
2. 開端タイプを採用する場合
3. ヤットコは必要により施工する。
4. 杭頭処理は「第Ⅱ編第3章①鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）」により別途計上する。

### 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要
回 転 貫 入	全回転型 オールケーシング 掘削機（回転杭 用）	ケーシングドライバ（スキッド 式・ディーゼル/油圧駆動・回 転杭用） 最大掘削径φ2,000mm 排出ガス対策型（第3次基準値）	台	1	
回転貫入機移動 据付、杭建込、 ヤットコ建込	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 100t吊 排出ガス対策型（第3次基準 値）	〃	1	
杭回転用カラー 取付け・取外し	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排出ガス対策型（第3次基準 値）	〃	1	(注) 1 (注) 2
穴 埋 め ・ 整 地 作 業	バックホウ （クローラ型）	標準型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 山積0.5m³（平積0.4m³）	〃	1	(注) 1

- (注) 1. バックホウ、クローラクレーン（4.9t吊）は、賃料とする。
2. 開端タイプを採用する場合には、クローラクレーン（4.9t吊）を計上する。
3. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

### 4. 編成人員

編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員 (人)

職種	土木一般 世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工
編 成 人 員	1	1	1	1	2 (1)

- (注) 1. 鋼管杭径800mmの場合は、( ) 内の数値を計上する。
2. 継杭を施工しない場合は、溶接工は計上しない。

### 5. 施工歩掛

#### 5-1 杭10本当りの施工日数（T<sub>d</sub>）

杭10本当りの施工日数T<sub>d</sub>は、次式による。

$$T_d = \alpha \times \beta \times T_a$$

α：土質係数

β：板厚係数

T<sub>a</sub>：杭径別施工日数（日/10本）

（ヤットコの有無にかかわらず使用できるものとする。）

(1) 土質係数 ( $\alpha$ )表5.1 土質係数( $\alpha$ )

N値の範囲	20未満	20以上40未満	40以上
土質係数	1.00	1.20	1.51

(注) N値は掘削層の加重平均とする。

(2) 板厚係数 ( $\beta$ )表5.2 板厚係数( $\beta$ )

最小板厚	12mm	14mm	16mm
板厚係数	1.00	1.08	1.16

(注) 板厚の異なる継杭の場合は、最小板厚の板厚係数とする。

(3) 杭径別施工日数 ( $T_a$ )表5.3 杭径別施工日数( $T_a$ )

(日/10本)

掘削長 (m)	杭径				
	800mm	900mm	1,000mm	1,100mm	1,200mm
7m以上 16m以下	5.57	5.77	6.05	6.33	6.61
16mを超え 32m以下	10.11	10.67	11.37	12.07	12.77
32mを超え 48m以下	14.65	15.56	16.68	17.81	18.94

## 5-2 諸雑費

回転杭工の諸雑費は、鋼管吊具、カウンタウェイト、回転反力装置、ヤットコ、チャックプレート、定規鉄板、施工管理装置、溶接機の損料、溶接ワイヤー及び銅バンドの材料費、足場材（敷鉄板）の賃料及び設置・撤去・移設、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、ヤットコの有無にかかわらず、本諸雑費率を適用できる。

表5.4 諸雑費率 (%)

諸 雑 費 率	7
---------	---

## 6. 単価表

## (1) 杭10本当り単価表

SWB230110

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×T <sub>d</sub>	表4.1
と び 工		〃	1×T <sub>d</sub>	〃
特 殊 作 業 員		〃	1×T <sub>d</sub>	〃
普 通 作 業 員		〃	1×T <sub>d</sub>	〃
溶 接 工		〃	2 (1) × T <sub>d</sub>	表4.1, (注) 2
杭		本	10	
全 回 転 型 オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機 ( 回 転 杭 用 ) 運 転	ケーシングドライバ (スキッド式・ ディーゼル/油圧駆動・回転杭用) 最大掘削径φ2,000mm 排出ガス対策型 (第3次基準値)	日	T <sub>d</sub>	機械損料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 100t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	〃	T <sub>d</sub>	機械損料
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	〃	T <sub>d</sub>	機械賃料 (注) 3
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 ) 運 転	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	〃	T <sub>d</sub>	機械賃料
諸 雑 費		式	1	表5.4
計				

(注) 1. T<sub>d</sub>: 杭10本当り施工日数 (日/10本)

2. 鋼管杭径800mmの場合は, ( ) 内の数値を計上する。

3. 開端タイプを採用する場合は, クローラクレーン (4.9t吊) を計上する。

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
全 回 転 型 オ ー ル ケ ー シ ン グ 掘 削 機 ( 回 転 杭 用 )	ケーシングドライバ (スキッド式・ ディーゼル/油圧駆動・回転杭用) 最大掘削径φ2,000mm 排出ガス対策型(第3次基準値)	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 174 機械損料数量 → 1.48
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 100t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 94 機械損料数量 → 1.51
クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 排出ガス対策型 (第3次基準値)	機-28	運転労務数量 → 0.18 燃料消費量 → 2.1 機械賃料数量 → 1.64
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	機-28	運転労務数量 → 0.28 燃料消費量 → 11 機械賃料数量 → 1.59

(注)1. 開端タイプを採用する場合は, クローラクレーン (4.9t吊) を計上する。



## ①ー5 杭頭処理工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、杭破碎機による杭径300mm以上800mm以下の既製コンクリート杭（PHC杭，RC杭）の杭頭処理のうち、剛結合を目的とするカットオフ工の施工に適用する。

## 2. 施工歩掛

既製コンクリート杭のカットオフ工歩掛は、次表を標準とする。

表2.1 カットオフ工歩掛（杭10本当たり）

名 称	規 格	単位	杭 径 (mm)		
			杭径 φ 300～450mm	杭径 φ 500～600mm	杭径 φ 700～800mm
特 殊 作 業 員		人	1.7	2.9	4.1
杭 破 碎 機	杭径 φ 300～600mm	日	0.50	0.83	—
	杭径 φ 700～1,000mm		—	—	1.20
諸 雑 費 率		%	18		

- (注) 1. 本歩掛には廃材処理費は含まれていないので、別途計上する。  
 2. 諸雑費は、溶断器の損料及びアセチレン、酸素等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 3. 単価表

(1) 既製コンクリート杭カットオフ工10本当たり単価表

SWB231910

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
特 殊 作 業 員		人		表2.1
杭 破 碎 機 運 転		日		表2.1 機械損料
諸 雑 費		式	1	表2.1
計				

(2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
杭 破 碎 機	杭径 φ 300～ 600mm 杭径 φ 700～1,000mm	機－12	主 燃 料→ガソリン 燃料消費量→1.3

## ② 場所打杭工

## ②-1 全回転式オールケーシング工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、設計杭径1,000～1,200mmは掘削長60m以下、設計杭径1,500, 2,000mmは掘削長50m以下の全回転式オールケーシング工法による場所打杭の施工に適用する。

## 2. 施工概要

オールケーシング工法は、打込準備（敷鉄板の設置・撤去含む）を行ったのち、杭芯出しを行い、ケーシングチューブを建込み、ケーシングチューブを押込みながらハンマグラブによって土砂及び岩砕の搬出を行う。

支持層に達したことを確認した後、孔内清掃（スライム処理）、鉄筋建込を行い、さらにトレミー管によりコンクリートを打設しながらケーシングチューブを引抜くことによって杭を施工する。

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

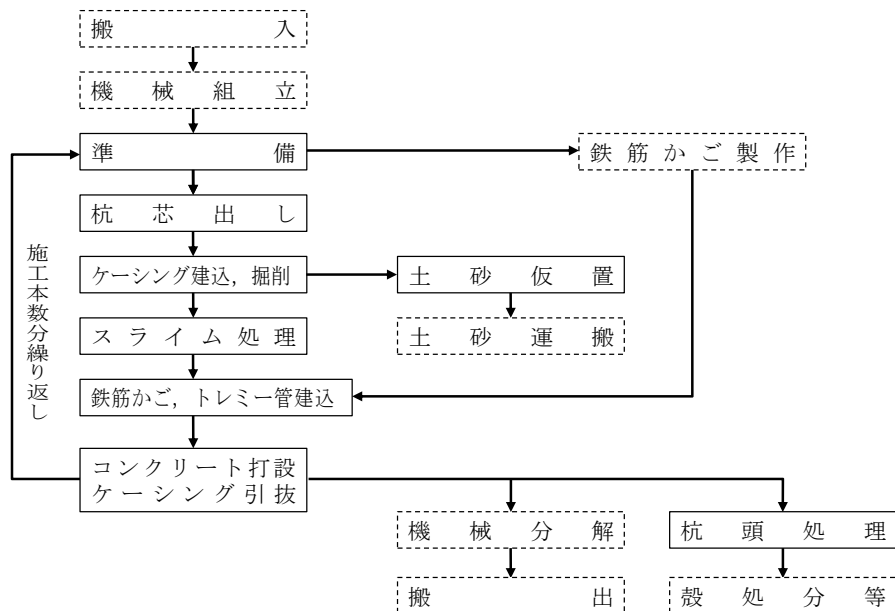


図2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

## 3-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
	全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライバ (スキッド式・ ディーゼル/油圧駆動) 最大掘削径 $\phi 1,500\text{mm}$  又は 最大掘削径 $\phi 2,000\text{mm}$	台	1	図3-1
掘削機設置・撤去, 鉄筋かご,ケーシング, トレミー管建込, 敷鉄板設置・撤去, 掘削作業	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次 基準値)70t吊  又は 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型排出ガス 対策型(2011年規制) 100t吊	〃	1	図3-2
杭周り・機械周り 整地,杭穴の埋戻整地, 掘削土集土	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)山積 $0.45\text{m}^3$ (平積 $0.35\text{m}^3$ )	〃	1	

- (注) 1. 掘削土砂は、掘削機よりベッセルに排土し、クローラクレーンで旋回範囲内に仮置きし、水切りした後に運搬するものを標準とする。  
 2. 掘削土処理については、「第Ⅱ編第1章②土工」により、別途計上する。  
 3. バックホウは、賃料とする。

## 3-2 掘削機の規格

掘削機の規格は、設計杭径及び掘削長により次図を標準とする。また、現場条件により次図により難しい場合は、別途考慮する。

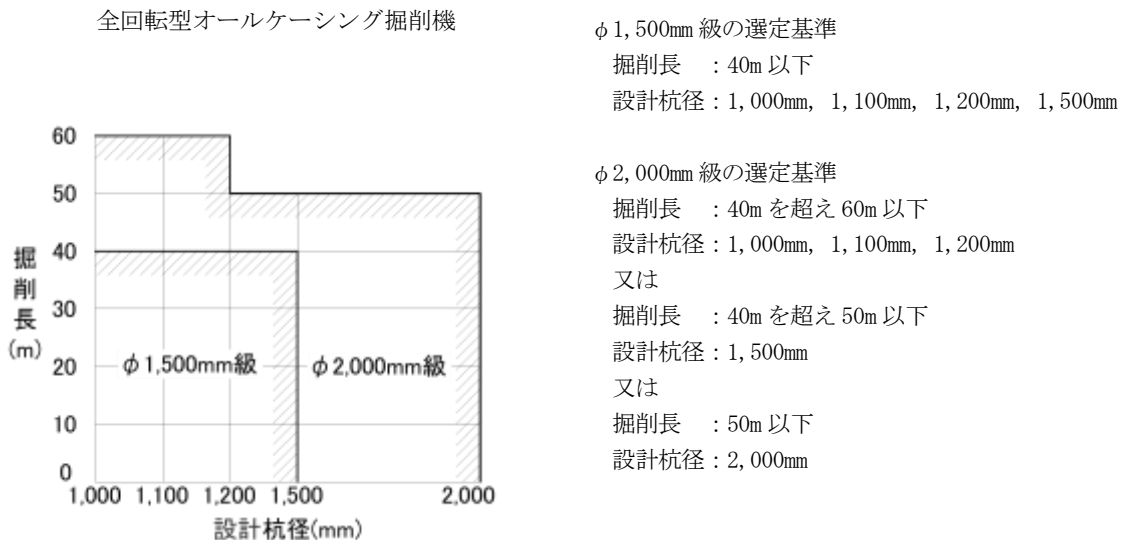


図3-1 掘削機別選定

## 3-3 クローラクレーンの規格

クローラクレーンの規格は、設計杭径及び掘削長により次図を標準とする。また、現場条件により次図により難しい場合は、別途考慮する。

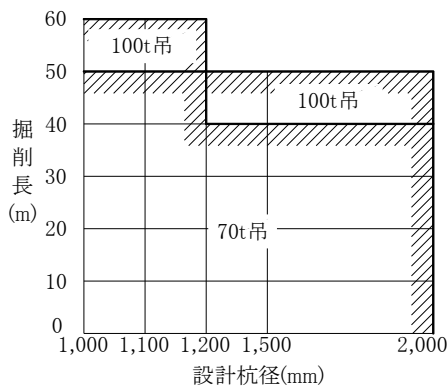


図 3-2 クローラクレーン別選定

## 70t 吊クローラクレーンの選定基準

掘削長：50m 以下

設計杭径：1,000mm, 1,100mm, 1,200mm

又は

掘削長：40m 以下

設計杭径：1,500mm, 2,000mm

## 100t 吊クローラクレーンの選定基準

掘削長：50m を超え 60m 以下

設計杭径：1,000mm, 1,100mm, 1,200mm

又は

掘削長：40m を超え 50m 以下

設計杭径：1,500mm, 2,000mm

## 4. 編成人員

掘削機1台に対する編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員

(人/台)

職 種	土 木 一 般 世 話 役	と び	工 特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員
編 成 人 員	1	1	1	1

(注) 上表は、掘削、鉄筋かご建込、コンクリート打設等及びその準備等を含んだ一連の作業にたずさわる人員である。

## 5. 施工歩掛

5-1 杭 1 本当りの施工日数 $D_c$ は、次式による。

$$D_c = D_{c1} + D_{c2}$$

$D_c$ ：杭 1 本当り施工日数（日/本）

$D_{c1}$ ：杭 1 本当りの掘削日数（日/本）

$D_{c2}$ ：杭 1 本当りのコンクリート打設等の施工日数（日/本）

①杭 1 本当りの掘削日数（ $D_{c1}$ ）

杭 1 本当りの掘削日数（ $D_{c1}$ ）は、次表の掘削日数を、掘削する土質毎に下記のとおり算出する。

$D_{c1} = (T_1 \times \ell_1) + (T_2 \times \ell_2) + \dots$ （日/本）（ $D_{c1}$ は、小数第3位を四捨五入し、小数第2位とする。）

$T_n$ ：各土質の掘削日数

$\ell_n$ ：各土質の掘削長（m）

(例) 全回転型オールケーシング掘削機

掘削長20m（レキ質土、粘性土、砂及び砂質土15m、硬岩Ⅰ5m）の場合

$$D_{c1} = (0.03 \times 15) + (0.08 \times 5) = 0.85$$

表 5.1 掘削日数(T)

(日/m)

土 質	レキ質土 粘性土 砂及び砂質土	岩塊・玉石 軟 岩Ⅰ	軟 岩Ⅱ	硬岩Ⅰ 中硬岩
掘 削 日 数	0.03	0.04	0.06	0.08

(注) 掘削日数はケーシング建込日数を含む。

②杭1本当りのコンクリート打設等の施工日数（D<sub>c2</sub>）

杭1本当りのコンクリート打設等の施工日数（D<sub>c2</sub>）には芯出し、機械移動据付、検尺、注水、スライム処理、鉄筋かご建込、鉄筋かご継足、トレミー管建込、コンクリート打設・ケーシング引抜、トレミー管引抜を含む。

表5. 2 杭1本当りのコンクリート打設等の施工日数（日/本）

掘削長	杭1本当りのコンクリート打設等の施工日数
$0 < \ell \leq 10$	0.45
$10 < \ell \leq 20$	0.70
$20 < \ell \leq 30$	0.97
$30 < \ell \leq 40$	1.24
$40 < \ell \leq 50$	1.50
$50 < \ell \leq 60$	1.76

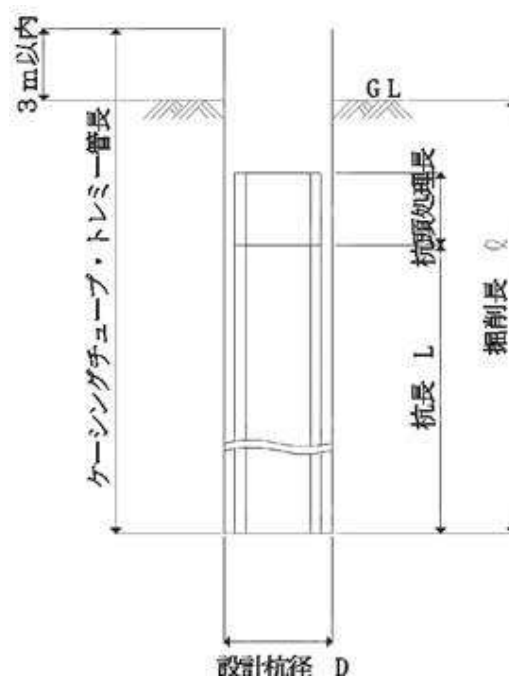


図5-1 施工図

## 5-2 材料の使用数量

杭1本に必要なコンクリート使用数量は、次式による。

$$Q = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times L \times (1 + K) \dots\dots (式 5.1)$$

Q：杭1本当りのコンクリート使用数量（m<sup>3</sup>/本）

D：設計杭径（m）

L：杭長（m）

K：ロス率

コンクリート使用数量のロス率（損失＋杭頭処理分を含む）は、次表とする。

表 5. 3 ロス率(K)

ロス率	+0.09
-----	-------

## 5-3 杭頭処理

杭1本当たり杭頭処理歩掛は、次表とする。

表5.4 杭頭処理歩掛

(1本当たり)

名 称	規 格	単位	設計杭径(mm)				
			1,000	1,100	1,200	1,500	2,000
土木一般世話役		人	0.09	0.10	0.11	0.14	0.18
特殊作業員		〃	0.31	0.34	0.37	0.46	0.62
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)50t吊	日	0.09	0.10	0.11	0.14	0.18
諸 雑 費		%	19				

(注) 1. ラフテレーンクレーンは賃料とする。

2. 諸雑費は、空気圧縮機運転（排出ガス対策型）、コンクリートブレーカ損料、付着防止材等の費用であり、労務費及び運転経費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3. 処分費が必要な場合は、別途計上する。

4. 殻積込については、「第Ⅱ編第2章④構造物とりこわし工」により、別途計上する。

5. 殻運搬については、「第Ⅱ編第2章共通工⑤殻運搬」により、別途計上する。

## 5-4 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。

## 5-5 諸雑費

諸雑費は、施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、ハンマグラブ、ケーシングチューブ、ハンマクラウン、プランジャ、ベッセル、スラッシュタンク、トレミー管、コンクリート打込スロープ、吊金具、吊ワイヤ、工事用水中モータポンプの損料、副バンド装置の損料、ビット等の損耗費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、運転経費、機械損料及び賃料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する（杭頭処理の労務費、機械賃料及び運転経費は含まない）。

表 5.5 諸雑費率

（%）

諸雑費率	29
------	----

## 6. 単価表

(1) 基礎杭工1本当り単価表

SWB230310

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×D <sub>c</sub>	表4.1
と び 工		〃	1×D <sub>c</sub>	〃
特 殊 作 業 員		〃	1×D <sub>c</sub>	〃
普 通 作 業 員		〃	1×D <sub>c</sub>	〃
掘 削 機 運 転		日	D <sub>c</sub>	機械損料
クローラクレーン運転		〃	D <sub>c</sub>	〃
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転		〃	D <sub>c</sub>	機械賃料
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式5.1, 表5.3
鉄 筋 工		t		別途計上する
諸 雑 費		式	1	表5.5
計				

(注) D<sub>c</sub>: 杭1本当り施工日数 (日/本)

(2) 杭頭処理1本当り単価表

SWB230350

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.4
特 殊 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)50t吊	日		表5.4 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表5.4
計				

## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
全 回 転 型 オールケーシング 掘 削 機	ケーシングドライバ (スキッド式・ディーゼル/ 油圧駆動) 最大掘削径φ1,500mm	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 82 機械損料数量→ 1.45
	ケーシングドライバ (スキッド式・ディーゼル/ 油圧駆動) 最大掘削径φ2,000mm	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 95 機械損料数量→ 1.45
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 106 機械損料数量→ 1.38
	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型・排出ガス対策型(2011年規制) 100t吊	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 119 機械損料数量→ 1.38
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	機－28	運転労務数量→ 0.80 燃 料 消 費 量 → 29 機械賃料数量→ 1.60




## ②-2 リバースサーキュレーション工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、リバースサーキュレーションによる場所打杭工の施工に適用する。なお、揚水方式はポンプサクショ方式とし、杭径は800～2,000mm、掘削長は70mまでとする。施工方法はA工法（クローラークレーン2台による施工）を標準とし、作業面積、障害物等によりクローラークレーン2台を常時使用して作業することが不可能な場合はB工法（クレーン1台施工）とする。

## 工法別作業順序

## (A工法)

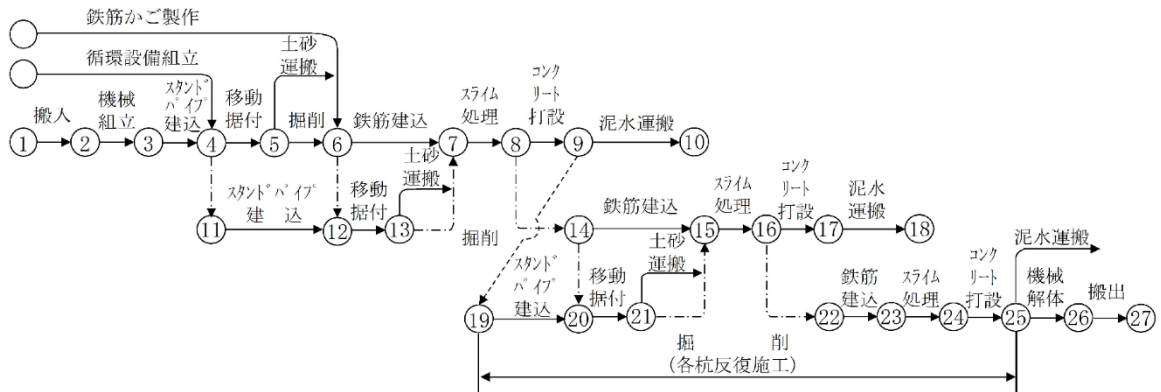

## (B工法)

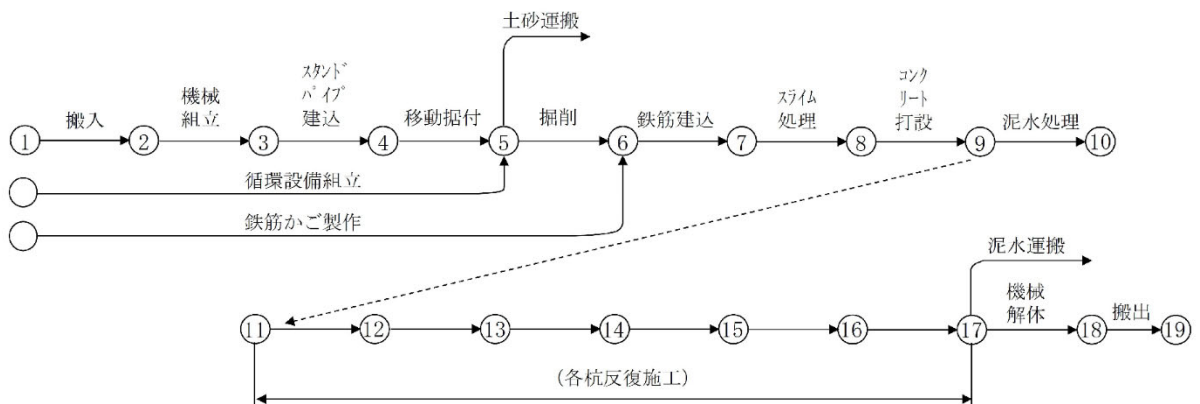


図1-1 工法別作業順序

## 2. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表2.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量		摘要
				A工法	B工法	
	リバースサーキュレーションドリル	ロータリテーブル式, 最大掘削径φ3,200mm, 最大掘削長200m	台	1	1	
	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 40t吊	〃	2	1	(注)
スタンドパイプ 施工用	油圧式鋼管 圧入引抜機	4本ジャッキ式(各種)	〃	1	1	
掘削土処理用	バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	〃	1	1	(注)
	スラッシュタンク		槽	必要量	必要量	

(注) クローラクレーン、バックホウは、賃料とする。

## 3. 編成人員

掘削機1台に対する編成人員は、次表を標準とする。

表3.1 編成人員

(人/台)

工法 \ 職種	土木一般世話役	特殊作業員	とび工	普通作業員
A工法	1	1	2	2
B工法	1	1	2	1

(注) この人員は、掘削機操作、水中ポンプ操作、鉄筋かご建込、コンクリート打設等を含んだ一連の作業にたずさわる人員である。

## 4. 施工歩掛

4-1 掘削長杭径別杭1本当り施工日数(d<sub>1</sub>)

(1) 掘削長杭径別杭1本当り施工日数は、次表による。

表4.1 掘削長杭径別杭1本当り施工日数(d<sub>1</sub>)

(日/本)

掘削長(m) \ 杭径(mm)	800 ≤ D ≤ 1,100	1,100 < D ≤ 1,400	1,400 < D ≤ 1,700	1,700 < D ≤ 2,000
0 < L <sub>1</sub> ≤ 10	0.51	0.55	0.59	0.63
10 < L <sub>1</sub> ≤ 20	0.69	0.81	0.93	1.05
20 < L <sub>1</sub> ≤ 30	0.87	1.07	1.27	1.47
30 < L <sub>1</sub> ≤ 40	1.05	1.33	1.61	1.90
40 < L <sub>1</sub> ≤ 50	1.23	1.59	1.96	2.32
50 < L <sub>1</sub> ≤ 60	1.41	1.85	2.30	2.74
60 < L <sub>1</sub> ≤ 70	1.59	2.11	2.64	3.16

(注) 上表には、準備、リバース機による掘削、スタンドパイプ建込部掘削、スタンドパイプ建込・引抜き、鉄筋かご建込、トレミー管建込、コンクリート打設を含む。

(2) 杭N本当り施工日数は、次式による。

$$d = d_1 \times N \times \gamma \quad (\text{日})$$

d : 掘削長杭径別杭N本当り施工日数(日)


d<sub>1</sub> : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数(日/本)

N : 施工本数(本)

γ : 施工係数

表4.2 施工係数(  $\gamma$  )

工 法	A 工 法	B 工 法	
杭 径(mm)	800以上2,000以下	1,400以下	1,400を超える
係 数	1	1.70	1.47

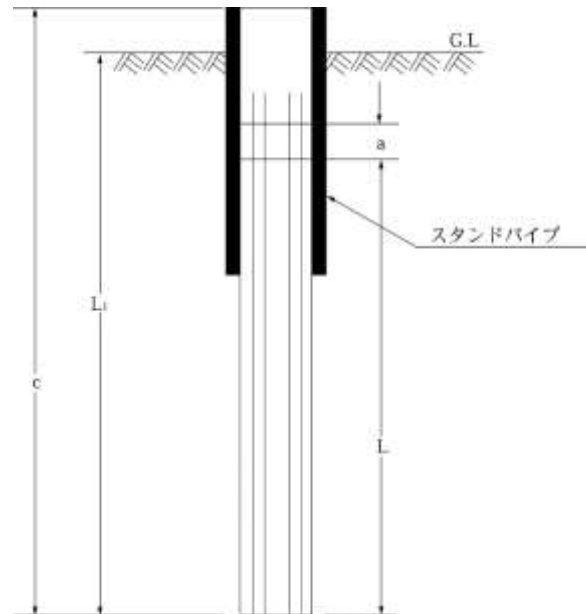

L : 杭長  
 $L_1$  : 掘削長  
a : 杭頭処理長  
c : トレミー管建込長

図4-1 施工図

## 4-2 杭1本の施工に要する各機械の供用日数及び運転日数

## (1) 掘削機（リバーササーキュレーションドリル）の供用日数

$$d_R = 1.51 \times \gamma \times \delta \times d_1 \text{ (供用日/本)}$$

$d_R$  : 掘削機（リバーササーキュレーションドリル）の供用日数（供用日/本）

$\gamma$  : 施工係数（表4.2）

$\delta$  : 掘削係数（表4.3）

$d_1$  : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数（日/本）

表4.3 掘削係数(  $\delta$  )

杭 径(mm)	1,400以下	1,400を超える
掘削係数	0.70	0.80

## (2) クローラクレーンの運転日数

$$d_{C1} = \gamma \times \varepsilon_1 \times d_1 \text{ (日/本)}$$

$$d_{C2} = \gamma \times \varepsilon_2 \times d_1 \text{ (日/本)}$$

$d_{C1}$  : クローラクレーン運転日数（1台目）

$d_{C2}$  : " (2台目)

$\gamma$  : 施工係数（表4.2）

$\varepsilon_1$  : クレーン係数（表4.4）

$\varepsilon_2$  : "

$d_1$  : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数（日/本）

表4.4 クレーン係数( $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ )

係 数	工 法	杭径1,400mm以下	杭径1,400mmを超える
$\varepsilon_1$	A, B工法	0.99	
$\varepsilon_2$	A工法	0.99	0.68

## (3) 油圧式鋼管圧入引抜機の供用日数

$$d_H = 1.51 \times \gamma \times d_1 \text{ (供用日/本)}$$

$d_H$  : 油圧式鋼管圧入引抜機の供用日数 (供用日/本)

$\gamma$  : 施工係数 (表4.2)

$d_1$  : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数 (日/本)

## (4) バックホウの運転日数

$$d_B = 1.09 \times \gamma \times \delta \times d_1 \text{ (日/本)}$$

$d_B$  : バックホウの運転日数 (日/本)

$\gamma$  : 施工係数 (表4.2)

$\delta$  : 掘削係数 (表4.3)

$d_1$  : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数 (日/本)

なお、この日数には、沈殿池の掘削、残土処理、簡単な作業足場敷均し等の全てを含む。

## 4-3 労務歩掛

(1) 表3.1に示す作業員等の杭1本当り労務歩掛 (M) は、次式による。

$$M = \gamma \times d_1 \times n \text{ (人/本)}$$

M : 作業員等の杭1本当り労務歩掛 (人/本)


$\gamma$  : 施工係数 (表4.2)

$d_1$  : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数 (日/本)

n : 編成人員 (人)

(2) ダンプトラックの運転労務は、「第Ⅰ編第7章①建設機械運転労務」による。

## 4-4 施工日数算定にあたってのフロー

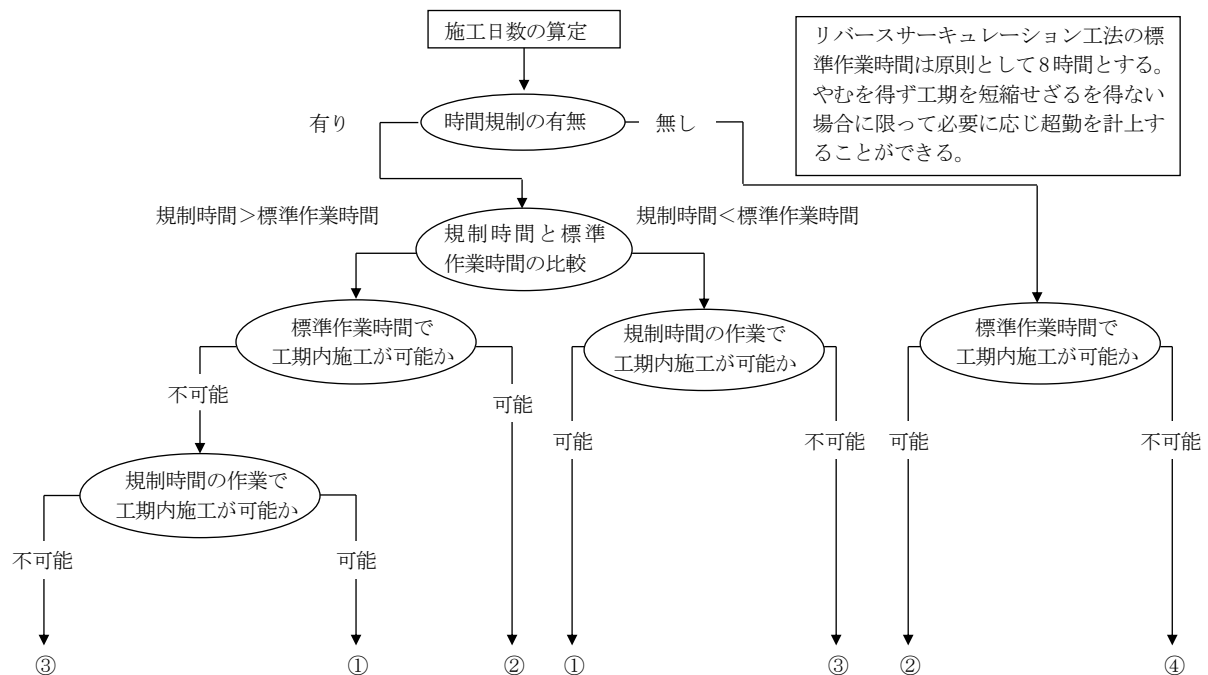

- ① 規制時間内施工で積算する。
- ② 標準時間作業時間（8時間）で積算する。
- ③ パーティ数を考慮して積算する。
- ④ 超勤及びパーティ数を考慮して積算する。

#### 5. 杭1本当りコンクリート使用量

杭1本当りに必要なコンクリート使用量は、次式による。

$$Q = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times L \times (1 + K) \text{ (m}^3\text{/本)}$$

Q：杭1本当りコンクリート使用量（m<sup>3</sup>/本）

D：杭径（m）

L：杭長（m）

K：コンクリートロス率

コンクリート量のロス（ロス＋杭頭処理部分を含む）は、次表とする。

表5.1 コンクリートのロス率(K)

ロ ス 率	+0.12
-------	-------

#### 6. 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章①ー1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。

#### 7. 掘削土及び泥水処理

- （1）掘削土の運搬が必要な場合は、ダンプトラック（オンロード・ディーゼル10t積級）を別途計上する。
- （2）掘削土の産業廃棄物処理費が必要な場合は、別途計上する。
- （3）泥水処理費が必要な場合は、別途計上する。

#### 8. 諸雑費

杭1本当りの諸雑費は、鉄筋かご建込時の溶接材、ブランジャ・スタンドパイプ・トレミー管・電気溶接機・ドリルパイプ・サクションホース・デリバリーホース・工事用水中モータポンプ・三翼ビット・ハンマグラブ及びハンマクラウンの損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設に関する経費、電力に関する経費、杭頭処理等の費用であり労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表8.1 諸雑費率 (%)

工 法	A工法・B工法
諸 雑 費 率	31

## 9. 単価表及び内訳書

## (1) 基礎杭工1本当り内訳書

SWB230410

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\gamma \times d_1 \times n$	表3.1, 表4.1, 表4.2
特 殊 作 業 員		〃	$\gamma \times d_1 \times n$	〃
と び 工		〃	$\gamma \times d_1 \times n$	〃
普 通 作 業 員		〃	$\gamma \times d_1 \times n$	〃
油 圧 式 鋼 管 圧 入 引 抜 機	4本ジャッキ式（各種）	供用日	$1.51 \times \gamma \times d_1$	表4.1, 表4.2 機械損料
リバースサーキュレー ションドリル	ロータリテーブル式 最大掘削径 $\phi 3,200\text{mm}$ 最大掘削長 200m	〃	$1.51 \times \gamma \times \delta \times d_1$	表4.1, 表4.2, 表4.3 機械損料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 40t吊	日	$\gamma \times \varepsilon_1 \times d_1$	表4.1, 表4.2, 表4.4 機械賃料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 40t吊	〃	$\gamma \times \varepsilon_2 \times d_1$	表4.1, 表4.2, 表4.4 機械賃料
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス 対策型(第1次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	〃	$1.09 \times \gamma \times \delta \times d_1$	表4.1, 表4.2, 表4.3 機械賃料
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		単価表(2)
鉄 筋 工		t		別途計上
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	h		別途計上 機械損料
諸 雑 費		式	1	表8.1
計				

- (注) 1. 諸雑費の対象額には、鉄筋工、コンクリート材料費、ダンプトラック運転は含まれない。  
 2. スラッシュタンクは、別途計上する。  
 3. クローラクレーン、バックホウは、賃料とする。  
 4.  $\gamma$  : 施工係数  
 $d_1$  : 掘削長杭径別杭1本当り施工日数  
 $n$  : 編成人員  
 $\delta$  : 掘削係数  
 $\varepsilon_1$  : クレーン係数  
 $\varepsilon_2$  : クレーン係数

## (2) コンクリート工杭1本当り単価表

SWB230420

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) コンクリート数量については、「5. 杭1本当りコンクリート使用量」を参照。

## (3) スラッシュタンク杭1本当り単価表

SWB230430

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
スラッシュタンク		供用日	$1.51 \times \gamma \times d_1$	表4.1, 4.2 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) スラッシュタンクは各規格毎に必要量を計上する。

## (4) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積 $0.5\text{m}^3$ (平積 $0.4\text{m}^3$ )	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 45 機械賃料数量→ 1.28
ク ロ ー ラ ク レ ーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 40t吊	機-27	燃料消費量→ 52 機械賃料数量→ 1.00

## ②-3 アースオーガ工・硬質地盤用アースオーガ工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、掘削長30m以下、杭径350mm～600mmのアースオーガにより掘削注入を行うモルタル場所打杭の施工に適用する。

なお、適用土質は、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、岩塊・玉石、軟岩（Ⅰ）及び軟岩（Ⅱ）とする。

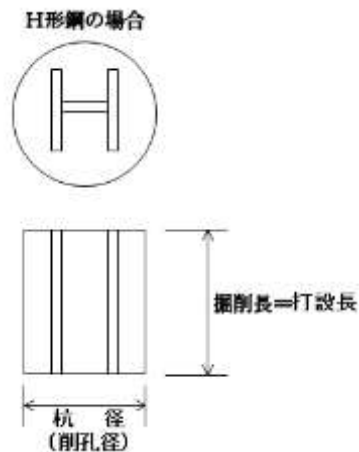


図1-1 施工図

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

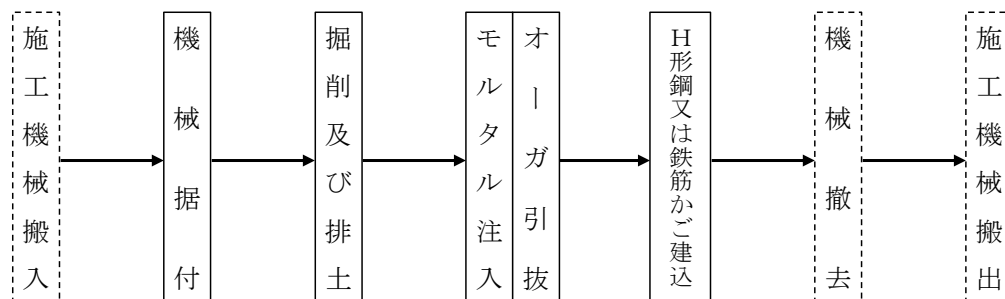


図2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

## 3-1 機種の選定

機械・規格の選定は、次表を標準とする。


表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
	クローラ式アースオーガ	単軸式・直結三点支持式 リーダ長18～21m	台	1	アースオーガ出力は 図3-1による
H形鋼又は鉄筋 かごの建込み	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 30～35t吊	〃	1	



## 3-2 アースオーガ

アースオーガの選定は、次図を標準とするが、現場条件により次図により難しい場合は別途考慮する。

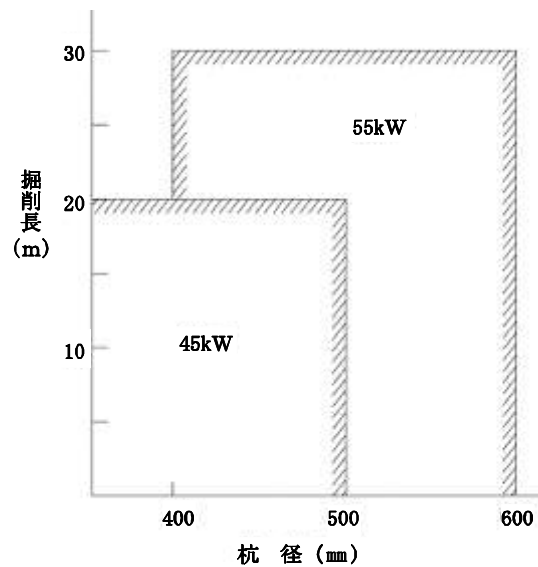

(注) 杭径400mm以上で岩塊・玉石、軟岩（Ⅰ）、軟岩（Ⅱ）を連続して2m以上含む場合は、杭径掘削長にかかわらず、オーガ出力は90kWとする。

図3-1 アースオーガの選定

## 4. 編成人員

掘削機1台に対する編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員

(人/台)

土木一般世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員
1	2	1	1

(注) 掘削機、クレーンの運転労務は、「第Ⅰ編第7章①建設機械運転労務」により別途計上する。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 杭10本当り施工日数（d）

杭10本当り施工日数は、次式による。

$$d = \frac{\alpha \cdot d_a}{F} \quad (\text{日/10本})$$

d : 杭10本当り施工日数（日/10本）

$\alpha$  : 土質係数

$d_a$  : 杭径掘削長別杭10本当り施工日数（日/10本）

F : 作業係数

## (1) 土質係数（α）

土質係数は、次表を標準とする。

表5.1 土質係数(α)

N値 \ 土質	土	岩塊・玉石	軟岩(I) 軟岩(II)
20 未 満	1.0	3.2	1.8
20 以 上	1.1		

- (注) 1. ここでいう「土」とは、レキ質土、粘性土、砂及び砂質土をいう。  
2. 土質係数αは、掘削する土質毎の係数を下記のとおり加重平均して算出する。

$$\alpha = \frac{\alpha_1 \times \ell_1 + \alpha_2 \times \ell_2 \cdots \cdots}{\ell_1 + \ell_2 \cdots \cdots}$$

ここで、α<sub>n</sub>：各土質の土質係数

ℓ<sub>n</sub>：各土質の掘削長(m)

(例) 土N値20以上の層5m、岩塊層5mの場合

$$\alpha = \frac{1.1 \times 5 + 3.2 \times 5}{5 + 5} = 2.15 \div 2.2$$

(2) 杭径掘削長別杭10本当り施工日数（d<sub>a</sub>）

杭径掘削長別杭10本当り施工日数は、次表を標準とする。

表5.2 杭径掘削長別杭10本当り施工日数(d<sub>a</sub>) (日/10本)

杭径(mm) \ 掘削長(m)	350以上 500以下	500を超え 600以下
10以下	1.3	1.4
10を超え14以下	1.7	1.8
14を超え18以下	2.0	2.2
18を超え22以下	2.8	2.9
22を超え26以下	3.1	3.3
26を超え30以下	3.4	3.7

(注) 杭径掘削長別杭10本当り施工日数には、準備時間、掘削時間、モルタル注入時間、鉄筋かご又はH形鋼建込及び継足し時間等を含む。

## (3) 作業係数（F）

作業係数は、次表を標準とする。

作業係数は、基準値を0.9とし、次式により補正する。

$$F = 0.9 + f$$

F：作業係数

f：作業条件による補正係数

表5.3 作業条件による補正係数(f)

補正係数(f) \ 条件	-0.05	0	+0.05	摘 要
施 工 規 模 (1工 事 当 り)	1,000本未満	1,000本以上 2,000本未満	2,000本以上	連続地中壁工の場合
	100本未満	100本以上 200本未満	200本以上	連続地中壁工以外の場合

## 6. 材料使用量

杭10本当りモルタル使用量は、次式による。

$$Q = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times L \times (1 + K) \times 10 \text{ (m}^3\text{/10本)}$$

Q : 杭10本当りモルタル使用量 (m<sup>3</sup>/10本)

D : 杭径 (m)

L : 打設長 (m)

K : ロス率

表6. 1 ロス率(K)

杭 径 (mm)	350以上600以下
ロ ス 率	+0.18

## 7. 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章①－1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。

## 8. 諸雑費

諸雑費は、オーガスクリュ、オーガヘッド、モルタルプラント（25kW）の損料及び電力に関する経費の費用等であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に、次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

なお、次表の上段の値は土のみの場合に適用し、下段の値は岩塊、玉石、軟岩（Ⅰ）・（Ⅱ）を連続して2m以上施工する場合に適用する。

表8. 1 諸雑费率

(%)

杭径 掘削長 モルタル区分	350mm以上 500mm以下		500mmを超え 600mm以下
	20m以下	20mを超え 30m以下	30m以下
モルタルプラント使用	20 28	27 31	
モルタルプラント不使用	10 18	18 22	

## 9. 単価表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×d	表4.1
と び 工		〃	2×d	〃
特 殊 作 業 員		〃	1×d	〃
普 通 作 業 員		〃	1×d	〃
モ ル タ ル		m <sup>3</sup>	Q	
鋼材(H形鋼又は鉄筋かご)		t		
クローラ式アースオーガ運	単軸式・直結三点支持式 リーダー長18～21m	日	d	表3.1, 図3-1 機械損料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 30～35t吊	〃	$\frac{1}{2} \times d$	機械損料
諸 雑 費		式	1	表8.1
計				

(注) 1. d : 杭10本当り施工日数 (日/10本)

2. Q : 杭10本当りモルタル使用量 (m<sup>3</sup>/10本)

## (1) 杭10本当り単価表

SWB230510

名 称	(1)	(2)	(3)	(4)
土 木 一 般 世 話 役	○			
と び 工	○			
特 殊 作 業 員	○			
普 通 作 業 員	○			
モ ル タ ル		○		
鋼 材 ( H 形 鋼 又 は 鉄 筋 か ご )			○	○
クローラ式アースオーガ運転	○			
クローラクレーン運転	○			
諸 雑 費	○	○	○	○
計				

## (2) モルタル10 本当り単価表

SWB230520

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
モ ル タ ル		m <sup>3</sup>	10 × Q	
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) Q : 杭1本当りモルタル使用量 (m<sup>3</sup>/本)

## (3) H形鋼10本当り単価表

SWB230530

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
H 形 鋼		t		
諸 雑 費		式	1	
計				

## (4) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	
クローラ式 アースオーガ	表3.1	機－18	運転労務数量→ 1.00 機械損料数量→ 1.58 燃料消費量→ 下記のとおりとする	
			規 格	燃料消費量(ℓ/日)
			45kW	49
			55kW	63
			90kW	56
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 30～35t吊	機－18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 54 機械損料数量→ 1.58	

(注) クローラ式アースオーガで、作業専用の油圧ユニットにディーゼルエンジンを使用する場合、排出ガス対策型とする。

## ②-4 大口径ボーリングマシン工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、大口径ボーリングマシンによる場所打杭工（山留工、地すべり抑止杭、基礎杭等）の施工に適用する。  
適用範囲は、設計杭径190～510mm、掘削長35m以下とし、杭の頭出しを行う場合にも適用する。

なお、頭出しの長さは6m以下とする。

継杭は地中部のみとし、地上部の継杭は場所打杭工の対象としない。

表1.1 設計杭径及び削孔径

項目 \ 設計杭径 (mm)	190以上 226未満	226以上 276未満	276以上 326未満	326以上 376未満	376以上 426未満	426以上 510以下
削孔径 (mm)	300	350	400	450	500	550
鋼管	設計杭径は、鋼管の外径とする。					
H形鋼	設計杭径は、H形鋼の対角線長とする。					

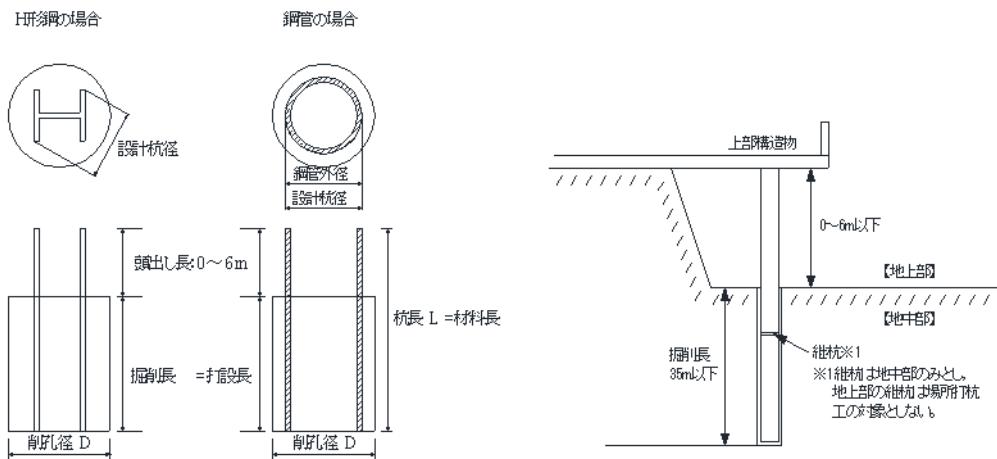


図1-1 施工図

## 2. 施工概要

本工法は、大口径ボーリングマシンを使用して施工するもので、地盤を掘削し、鋼管杭又はH形鋼を建込み、中詰コンクリートの打設、外詰モルタルの注入等の一連作業で杭を形成するものである。

なお、本工法は土質・岩質に対する適用範囲が広く、使用するビットによって粘性土、レキ質土、岩等に対応でき、孔壁の崩落保護を行いながら施工することを標準とする。

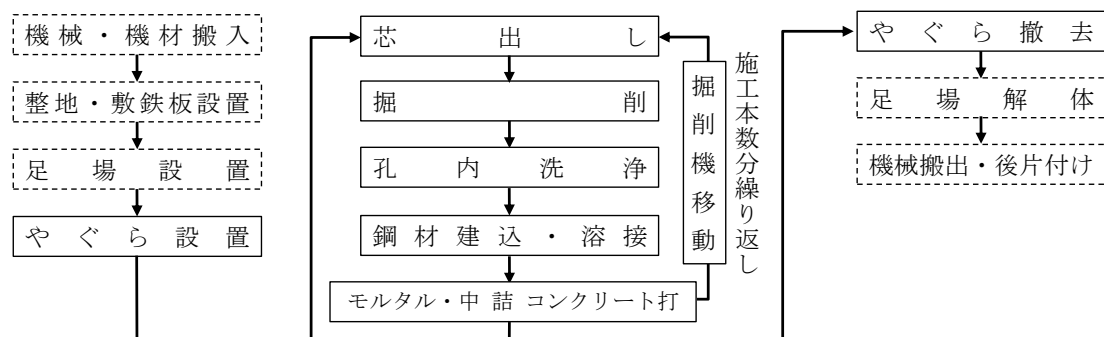



図2-1 施工フロー

- （注）1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
2. 泥土の処理費が必要な場合は、別途計上する。

## 3. 機種の選定

## 3-1 大口径ボーリングマシンの選定

施工機械の選定は、次図を標準とする。

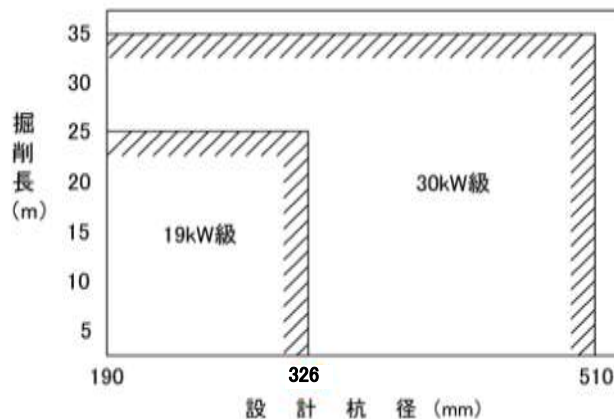

19kW級の選定基準

設計杭径：326mm未満

掘削長：25m以下

30kW級の選定基準

設計杭径：326mm以上510mm以下

掘削長：35m以下

又は

設計杭径：326mm未満

掘削長：25m超35m以下

(注) 現場条件により機械の搬入が困難で、これにより難しい場合は別途考慮する。

図3-1 大口径ボーリングマシンの選定

## 3-2 補助機械の選定

鋼管、H形鋼の建込み、大口径ボーリングマシンの移動は付属のウインチで施工することを標準とするが、下記現場及び作業条件により補助機械が必要な場合は、別途計上する。

現場及び作業条件

- ① 施工場所より10m以内に材料置場を設けることができない場合。
- ② 民家、構造物、その他の施設等を破損又は、危険にさらす恐れがある場合。
- ③ 水路等の連続的な凸凹の障害により大口径ボーリングマシン付属ウインチによる施工が困難な場合。

表3.1 機種の選定

作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
資材等の現場内小運搬、 鋼管、H形鋼の建込み、溶接、 大口径ボーリングマシンの移動	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次 基準値)25t吊	台	1	必要に応じて 計上する

(注) 1. ラフテレーンクレーンは上表を標準とするが、現場条件により上表により難しい場合は別途考慮する。

2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 4. 編成人員

大口径ボーリングマシンによる場所打杭工の編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員

(人/日)

職 種	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員
編 成 人 員	1	2	2

(注) 継杭を施工する場合は、溶接工0.75人工計上する。

## 5. 施工歩掛

杭1本当たり施工日数 ( $T_c$ )

H形鋼杭の場合…………… $T_c = T_1 + T_2 + T_3$

鋼管杭の場合…………… $T_c = T_1 + T_2 + (T_3 \cdot \alpha)$

$T_1$ ：杭1本当たりの削孔日数 (日/本)

$T_2$ ：杭1本当たりの準備・建込み等、充填日数 (日/本)

$T_3$ ：杭1本当たりの溶接日数 (日/本)

$\alpha$ ：鋼管板厚補正係数

(注)  $T_3$ は立継溶接(※<sub>1</sub>)により継杭を施工する場合に計上する。

なお、機械式継手(※<sub>2</sub>)により継杭を施工する場合も適用できるが、 $T_3$ 及び溶接工は計上せずに、費用等を別途計上する。

※<sub>1</sub> 立継溶接・・・・・・鋼材を大口径ボーリングマシンのウインチ等で建込みながら溶接する施工方法。

※<sub>2</sub> 機械式継手・・・・・・あらかじめ杭の上下端部に工場で溶接取付された継手部材を現地で自重等により嵌合させる構造のもの。

### ① 杭1本当りの削孔日数 ( $T_1$ )

表5.1 土質毎の削孔日数( $T_a$ )

(日/m)

土質・岩質 分類 ボーリングマシン	レキ質土 軟岩(I)	砂及び砂質土 粘性土	岩塊・玉石	軟岩(Ⅱ)	硬 岩
19kW級	0.15	0.07	0.24	0.34	0.44
30kW級					

(注) 1. 土質毎の削孔日数 ( $T_a$ ) は、掘削する土質毎に次のとおり加算して算出する。

$$T_1 = T_{a1} \times \ell_1 + T_{a2} \times \ell_2 + T_{a3} \times \ell_3 + T_{a4} \times \ell_4 + \dots$$

$T_{an}$  : 各土質の削孔日数 (日/m)

$\ell_n$  : 各土質の掘削長 (m)

2.  $T_1$ は小数点第2位とし、小数点第3位を四捨五入する。

(例) 大口径ボーリングマシン19kW級を使用してレキ質土5m、砂質土の層10mを施工した場合

$$T_1 = 0.15 \text{ (日/m)} \times 5 \text{ (m)} + 0.07 \text{ (日/m)} \times 10 \text{ (m)} = 1.45$$

### ② 杭1本当りの準備・建込み等、充填日数 ( $T_2$ )

杭1本当りの準備(足場作り、1回目のビット取付、大口径ボーリングマシンの移動、芯出し)、鋼管・H形鋼建込、孔内洗浄、ロッド継足し・引抜き、モルタル及び中詰コンクリート打設の施工日数は次表とする。

表5.2 杭種毎の準備・建込み等、充填日数( $T_2$ )

(日/本)

掘削長 (m) 設計杭径 (mm) 杭 種		9.0以下	9.1～18.0	18.1～27.0	27.1～35.0
H 形 鋼	190以上326未満	0.62	0.94	1.24	1.52
	326以上510以下	0.67	1.07	1.45	1.81
鋼 管	190以上326未満	0.63	0.94	1.27	1.57
	326以上510以下	0.70	1.09	1.50	1.88

(注) 1. 機械の1回の移動距離は3m以内を標準とし、ブロック間の移動は、別途考慮する。

2. 足場作りとは、大口径ボーリングマシンの下に敷く足場材の敷設とし、全体の仮設足場は含まない。

3. 削孔途中でのロッド引抜きや挿入及びロッドの先端補修を含む。

4. 補助機械の有無にかかわらず適用できる。

5. モルタル注入はグラウトポンプにより行い、注入パイプの取付け・取外しを含む時間である。

6. 中詰コンクリートは、トラックミキサ等による打設時間とする。



③ 杭1本当りの溶接日数（ $T_3$ ）表5.3 H形鋼( $T_3$ ) (日/本)

H形鋼規格(mm) 溶接回数(標準) 杭長		150～175	200～250	300～350
$L \leq 12m$	0回	—	—	—
$12m < L \leq 24m$	1回	0.08	0.20	0.43
$24m < L \leq 35m$	2回	0.16	0.40	0.86

表5.4 鋼管( $T_3$ ) (日/本)

鋼管外径(mm) 溶接回数(標準) 杭長		190以上 300未満	300以上 400未満	400以上 500未満	500以上 510以下
$L \leq 12m$	0回	—	—	—	—
$12m < L \leq 24m$	1回	0.08	0.12	0.15	0.18
$24m < L \leq 35m$	2回	0.16	0.24	0.30	0.36

なお、現場条件により溶接回数（標準）により難しい場合は、表5.5より1回当りの溶接日数を加減する。

表5.5 1回当りの溶接日数 (日/回)

H形鋼規格(mm)	1回当り溶接日数	鋼管外径(mm)	1回当り溶接日数
150～175	0.08	190以上300未満	0.08
200～250	0.20	300以上400未満	0.12
300～350	0.43	400以上500未満	0.15
		500以上510以下	0.18

(例1) 鋼管外径190mm杭長30m 溶接回数が3回の場合（標準2回）  
 $0.16 \text{ (日/本・標準)} + 0.08 \text{ (日/回・1回当り)} = 0.24 \text{ (日/本)}$

(例2) 鋼管外径190mm杭長9m 溶接回数が1回の場合（標準0回）  
 $0 \text{ (日/本・標準)} + 0.08 \text{ (日/回・1回当り)} = 0.08 \text{ (日/本)}$

④ 鋼管板厚補正係数（ $\alpha$ ）表5.6 鋼管板厚補正係数( $\alpha$ )

板 厚 (mm)	～15	16～20	21～25	26～30
係 数	1.00	1.60	2.15	2.86

(注) 板厚30mmを超えるものについては、別途考慮する。

## 6. 杭1本当りモルタル及びコンクリート使用量

杭1本当りモルタル及びコンクリート使用量は、次式とする。

ただし、H形鋼を使用する場合はモルタル杭を標準とする。

## 6-1 モルタルを使用する場合

$$Q = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times \ell \times (1 + K_1) \quad (\text{m}^3/\text{本})$$

Q：杭1本当りモルタル (m<sup>3</sup>/本)

D：削孔径 (m)

ℓ：打設長 (m)

K<sub>1</sub>：モルタルロス率

表6.1 モルタルロス率(鋼管・H形鋼の場合)(K<sub>1</sub>)

K <sub>1</sub>	+0.1
----------------	------

## 6-2 コンクリート（生コン）を使用する場合

$$Q_1 = \frac{\pi}{4} \times (D_1^2 - D^2) \times \ell \times (1 + K_2) \quad (\text{m}^3/\text{本})$$

$$Q_2 = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times \ell \times (1 + K_3) \quad (\text{m}^3/\text{本})$$

Q<sub>1</sub>：モルタル使用量 (m<sup>3</sup>/本)

Q<sub>2</sub>：中詰コンクリート使用量 (m<sup>3</sup>/本)

D：設計杭径 (m)

D<sub>1</sub>：削孔径 (m)

ℓ：打設長 (m)

K<sub>2</sub>：モルタルロス率

K<sub>3</sub>：中詰コンクリートロス率

表6.2 モルタルロス率(K<sub>2</sub>)

K <sub>2</sub>	+0.1
----------------	------

表6.3 中詰コンクリートロス率(K<sub>3</sub>)

K <sub>3</sub>	+0.02
----------------	-------

## 7. やぐらの設置・撤去

やぐらの設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。ただし、搬入搬出時及びやぐらを解体しなければ移動できない場合に計上する。

表7.1 やぐらの設置・撤去歩掛(ラフテレーンクレーン使用の場合) (1基1回当り)

名 称	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0	
と び 工	〃	1.0	
特 殊 作 業 員	〃	2.0	
普 通 作 業 員	〃	2.0	
ラフテレーンクレーン運転	日	1.0	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊

(注) 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

2. ラフテレーンクレーンは、上表を標準とするが、現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

表7.2 やぐらの設置・撤去歩掛（索道使用の場合）（1基1回当たり）

名 称	単位	数量	摘 要
土木一般世話役	人	1.0	
と び 工	〃	3.0	
特 殊 作 業 員	〃	2.5	
普 通 作 業 員	〃	3.5	
ウ イ ン チ 運 転	日	1.5	開放型(電動)・単胴 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m
発 動 発 電 機 運 転	〃	1.5	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量 75 kVA (19kW級用) 定格容量100 kVA (30kW級用)

(注) 1. 発動発電機は、賃料とする。  
2. 索道の設置・撤去が必要な場合は、別途計上する。

## 8. ビット等損耗費

ビット等損耗費は、大口径ボーリングマシンに使用するビット及びロッド等の費用であり、労務費、機械損料の合計額に次表の率を乗じた金額を計上する。

なお、ビット等損耗費については、杭1本当たりで算出する。

表8.1 ビット等損耗費率(P) (1m当り損耗費率)

設計杭径(mm)	土質	砂及び砂質土 粘性土	レキ質土 軟岩 (Ⅰ)	軟岩 (Ⅱ)	硬 岩	岩 塊 玉 石
190以上226未満		15%		18%		30%
226以上276未満				30%		60%
276以上326未満		20%		45%		90%
326以上376未満						
376以上426未満		25%		60%		150%
426以上510以下				80%		

(注) 1. ビット等損耗費率は、掘削する土質毎に損耗費率を加重平均して算出する。

$$\text{損耗費率}P = \frac{P_1 \times \ell_1 + P_2 \times \ell_2 \cdots}{\ell_1 + \ell_2 \cdots}$$

ここで、 $P_n$ ：各土質毎のビット等損耗費率  
 $\ell_n$ ：各土質の掘削長 (m)

2. Pは整数とし、小数点第1位を四捨五入する。

(例) 設計杭径350mm, 砂質土2m, レキ質土15m, 岩塊・玉石3mの場合

$$P = \frac{20\% \times 2m + 45\% \times 15m + 90\% \times 3m}{2m + 15m + 3m} = 49.3\cdots \div 49\%$$

3. 補助機械賃料、やぐらの設置・撤去及び仮設足場の設置・撤去費用は、ビット損耗費対象額としない。

## 9. 諸雑費

諸雑費は、大口径ボーリングマシンの足場材、溶接機及び溶接棒、注入管、やぐら及び水槽損料、グラウトポンプ（試錐ポンプ）、サンドポンプ、ベントナイトミキサ、グラウトポンプ（モルタル圧送用）、グラウトミキサ、サイクロンスクリーン、給水ポンプの損料及び燃料費、ベントナイトの材料費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。


表9.1 諸雑費率 (%)

諸 雑 費 率	28
---------	----

- (注) 1. 傾斜地等で仮設足場が必要な場合は、別途計上する。  
2. 補助機械賃料、やぐらの設置・撤去及び仮設足場の設置・撤去の費用、ビット等損耗費は、諸雑費対象額としない。

(足場概念図)

諸雑費に含まれる足場材料は   の範囲とする。

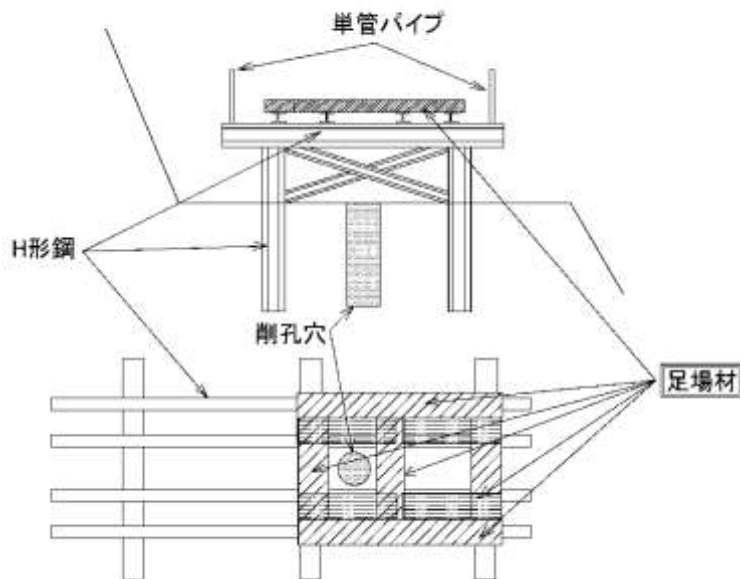

- (注) 足場については、主部材（H形鋼等）の組立及び損料等は含まず、大口径ボーリングマシンの足場材である。  
足場については、作業する現場条件及び機械及び材料等の重量を考慮し、適正に構造を検討する。

図9-1 足場概念図

## 10. 泥水（ベントナイト）の処理費

泥水処理等の費用については、別途計上するものとする。

## 11. 単価表

(1) 大口径ボーリングマシンによる場所打杭1本当り単価表

SWB230610

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_c \times 1$	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	$T_c \times 2$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_c \times 2$	〃
溶 接 工		〃	$T_3 \times 0.75$	継杭の場合に計上 鋼管の場合は(注)2による
中 詰 材 料		m <sup>3</sup>		モルタル・コンクリート
鋼 管 ・ H 形 鋼 等		本	1	
大口径ボーリングマシン運転		日	$T_1 + T_2$	機械損料
ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値)25t吊	〃	$T_2 + T_3$	必要に応じて計上 機械賃料
ビ ッ ト 等 損 耗 費		式	1	表8.1
諸 雑 費		〃	1	表9.1
計				

(注) 1. 泥土処理費が必要な場合は、別途計上とする。

2. 鋼管における数量については、「 $T_3 \times \alpha \times 0.75$ 」とする。3. 継杭に機械式継手を施工する場合は、 $T_3$ 及び溶接工は計上せずに、費用等を別途計上する。

(2) やぐらの設置・撤去単価表（ラフテレーンクレーン使用の場合）

SWB230630

(1基1回当り)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.1
と び 工		〃		〃
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値)25t吊	日		表7.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (3) やぐらの設置・撤去単価表（索道使用の場合）

SWB230630

(1基1回当り)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.2
と び 工		〃		〃
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ウ イ ン チ 運 転	開放型(電動)・単胴 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m	日		表7.2 機械損料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準 値) 定格容量 75 kVA (19kW級用) 定格容量100 kVA (30kW級用)	〃		表7.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (4) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
大 口 径 ボ ー リ ン グ マ シ ン	図3-1	機-25	機械損料数量→ 1.33
ウ イ ン チ	開放型(電動)・単胴・ 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m	機-25	機械損料数量→ 1.41
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準 値) 定格容量 75 kVA (19kW級用) 定格容量100 kVA (30kW級用)	機-16	燃 料 消 費 量 75 kVA→ 43 100 kVA→ 73 機械賃料数量→ 1.3

## ②-5 ダウンザホールハンマエ（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、ダウンザホールハンマによる場所打杭工（山留工、地すべり抑止杭、基礎杭（構造物、仮設物）、防護柵）の施工に適用する。ただし、防護柵については、吸収エネルギーが750～1,000kJ程度の高エネルギー吸収柵の支柱設置のみ適用する。

適用範囲は、設計杭径 170mm 以上 580mm 以下、掘削長 30m 以下とする。ただし、防護柵については、設計杭径 270mm 超え 320mm 以下、掘削長 8m 以下とする。また、杭の頭出しを行う場合にも適用する。

なお、鋼管・H形鋼の頭出しの長さは6m以下とし、防護柵の頭出しの長さは、4m以下とする。

継杭は地中部のみとし、地上部の継杭は場所打杭工の対象としない。

表 1.1 設計杭径及び削孔径

設計杭径 (mm)	170 以上 220 以下	220 超え 270 以下	270 超え 320 以下	320 超え 360 以下	360 超え 430 以下	430 超え 510 以下	510 超え 580 以下
削 孔 径 (mm)	300	350	400	450	500	550	600
H 形 鋼	設計杭径は、H形鋼の対角線長とする。						
鋼 管	設計杭径は、鋼管の外径とする。						
防 護 柵	設計杭径は、回転防止筋を含む外径とする。						

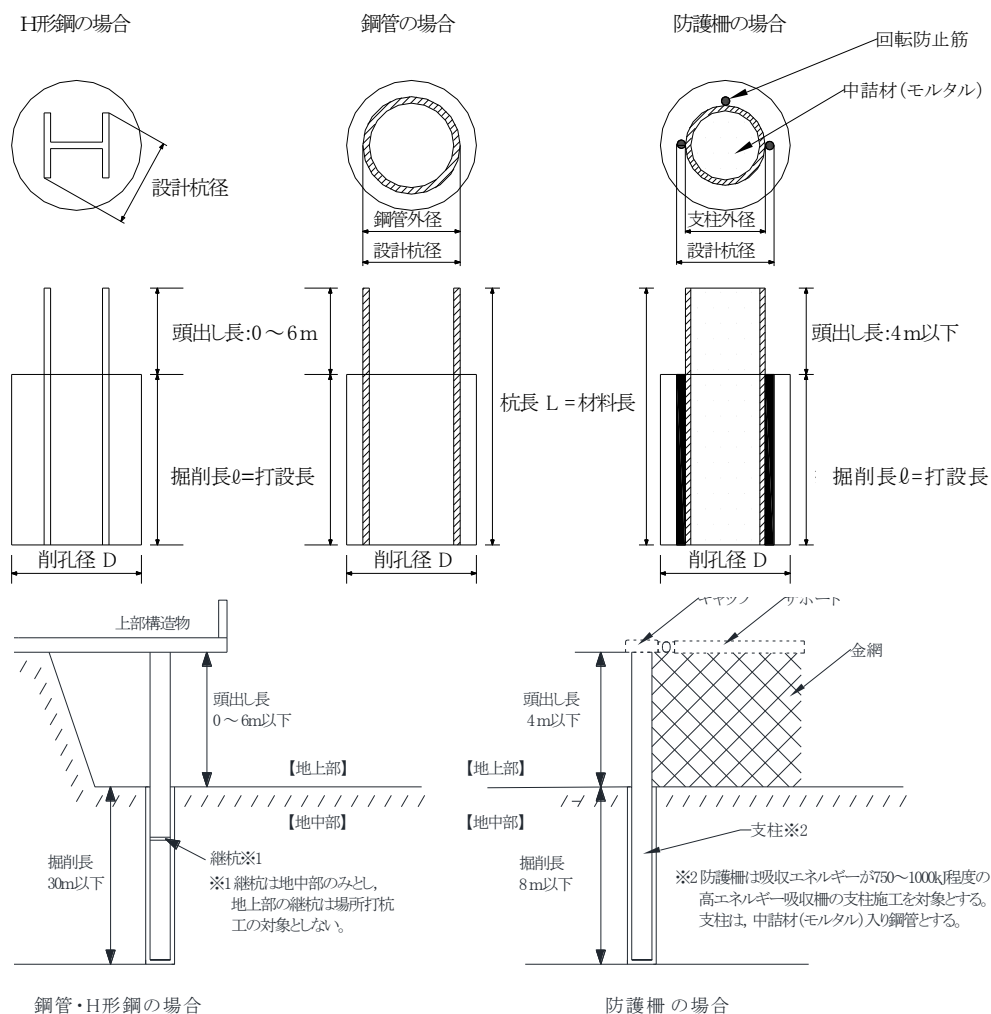


図1-1 施工図

## 2. 施工概要

本工法は、クレーン又は大口径ボーリングマシンに取付けたダウンザホールハンマの打撃により地盤を掘削し、鋼管杭又はH形鋼杭を建込み、中詰材・外詰材の注入等の一連作業で杭を形成するものである。

なお、本工法は比較的安定した地盤で孔壁保護を行わずに施工する場合に適用し、孔壁保護を行う場合には、本工法の適用外とし別途考慮する。

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

## 1) A工法（クレーン工法）

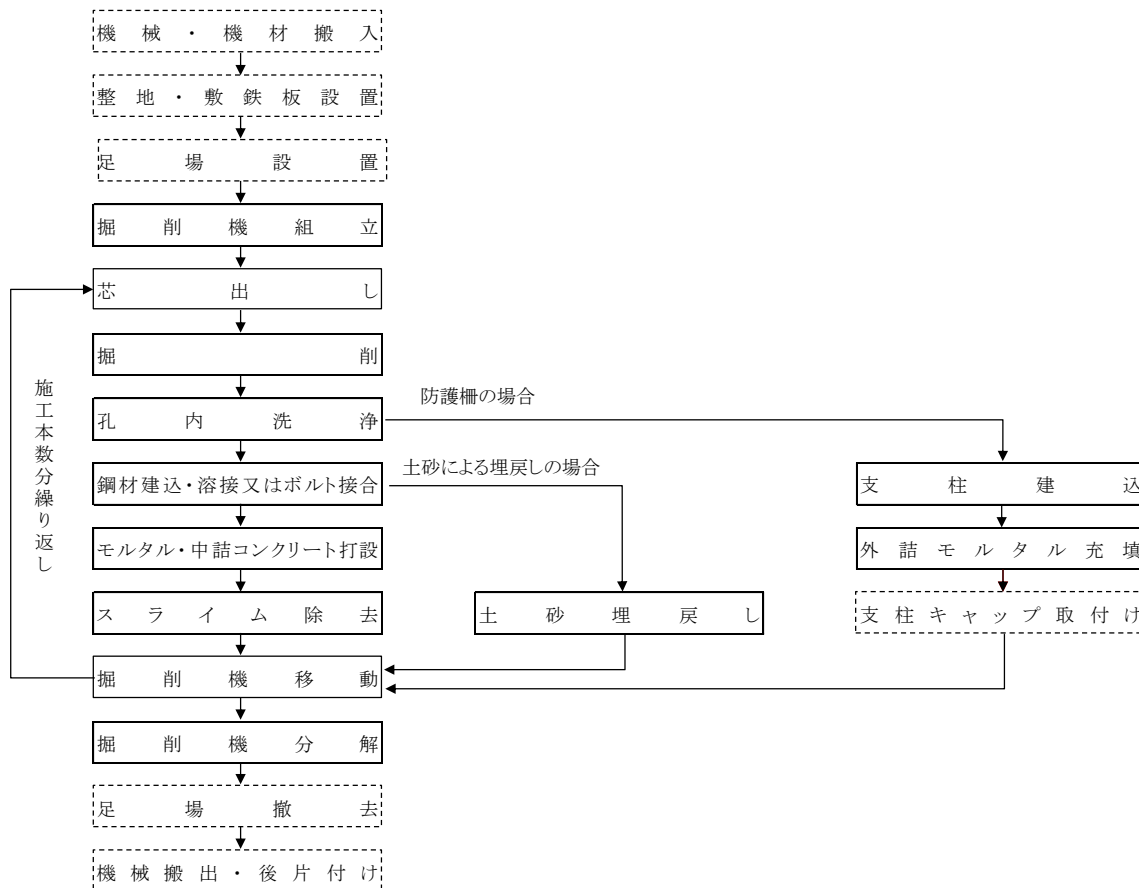


図 2-1 施工フロー

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 防護柵の場合は、中詰材（モルタル）入り鋼管とし、外詰モルタル充填のみ計上する。  
 3. 支柱キャップ取付け及び取付けに必要な足場については別途計上する。



## 2) B工法（大口径ボーリングマシン工法）

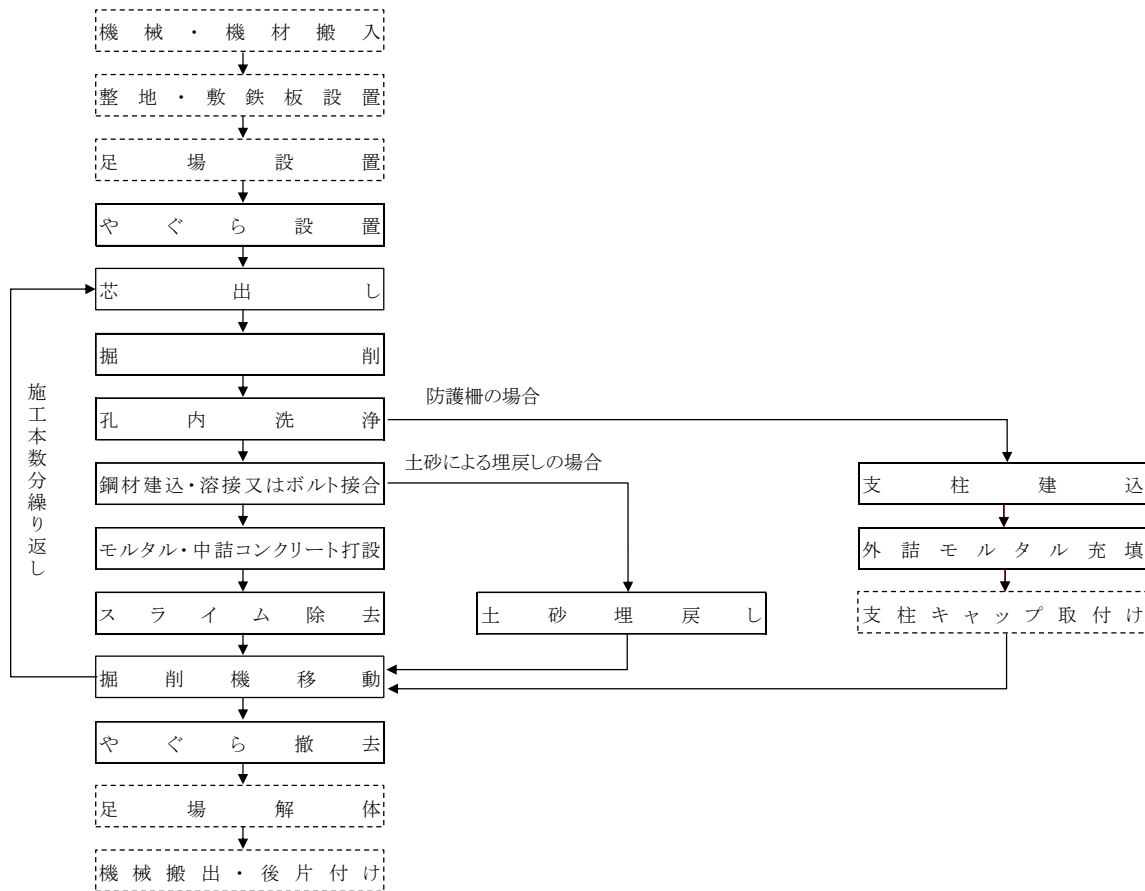


図 2-2 施工フロー

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 防護柵の場合は、中詰材（モルタル）入り鋼管とし、外詰モルタル充填のみ計上する。  
 3. 支柱キャップ取付け及び取付けに必要な足場については別途計上する。  
 4. 傾斜地等で仮設足場が必要な場合、別途計上する。

## 3) C工法（テーブルマシン工法）


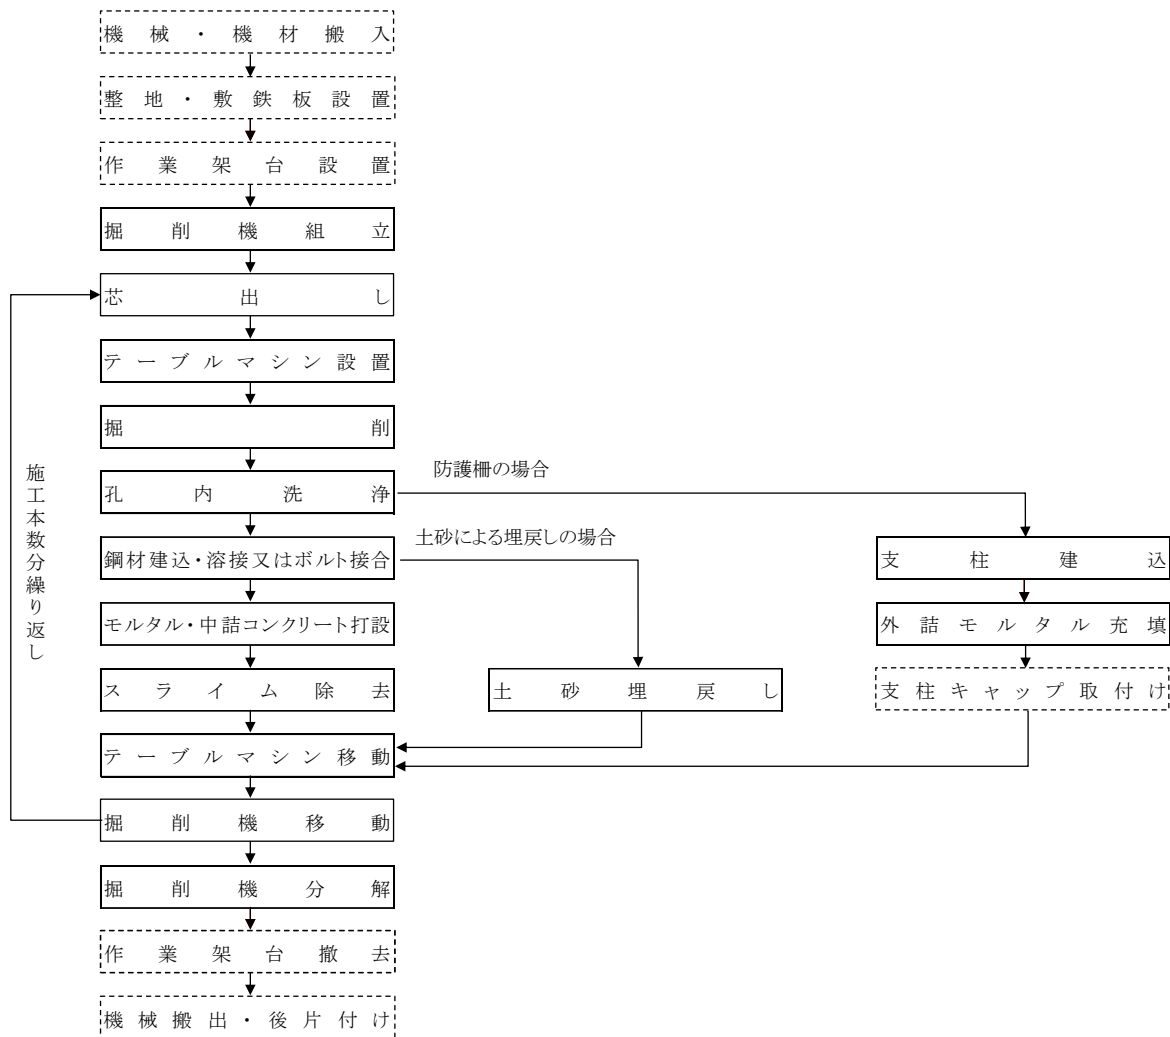


図2-3 施工フロー

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
2. 防護柵の場合は、中詰材（モルタル）入り鋼管とし、外詰モルタル充填のみ計上する。
3. 支柱キャップ取付け及び取付けに必要な足場については別途計上する。
4. 作業架台の設置・撤去は別途計上とする。

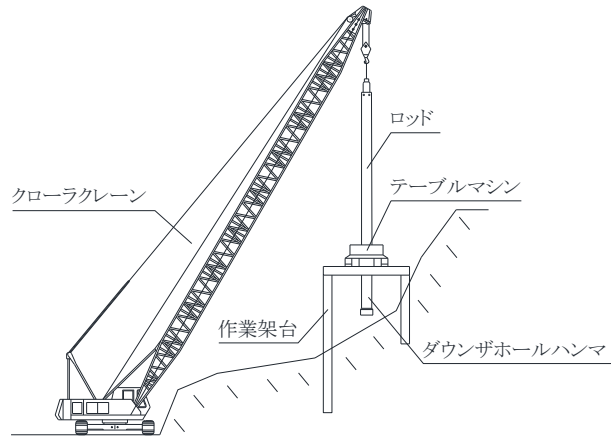

- (注) 1. テーブルマシンとは、クレーンで吊下げたダウンザホールハンマを回転させる装置である。  
2. テーブルマシンの据付及び移動は、クレーン（掘削用）を標準とする。

参考図(C工法模式図)

## 2-2 工法の選定

工法の選定は、「図2-4」による。

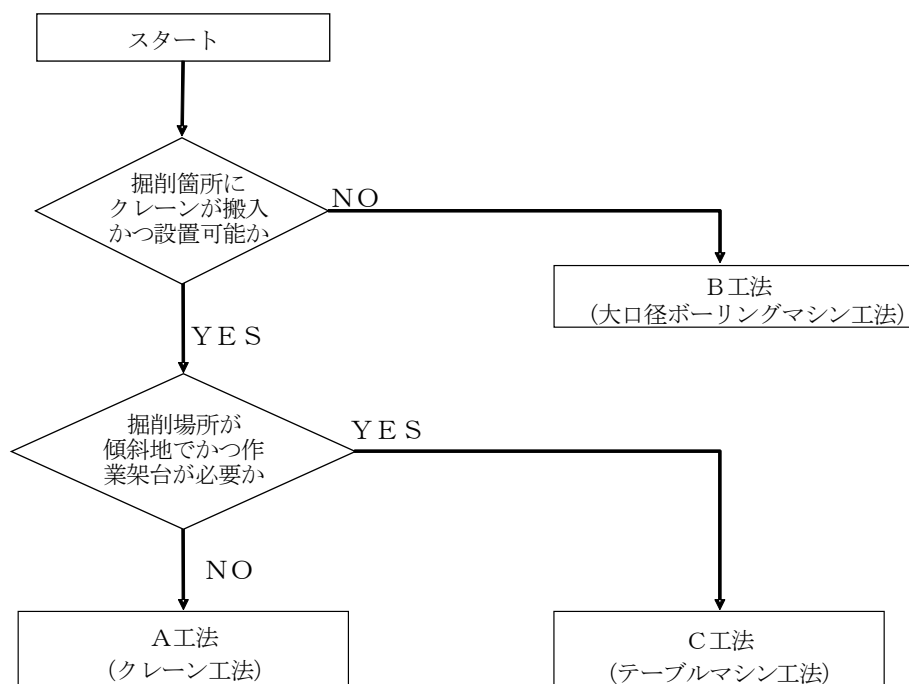


図2-4 工法の選定

## 3. 機種の選定

## 3-1 機種の選定

機械・規格は、下記を標準とする。

表3. 1 機種の選定（A工法）

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
	クレーン（掘削用）		台	1	図3-1, 表3.4
	ダウンザホールハンマ	空圧式	〃	1	表3.5
	空気圧縮機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第2次基準値)	〃	必要台数	表3.6
鋼管杭・H形鋼杭建込用 掘削機組立・分解用	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	〃	1	

（注）1. 鋼管杭，H形鋼杭の建込み，クレーン（掘削用）の組立（リーダ，減速機の取付け）・分解時については，ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型25t吊）を標準とするが，現場条件により上表により難しい場合は，別途考慮する。

2. 空気圧縮機は，賃料とする。

3. 粉塵対策が必要な場合には，給水ポンプ，集塵機を共通仮設費の安全費に別途計上する。

表3. 2 機種の選定（B工法）

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
	大口径ボーリングマシン		台	1	図3-2
	ダウンザホールハンマ	空圧式	〃	1	表3.5
	空気圧縮機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第2次基準値)	〃	必要台数	表3.6
資材等現場内小運搬 掘削機の移動 鋼管杭，H形鋼杭建込	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	〃	1	必要に応じてラフテレーンクレーン（補助クレーン用）を別途計上する。

（注）1. 鋼管杭，H形鋼杭の建込み，掘削機の移動については，大口径ボーリングマシン付属のウインチで施工することを標準とする。

2. 現場，作業条件が下記に該当する場合は，必要に応じて補助クレーンを別途計上する。

①工事場所により10m以内のところに材料置場を設けることができない場合。

②民家，構造物，その他の施設等を破損又は危険にさらす恐れのある場合。

③現場条件等により，大口径ボーリングマシン付属のウインチによる施工が困難な場合。

3. 補助クレーンの場合，作業は準備作業までとする。

4. 空気圧縮機，ラフテレーンクレーンは，賃料とする。

5. 粉塵対策が必要な場合には，給水ポンプ，集塵機を共通仮設費の安全費に別途計上する。

表3. 3 機種の選定（C工法）

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
	クレーン（掘削用）		台	1	図3-1, 表3.4
	ダウンザホールハンマ	空圧式	〃	1	表3.5
	空気圧縮機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型(第2次基準値)	〃	必要台数	表3.6


（注）1. 鋼管杭，H形鋼杭の建込みは，クレーン（掘削用）を標準とするが，現場条件により上表により難しい場合は，別途考慮する。

2. 空気圧縮機は，賃料とする。

3. 粉塵対策が必要な場合には，給水ポンプ，集塵機を共通仮設費の安全費に別途計上する。

## 3-2 掘削機の選定

掘削機の選定は、次図を標準とする。

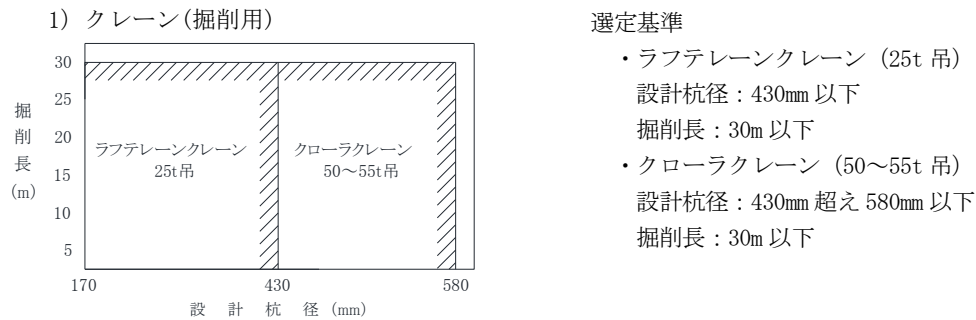


(注) 現場条件等により、上図により難しい場合は別途考慮する。

図3-1 クレーン(掘削用)機種選定

表3.4 クレーン(掘削用)機種・規格

機 械 名	規 格	摘 要
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 50～55t吊	

## 2) 大口径ボーリングマシン

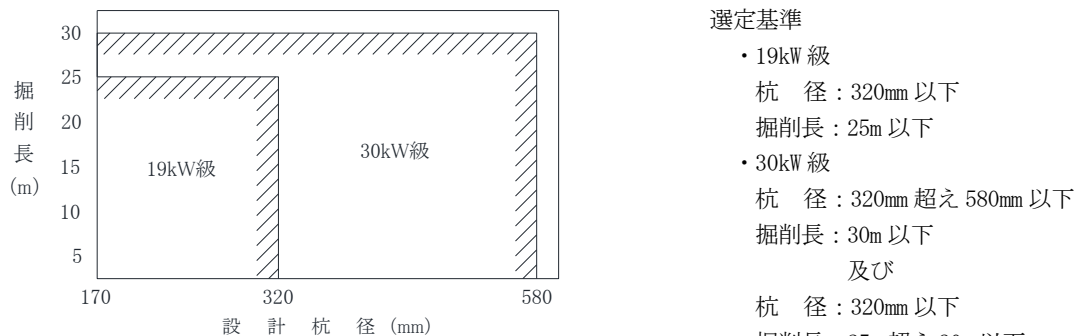

(注) 現場条件等により、上図により難しい場合は別途考慮する。

図3-2 大口径ボーリングマシンの選定

## 3-3 ダウンザホールハンマの選定

ダウンザホールハンマの選定は、次表を標準とする。

表3.5 ダウンザホールハンマの選定

設計杭径 (mm)	170以上 220以下	220超え 270以下	270超え 320以下	320超え 360以下	360超え 430以下	430超え 510以下	510超え 580以下
ダウンザホール ハンマ規格	掘削孔 径φ250 ～300mm	掘削孔 径φ302 ～381mm	掘削孔径φ382～ 457mm		掘削孔径φ508～762mm		

## 3-4 空気圧縮機の選定

空気圧縮機の選定は、次表を標準とする。

表3.6 空気圧縮機の選定

設計杭径 (mm)	170以上 320以下	320超え 430以下	430超え 510以下	510超え 580以下
空気圧縮機 規格・台数	18～19 m <sup>3</sup> /min 2台	18～19 m <sup>3</sup> /min 3台	18～19m <sup>3</sup> /min 3台 7.5～7.8m <sup>3</sup> /min 1台	18～19 m <sup>3</sup> /min 4台

- (注) 1. 空気圧縮機は、可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）とする。  
2. 空気圧縮機は、賃料とする。

## 4. 編成人員

ダウンザホールハンマによる場所打杭工の編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 編成人員 (人)

工法種別 \ 職種	土木一般 世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工
A 工 法 ( クレーン 工 法 )	1	1	1	1	1
B 工 法 (大口径ボーリングマシン工法)	1	1	1	2	1
C 工 法 ( テーブルマシン 工 法 )	1	1	1	1	1

(注) 継杭を施工しない場合は、溶接工を計上しない。

## 5. 施工歩掛

5-1 杭1本当り施工日数 (T<sub>0</sub>)

杭1本当り施工日数は、次式による。

鋼管杭の場合：  $T_c = T_1 + T_2 + T_3 + (T_4 \cdot \alpha)$  (日/本) ……式 5. 1

H形鋼杭の場合：  $T_c = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$  (日/本) ……式 5. 2

防護柵の場合：  $T_c = T_1 + T_2 + T_3$  (日/本) ……式 5. 3

T<sub>1</sub>：杭1本当りの削孔日数 (日/本)

T<sub>2</sub>：杭1本当りの準備・建込み等日数 (日/本)

T<sub>3</sub>：杭1本当りの充填日数 (日/本)

T<sub>4</sub>：杭1本当りの溶接・ボルト接合日数 (日/本)

α：鋼管板厚補正係数

(注) T<sub>4</sub>は立継溶接(※<sub>1</sub>)、又はボルト接合により継杭を施工する場合に計上する。ただし、ボルト接合は溶接工を計上しない。

なお、機械式継手(※<sub>2</sub>)により継杭を施工する場合も適用できるが、T<sub>4</sub>及び溶接工は計上せずに、費用等を別途計上する。

※<sub>1</sub> 立継溶接…鋼材をクレーン等で建込みながら溶接する施工方法。

※<sub>2</sub> 機械式継手(鋼管杭)…あらかじめ杭の上下端部に工場で溶接取付された継手部材を現地で自重等により嵌合させる構造のもの。

① 杭1本当りの削孔日数（ $T_1$ ）表5.1 土質毎の削孔日数( $T_a$ ) (日/m)

土質・岩質分類	砂質土	粘性土	レキ質土 岩塊・玉石 軟岩 中硬岩	硬岩
削孔日数	0.03	0.05	0.06	0.08

(注) 1. 杭1本当りの削孔日数( $T_1$ )は、掘削する土質毎に次のとおり加算して算出する。

$$T_1 = T_{a1} \times \ell_1 + T_{a2} \times \ell_2 + T_{a3} \times \ell_3 + T_{a4} \times \ell_4 + \dots$$

$T_{an}$ ：各土質毎の削孔日数(日/m)

$\ell_n$ ：各土質の削孔長(m)

2.  $T_1$ は小数点第2位とし、小数点第3位を四捨五入する。

② 杭1本当りの準備・建込み等日数（ $T_2$ ）

杭1本当りの準備（足場作り、テーブルマシン又は大口径ボーリングマシンの移動、芯出し）、鋼管・H形鋼建込、孔内洗浄、ロッド継足し・引抜き等の施工日数は次表とする。

表5.2 杭1本当りの準備・建込み等日数( $T_2$ ) (日/本)

掘削長 (m)		$\ell \leq 10$	$10 < \ell \leq 20$	$20 < \ell \leq 30$
工法名				
杭種				
H 形 鋼	A 工法 (クレーン工法)	0.16	0.21	0.27
	B 工法 (大口径ボーリングマシン工法)	0.26	0.32	0.38
	C 工法 (テーブルマシン工法)	0.20	0.26	0.32
鋼 管 又は 防 護 柵	A 工法 (クレーン工法)	0.17	0.25	0.33
	B 工法 (大口径ボーリングマシン工法)	0.27	0.35	0.44
	C 工法 (テーブルマシン工法)	0.21	0.30	0.38

- (注) 1. 大口径ボーリングマシンの1回の移動距離は3m以内を標準とし、ブロック間の移動は、別途考慮する。
2. 足場作りとは、テーブルマシン又は大口径ボーリングマシンの下に敷く足場材の敷設とし、全体の仮設足場は含まない。
3. 削孔途中でのロッド引抜や挿入及びロッドの先端補修を含む。
4. 大口径ボーリングマシンは、補助機械の有無にかかわらず適用できる。
5. 削孔口周辺が崩壊する場合は、保護対策を別途計上する。

③ 杭1本当りの充填日数 ( $T_3$ )

杭1本当りのモルタル及び中詰コンクリート打設日数，土砂埋戻し日数は，次表とする。

表5.3 H形鋼(モルタル杭)( $T_3$ ) (日/本)

設計杭径 \ 掘削長	10m以下	$10 < \ell \leq 20$	$20 < \ell \leq 30$
170mm以上320mm以下	0.10	0.17	0.25
320mm超え580mm以下	0.15	0.31	0.48

表5.4 鋼管(モルタル・コンクリート杭)( $T_3$ ) (日/本)

設計杭径 \ 掘削長	10m以下	$10 < \ell \leq 20$	$20 < \ell \leq 30$
170mm以上320mm以下	0.06	0.13	0.20
320mm超え580mm以下	0.11	0.27	0.43

- (注) 1. モルタル注入はグラウトポンプにより行い，注入パイプの取付け・取外しを含む日数である。  
2. 中詰コンクリートは，トラックミキサ等による打設日数とする。

表5.5 土砂埋戻し ( $T_3$ ) (日/本)

設計杭径 \ 掘削長	10m以下	$10 < \ell \leq 20$	$20 < \ell \leq 30$
170mm以上320mm以下	0.03	0.09	0.14
320mm超え580mm以下	0.07	0.20	0.32

(注) 土砂埋戻しは人力，土砂ホッパ等により行う日数である。

表5.6 防護柵(モルタル杭)( $T_3$ ) (日/本)

設計杭径 \ 掘削長	8m以下
270mm超え320mm以下	0.02

(注) モルタル注入はグラウトポンプにより行い，外詰モルタル打設日数とする。

④ 杭1本当りの溶接・ボルト接合日数(溶接) ( $T_4$ )表5.7 H形鋼(溶接)( $T_4$ ) (日/本)

H形鋼規格(mm) \ 溶接回数(標準) \ 杭長	150～175	200	250	300	350	400
$L \leq 12m$ 0回	—	—	—	—	—	—
$12m < L \leq 24m$ 1回	0.03	0.04	0.06	0.08	0.13	0.19
$24m < L \leq 30m$ 2回	0.06	0.08	0.12	0.16	0.26	0.38



表5.8 鋼管(T<sub>4</sub>) (日/本)

鋼管規格(mm) 溶接回数(標準) 杭長		170以上300 未満	300以上400 未満	400以上500 未満	500以上580 以下
L ≤ 12m	0回	-	-	-	-
12m < L ≤ 24m	1回	0.04	0.08	0.10	0.11
24m < L ≤ 30m	2回	0.08	0.16	0.20	0.22

なお、現場条件により溶接回数（標準）により難い場合は、表5.9より1回当りの溶接日数を加減する。

表5.9 1回当りの溶接日数 (日/回)

H形鋼規格(mm)	1回当り溶接日数	鋼管外径(mm)	1回当り溶接日数
150～175	0.03	170以上300未満	0.04
200	0.04	300以上400未満	0.08
250	0.06	400以上500未満	0.10
300	0.08	500以上580以下	0.11
350	0.13		
400	0.19		

- (例1) 鋼管外径 190mm 杭長 30m 溶接回数が3回の場合（標準2回）  
 $0.08 \text{ (日/本・標準)} + 0.04 \text{ (日/回・1回当り)} = 0.12 \text{ (日/本)}$
- (例2) 鋼管外径 190mm 杭長 9m 溶接回数が1回の場合（標準0回）  
 $0 \text{ (日/本・標準)} + 0.04 \text{ (日/回・1回当り)} = 0.04 \text{ (日/本)}$

## ⑤ 鋼管板厚補正係数 (α)

表5.10 鋼管板厚補正係数(α)

板厚 (mm)	～14	15～17	18～21	22～25	26～30
係数	1.00	1.41	2.00	2.76	3.84

(注) 板厚30mmを超えるものについては、別途考慮する。

⑥ 杭1本当りの溶接・ボルト接合日数（ボルト接合）(T<sub>4</sub>)表5.11 H形鋼(ボルト接合)(T<sub>4</sub>) (日/本)

H形鋼規格(mm) 接合回数(標準) 杭長		300	350	400
L ≤ 12m	0回	-	-	-
12m < L ≤ 24m	1回	0.06	0.08	0.10
24m < L ≤ 30m	2回	0.12	0.16	0.20

なお、現場条件により接合回数（標準）により難い場合は、表5.12より1回当りのボルト接合日数を加減する。

表5. 12 1回当りのボルト接合日数（日/回）

H形鋼規格(mm)	1回当り接合日数
300	0.06
350	0.08
400	0.10

(例1) H350mm 杭長 30m 接合回数が3回の場合（標準2回）  
 $0.16（日/本・標準）+0.08（日/回・1回当り）=0.24（日/本）$

(例2) H350mm 杭長 9m 接合回数が1回の場合（標準0回）  
 $0（日/本・標準）+0.08（日/回・1回当り）=0.08（日/本）$

## 6. 杭1本当りモルタル・コンクリート及び購入土（砂）使用量

杭1本当りモルタル・コンクリート又は購入土（砂）使用量は、次式による。  
ただし、H形鋼を使用する場合は、モルタル杭又は購入土（砂）を標準とする。

### 6-1 モルタルを使用する場合

$$Q = \frac{\pi}{4} \times D_1^2 \times \ell \times (1 + K_1) \quad \cdots \cdots \text{式 6. 1}$$

Q：モルタル使用量（m<sup>3</sup>/本）

D<sub>1</sub>：削孔径（m）

ℓ：打設長（m）

K<sub>1</sub>：モルタルロス率

表6. 1 モルタルロス率(K<sub>1</sub>)

K <sub>1</sub>	+0.1
----------------	------

### 6-2 コンクリート（生コン）を使用する場合

$$Q_1 = \frac{\pi}{4} \times (D_1^2 - D_2^2) \times \ell \times (1 + K_2) \quad \cdots \cdots \text{式 6. 2}$$

$$Q_2 = \frac{\pi}{4} \times D_2^2 \times \ell \times (1 + K_3) \quad \cdots \cdots \text{式 6. 3}$$

Q<sub>1</sub>：モルタル使用量（m<sup>3</sup>/本）

Q<sub>2</sub>：中詰コンクリート使用量（m<sup>3</sup>/本）

D<sub>1</sub>：削孔径（m）

D<sub>2</sub>：設計杭径（m）

ℓ：打設長（m）

K<sub>2</sub>：モルタルロス率

K<sub>3</sub>：中詰コンクリートロス率

表6. 2 モルタルロス率(K<sub>2</sub>)

K <sub>2</sub>	+0.1
----------------	------

表6. 3 中詰コンクリートロス率(K<sub>3</sub>)

K <sub>3</sub>	+0.02
----------------	-------

（注）防護柵の場合は、D<sub>2</sub>を支柱外径とし、Q<sub>1</sub>（モルタル）のみ計上する。

## 6-3 購入土（砂）を使用する場合

$$Q = \frac{\pi}{4} \times D_1^2 \times \ell \cdots \cdots \text{式 6. 4}$$

Q : 購入土（砂）使用量 (m<sup>3</sup>/本)D<sub>1</sub> : 削孔径 (m)

ℓ : 打設長 (m)

## 7. やぐらの設置・撤去

やぐらの設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

ただし、搬入搬出時及びやぐらの解体をしなければ移動できない場合に計上する。

表7.1 やぐらの設置・撤去歩掛(ラフテレーンクレーン使用の場合) (1基1回当たり)

名 称	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0	
と び 工	〃	1.0	
特 殊 作 業 員	〃	2.0	
普 通 作 業 員	〃	2.0	
ラフテレーンクレーン運転	日	1.0	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値)25t吊

(注) 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

表7.2 やぐらの設置・撤去歩掛(索道使用の場合) (1基1回当たり)

名 称	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役	人	1.0	
と び 工	〃	3.0	
特 殊 作 業 員	〃	2.5	
普 通 作 業 員	〃	3.5	
ウ イ ン チ 運 転	日	1.5	開放型(電動)・単胴 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m
発 動 発 電 機 運 転	〃	1.5	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量75 kVA

(注) 1. 発動発電機は、賃料とする。

2. 索道の設置・撤去が必要な場合は、別途計上する。

## 8. 諸雑費

諸雑費は、大口径ボーリングマシンの足場材（B工法のみ）、テーブルマシンの足場材（C工法のみ）、溶接材、ボルト・ナット、電気溶接機、インパクトレンチ、トルクレンチ、注入管、高圧ホース、やぐら装置（B工法のみ）、グラウトポンプ（モルタル圧送用）、コンクリートバケット、土砂ホッパ、レシーバタンク、リーダ・減速機（A工法のみ）、テーブルマシン（C工法のみ）の損料、電力に関する経費、ビット等の損耗費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表8.1 諸雑费率(A工法, B工法, C工法) (%)


諸 雑 費 率	28
---------	----

- (注) 1. 敷鉄板仮設が必要な場合は、別途計上する。  
 2. 補助ウインチ損料, 補助ラフテレーンクレーン賃料, やぐらの設置・撤去及び仮設足場等の設置・撤去の費用は、諸雑費の対象額としない。

## 9. 掘削土の処理費

掘削土等の処理費用については、別途計上するものとする。

## (B工法:足場概念図)

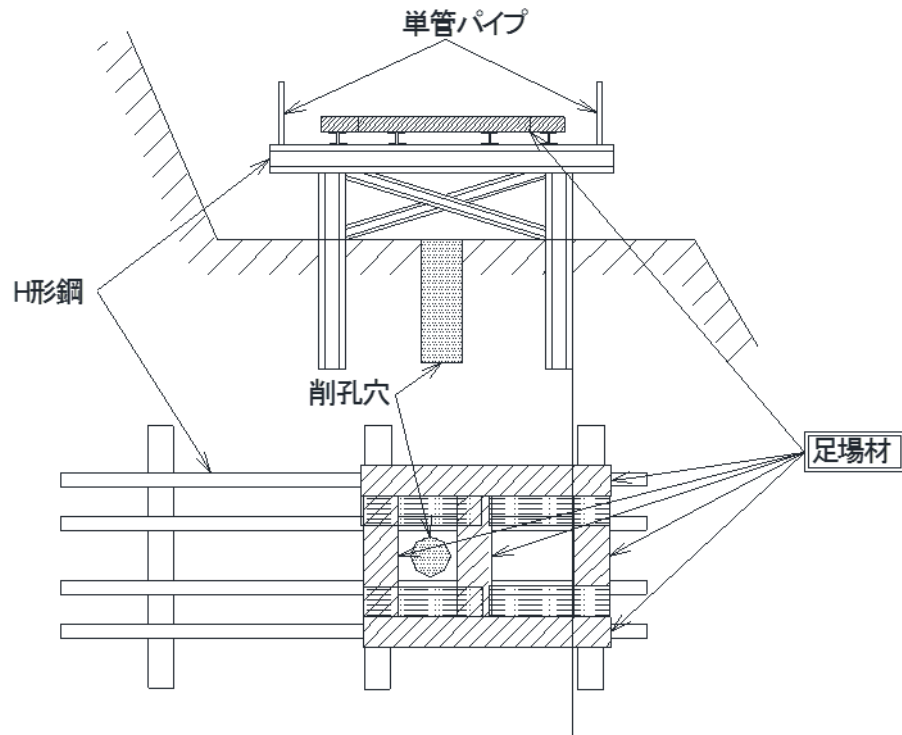諸雑費に含まれる足場材料は   の範囲とする。

## (C工法:作業架台概念図)

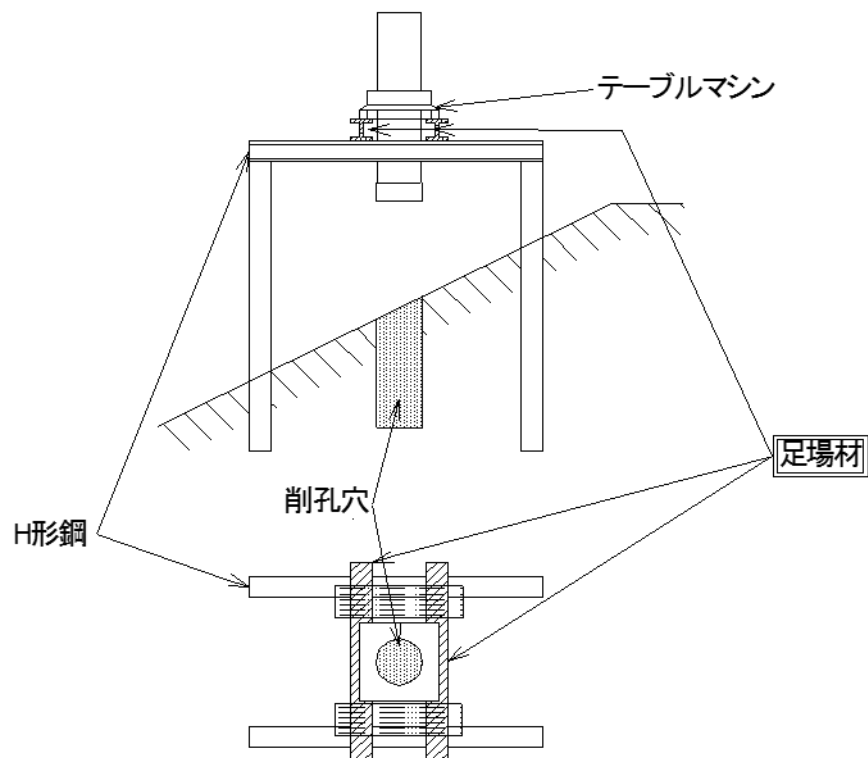
諸雑費に含まれる作業架台の足場材は   の範囲とする。

図9-1 足場概念図

## 10. 単価表

## (1) 杭1本当り単価表（A工法）

SWB230810

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_c \times 1$	表4.1
と び 工		〃	$T_c \times 1$	〃
特 殊 作 業 員		〃	$T_c \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_c \times 1$	〃
溶 接 工		〃	$T_c \times 1$	表4.1 (継杭の場合に計上)
中 詰 材 料		m <sup>3</sup>		式6.1～式6.4
鋼 管 ・ H 形 鋼 等		本	1	
クレーン(掘削用)運転		日	$T_c$	図3-1 機械損料
ダウンザホール ハンマ運転	空圧式	〃	$T_c$	表3.5 機械損料
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)	〃	$T_c$	表3.6 機械賃料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	〃	$T_c$	鋼管杭・H形鋼杭建込用 掘削機組立・分解用 機械損料
諸 雑 費		式	1	表8.1
計				

(注)  $T_c$ : 杭1本当り施工日数(日/本)

## (2) 杭1本当り単価表（B工法）

SWB230830

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_c \times 1$	表4.1
と び 工		〃	$T_c \times 1$	〃
特 殊 作 業 員		〃	$T_c \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_c \times 2$	〃
溶 接 工		〃	$T_c \times 1$	表4.1 (継杭の場合に計上)
中 詰 材 料		m <sup>3</sup>		式6.1～式6.4
鋼 管 ・ H 形 鋼 等		本	1	
大口径ボーリング マシン運転		日	$T_c$	図3-2 機械損料
ダウンザホール ハンマ運転	空圧式	〃	$T_c$	表3.-5 機械損料
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)	〃	$T_c$	表3.-6 機械賃料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	〃	$T_c$	必要に応じて計上 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表8.1
計				

(注)  $T_c$ : 杭1本当り施工日数(日/本)

## (3) 杭1本当り単価表（C工法）

SWB230850

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_c \times 1$	表4.1
と び 工		〃	$T_c \times 1$	〃
特 殊 作 業 員		〃	$T_c \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_c \times 1$	〃
溶 接 工		〃	$T_c \times 1$	表4.1 (継杭の場合に計上)
中 詰 材 料		m <sup>3</sup>		式6.1～式6.4
鋼 管 ・ H 形 鋼 等		本	1	
クレーン(掘削用)運転		日	$T_c$	図3-1 機械損料
ダウンザホール ハンマ運転	空圧式	〃	$T_c$	表3.5 機械損料
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)	〃	$T_c$	表3.6 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表8.1
計				

(注) 1.  $T_c$ : 杭1本当り施工日数(日/本)

## (4) やぐらの設置・撤去1基1回当り単価表（ラフテレーンクレーン使用の場合）

SWB230820

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.1
と び 工		〃		〃
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表7.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (5) やぐらの設置・撤去1基1回当り単価表（索道使用の場合）

SWB230821

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.2
と び 工		〃		〃
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ウインチ運転	開放型(電動)・単胴 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m	日		表7.2 機械損料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量75 kVA	〃		表7.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
大口徑ボーリングマシン	図3-2	機-25	機械損料数量→1.28
空 気 圧 縮 機	表3.6	機-16	燃料消費量→下記の とおりとする
			規 格                  数 量
			7.5～7.8m <sup>3</sup> /min                  66
			18～19m <sup>3</sup> /min                  156
			機械賃料数量→ 1.33
ダウンザホールハンマ	空圧式 表3.5	機-25	機械損料数量→ 1.37
ウ イ ン チ (やぐら設置・撤去用)	開放型(電動)・単胴 巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m	機-25	機械損料数量→ 1.55
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 定格容量75 kVA	機-16	燃料消費量→ 60 機械賃料数量→ 1.18
ラフテレーンクレーン (掘削用)	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値)25t吊	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 102 機械損料数量→ 1.63
クローラクレーン (掘削用)	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値) 50～55t吊	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 60 機械損料数量→ 1.08
ラフテレーンクレーン (鋼管杭・H形鋼杭建込用 掘削機組立・分解用)	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値)25t吊	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 102 機械損料数量→ 1.02




## ③ 深礎工

## ③-1 深礎工（建地-E）

## 1. 適用範囲

本資料は、人力及び人力併用機械掘削、機械排土、ライナープレート土留工法による図1-1、図1-2に示す範囲の深礎杭の施工に適用する。


なお、本資料での杭径とは、ライナープレートの公称径（ボルト穴間の径）とし、土質区分は、表1. 1とする。

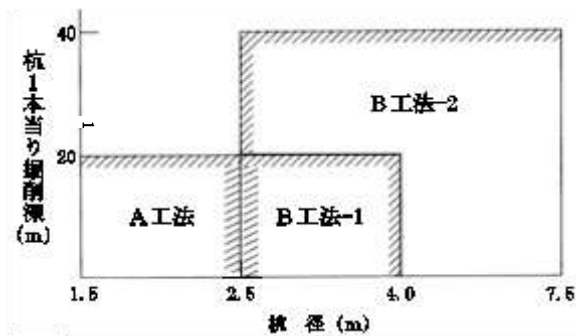

A工法：人力掘削、機械排土

B工法：人力併用機械掘削、機械排土  
（B工法-1、B工法-2）

図1-1 適用杭径及び掘削深（標準）

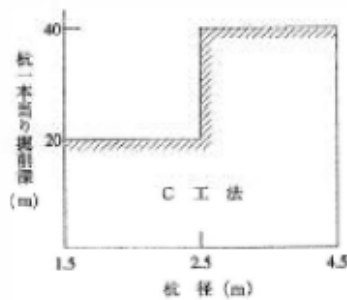

C工法：人力掘削、やぐら装置排土

図1-2 適用杭径及び掘削深（掘削機が現場に搬入できない場合）

表1. 1 土質

土質	適用土質
土	砂及び砂質土，粘土及び粘性土，レキ及びレキ質土
岩	岩塊・玉石及びこれらが砂，砂質土，粘性土，レキ質土と混合した土，軟岩（Ⅰ），（Ⅱ），中硬岩・硬岩（Ⅰ）

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

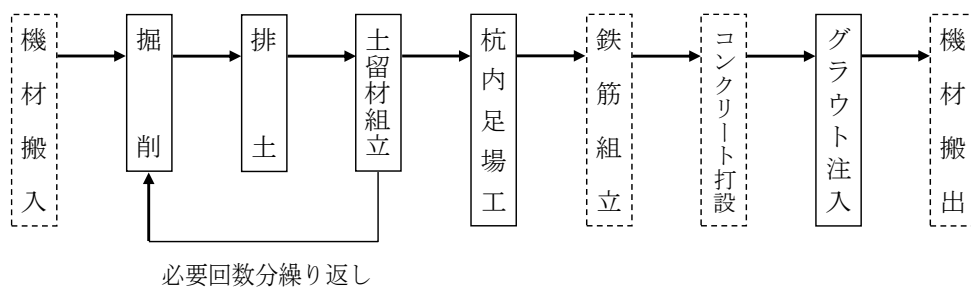


図2-1 施工フロー

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

(1) 掘削土留作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。

表3. 1 機種の選定

作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	工 法				摘 要
					A	B-1	B-2	C	
排 土	ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル・テレスコピック式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) バケット容量(平積) 0.4m <sup>3</sup>	台	1	○				
排土及び 土留材の 吊込み	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	〃	1	○	○	○		
	や ぐ ら 装 置	簡易やぐら(モータウインチ付) 能力0.5t	〃	1				○	杭径4.5m 以下に使用
掘 削	小 型 バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	電動式 山積0.03m <sup>3</sup> (平積0.021m <sup>3</sup> )	〃	1		○			
		超小旋回型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	〃	1			○		

- (注) 1. 上表の設備は、掘削土を杭端近隣に仮置きする場合である。  
 2. 排土運搬にベルトコンベヤを使用する場合は、別途計上する。  
 3. B工法のラフテレーンクレーン作業は、バックホウの杭内搬入・搬出を含む。  
 4. ラフテレーンクレーン、小型バックホウ(山積0.11m<sup>3</sup>)は、賃料とする。

## (2) 土留材

土留材は、ライナープレートを使用し、全ての土質について掘削深全長を施工し、土留材は撤去しない埋設を原則とする。また、使用規格は、土圧計算等によって決定する。

## (3) 機械損料補正

深礎工に使用する掘削機械(小型バックホウ)、排土機械(クラムシェル)の損料については、岩石割増(中硬岩・硬岩(I))として運転1時間当たり損料に対し損料補正を行うものとし、補正係数は、次表とする。

表3. 2 補正係数

機械名 \ 岩分類	中硬岩・硬岩(I)	摘 要
ク ラ ム シ ェ ル	+0.1	A工法
小 型 バ ッ ク ホ ウ (電動式 山積0.03m <sup>3</sup> )	+0.1	B工法-1

## 4. 編成人員

掘削土留作業編成人員は、次表を標準とする。

表4. 1 掘削土留作業編成人員

(人)

職 種	工 法				
	A工法 杭径(m) 1.5以上 2.5以下	B工法-1 2.5を超え 4.0以下	B工法-2 2.5以上 7.5以下	C工法	
土木一般世話役	1	1	1	1.5以上 2.5以下	2.5を超え 4.5以下
トンネル特殊工	2	2	4	2	4
特 殊 作 業 員	1	1	1	1	1
普 通 作 業 員	1	1	1	1	1

## 5. 施工歩掛

## 5-1 深礎杭1本当り施工日数

深礎杭1本当り施工歩掛は、次式による。

$$d = \alpha \cdot d_1 \cdot \ell \text{ (日/本)}$$

$d$  : 深礎杭1本当り施工日数 (日/本)

$\alpha$  : 土質係数

$d_1$  : 掘削1m当り施工日数 (日/m)

$\ell$  : 深礎杭1本当り掘削長 (m/本)

(1) 土質係数 ( $\alpha$ )

土質係数は、次表を標準とする。

表5. 1 土質係数 ( $\alpha$ )

土	岩
砂及び砂質土, 粘性土, レキ質土	岩塊・玉石混じり土, 軟岩(I), (II), 中硬岩, 硬岩(I)
0.57	1.12

(注) 杭1本当り土質区分が異なる場合の土質係数 $\alpha$ は、次のとおり加重平均して算出する。

$$\alpha = \frac{\alpha_1 \times \ell_1 + \alpha_2 \times \ell_2}{\ell_1 + \ell_2}$$

$\alpha_1$  : 土質係数 (土)

$\ell_1$  : 掘削長 (土)

$\alpha_2$  : 土質係数 (岩)

$\ell_2$  : 掘削長 (岩)

(2) 掘削1m当り施工日数 ( $d_1$ )

掘削1m当り施工日数は、次表を標準とする。

なお、岩掘削は火薬によるものとする。

表5. 2 掘削1m当り施工日数 ( $d_1$ ) (A工法) (日/m)

杭径(m) 掘削深(m)	1.5以上 2.0以下	2.0を超え 2.5以下
5以下	0.34	0.41
5を超え10以下	0.45	0.54
10を超え15以下	0.56	0.67
15を超え20以下	0.67	0.80

表5. 3 掘削1m当り施工日数 ( $d_1$ ) (B工法-1) (日/m)

杭径(m) 掘削深(m)	2.5を超え 3.0以下	3.0を超え 3.5以下	3.5を超え 4.0以下
5以下	0.73	0.77	0.82
5を超え10以下	0.85	0.90	0.95
10を超え15以下	0.97	1.03	1.09
15を超え20以下	1.09	1.16	1.22

表5. 4 掘削1m当り施工日数（d<sub>1</sub>）（B工法-2）

（日/m）

杭径(m) 掘削深(m)	2.5以上 3.0以下	3.0を超え 3.5以下	3.5を超え 4.0以下	4.0を超え 4.5以下	4.5を超え 5.0以下	5.0を超え 5.5以下	5.5を超え 6.0以下	6.0を超え 6.5以下	6.5を超え 7.0以下	7.0を超え 7.5以下
5以下	—	—	—	1.06	1.13	1.23	1.32	1.45	1.60	1.76
5を超え10以下	—	—	—	1.16	1.23	1.33	1.43	1.57	1.74	1.91
10を超え15以下	—	—	—	1.20	1.28	1.38	1.49	1.63	1.81	1.99
15を超え20以下	—	—	—	1.23	1.31	1.42	1.52	1.67	1.86	2.04
20を超え25以下	1.04	1.11	1.17	1.25	1.33	1.45	1.55	1.71	1.89	2.08
25を超え30以下	1.06	1.13	1.19	1.27	1.36	1.47	1.58	1.73	1.92	2.11
30を超え35以下	1.07	1.14	1.20	1.29	1.37	1.49	1.60	1.75	1.94	2.14
35を超え40以下	1.08	1.15	1.22	1.30	1.39	1.50	1.61	1.77	1.97	2.16

表5. 5 掘削1m当り施工日数（d<sub>1</sub>）（C工法）

（日/m）

杭径(m) 掘削深(m)	1.5以上 2.5以下	2.5を超え 3.0以下	3.0を超え 3.5以下	3.5を超え 4.0以下	4.0を超え 4.5以下
5以下	0.98	0.98	1.36	1.65	2.10
5を超え10以下	1.15	1.15	1.52	1.86	2.36
10を超え15以下	1.33	1.33	1.68	2.07	2.68
15を超え20以下	1.50	1.50	1.84	2.28	2.89
20を超え25以下	—	1.67	2.00	2.49	3.16
25を超え30以下	—	1.85	2.16	2.70	3.42
30を超え35以下	—	2.02	2.32	2.91	3.69
35を超え40以下	—	2.19	2.48	3.12	3.95

## (3) 諸雑費

諸雑費は、施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、軸流ファン・工事用水中モータポンプ、ピックハンマ、コンクリートブレイカ、排土バケット、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、工事用水中モータポンプの有無に関係なく同率とする。

表5. 6 諸雑費率（β）

（%）

諸 雑 費 率	工法	A工法	B工法-1	B工法-2	C工法
	土質区分				
	砂及び砂質土、 粘性土、レキ質土 （土）	13	16	10	11
	岩塊・玉石混じり土、 軟岩（Ⅰ）、（Ⅱ）、 中硬岩、硬岩（Ⅰ） （岩）	27	34	27	16

- （注）1. 岩掘削は火薬を標準としており、火薬による施工が困難な場合は、別途考慮する。  
2. 杭1本当り土質区分が異なる場合の諸雑費率βは、次のとおり加重平均して算出する。

$$\beta = \frac{\alpha_1 \times \beta_1 \times l_1 + \alpha_2 \times \beta_2 \times l_2}{\alpha_1 \times l_1 + \alpha_2 \times l_2}$$

$\alpha_1$  : 土質係数（土）  
 $\beta_1$  : 諸雑費率（土）  
 $l_1$  : 掘削長（土）  
 $\alpha_2$  : 土質係数（岩）  
 $\beta_2$  : 諸雑費率（岩）  
 $l_2$  : 掘削長（岩）

## 5-2 杭内足場工

## (1) 足場の種類及び数量

足場の種類は、手摺先行型枠組足場を標準とする。

掛面積は、次式による。

$$\text{掛面積 (m}^2\text{)} = \text{掘削1m当り掛面積 (m}^2\text{)} \times \text{掘削深 (m)}$$

表5.7 掘削1m当り掛面積 (m<sup>2</sup>)

杭 径 (m)	1.5以上 2.0以下	2.0を超え 2.5以下	2.5を超え 3.0以下	3.0を超え 3.5以下	3.5を超え 4.0以下	4.0を超え 4.5以下
掛面積 (m <sup>2</sup> )	1.2	1.5	3.6	3.6	5.0	6.6
杭 径 (m)	4.5を超え 5.0以下	5.0を超え 5.5以下	5.5を超え 6.0以下	6.0を超え 6.5以下	6.5を超え 7.0以下	7.0を超え 7.5以下
掛面積 (m <sup>2</sup> )	8.2	9.7	11.3	12.9	14.4	16.0

## (2) 設置・撤去歩掛

足場設置・撤去歩掛は、による。ただし、ラフテレーンクレーンが使用できない場合は、別途考慮する。

## 5-3 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。

## 5-4 コンクリート工

コンクリート打設は、「第Ⅱ編第3章深礎工③-2コンクリート工（深礎工）」により別途計上する。

## 5-5 グラウト工

## (1) 注入歩掛

グラウト材は、混合済みグラウト材の現場持込みを標準とする。

土留材と地山の隙間をグラウトにより間詰する場合の注入歩掛は、次表を標準とする。

表5.8 グラウト注入歩掛 (注入量10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単位	数量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.49
特 殊 作 業 員		〃	0.98
普 通 作 業 員		〃	0.49
諸 雑 費 率		%	21

(注) 1. グラウト用パイプが必要な場合は、別途計上する。

2. 諸雑費は、グラウトポンプ、グラウトホース、グラウト流量・圧力測定装置、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## (2) グラウト使用量

次式を標準とするが、現場条件により次式が適用できない場合は、別途考慮する。

$$G = 0.08 \pi (D + 0.08) \ell_2 \times 1.14$$

G : 杭1本当りグラウト使用量 (m<sup>3</sup>/本)

D : 杭径 (公称径) (m)

$\ell_2$  : 杭1本当りグラウト必要長 (m)

## 5-6 掘削作業設備組立解体工（C工法に適用）

深礎杭1本当りのやぐら装置，作業用足場等の組立・解体は，次表を標準とする。

表5.9 組立・解体歩掛

(深礎杭1本当り)

名 称	規 格	単位	杭 径 (m)		
			1.5以上2.5未満	2.5以上3.0未満	3.0以上4.5以下
土 木 一 般 世 話 役		人	0.6	0.9	1.2
と び 工		〃	0.9	1.1	1.3
特 殊 作 業 員		〃	1.3	1.5	1.7
普 通 作 業 員		〃	1.1	1.6	2.1
トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.6		
諸 雑 費 率		%	3		

- (注) 1. 上表は，組立と解体を合計した歩掛である。  
 2. 諸雑費は，作業用足場等の材料費であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 3. トラッククレーンは，賃料とする。  
 4. 現場条件により上表により難い場合は，別途考慮する。

## 6. 内訳書及び単価表

## (1) 深礎杭1本当り内訳書

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
掘 削 土 留		本		単価表(2)
掘削作業設備組立解体工	やぐら装置	式	1	単価表(3) ※C工法のみ計上
杭 内 足 場 工	手摺先行型枠組足場	掛 $m^2$		
鉄 筋 工		t		
コ ン ク リ ー ト 工		$m^3$		別途計上
グ ラ ウ ト 工		〃		単価表(4)
土 留 材	ライナープレート	m		
計				

(2) 掘削土留1本当り単価表

SWB230910

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	d×M	d : 深礎杭1本当り施工日数 M : 表4.1の人員
ト ン ネ ル 特 殊 工		〃	d×M	
特 殊 作 業 員		〃	d×M	
普 通 作 業 員		〃	d×M	
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧クラムシェル・ テレスコピック式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) バケット容量(平積0.4m <sup>3</sup> )	日	d	※A工法のみ計上 機械損料
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	〃	d	※A, B工法のみ計上 機械賃料
小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	電動式 山積0.03m <sup>3</sup> (平積0.021m <sup>3</sup> )	〃	d	※B工法-1のみ計上 機械損料
小 型 バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運 転	超小旋回型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	〃	d	※B工法-2のみ計上 機械賃料
や ぐ ら 装 置	簡易やぐら(モータウインチ付) 能力0.5t	〃	d'	※C工法のみ計上 d' = 1.5×d d' : 深礎杭1本当り供用日数 機械損料
諸 雑 費		式	1	表5.6
計				

(3) 掘削作業設備組立解体工 杭1本当り単価表 (C工法のみ計上)

SWB230920

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.9
と び 工		〃		〃
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ト ラ ッ ク ク レ ーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日		表5.9 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表5.9
計				

(4) グラウト注入10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB230930

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.8
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
グ ラ ウ ト 材	注入用モルタル	m <sup>3</sup>	11.4	
諸 雑 費		式	1	表5.8
計				

(5) 土留材材料費（撤去しない埋設）10m当り単価表

SWB230940

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ラ イ ナ ー プ レ ー ト		m	10	
諸 雑 費		式	1	
計				

(6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル テレスコピック式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) バケット容量(平積) 0.4m <sup>3</sup>	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 →45 機械損料数量→ 1.42
小型バックホウ (クローラ型)	電動式 山積0.03m <sup>3</sup> (平積0.021m <sup>3</sup> )	機-25	(B工法-1) 電源→発動発電機(電力に関する経費) 機械損料数量→ 1.39
小型バックホウ (クローラ型)	超小旋回型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	機-16	(B工法-2) 燃 料 消 費 量 → 9.0 機械賃料数量→ 1.39




## ③-2 コンクリート工（深礎工）（建地-E）

## 1. 適用範囲

深礎工における人力及び機械によるコンクリート打設に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。



（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-1 施工フロー

## 3. コンクリート打設工法の選定

コンクリート打設工法の選定は、図 3-1 及び図 3-2 を標準とするが、現場状況等を考慮し、これにより難しい場合は、別途考慮する。


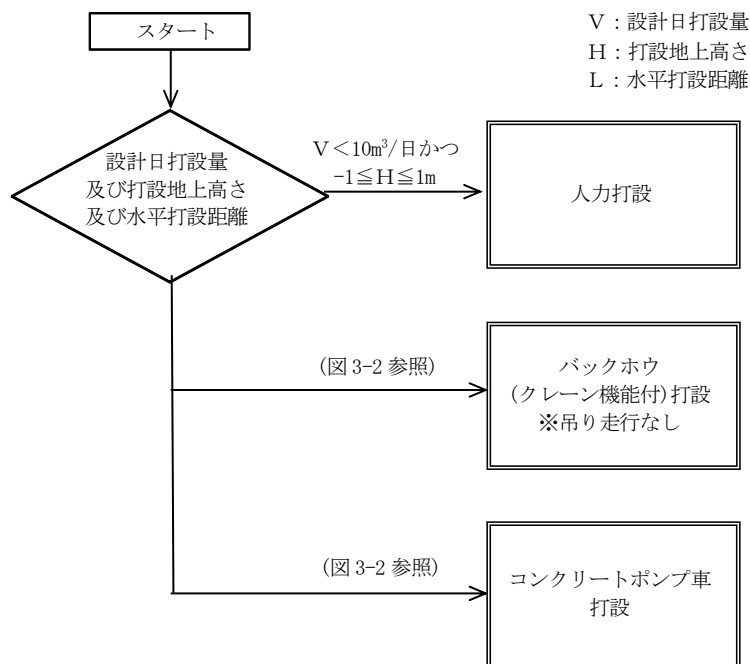


図 3-1 コンクリート打設工法の選定(1)

打 設 地 上 高 さ	4.5m 超 4.5m 以下	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ただし L ≤ 4.0m ※吊り走行なし	コンクリートポンプ車打設	コンクリートポンプ車打設	適用範囲外	
	1.0m 超 1.0m 以下					
	0m	人力打設 (現場内小運搬 15m 以下)				
	10m³/日未満	10m³/日以上	100m³/日未満	100m³/日以上	500m³/日未満	500m³/日以上
	−1.0m 以上 −1.0m 未満	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ただし L ≤ 2.0m ※吊り走行なし	コンクリートポンプ車打設	コンクリートポンプ車打設	適用範囲外	
−6.5m 以上 −6.5m 未満						

設 計 日 打 設 量

図 3-2 コンクリート打設工法の選定(2)

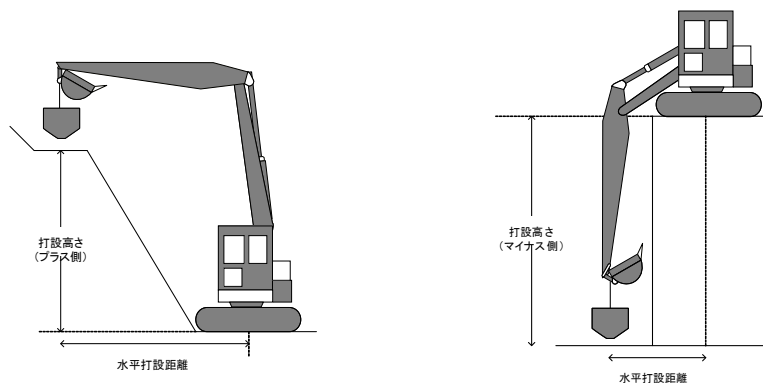

(参考図)バックホウによるコンクリート打設範囲

## 4. 施工パッケージ

## 4-1 コンクリート打設（深礎工）（SCB230960）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 4. 1 コンクリート打設（深礎工） 積算条件区分一覧（積算単位：m<sup>3</sup>）

打設工法	コンクリート規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無
コンクリートポンプ車打設	(表 4. 3)	10m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満	養生無し	延長無し	—
				60m 以下	
				60m を超え 120m 以下	
				120m を超え 180m 以下	
				180m を超え 240m 以下	
			一般養生	延長無し	
				60m 以下	
				60m を超え 120m 以下	
				120m を超え 180m 以下	
				180m を超え 240m 以下	
			特殊養生 (練炭, ジェットヒータ)	延長無し	
				60m 以下	
				60m を超え 120m 以下	
				120m を超え 180m 以下	
				180m を超え 240m 以下	
		100m <sup>3</sup> 以上 500m <sup>3</sup> 未満	養生無し	延長無し	
				240m 以下	
			一般養生	延長無し	
				240m 以下	
			特殊養生 (練炭, ジェットヒータ)	延長無し	
				240m 以下	
バックホウ (クレーン機能付) 打設	(表 4. 3)	—	養生無し	—	—
			一般養生		
			特殊養生 (練炭, ジェットヒータ)		
人力打設	(表 4. 3)	—	養生無し	—	有り
			一般養生		無し
			特殊養生 (練炭, ジェットヒータ)		有り
			一般養生		無し
			特殊養生 (練炭, ジェットヒータ)		有り

- (注) 1. 上表は、コンクリート打設、締固め、表面仕上、養生、15m 以下の人力運搬車による現場内小運搬（人力打設で、現場内小運搬「有り」の場合）、シュート、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料、電力に関する経費、ホースの筒先作業等を行う機械付補助作業（コンクリートポンプ車打設の場合）、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助作業（クレーン車打設及びバックホウ（クレーン機能付）打設の場合）等、その施工に要する全ての費用を含む。
2. コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は、+0.02 とする。
3. コンクリートポンプ車打設において、コンクリートポンプ車圧送のコンクリートのスランプ値及び粗骨材の最大寸法は、表 4. 2 のとおりとする。
4. コンクリートポンプ車打設において、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超える場合は、超えた部分について圧送管延長距離を積算条件区分から選択する。この場合、圧送管の日々の組立・撤去費用を含む。なお、圧送管の固定足場（受枠）を必要とする場合は、別途計上する。

5. バックホウ（クレーン機能付）打設のバケット容量は、 $V=0.3\text{m}^3$ を標準とする。
6. 特殊養生は、寒中コンクリートの養生に適用する。なお、養生方法は給熱養生を標準とする。養生のための足場は別途計上とする。

表 4.2 コンクリートポンプ車圧送のコンクリートの標準範囲

スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)
8 ～ 12	40 以下

表 4.3 コンクリート規格

積算条件	区分		
コンクリート規格	21-8-25(20) (普通)	24-8-40(普通)	24-12-40(高炉)
	21-12-25(20) (普通)	24-12-40(普通)	21-12-40(高炉)
	24-8-25(20) (普通)	4.5-2.5-40(普通)	40-8-25(早強)
	24-12-25(20) (普通)	21-8-25(20) (高炉)	40-12-25(早強)
	27-8-25(20) (普通)	21-12-25(20) (高炉)	21-8-25(早強)
	27-12-25(20) (普通)	24-8-25(20) (高炉)	21-12-25(早強)
	30-8-25(20) (普通)	24-12-25(20) (高炉)	24-8-25(早強)
	30-12-25(20) (普通)	19.5-5-40(高炉)	24-12-25(早強)
	40-8-25(20) (普通)	19.5-8-40(高炉)	18-8-25(高炉)
	40-12-25(20) (普通)	19.5-12-40(高炉)	18-12-25(高炉)
	18-8-40(普通)	18-5-40(高炉)	21-5-80(高炉)
	18-12-40(普通)	21-5-40(高炉)	18-3-40(高炉)
	19.5-8-40(普通)	18-8-40(高炉)	21-3-40(高炉)
	21-8-40(普通)	18-12-40(高炉)	Y-020000(各種)
	21-12-40(普通)	21-8-40(高炉)	
	22.5-8-40(普通)	24-8-40(高炉)	

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 4.4 コンクリート打設(深礎工) 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格		備考
機械	K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 $\text{m}^3/\text{h}$	ポンプ車打設の場合
		バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 $0.8\text{m}^3$ (平積 $0.6\text{m}^3$ ) 吊能力 2.9t	・賃料 ・バックホウ打設の場合
	K2	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126 MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）の場合
	K3	—	
労務	R1	普通作業員	
	R2	特殊作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	運転手（特殊）	ポンプ車打設の場合、バックホウ打設の場合
材料	Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C55%	
	Z2	軽油 1.2号 パトロール給油	ポンプ車打設の場合、バックホウ打設の場合
	Z3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	特殊養生（練炭、ジェットヒータ）の場合
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ④ ニューマチックケーソン工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、掘削深度が40m未満でかつ掘削面積が40m<sup>2</sup>以上300m<sup>2</sup>未満までのニューマチックケーソン工事に適用する。

なお、次項の掘削条件等の場合、又は現場条件により本資料により難しい場合は、別途考慮する。

- (1) 函内作業気圧（函内作業気圧とはゲージ圧力（絶対圧力：大気圧）をいう）が、0.4MPaを超えて施工する場合
- (2) 工期等により3組以上で施工する場合  
なお、「組」については、「第Ⅰ編第2章①直接工事費3. 労務費」を参照
- (3) ケーソン1基に対し、2艀装（マンロック（空気減圧対応型）又はマンロック（酸素減圧対応型）1艀装、マテリアルロック1艀装）以外で施工する場合


## 2. 施工概要

## 2-1 工法説明

ニューマチックケーソン工法は、ケーソンを構築し底部に作業室を設けて、送気設備より地下水に対抗する圧力の空気を送り、ドライに近い状態の室内へ作業員が入り、土砂を掘削、排出してケーソンを所定の支持地盤まで沈下させる工法である。

## 2-2 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

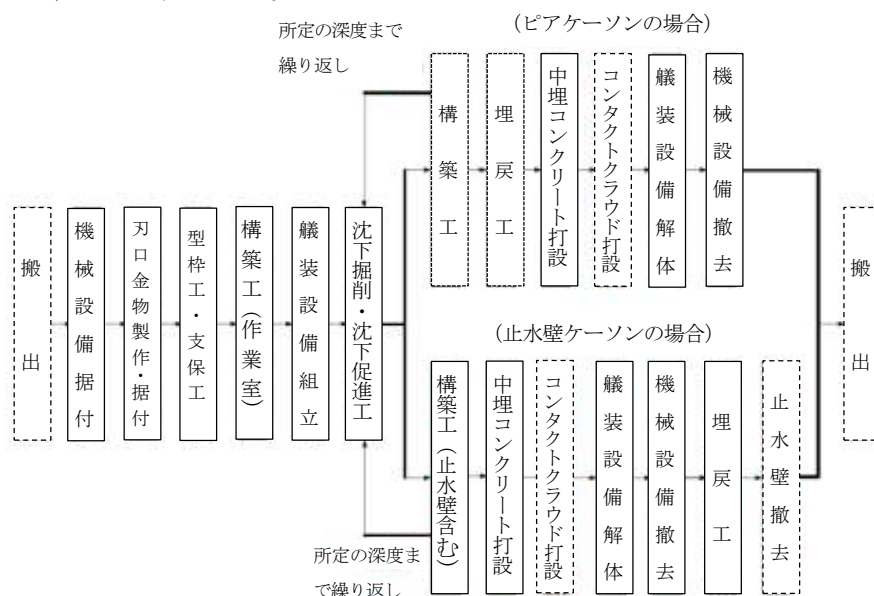

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
2. 埋戻工、コンタクトグラウド打設、止水壁撤去が必要な場合は、別途計上する。

図2-1 施工フロー

## 3. 掘削工法及び艀装の選定

掘削工法及び艀装は、次表を標準とする。

表3.1 掘削工法及び艀装数

ケーソン1基の掘削面積	工 法	艀装数	艀 装 内 訳
40m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	機械掘削	2	マンロック（空気減圧対応型）又はマンロック（酸素減圧対応型）1艀装、マテリアルロック1艀装

## 4. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

減圧方法が空気減圧を行う場合に空気減圧対応型を選定し、酸素減圧対応型を計上しない。又、減圧方法が酸素減圧を行う場合に酸素減圧対応型を選定し、空気減圧対応型を計上しない。

表4.1 機種の選定(ケーソン1基当り)

種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
排土設備	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 50t吊	台	1	(注) 1
	バ ケ ッ ト	1.0m <sup>3</sup> 級	個	2	1マテリアルロックにつき2個
	土 砂 ホ ッ パ	10m <sup>3</sup> 級	基	1	
機 装 設 備	マテリアルロック	通過可能バケット1.0m <sup>3</sup> 級 径×長さφ1.8～1.9×5.5m級 圧力0.4MPa	〃	1	機械掘削1基
	マ ン ロ ッ ク (空気減圧対応型)	立型10～12人用 圧力0.4MPa	〃	1	暖房, 自記気圧計, 自動換気装置を含む
	マ ン ロ ッ ク (酸素減圧対応型)	立型8人用 圧力0.4MPa	〃	1	暖房, 自記気圧計, 自動換気装置, 酸素・二酸化炭素計測装置及び濃度表示器を含む
	ケーソン用エレベータ (内 圧 用)	3人用 圧力0.4MPa	〃	1	必要に応じて別途計上
	ケーソン用エレベータシャフト (内圧用)	3人用 圧力0.4MPa	式	1	〃
	マテリアルシャフト	径×長さφ1.2m×2.0m級 圧力0.4MPa	〃	1	必要数量
	マ ン シ ャ フ ト	径×長さφ1.2m×2.0m級 圧力0.4MPa	〃	1	〃
	スペシャルシャフト	径×長さφ1.4m×0.5m級 圧力0.4MPa	個	2	
	ボ ッ ト ム ド ア	径1.4m級 圧力0.4MPa	〃	2	
	自動圧力調整装置	径φ100mm級 圧力0.4MPa	〃	1	
	高 圧 ホ ー ス	径φ100mm級 長さ10m 圧力1.0MPa	本	7	
	送 気 管	径φ100mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	m		ゲージ設備からケーソンまで
	照 明 設 備		式	1	
掘削設備	天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル	山積0.15m <sup>3</sup> (平積0.13m <sup>3</sup> )	台	1	掘削面積40m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満の場合
	走 行 レ ー ル (天井走行式ショベル用)	長さ2m級×1本	式	1	掘削面積100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満の場合
安全設備	酸 素 集 合 装 置	マンロック, ホスピタルロック用	基	1	必要に応じて別途計上(注)2
	酸 素 呼 吸 装 置 (マンロック用)		台	10	〃 〃
安全管理・連絡設備	ガ ス 検 知 器	携帯用	個	1	(注) 3
	ガ ス 検 知 器 (ニューマチックケーソン用)	定置式 [3点 (酸素, マン, H2S) 計測用]	台	1	(注) 3, 4
		定置式 [5点 (酸素, マン, H2S, CO, CO2) 計測用]	〃	1	
	電話又はインターホン		式	1	(注) 3
	ブ ザ ー		〃	1	〃
	函 内 T V		〃	1	〃

(注)1. クローラクレーンは、賃料とする。

2. 酸素減圧を行う場合、酸素集合装置、酸素呼吸装置(マンロック用)について、共通仮設費の安全費で別途計上する。

3. 安全管理・連絡設備は、共通仮設費(率分)に含まれる。

4. ガス検知器(ニューマチックケーソン用)は、現場条件により3点または5点計測用を用いる。

5. 現場条件により上表により難しい場合は別途考慮する。

表4.2 機種の選定(1工事当り機械設備)

種別	機 械 名	規 格	単位	数 量	摘 要
送気設備	空 気 圧 縮 機	吐出量29/36m <sup>3</sup> /min 圧力0.4MPa	台	必要台数	(注) 1
	圧縮空気清浄機	処理量 1,100m <sup>3</sup> /h	〃	必要台数	(注) 2
	クーリングタワー	40～60t/h	〃	必要台数	(注)3, 4, 5
	循環水ポンプ	口径φ80mm・全揚程30m	〃	必要台数	(注)4, 6
	レシーバタンク	容量2.5m <sup>3</sup> 圧力0.7～0.9MPa	〃	必要台数	(注) 2
	送 気 管	径φ150mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	m	空気圧縮機から ゲージ設備まで	
救急設備	ホスピタルロック (空気再圧対応型)	〔中型〕 径×長さ φ1.9×4m級 圧力0.5MPa	台	1	(注) 7
	ホスピタルロック (酸素再圧対応型)	〔中型〕 径×長さ φ1.9×4m級 圧力0.5MPa	〃	1	(注) 7, 8
	酸素集合装置	マンロック, ホスピタルロック用	基	1	〃 必要に応じて別途計上
	酸素呼吸装置 (ホスピタル ロック用)		台	4	〃 必要に応じて別途計上
	圧縮空気清浄機	処理量 650m <sup>3</sup> /h	〃	1	(注) 7
	高気圧下用 空気呼吸器	〔半閉鎖循環式〕 圧力0.4MPa 使用時間30min ボンベ内容量30級	個	4	〃
予備設備	空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 7.5～7.8m <sup>3</sup> /min 10.5～11m <sup>3</sup> /min 18～19m <sup>3</sup> /minの中から選定	台	必要台数	(注) 9
	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 35kVA	〃	必要台数	〃
電 力 設 備			式	1	

- (注) 1. 必要空気量を求め、それに見合う空気圧縮機の台数を計上する。  
2. 圧縮空気清浄機, レシーバタンクは, 空気圧縮機の容量に見合う台数を計上する。  
3. クーリングタワー用補給水として, 清水(水道水, ろ過河川水等)を次の量補給する。  
40t/h……70/min  
4. 空気圧縮機動力100kW当り180ℓ/minの清水が得られる場合は, その取水設備を計上し,  
クーリングタワーと循環水ポンプは計上しない。  
5. クーリングタワー用の補給水について, 水道水等による補給が出来ず運搬を伴う場合には  
別途考慮する。  
6. 循環水ポンプについては, 必要台数に予備ポンプを含める。  
7. 救急設備は, 共通仮設費の安全費で別途計上する。  
8. 酸素減圧を行う場合, 酸素集合装置, 酸素呼吸装置(ホスピタルロック用)について, 共通  
仮設費の安全費で別途計上する。  
9. 予備設備の空気圧縮機, 発動発電機は, 賃料とする。  
10. 現場条件により上表により難しい場合は, 必要により別途考慮する。なお, 空気圧縮機用の  
仮設建屋の費用は共通仮設費において, 別途計上する。

## 5. 編成人員

## 5-1 函内作業

ケーソン1基当りの函内作業の編成人員は、次表を標準とする。

表5.1 函内編成人員 (人/基)

掘削工法	掘削面積	潜かん世話役	潜かん工	摘 要
機 械 掘 削	40m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満	1	5	天井走行式ショベル1台
	100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満	1	7	天井走行式ショベル2台

(注) 機械掘削の場合の函内掘削機械の運転は、潜かん工が行うものとし、上表に含まれている。

## 5-2 函外作業

ケーソン1基当りの函外作業の編成人員は、次表を標準とする。

表5.2 函外編成人員 (人/基)

艀装数	潜かん世話役	潜かん工	特殊作業員	普通作業員	摘 要
2	1	1	1 (0)	2	

(注) 函内作業気圧が0MPa（素掘）の場合は、特殊作業員は計上しない。

## 5-3 送気用設備

送気用設備の運転の編成人員は、次表を標準とする。

表5.3 送気用設備編成人員 (人)

特 殊 作 業 員	電 工
1	1

## 6. 作業時間等

## 6-1 函内作業及び函外作業

函内作業及び函外作業に従事する作業員の1組当たり作業時間（賃金対象時間）は8時間とし、1日2交替（2組）とする。

## 6-2 送気用設備

送気用設備の運転に従事する特殊作業員、電工の作業時間は、全日（24時間）とし、2交替で従事するものとする。

なお、所要日数は、送気開始日から終了日までとする。



## 7. 設備等の供用日数

設備等の供用日数は、積上げて算出することを原則とするが、次表のとおり算定することができる。

表7.1 供用日数

設 備 等	供 用 日 数	摘 要
排 土 設 備	$(A+B+E) \times 1.4$	ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。
掘 削 設 備	$(A+B+E) \times 1.4$	
艀 装 設 備	$(A+B+C) \times 1.4$	
外 側 足 場	$(A+B) \times 1.4$	
内 側 足 場	$(A_1+B_1) \times 1.4$	
安 全 設 備	$(A+B+C) \times 1.4$	
送 気 設 備	$(A+B+C+D) \times 1.4$	
救 急 設 備	$(A+B+C) \times 1.4$	
予 備 設 備	$(A+B+C) \times 1.4$	

ただし、A：ケーソン構築日数（艀装日数含む）

A<sub>1</sub>：ケーソン部構築日数（ピアケーソンのピア部を含まず）

B：掘削沈下日数

B<sub>1</sub>：ケーソン部掘削沈下日数（ピアケーソンのピア部を含まず）

C：中埋コンクリート打設・養生日数（支持力テスト含む）

D：定置式空気圧縮機組立・分解日数

E：天井走行式ショベル組立・分解日数

- (注) 1. 送気用空気圧縮機は、最大容量分を同時に据付・撤去する。  
 2. 送気用空気圧縮機は、各ロットの掘削又は構築作業毎に運転台数を求め計上する。  
 3. 艀装用シャフトは、ケーソン1基当たり全使用本数の1/2に全供用日数を計上し、残り1/2に全供用日数の1/2を計上する。  
 4. 内側足場は、ケーソン1基当たり全内側足場掛  $m^2$  の1/2に全供用日数を計上し、残り1/2に全供用日数の1/2を計上する。  
 5. 供用日数は整数止めとし、小数点以下第1位を切り上げるものとする。

## 8. 施工歩掛

## 8-1 刃口金物製作・据付

## 8-1-1 刃口金物の材料費

刃口金物の材料費（製作費含む）は、一般管理費等のみ対象とする。

## 8-1-2 刃口金物の据付け

刃口金物の据付けは、次表を標準とする。

表8.1 刃口金物据付歩掛

(1基当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$0.5 \times T_1$	T <sub>1</sub> ：1基当り刃口金物質量 (t)
溶 接 工		〃	$1.0 \times T_1$	
普 通 作 業 員		〃	$0.8 \times T_1$	
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日	$0.24 \times T_1$	
諸 雑 費 率		%	7	

- (注) 1. 据付地盤の整地は含まない。  
 2. 溶接工には、機械工を含む。  
 3. 電気溶接機の運転を含む。  
 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。  
 5. 諸雑費は、電力に関する経費、溶接機の損料、燃料・油脂及び溶接ワイヤー等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 8-2 沈下掘削

## 8-2-1 機械掘削

施工1日（2組）当りの掘削量（ $D_c$ ）は、次式による。

$$D_c = \beta \times D_{c1}$$

$D_c$ ：1日（2組）当りの掘削量（ $m^3 \cdot \text{地山/日}$ ）

$\beta$ ：補正係数

$D_{c1}$ ：機械掘削1日（2組）当りの掘削量（ $m^3 \cdot \text{地山/日}$ ）

表8.2 機械掘削1日（2組）当りの掘削量（ $D_{c1}$ ）（ $m^3 \cdot \text{地山/日}$ ）

掘削面積（ $m^2$ ） 函内 作業気圧（MPa）	40以上60未満	60以上100未満	100以上300未満
0（素掘）	53.4 （—）	61.4 （—）	96.3 （—）
0 を超え0.10以下	51.9 （—）	59.6 （—）	93.6 （—）
0.10を超え0.14以下	42.0 (45.0)	48.2 (51.8)	75.7 (81.2)
0.14を超え0.18以下	30.5 (36.6)	35.1 (42.1)	55.1 (66.1)
0.18を超え0.22以下	19.8 (26.7)	22.8 (30.7)	35.8 (48.2)
0.22を超え0.26以下	16.0 (22.9)	18.4 (26.3)	28.9 (41.3)
0.26を超え0.30以下	12.2 (18.3)	14.0 (21.1)	22.0 (33.0)
0.30を超え0.34以下	— (14.5)	— (16.7)	— (26.2)
0.34を超え0.36以下	— (11.4)	— (13.2)	— (20.6)
0.36を超え0.38以下	— (9.9)	— (11.4)	— (17.9)
0.38を超え0.40以下	— (9.9)	— (11.4)	— (17.9)

（注）酸素減圧を行う場合は、（ ）内の数値を計上する。

表8.3 土質による補正係数（ $\beta$ ）

土 質	砂、砂質土、 粘性土及び粘土	レキ及び レキ質土	玉石混り 砂レキ	軟岩（Ⅰ）	軟岩（Ⅱ）
補正係数	1.00	0.84	0.56	0.35	0.17

- （注）
1. 刃口掘付面から掘削深3mまでは、上表を30%低減する。
  2. 軟岩（Ⅰ）は、ピックハンマ等による掘削、軟岩（Ⅱ）は発破を必要とする場合の歩掛である。
  3. 軟岩（Ⅱ）の場合、掘削10 $m^3$ 当り火薬2.1kg、雷管13個を計上する。
  4. 軟岩（Ⅱ）の場合は削岩機を、軟岩（Ⅰ）の場合はピックハンマを次の台数計上する。  
掘削面積 40 $m^2$ 以上100 $m^2$ 未満2台  
空気圧縮機（削岩機用）7.5～7.8 $m^3/min$  [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] ×1台  
掘削面積 100 $m^2$ 以上300 $m^2$ 未満3台  
空気圧縮機（削岩機用）7.5～7.8 $m^3/min$  [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] ×1台  
掘削面積 40 $m^2$ 以上100 $m^2$ 未満2台  
空気圧縮機（ピックハンマ）7.5～7.8 $m^3/min$  [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] ×1台  
掘削面積 100 $m^2$ 以上300 $m^2$ 未満3台  
空気圧縮機（ピックハンマ）7.5～7.8 $m^3/min$  [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] ×1台
  5. 軟岩（Ⅰ）で亀裂が少なくブレーカを使用しても大塊となるもの及び軟岩（Ⅱ）において中硬岩に近く相当に発破を必要とするものについては、日当り掘削量を30%低減することができる。

## 8-3 沈下促進工法

## 8-3-1 载荷工法

## (1) 材料

水荷重（ポンプによる注排水）を標準とするが、現場条件等によりその他の工法が必要な場合は別途計上する。

## (2) 水荷重（ポンプによる注排水）作業

水荷重（ポンプによる注排水）作業は、次表を標準とする。

表8.4 水荷重(ポンプによる注排水)作業歩掛 (1t当り)

名 称	単 位	数 量
特 殊 作 業 員	人	0.02

(注) 注排水は、工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) φ100を必要台数計上する。

## 8-4 構築工

## 8-4-1 ケーソン本体及び止水壁の製作

ケーソン本体及び止水壁は、鉄筋コンクリート構造を標準とする。

## (1) ケーソン本体及び止水壁の構築日数

コンクリートは早強セメント使用を標準とし、1リフト（ロット）当り標準構築日数は、艀装の組立・解体を含めて10日（普通セメント使用の場合12日）とする。なお、止水壁の製作は止水壁ケーソンを使用する場合のみ適用する。

## (2) 投入打設工

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工（鉄筋構造物）」により別途計上する。

## (3) 足場工

## ① 足場は手摺先行型枠組足場を標準とし、掛面積は、次式による。

外側足場掛面積（ケーソン部）（掛 $m^2$ ）＝初期2ロット分外周面積×1.3（掛 $m^2$ ）

外側足場掛面積（ピア部）（掛 $m^2$ ）＝1ロット分外周面積×1.3（掛 $m^2$ ）

内側足場掛面積（掛 $m^2$ ）＝必要ロット分外周面積×0.55（掛 $m^2$ ）

## ② 外側足場材の設置・撤去は、止水壁ケーソン及びピアケーソンのケーソン部の構築において、1回のみ計上し、ピアケーソンのピア部は1ロットごとに計上する。ただし、ピアケーソンのピア部の外側足場については、1ロット分の掛面積とする。

## ③ 内側足場材の設置・撤去は、止水壁ケーソン及びピアケーソンのケーソン部の構築において、1回のみ計上する

## ④ 足場材の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表8.5 足場材設置・撤去歩掛

(100掛 $m^2$ 当り)

名 称	規 格	単 位	外側足場	内側足場
土 木 一 般 世 話 役		人	1.5	2.6
と び 工		〃	6.1	6.5
普 通 作 業 員		〃	1.1	2.1
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 50t吊	日	1.8	2.6

- (注) 1. クローラクレーンは、賃料とする。  
2. 足場の架台及び支持杭が必要な場合には別途計上する。  
3. 上記歩掛には、安全ネットの設置撤去手間が含まれている。

- ⑤ 足場材賃料を計上する場合、次式の通り算定することができる。

賃料 $=L \times (M1 \times T + M2) \times A$  (円) ……………式8.1

L：賃料係数 (1.3)

M1：先行据置2段手すりの1日当たりの賃料 (円/日)

M2：先行据置2段手すりの基本料金 (円)

T：足場材の併用日数 (日) ……………式7.1

A：足場の掛面積 (掛 $m^2$ )

足場材は、敷板、建枠、筋違、建付布枠、連結ピン、アームロック、ジャッキベース、手摺柱、手摺、先行据置2段手すり、幅木、階段、養生ネット（メッシュシート）、安全ネット等である。

- (4) 型枠工

「第Ⅱ編第4章②-1型枠工」により別途計上する。

- (5) 支保工

「第Ⅱ編第5章⑦-2支保工」により別途計上する。

- (6) 鉄筋工

鉄筋工は、「第Ⅵ編第1章①-1鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。

- (7) 養生工

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。

#### 8-4-2 埋戻工

現場条件により埋戻工が必要な場合は、別途考慮する。

#### 8-4-3 止水壁撤去

止水壁撤去が必要な場合は、別途計上する。

## 8-4-4 中埋コンクリート打設

## (1) 中埋コンクリート工

中埋コンクリート工は作業室内を充填するコンクリートの打設を対象とする。作業室天井のシャフト部を中埋コンクリートと異なるコンクリートで充填する場合は、別途計上する。

中埋コンクリート打設歩掛、コンクリートポンプ車の運転経費は、次表を標準とする。

表8.6 中埋コンクリート打設歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
潜 か ん 世 話 役		人	0.15
潜 か ん		〃	0.15
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	日	0.11

(注) コンクリートポンプ車圧送のスランプ値及び粗骨材の最大寸法は、次表のとおりとする。

表8.7 コンクリートポンプ車圧送のコンクリート標準範囲

スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)
18～21	25以下

## (2) 中埋コンクリート打設量

中埋コンクリートの使用量は、次式による。

中埋コンクリート使用料＝設計量×(1+K)……………式8.2

設計量：作業室中埋コンクリート量 (m<sup>3</sup>)

K：ロス率

表8.8 ロス率(K)

K:ロス率	+0.04
-------	-------

## (3) ブローパイプバルブ調整

ケーソン1基当りのブローパイプのバルブ調整は、次表を標準とする。

表8.9 ブローパイプバルブ調整 (1基当り)

名 称	単 位	数 量
潜 か ん 工	人	6.3
諸 雑 費 率	%	21

## 8-4-5 コンタクトグラウト打設

コンタクトグラウト打設が必要な場合は、別途計上する。

## 9. 仮設備工

## 9-1 仮設備の組立・解体

仮設備の組立・解体は、次表を標準とする。

ただし、定置式空気圧縮機設備、土砂ホッパ等を同場所に同時に2台以上組立・解体する場合は、次表に台数分を乗じて計上する。

表9.1 仮設備の組立・解体歩掛

(1台当り)

名 称	規格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m <sup>3</sup> /min)		土砂ホッパ (10m <sup>3</sup> 級)		天井走行式 ショベル (山積0.15 m <sup>3</sup> 平積0.13m <sup>3</sup> )		クーリング タワー設備 (40～60t/h)		ホスピタル ロック	
			組立 7.0日	解体 5.0日	組立	解体	組立 3.2日	解体 3.2日	組立	解体	組立	解体
土木一般世話役		人	3.3	2.0	1.5	0.5	2.2	2.2	—	—	1.0	1.0
と び 工		〃	7.0	3.0	5.2	2.5	—	—	—	—	3.0	1.0
溶 接 工		〃	14.0	5.0	3.5	1.3	—	—	1.0	0.5	4.0	1.1
潜 か ん 工		〃	—	—	—	—	7.9	6.3	—	—	—	—
電 工		〃	3.0	1.0	0.4	0.2	1.0	1.0	—	—	—	—
普通作業員		〃	11.0	5.0	0.6	0.4	—	—	0.7	0.3	3.3	2.0
コンクリート		m <sup>3</sup>	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日	2.0	1.0	1.5	1.0	3.2	3.2	0.3	0.2	1.0	1.0
諸 雑 費		%	24		7		10		32		14	

- (注) 1. 組立材料は、地盤状態のよい水平面上に設置した場合の必要量を計上するものとし、コンクリートの打設歩掛は組立・解体歩掛に含まれている。  
2. 天井走行式ショベルの組立・解体には、天井走行レールの組立・解体を含む。  
3. 定置式空気圧縮機設備の歩掛は、レシーバタンク、圧縮空気清浄装置の組立・解体を含む。  
4. クーリングタワーの歩掛は、空気圧縮機等からの配管を含む。  
5. 天井走行式ショベルの解体歩掛は、函内作業気圧0.22MPa（酸素減圧の場合は0.26MPa）までを標準とし、それ以上については別途考慮する。  
6. 諸雑費は組立に必要な配管、ボルトナット、バルブ、パッキン、土砂ホッパの足下に設置するH形鋼、ホスピタルロックの建屋材等であり、労務費、組立材料費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
7. 定置式空気圧縮機設備の基礎コンクリートの撤去については、「第Ⅱ編第2章④構造物とりこわし工」により別途計上する。  
8. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 9-2 送気用配管設備

配管は、一般配管用鋼管（ガス管）とし、空気圧縮機からゲージ設備まではφ150mm、ゲージ設備からケーソンまではφ100mmを標準とし、配管歩掛は次表を標準とする。

表9.2 配管歩掛

(100m当り)

名 称	単 位	管 径 (mm)			
		100		150	
		組立	解体	組立	解体
土木一般世話役	人	1.0	0.5	1.0	0.6
普通作業員	〃	3.0	2.0	4.0	2.0
配 管 工	〃	3.0	2.0	5.0	3.0
諸 雑 費	%	21		16	

- (注) 諸雑費はパッキン、ボルトナット、ティー、バルブの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 9-3 艀装設備組立・解体

潜函のシャフト（たて管）、送気管、排気管及び配電管等の設備機械の艀装は、1リフト（ロット）毎に組立・解体を行い、歩掛は次表を標準とする。

表9.3 組立・解体歩掛

(人/1艀装・1リフト（ロット）当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0
潜 か ん 工		〃	3.0
溶 接 工		〃	5.5
クローラクレーン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 50t吊	日	1.0
諸 雑 費		%	6

- (注) 1. 沈下完了後の解体労務は、上記歩掛に含まれている。  
 2. 艀装組立・解体日数は、1艀装1リフト(ロット)当り1日とする。  
 3. クローラクレーンは、賃料とする。  
 4. 諸雑費は艀装に伴うボルトナット、送排気管、パッキンであり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 10. 参考資料

## 10-1 函内照明設備

函内照明は40W蛍光灯とし、個数は次式による。

$$N > (1 + \frac{L}{6}) S + 0.14A$$

N：ケーソン内40W蛍光灯個数（個）

L：マンシャフト長（m）

S：マンロック数（基）

A：掘 削 面 積（m<sup>2</sup>）

## 10-2 1組当り掘削実作業時間

1組当りの掘削実作業時間は、次表を標準とする。

表10.1 1組当り掘削実作業時間

函内作業気圧（MPa）	1組当り掘削実作業時間（h）
0（素掘）	7.0 (—)
0を超え0.10以下	6.8 (—)
0.10を超え0.14以下	5.5 (5.9)
0.14を超え0.18以下	4.0 (4.8)
0.18を超え0.22以下	2.6 (3.5)
0.22を超え0.26以下	2.1 (3.0)
0.26を超え0.30以下	1.6 (2.4)
0.30を超え0.34以下	— (1.9)
0.34を超え0.36以下	— (1.5)
0.36を超え0.38以下	— (1.3)
0.38を超え0.40以下	— (1.3)

- (注) 1. 上記の1組当り掘削実作業時間は、平成27年4月「高気圧作業安全衛生規則」の改正により、高圧下の時間（高圧室内作業者に加圧を開始した時から減圧を開始するまでの時間）を基礎に純作業時間を考慮し示したものである。  
 2. ( )内は酸素減圧を行った場合の作業時間を示す。

## 10-3 酸素使用量

酸素使用量は以下を標準とする。

## (1) 酸素使用量

酸素使用量は、次式による

$$\text{酸素使用量 (m}^3\text{)} = \Sigma (\text{a} \times \text{b} \times \text{c})$$

酸素使用量：1組当り酸素使用量 (m<sup>3</sup>)

a：区分毎の1人当り酸素使用量 (m<sup>3</sup>/人)

b：区分毎の1組当り函内編成人員 (人/組)

c：区分毎の交替数 (組)

表10.2 酸素使用量 (m<sup>3</sup>)

区 分		1人当り 酸素使用量 a (m <sup>3</sup> /人)	1組当り 函内編成人員 b (人/組)	交替数 c (組)
函内作業気圧 (MPa)				
掘 削 作 業 時	0.10を越え 0.14以下	2.1	編成人員(表5.1)	交替数
	0.14を越え 0.18以下	3.8	〃	〃
	0.18を越え 0.22以下	3.6	〃	〃
	0.22を越え 0.26以下	4.5	〃	〃
	0.26を越え 0.30以下	4.4	〃	〃
	0.30を越え 0.34以下	4.7	〃	〃
	0.34を越え 0.36以下	4.3	〃	〃
	0.36を越え 0.38以下	4.0	〃	〃
	0.38を越え 0.40以下	4.4	〃	〃
そ の 他	作業室内設備解体	(注)3	4人/組	〃
	地耐力試験	〃	〃	〃
	中埋コンクリート確認	〃	〃	〃

- (注) 1. 酸素使用量には、酸素ボンベ内の圧力低下によるロス率25%を含む。  
 2. 酸素（医療用）費用については、共通仮設費の安全費で別途計上する。  
 3. 函内作業気圧時の酸素使用量を用いる。

## 10-4 酸素集合装置設置・撤去（マンロック・ホスピタルロック用）


酸素集合装置設置・撤去は、次表を標準とする。

表10.3 酸素集合装置設置・撤去（マンロック・ホスピタルロック用） (1基当り)


名 称	規 格	単 位	設 置	撤 去
特 殊 作 業 員		人	2.0	1.0
普 通 作 業 員		〃	1.0	0.5
諸 雑 費 率		%	30	


- (注) 1. 上記には、酸素集合装置の設置及び配管を含む。  
 2. 諸雑費は、設置に伴う配管材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



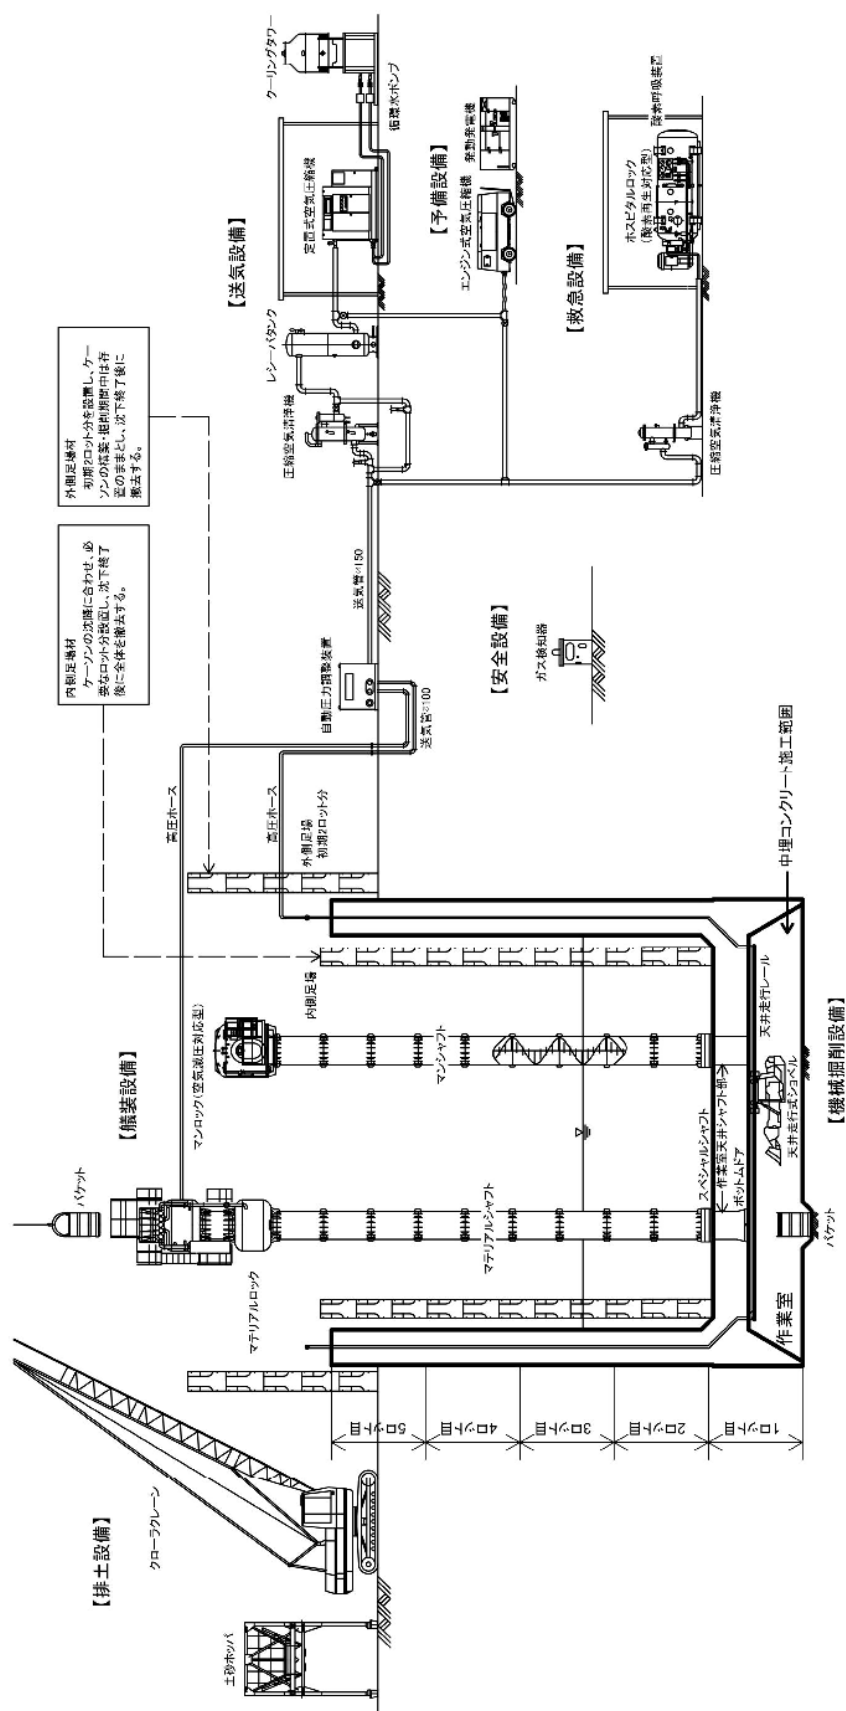


参考図1 ニューマチックケーン工法(空気減圧)止水壁ケーソン概要図



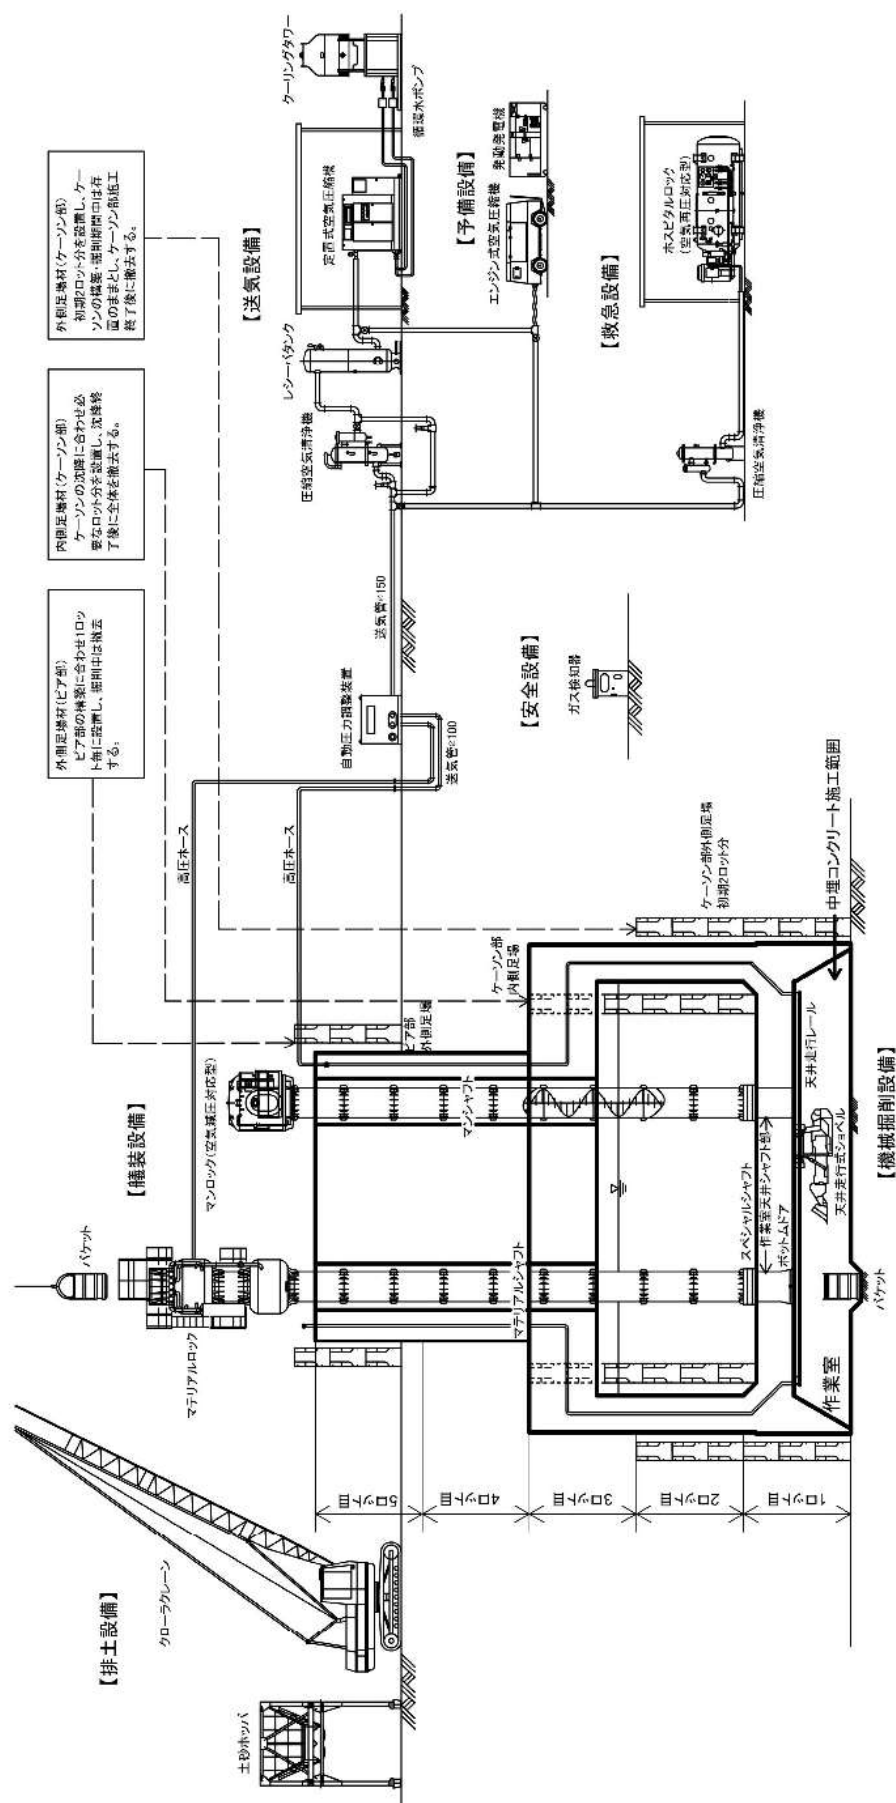

参考図3 ニューマチックケーン工法(空気減圧) ピアケーソン概要図

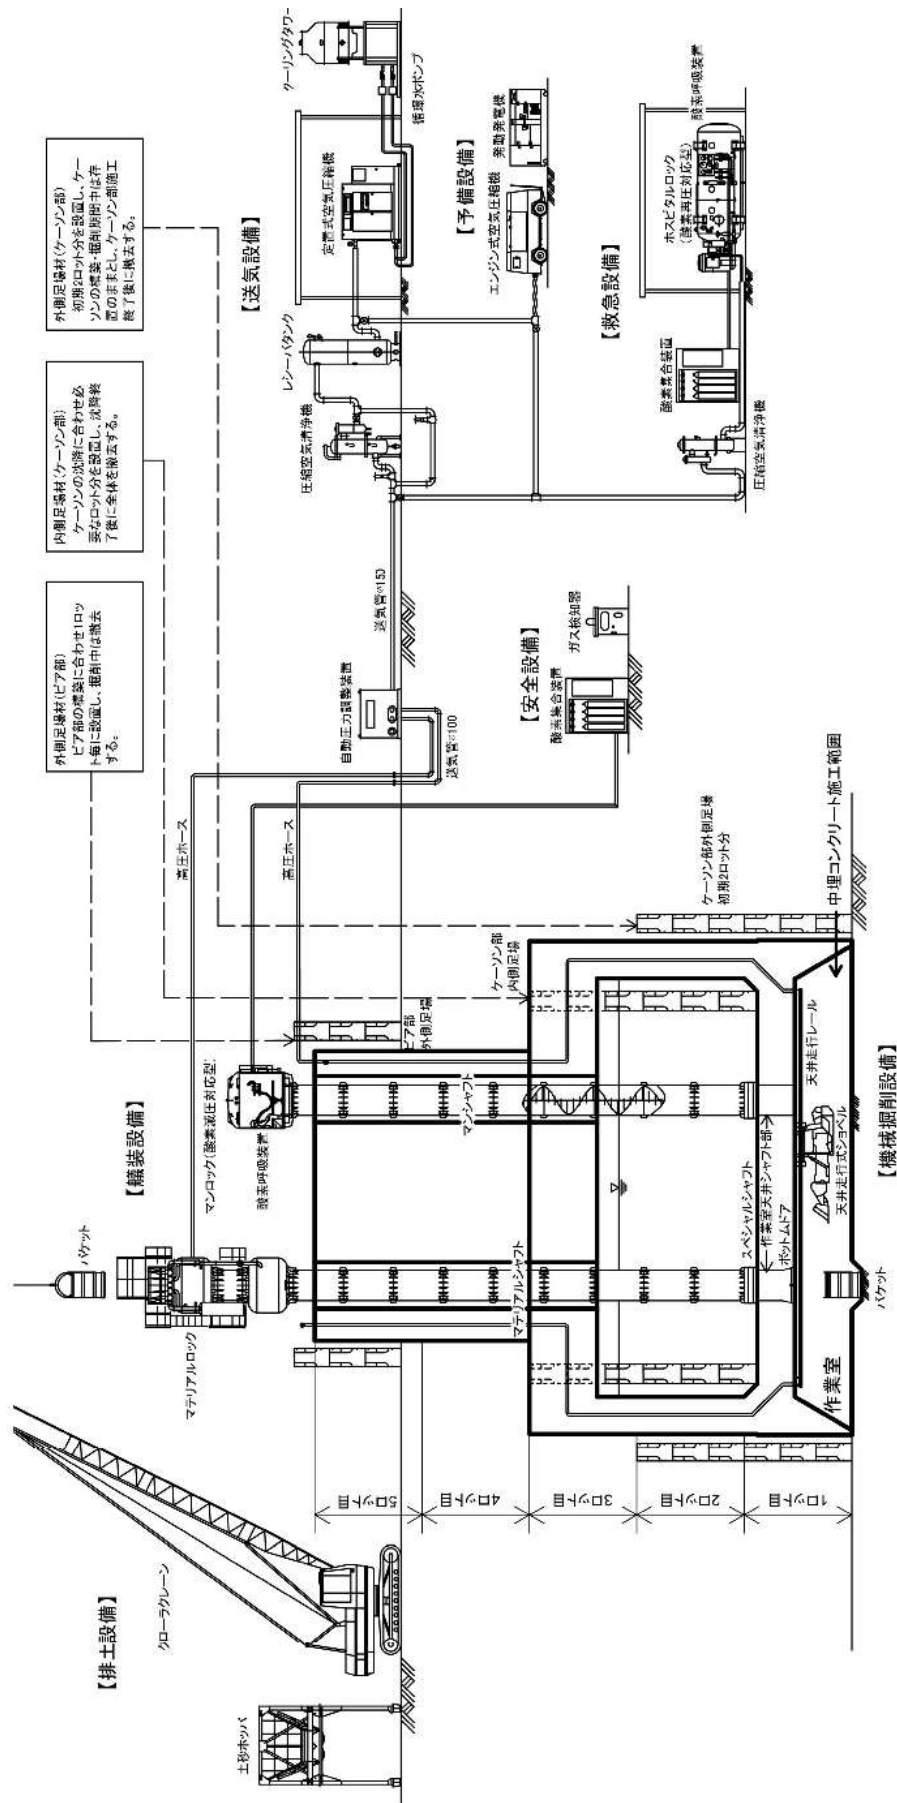

参考図4 ニューマチックケーソン工法(酸素減圧) ピアケーソン概要図

## 11. 単価表

(1) 刃口金物材料費1基当り単価表

SWB231010

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
材 料 費		t		
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 刃口金物据付1基当り単価表

SWB231020

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表8.1
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日		〃 機械賃料
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(3) 機械掘削10m³当り単価表

SWB231220

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
潜 か ん 世 話 役		人	$M \times 2 \times 10 / D_c$	
潜 か ん 工		〃	$M \times 2 \times 10 / D_c$	
特 殊 作 業 員		〃	$M \times 2 \times 10 / D_c$	
普 通 作 業 員		〃	$M \times 2 \times 10 / D_c$	
シ ョ ベ ル 電 力		kWh	Hw	
ク ロー ラ ク レ ー ン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50t吊	日	$10 / D_c$	機械賃料
発 破 経 費		式	1	必要に応じて別途計上
諸 雑 費		〃	1	
計				

(注) 1.  $M$  = 表5.1人員 + 表5.2人員2.  $H_w$  : ショベル電力

$$H_w = P_s \times Q_s \times D \times 2 \times H \times 10 / D_c$$

 $P_s$  : 天井走行式ショベル電力 (kW) $Q_s$  : 天井走行式ショベル燃料消費率 (kWh/kW) $D$  : 天井走行式ショベル台数 (台) $H$  : 1組当り掘削実作業時間……表10.1 $D_c$  : 機械掘削1日 (2組) 当り掘削量

3. 函内作業気圧が0MPa (素掘) の場合は, 特殊作業員は計上しない。

4. 軟岩 (Ⅰ), 軟岩 (Ⅱ) の場合は, 削岩機, ピックハンマ, 空気圧縮機 (排出ガス対策型 (第1次基準値)), 火薬, 雷管を必要数計上する。

(4) 足場材設置・撤去 100 掛  $\text{m}^2$  当り単価表

SWB231400・SWB231420・SWB231440

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表8.5
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
クローラクレーン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50t吊	日		表8.5, 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (5) 足場材賃料一式当り単価表

SWB231410・SWB231430・SWB231450

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
足 場 材 賃 料	手摺先行型枠組足場	式	1	表8.1 (必要数量計上)
諸 雑 費		式	1	
計				

## (6) 送気用設備運転 1 日当り単価表 (2 交替)

SWB231230

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
特 殊 作 業 員		人	1(人)×2(2方) ×11/8(h)	表5.3 (数量×供用日数)
電 工		〃	1(人)×2(2方) ×11/8(h)	〃
電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)	数量×延運転時間
電 力 量 (クーリングタワー用)		〃	0.91kWh	必要に応じて 別途計上 数量×延運転時間
電 力 量 (循環水ポンプ用)		〃	5.3kWh	〃
諸 雑 費		式	1	
計				

## (7) 水荷重 (ポンプによる注排水) 作業1t当り単価表

SWB231250

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
特 殊 作 業 員		人	0.02	表8.4
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ 運 転	普通型(潜水ポンプ) φ100	日		必要日数計上 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(8) 中埋コンクリート打設10m<sup>2</sup>当り単価表

SWB231390

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
潜 か ん 世 話 役		人	0.15	表8.6
潜 か ん 工		〃	0.15	〃
コンクリートポンプ車 運 転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日	0.11	表8.6, 機械損料
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>	10.4	表8.2
諸 雑 費		式	1	
計				

(9) ブローパイプバルブ調整ケーソン1基当り単価表

SWB231240

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
潜 か ん 工		人	6.3	表8.9
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(10) 艀装設備組立・解体1艀装1リフト（ロット）当り単価表

SWB231270

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1.0	表9.3
潜 か ん 工		〃	3.0	〃
溶 接 工		〃	5.5	〃
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50t吊	日	1.0	表9.3, 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表9.3
計				

(11) 排土設備ケーソン1基当り単価表

SWB231280

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50t吊	台	1	表4.1 機械賃料
バ ケ ッ ト	1.0m <sup>3</sup> 級	個	2	〃
土 砂 ホ ッ パ	10m <sup>3</sup> 級	基	1	〃
諸 雑 費		式	1	
計				



(12) 艀装設備ケーソン1基当り単価表

SWB231290

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
マテリアルロック	通過可能バケット1.0m <sup>3</sup> 径×長さφ1.8～1.9×5.5m 級 圧力0.4MPa	基	1	表4.1
マンロック (空気減圧対応型)	立型10～12人用 圧力0.4MPa	〃	1	〃
マンロック (酸素減圧対応型)	立型8人用 圧力0.4MPa	〃	1	〃
ケーソン用エレベータ (内圧用)	3人用 圧力0.4MPa	〃	1	表4.1 (必要に応じて 別途計上)
ケーソン用エレベータ シャフト (内圧用)	3人用 圧力0.4MPa	式	1	〃 ( 〃 )
マテリアルシャフト	径×長さφ1.2m×2.0m級 圧力0.4MPa	〃	1	表4.1 (必要数量)
マンシャフト	径×長さφ1.2m×2.0m級 圧力0.4MPa	〃	1	〃 ( 〃 )
スペシャルシャフト	径×長さφ1.4m×0.5m級 圧力0.4MPa	個	2	表4.1
ボットムドア	径1.4m級 圧力0.4MPa	〃	2	〃
自動圧力調整装置	径φ100mm級 圧力0.4MPa	〃	1	〃
高圧ホース	径φ100mm級 長さ10m 圧力1.0MPa	本	7	〃
送気管	径φ100mm 長さ5.5m 圧力 1.0MPa	m		表4.1 (ゲージ設備 からケーソンまで)
照明設備		式	1	表4.1
諸雑費		〃	1	
計				

(13) 掘削設備ケーソン1基当り単価表

SWB231300

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
天井走行式ショベル	山積0.15m <sup>3</sup> (平積0.13m <sup>3</sup> )	台	1	表4.1 (掘削面積40m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満)
天井走行式ショベル	山積0.15m <sup>3</sup> (平積0.13m <sup>3</sup> )	〃	2	表4.1 (掘削面積100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満)
走行レール (天井走行式ショベル)	長さ2m級×1本	式	1	表4.1 (必要数量計上)
諸雑費		〃	1	
計				

(14) 送気設備 (空気圧縮機) 1工事当り単価表

SWB231310

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
空気圧縮機	吐出量29/36m <sup>3</sup> /min 圧力 0.4MPa	台		表4.2 (必要数量計上)
諸雑費		式	1	
計				



(15) 送気設備（その他）1工事当り単価表

SWB231320

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
圧縮空気清浄機	処理量 1,100m <sup>3</sup> /h	台		表4.2 (必要数量計上)
クーリングタワー	40～60t/h	〃		〃 ( 〃 )
循環水ポンプ	口径φ80mm・全揚程30m	〃		〃 ( 〃 )
レシーバタンク	容量φ2.5m <sup>3</sup> 圧力0.7～0.9MPa	〃		〃 ( 〃 )
送 気 管	径150mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	m		〃 ( 〃 )
諸 雑 費		式	1	
計				

(16) 安全設備 ケーソン1基当り単価表

SWB231370

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
酸素集合装置	マンロック, ホスピタルロック用	基	1	表4.1
酸素呼吸装置 (マンロック用)		台	10	〃
酸素(医療用)		m <sup>3</sup>		表10.2
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 酸素(医療用)費用については、共通仮設費の安全費に計上する。

(17) 救急設備 1工事当り単価表

SWB231330

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ホスピタルロック (空気再圧対応型)	〔中型〕径×長さ φ1.9× 4m級・圧力0.5MPa	台	1	表4.2
ホスピタルロック (酸素再圧対応型)	〔中型〕径×長さ φ1.9× 4m級・圧力0.5MPa	〃	1	〃
酸素集合装置	マンロック, ホスピタルロック用	基	1	〃 (必要に応じて 別途計上)
酸素呼吸装置 (ホスピタルロック用)		台	4	〃 ( 〃 )
圧縮空気清浄機	処理量 650m <sup>3</sup> /h	〃	1	〃
高気圧下用空気呼吸器	〔半閉鎖循環式〕 圧力0.4MPa 使用時間30minボンベ内容 量30級	個	4	〃
諸 雑 費		式	1	
計				

(18) 仮設備の組立・解体 1 台当り単価表

SWB231350

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人		表9.1
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
潜 か ん 工		〃		〃
電 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ート		m <sup>3</sup>		〃
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出 ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表9.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表9.1
計				

(19) 予備設備 1工事当り単価表

SWB231340

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
エ ン ジ ン 式 空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型・排出ガス 対策型(第1次基準値)	台		表4.2(必要台数計上) 機械賃料
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン 駆動・排出ガス対策型 (第1次基準値) 35kVA	〃		〃
諸 雑 費		式	1	
計				

(20) 送気用配管設備組立・解体 100m 当り単価表

SWB231360

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人		表9.2
普 通 作 業 員		〃		〃
配 管 工		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## (21) 酸素集合装置設置・撤去（マンロック・ホスピタルロック用）1基当り単価表 SWB231380

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
特 殊 作 業 員		人		表10.3
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## (22) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型(潜水ポンプ) φ100	機-14	
ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第1次 基準値） 50t吊	機-16	燃 料 消 費 量→122 機 械 賃 料 数 量→ 2.15
ク ロ ー ラ ク レ ー ン （ 艀 装 ・ 足 場 用 ）	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第1次 基準値） 50t吊	機-16	燃 料 消 費 量 （艀装）→ 61 （足場）→ 60 機 械 賃 料 数 量→ 1.00
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	機-18	運 転 労 務 数 量→ 1.00 燃 料 消 費→ 98 機 械 損 料 数 量→ 1.00

## ⑤ 基礎工（鋼管矢板基礎工）（建地－E）


## ⑤－1 打撃工法

## 1. 適用範囲

本資料は、橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

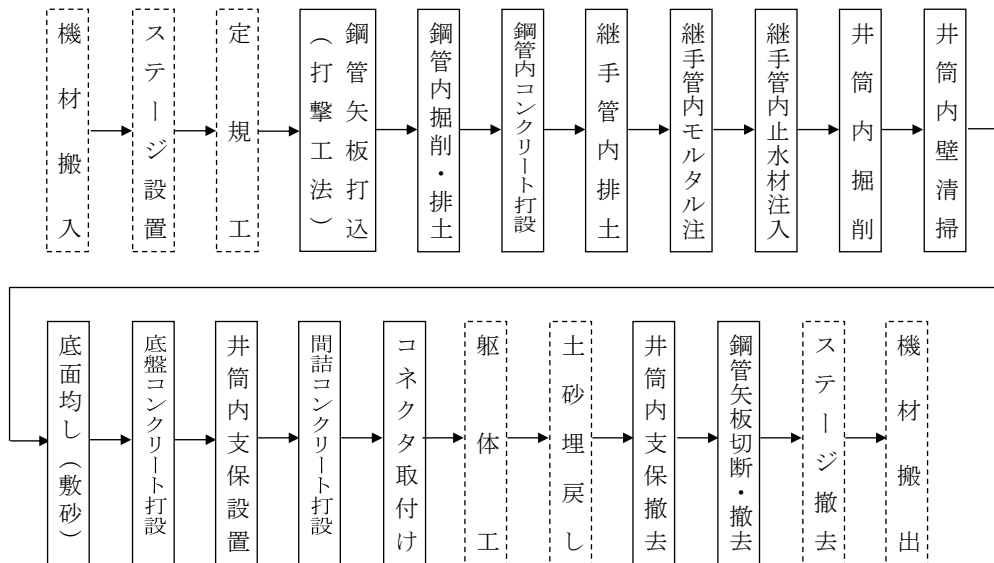

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2－1 施工フロー

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
クローラ式杭打機	油圧ハンマ・直結三点支持式、又は直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ・直結三点支持式	台	1	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊	〃	1	
ハンマグラブ		個	1	
クラムシエル	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m <sup>3</sup>	台	1	
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	〃	1	
杭 打 ち 用 ウォータージェット	エンジン式・排出ガス対策型(第1次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325 ℓ/min	〃	1	
鉄筋スタッド施工機械	2,000A用	組	1	スタッド溶殖機・4連ガン・制御装置・昇降フレーム・電動空気圧縮機・自走式リフト(2台)を含む
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	台	1	
電気溶接機	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃	1	
水中切断機		〃	1	
パイプロハンマ	60kW	〃	1	
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量60kVA	〃	1	
	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量250kVA	〃	1	
	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量300kVA	〃	1	

(注) 1. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

2. 発動発電機、トラッククレーンは、賃料とする。

## 3-1 油圧パイルハンマの選定

油圧パイルハンマの選定は、次図による。

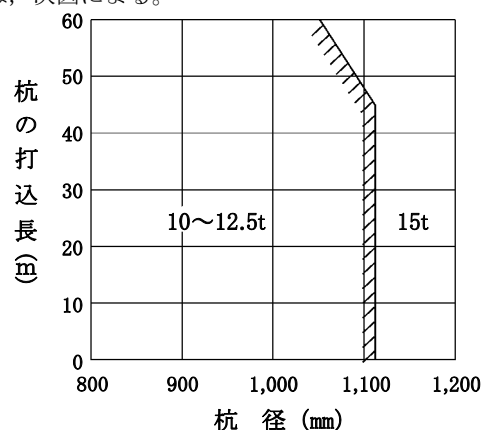


図3-1 油圧パイルハンマの選定

## 4. 施工歩掛

## 4-1 鋼管矢板打込工（打撃工法）

鋼管矢板の打込みは、油圧ハンマによる施工を標準とする。

## 4-1-1 編 成 人 員

杭打機1台に対する日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 日当り編成人員 (人/台・日)

土木一般世話役	と び 工	普通作業員	溶 接 工
1	2	1	2

（注）継杭を施工しない場合には、溶接工は計上しない。

## 4-1-2 油圧ハンマによる打込み

(1) 杭10本当り施工日数（ $T_d$ ）

杭10本当り施工日数は、次式による。

$$T_d = \alpha \cdot \beta \cdot T_a$$

$T_d$ ：杭10本当り施工日数（日/10本）

$\alpha$ ：土質係数（表4.2）

$\beta$ ：板厚係数（表4.3）

$T_a$ ：規格別施工日数（表4.4）

（注） $\beta$ については杭長にて決定、 $T_a$ については打込長にて決定すること。

① 土質係数（ $\alpha$ ）表4.2 土質係数（ $\alpha$ ）


N値の範囲	
1以上20未満	20以上
1.00	1.07

（注）N値は、打込層の加重平均N値とする。

② 板厚係数（ $\beta$ ）表4.3 板厚係数（ $\beta$ ）

杭 長 (m)	継手管 板 厚 (mm)	本 管 板 厚 (mm)						
		9	10	12	14	16	19	22
16m以下	9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16mを超え32m以下	9	0.94	0.96	1.00	1.07	1.17	1.33	1.61
	11	1.01	1.02	1.06	1.13	1.22	1.40	1.67
32mを超え48m以下	9	0.94	0.95	1.00	1.07	1.18	1.37	1.71
	11	1.00	1.03	1.07	1.15	1.24	1.44	1.77
48mを超え64m以下	9	0.94	0.96	1.00	1.09	1.18	1.39	1.73
	11	1.00	1.02	1.07	1.15	1.27	1.49	1.86

(注) 1. 本管の板厚が異なる場合には、薄い板厚の板厚係数を採用する。  
 2. 溶接箇所が2箇所以上ある場合は、それぞれの板厚係数の平均値を採用する。

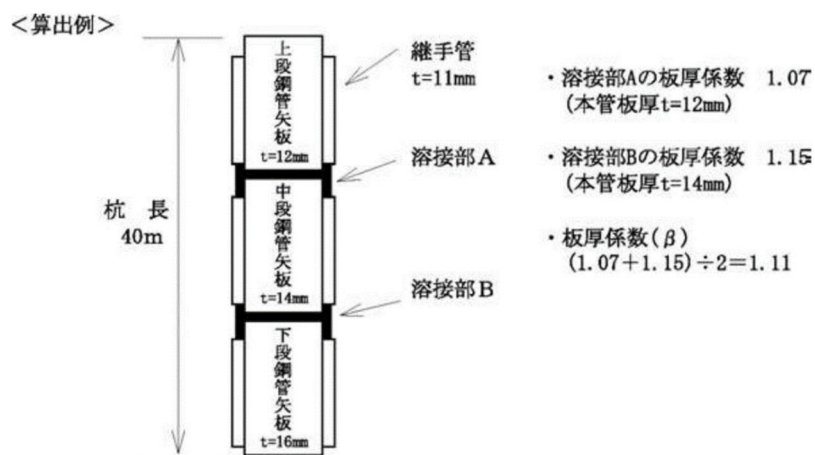

参考図

③ 規格別施工日数（ $T_a$ ）表4.4 規格別施工日数（ $T_a$ ） (日)

打 込 長 (m)	杭 径 (mm)				
	800	900	1,000	1,100	1,200
16m以下	1.4	1.5	1.6	1.7	1.4
16mを超え32m以下	4.4	4.7	5.0	5.3	4.8
32mを超え48m以下	7.9	8.3	8.8	9.4	8.7
48mを超え64m以下	11.3	12.2	12.5	12.2	12.5

## 4-1-3 諸雑費率

表4.5 諸雑費率 (%)

	単 杭	継 杭
諸 雑 費 率	23	31

(注) 諸雑費は、溶接棒（ワイヤ）、足場材の費用、電気溶接機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-2 定規工（導杭・導枠）

定規工の施工歩掛は、下記による。

## 4-2-1 導杭

「第Ⅱ編第5章②-1パイプロハンマ工」のパイプロハンマによるH形鋼の施工（打込み、引抜き）による。

## 4-2-2 導枠

「第Ⅱ編第5章⑥仮設材設置撤去工」の切梁・腹起しによる。

## 4-3 鋼管内掘削工

鋼管内の掘削の歩掛は、次表を標準とする。

表4.6 鋼管内掘削工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.19
普 通 作 業 員		〃	0.74
ハ ン マ グ ラ ブ 運 転		日	0.40
諸 雑 費 率		%	14

- (注) 1. 本歩掛には、管内掘削後のスライム処理を含む。  
 2. 諸雑費は、ハンマクラウン損料、工事用水中モータポンプ損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 3. 日当りの施工量は、53m<sup>3</sup>を標準とする。

## 4-4 鋼管内コンクリート打設工

## 4-4-1 施工歩掛

鋼管内のコンクリート打設工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.7 鋼管内コンクリート打設工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.08
特 殊 作 業 員		〃	0.20
普 通 作 業 員		〃	0.27
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日	0.08

(注) 日当りの施工量は、125m<sup>3</sup>を標準とする。

## 4-4-2 鋼管内コンクリートの使用数量

鋼管内コンクリートの使用数量は、次式による。

使用数量 (m<sup>3</sup>) = 設計数量 × (1 + K) ……式4. 1

K：ロス率

表4.8 ロス率(K)

ロ	ス	率	+0.04
---	---	---	-------



## 4-5 継手管内排土工

P-P型継手における継手管内の排土の歩掛は、次表を標準とする。

表4.9 継手管内排土工歩掛 (継手100m当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.4
特 殊 作 業 員		〃	1.2
普 通 作 業 員		〃	1.3
杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 圧力14.7MPa吐出量3250/min	日	0.4
諸 雑 費 率		%	6

(注) 1. 諸雑費は、工事用水中モータポンプ損料、水槽損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 日当りの施工量は、250mを標準とする。

## 4-6 継手管内モルタル注土工

## 4-6-1 施工歩掛

P-P型継手における継手管内のモルタル注入の歩掛は、次表を標準とする。

表4.10 継手管内モルタル注土工歩掛 (継手100m当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.4
特 殊 作 業 員		〃	1.0
普 通 作 業 員		〃	0.8
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量60kVA	日	0.5
諸 雑 費 率		%	12

(注) 1. 諸雑費は、グラウトミキサ損料、グラウトポンプ損料、工事用水中モータポンプ損料、水槽損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 日当りの施工量は、250mを標準とする。

## 4-6-2 継手管内モルタルの使用数量

継手管内モルタルの使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式4.2}$$

K：ロス率

表4.11 ロス率(K)

ロ	ス	率	+0.05
---	---	---	-------

継手管内モルタルの設計数量は、パイプ型（P-P型）φ165.2mmの場合、2.5m<sup>3</sup>/100mを標準とする。

なお、これにより難しい場合は、別途考慮する。

## 4-7 継手管内止水材注入工

## 4-7-1 施工歩掛

P-P型継手における継手管内の止水材注入の歩掛は、次表を標準とする。

表4.12 継手管内止水材注入工歩掛 (継手100m当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.5
特 殊 作 業 員		〃	1.4
普 通 作 業 員		〃	1.0
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量60kVA	日	0.9
諸 雑 費 率		%	16

- (注) 1. 諸雑費は、グラウトミキサ損料、グラウトポンプ損料、工事用水中モータポンプ損料、水槽損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
2. 日当りの施工量は、200mを標準とする。

## 4-7-2 継手管内止水材の使用数量

継手管内止水材の使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式4.3}$$

K：ロス率

表4.13 ロス率(K)

ロ	ス	率	+0.14
---	---	---	-------

継手管内止水材の設計数量は、パイプ型（P-P型）φ165.2mmの場合、2.5m<sup>3</sup>/100mを標準とする。  
なお、これにより難い場合は、別途考慮する。

## 4-8 井筒内掘削工

井筒内の水中掘削の歩掛は、次表を標準とする。

表4.14 井筒内掘削工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.07
普 通 作 業 員		〃	0.33
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m <sup>3</sup>	日	0.13

(注) 日当りの施工量は、143m<sup>3</sup>を標準とする。

## 4-9 底面均し（敷砂）工

水中における底面均し（敷砂）の歩掛は、次表を標準とする。

表4.15 底面均し（敷砂）工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7
潜 水 士		〃	1.2
普 通 作 業 員		〃	1.3
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m <sup>3</sup>	日	0.2
諸 雑 費 率		%	6

- (注) 1. 井筒の内壁清掃作業を含む。  
2. 諸雑費は、潜水士の設備用具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
3. 日当りの施工量は、19m<sup>3</sup>を標準とする。

## 4-10 底盤コンクリート打設工

## 4-10-1 施工歩掛

底盤コンクリートの水中打設の歩掛は、次表を標準とする。

表4. 16 底盤コンクリート打設工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.08
特 殊 作 業 員		〃	0.18
普 通 作 業 員		〃	0.27
コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 運 転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日	0.08

(注) 1. 潜水土による作業（水中コンクリートの均し、確認等）が必要な場合は、別途計上する。  
2. 日当りの施工量は、125m<sup>3</sup>を標準とする。

## 4-10-2 底盤コンクリートの使用数量

底盤コンクリートの使用数量は、次式による。

使用数量 (m<sup>3</sup>) = 設計数量 × (1 + K) ……式4. 4

K : ロス率

表4. 17 ロス率(K)

ロ	ス	率	+0.09
---	---	---	-------

## 4-11 井筒内支保設置・撤去工

井筒内の排水・注水を伴う支保設置・撤去の歩掛は、次表を標準とする。

表4. 18 井筒内支保設置・撤去工歩掛 (10t当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	2.6
と		〃	6.5
溶		〃	4.1
普 通 作 業 員		〃	3.9
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	日	4.1
諸 雑 費 率		%	23

(注) 1. 本歩掛は、設置及び撤去の合計であり、構成は設置65%、撤去35%である。  
2. 井筒内の排水及び注水作業を含む。  
3. 支保工内に支柱を建込む場合は、別途計上する。  
4. 諸雑費は、工事用水中モータポンプ損料、電気溶接機損料、ガス切断機損料、電力に関する経費、酸素、アセチレン、ホース等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
5. 日当りの施工量は、4tを標準とする。

## 4-12 井筒内支保間詰コンクリート工

## 4-12-1 施工歩掛

井筒内の支保間詰コンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。

表4. 19 井筒内支保間詰コンクリート打設工歩掛 (10m<sup>3</sup>当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.9
特 殊 作 業 員		〃	2.4
普 通 作 業 員		〃	2.8
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日	0.7

- (注) 1. 底板等の設置撤去労務を含む。  
 なお、底板等の材料費は、別途計上する。  
 2. 日当りの施工量は、11m<sup>3</sup>を標準とする。

## 4-12-2 井筒内支保間詰コンクリートの使用数量

井筒内支保間詰コンクリートの使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式4. 5}$$

K：ロス率

表4. 20 ロス率(K)

ロ	ス	率	+0.04
---	---	---	-------

## 4-13 コネクタ取付工

## 4-13-1 鉄筋スタッド方式

鉄筋スタッド方式によるコネクタ取付けの歩掛は、次表を標準とする。

表4. 21 コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式)歩掛 (4列10段当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.2
特 殊 作 業 員		〃	0.4
溶 接 工		〃	0.2
普 通 作 業 員		〃	0.2
鉄筋スタッド施工機械運転	2,000A用	日	0.2
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量250kVA	〃	0.2
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	〃	0.1
諸 雑 費		%	5

- (注) 1. 鉄筋スタッド方式(4列)に適用するものであり、それ以外については別途考慮する。  
 2. 鉄筋スタッド施工機械運転には、スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・昇降フレーム・電動空気圧縮機・自走式リフト(2台)の運転経費を含む。  
 3. 諸雑費は、電気溶接機損料、溶接棒、昇降フレーム固定治具、グラインダー、マーカ等の費用であり、労務費、材料費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 4. 日当りの施工量は、50段を標準とする。  
 5. 発動発電機、トラッククレーンは、賃料とする。

## 4-13-2 プレートブラケット方式

プレートブラケット方式によるコネクタ取付けの歩掛は、次表を標準とする。

表4. 22 コネクタ取付工(プレートブラケット方式)歩掛 (1t当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.4
溶 接 工		〃	2.3
普 通 作 業 員		〃	0.6
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運 転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	日	0.4
電 気 溶 接 機 運 転	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃	2.1
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量300kVA	〃	2.1

(注) 1. 1日当りの施工量は、3tを標準とする。  
2. 発動発電機は、賃料とする。

## 4-14 鋼管矢板切断・撤去工

鋼管矢板の切断・撤去工は、水中切断機による鋼管矢板の切断及び切断後の鋼管矢板の撤去作業に適用する。

## 4-14-1 編成人員

日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4. 23 日当り編成人員 (人/日)

土 木 一 般 世 話 役	と び 工	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員
1	1	1	1

4-14-2 鋼管矢板10本当り切断・撤去施工日数 (T<sub>x</sub>)

鋼管矢板10本当り切断・撤去施工日数は、次式による。

$$T_x = T_y + T_z \text{ (日/10本)}$$

T<sub>x</sub>: 鋼管矢板10本当り施工日数 (日/10本)

T<sub>y</sub>: 〃 切断日数 (日/10本)

T<sub>z</sub>: 〃 撤去日数 (日/10本)

4-14-3 鋼管矢板10本当り切断日数 (T<sub>y</sub>)

表4. 24 鋼管矢板10本当り切断日数 (日/10本)

鋼管矢板杭径	800mm	900～1,000mm	1,100～1,200mm
施 工 日 数	1.4	1.6	1.8

4-14-4 鋼管矢板10本当り撤去日数 (T<sub>z</sub>)

鋼管矢板10本当りの準備作業を含めた撤去日数は、次表を標準とする。

表4. 25 鋼管矢板10本当り撤去日数 (日/10本)

鋼管矢板10本当り撤去日数	0.5
---------------	-----

## 5. 単価表

(1) 鋼管矢板打込工（打撃工法）10本当り単価表

SWB231510

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_d \times 1$	表4.1
溶 接 工		〃	$T_d \times 2$	表4.1 必要に応じて計上
と び 工		〃	$T_d \times 2$	表4.1
普 通 作 業 員		〃	$T_d \times 1$	〃
鋼 管 矢 板		本	10	板厚, 杭径毎に別段書き
補 強 材		〃		必要に応じて計上
クローラ式杭打機運転		日	$T_d$	表3.1 機械損料
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	〃	$T_d$	表3.1 必要に応じて計上 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.5
計				

(注)  $T_d$ : 杭10本当り施工日数（日/10本）(2) 鋼管内掘削工10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB231520

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.6
普 通 作 業 員		〃		〃
ハンマグラブ運転		日		表4.6 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.6
計				

(3) 鋼管内コンクリート打設工10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB231530

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.7
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式4.1
コンクリートポンプ車 運	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日		表4.7 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(4) 継手管内排土工継手100m当り単価表

SWB231540

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.9
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325ℓ/min	日		表4.9 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.9
計				

(5) 継手管内モルタル注入工継手100m当り単価表

SWB231550

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.10
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
注 入 材 料		m <sup>3</sup>		式4.2
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量60kVA	日		表4.10 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.10
計				

(6) 継手管内止水材注入工継手100m当り単価表

SWB231560

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.12
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
注 入 材 料		m <sup>3</sup>		式4.3
止 水 袋		m		必要数量計上
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量60kVA	日		表4.12 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.12
計				

(7) 井筒内掘削工10m3当り単価表

SWB231570

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.14
普 通 作 業 員		〃		〃
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m <sup>3</sup>	日		表4.14 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(8) 底面均し（敷砂）工10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB231580

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4. 15
潜 水 士		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
敷 砂 材 料		m <sup>3</sup>	10	
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m <sup>3</sup>	日		表4. 15 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4. 15
計				

(9) 底盤コンクリート打設工10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB231590

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4. 16
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式4. 4
コンクリートポンプ車 運 転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日		表4. 16 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(10) 井筒内支保設置・撤去工10t当り単価表

SWB231600

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4. 18
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	日		表4. 18 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4. 18
計				

(11) 井筒内支保間詰コンクリート工10m<sup>3</sup>当り単価表

SWB231610

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4. 19
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式4. 5
コンクリートポンプ車 運 転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	日		表4. 19 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				



(12) コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式）4列10段当り単価表

SWB231670

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4. 21
特 殊 作 業 員		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材		本	40	
鉄筋スタッド施工機械 運	2,000A用	日		表4. 21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量250kVA	〃		表4. 21 機械賃料
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃		表4. 21 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4. 21
計				

(13) コネクタ取付工（プレートブラケット方式）1t当り単価表

SWB231620

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4. 22
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	日		表4. 22 機械損料
電 気 溶 接 機 運 転	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃		表4. 22 機械損料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量300kVA	〃		表4. 22 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 材料費は別途計上すること。

(14) 鋼管矢板切断・撤去工10本当り単価表

SWB231630

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$T_x \times 1$	表4. 23
と び 工		〃	$T_x \times 1$	〃
特 殊 作 業 員		〃	$T_x \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$T_x \times 1$	〃
水 中 切 断 機		日	$T_y$	表4. 24 機械損料
パイプロハンマ運転	60kW	〃	$T_z$	表4. 25 機械損料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量300kVA	〃	$T_x$	機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注)  $T_x$ : 鋼管矢板10本当り施工日数 (日/10本)  
 $T_y$ : 鋼管矢板10本当り切断日数 (日/10本)  
 $T_z$ : 鋼管矢板10本当り撤去日数 (日/10本)

(15) 導枠, 井筒内支保材料費1t当り単価表

SWB231640

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
材 料 費		t	1	
修 理 費 及 び 損 耗 費	山留主部材	〃	1	
副 部 材 賃 料	副部材(A)	〃	0. 22 (0. 67)	Ⅱ-5-②, 表7. 1
修 理 費 及 び 損 耗 費	〃	〃	0. 22 (0. 67)	〃 , 〃
副 部 材 賃 料	副部材(B)	〃	0. 04 (0. 06)	〃 , 〃
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 上表の副部材 (A) (B) の ( ) 書きについては, 火打ブロック使用の場合の数量である。

(16) コネクタ材料費 (プレートブラケット) 1t当り単価表

SWB231650

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
材 料 費		t	1	
諸 雑 費		式	1	
計				

(17) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラ式杭打機	油圧ハンマ 直結三点支持式 又は 直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ・ 直結三点支持式	機-18	運転労務数量→1.00 機械損料数量→1.59 燃料消費量→下記のとおりとする
			ラム質量      燃料消費量(ℓ/日)
			10～12.5t      150 15t      187
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→55 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.59 その他工種→1.49
ハンマクラブ		機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→55 機械損料1→ハンマクラブ 機械損料数量→1.49 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型50～55t吊 機械損料数量→1.49
クラムシエル	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m <sup>3</sup>	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→107 機械損料数量→1.50
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→109 機械損料数量→1.21
杭打ち用ウォータ ージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325ℓ/min	機-24	燃料消費量→131 機械損料数量→1.25
鉄筋スタッド施工機械	2,000A用	機-25	機械損料数量→1.75 スタッド溶殖機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む
発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量250kVA	機-16	燃料消費量→218 機械賃料数量→1.75
水中切断機		機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→73 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.49 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型50～55t吊 機械損料数量→1.49
バイプロハンマ	60kW	機-20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→68 機械損料1→バイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.19 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型50～55t吊 機械損料数量→1.19
電気溶接機	半自動アーク溶接機 定格電流500A	機-25	機械損料数量→1.50
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量 60kVA 定格容量300kVA	機-16	燃料消費量→下記のとおりとする 継手管内モルタル→42 継手管内止水材→50 コネクタ取付→263 (プレートブラケット方式) 鋼管矢板切断撤去→266 機械賃料数量→1.30

## ⑤-2 中掘工法


## 1. 適用範囲

本資料は、橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（中掘工法）に適用する。

なお、中掘工法の先端処理方法については、根固め工法（セメントミルク噴出攪拌方式）のみの適用とする。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

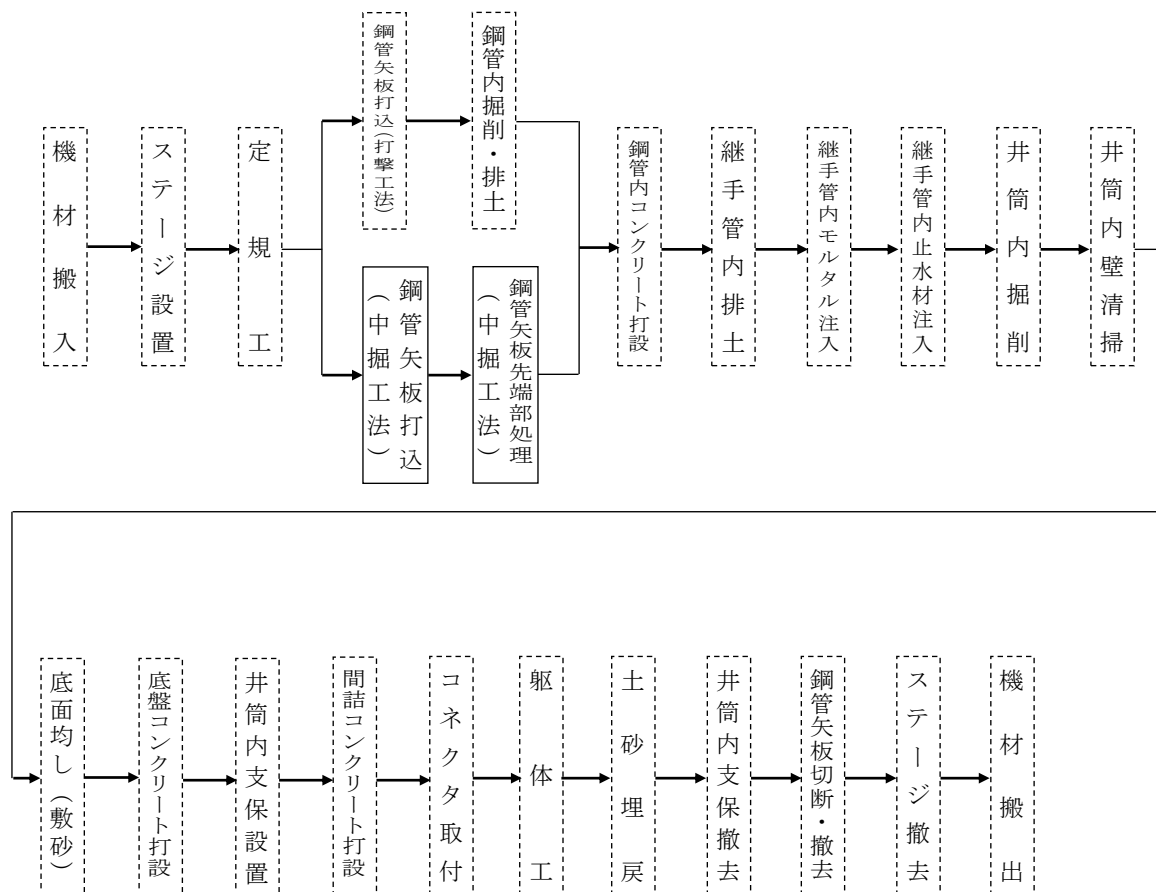

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 定規工，鋼管内コンクリート打設，継手管内排土，継手管内モルタル注入，継手管内止水材注入，井筒内掘削，井筒内壁清掃，底面均し（敷砂），底盤コンクリート打設，井筒内支保設置・撤去，間詰コンクリート打設，コネクタ取付，鋼管矢板切断・撤去は、「[第Ⅱ編第3章⑤-1 打撃工法](#)」による。

図2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

## 3-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW	台	1	A区分に適用
	直結三点支持式 オーガ出力110kW			B区分に適用
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊	〃	1	鋼管径φ1,000mm以下
	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 80t吊			鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下
バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	〃	1	掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)
モルタルプラント	攪拌容量500ℓ×2 281～300ℓ/min	〃	1	

(注) 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 3-2 クローラ式アースオーガの選定

クローラ式アースオーガの選定は、次図による。

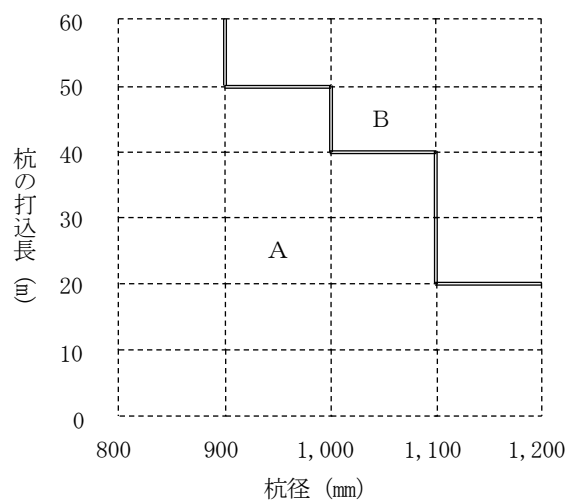


図3-1 クローラ式アースオーガの選定

## 4. 施工歩掛

## 4-1 鋼管矢板打込工（中掘工法）

現場条件により油圧ハンマによる施工ができない場合は、中掘工法とする。

## 4-1-1 編成人員

鋼管矢板中掘工法の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 日当り編成人員 (人)

土木一般世話役	とび工	特殊作業員	普通作業員	溶接工
1	2	1	1	2

## 4-1-2 施工歩掛

(1) 鋼管矢板1本当り施工時間 (T<sub>c</sub>)

$$T_c = T_E + T_Z$$

T<sub>c</sub> : 鋼管矢板1本当り施工時間 (分/本)

T<sub>E</sub> : 鋼管矢板1本当りオーガ掘削時間 (分/本)

T<sub>Z</sub> : 鋼管矢板1本当りグラウト施工・継手溶接・その他準備時間 (分/本)

1) 鋼管矢板1本当りオーガ掘削時間 (T<sub>E</sub>)

鋼管矢板1本当りオーガ掘削時間 (T<sub>E</sub>) は、次表を標準とする。

表4.2 鋼管矢板1本当りオーガ掘削時間(T<sub>E</sub>) (分/本)

加重平均N値		N値20未満		N値20以上40未満		N値40以上	
鋼管矢板杭径		800mm以上 1,000mm以下	1,000mmを超え 1,200mm以下	800mm以上 1,000mm以下	1,000mmを超え 1,200mm以下	800mm以上 1,000mm以下	1,000mmを超え 1,200mm以下
打 込 長	1m以上 5m以下	8.7	9.6	17.1	18.5	28.2	30.6
	5mを超え 10m以下	23.2	25.6	45.6	49.2	75.2	81.6
	10mを超え15m以下	37.7	41.6	74.1	80.0	122.2	132.6
	15mを超え20m以下	52.2	57.6	102.6	110.7	169.2	183.6
	20mを超え25m以下	66.7	73.6	131.1	141.5	216.2	234.6
	25mを超え30m以下	81.2	89.6	159.6	172.2	263.2	285.6
	30mを超え35m以下	95.7	105.6	188.1	203.0	310.2	336.6
	35mを超え40m以下	110.2	121.6	216.6	233.7	357.2	387.6
	40mを超え45m以下	124.7	137.6	245.1	264.5	404.2	438.6
	45mを超え50m以下	139.2	153.6	273.6	295.2	451.2	489.6
	50mを超え55m以下	153.7	169.6	302.1	326.0	498.2	540.6
	55mを超え60m以下	168.2	185.6	330.6	356.7	545.2	591.6

2) 鋼管矢板1本当りグラウト施工・継手溶接・その他準備時間（T<sub>Z</sub>）表4.3 鋼管矢板1本当りグラウト施工・継手溶接・その他準備時間（T<sub>Z</sub>）（分/本）

鋼管板厚		t9～10				t12				t14			
継杭回数		0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
鋼管径	800mm以上1,000mm以下	111.6	184.8	258.0	331.2	111.6	194.6	277.6	360.6	111.6	205.9	300.2	394.5
	1,000mmを超え1,200mm以下	120.9	201.7	282.5	363.3	120.9	214.4	307.9	401.4	120.9	229.4	337.9	446.4
鋼管板厚		t16				t19							
継杭回数		0	1	2	3	0	1	2	3				
鋼管径	800mm以上1,000mm以下	111.6	220.6	329.6	438.6	111.6	247.9	384.2	520.5				
	1,000mmを超え1,200mm以下	120.9	247.9	374.9	501.9	120.9	283.4	445.9	608.4				

- （注）1. 鋼管径・長さにかかわらず，グラウト注入（グラウトロッド挿入，引抜等を含む）の準備時間を含む。  
 2. 半自動溶接機2台を使用する場合の溶接時間を含む。また，溶接には連結継手管2箇所を含む。  
 3. 足場作り，杭打機の移動，鋼管矢板の吊込，芯出し及び回転防止材の設置等を含む。

## 4-1-3 諸雑費率

諸雑費は，グラウト材（セメントミルク），溶接棒（ワイヤ），杭先端加工，足場材の費用，オーガスクリユー・オーガヘッド・交流アーク溶接機損料，空気圧縮機運転費，電力に関する経費等を含み，労務費，材料費，機械損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表4.4 諸雑費率（％）

諸 雑 費 率	11
---------	----

## 5. 単価表

## (1) 鋼管矢板打込工（中掘工法）10本当り単価表

SWB231660

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 1$	表4. 1
溶 接 工		〃	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 2$	〃
特 殊 作 業 員		〃	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 1$	〃
と び 工		〃	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 2$	〃
普 通 作 業 員		〃	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 1$	〃
鋼 管 矢 板		本		肉厚, 杭径毎に別段書き
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転		h	$10 \times T_c / 60$	表3. 1 機械損料
クローラクレーン運転		〃	$10 \times T_c / 60 \times 0. 6$	表3. 1 機械損料
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 ) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0. 5m <sup>3</sup> (平積0. 4m <sup>3</sup> )	〃	$10 \times T_c / 60 \times 0. 3$	表3. 1 機械損料 (注) 3
モルタルプラント運転	攪拌容量500ℓ×2	日	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T$	表3. 1 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4. 4
計				

- (注) 1.  $T_c$  : 鋼管矢板1本当り施工時間 (分/本)  
 2.  $T$  : 杭打機運転1日当り運転時間  
 3. バックハウ運転については、仮栈橋上施工時には計上しない。

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力110kW	機－1	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 50～55t吊 80t吊	機－1	
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0. 5m <sup>3</sup> (平積0. 4m <sup>3</sup> )	機－1	
モルタルプラント	攪拌容量500 ℓ×2	機－25	機械損料数量→1. 00



## ⑥ ドロップハンマ杭打工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料はドロップハンマ杭打工によるRC杭の施工に適用する。なお、杭径は200～300mm、杭長は2～6mで杭長の80～100%の打込みとする。

## 2. 施工歩掛

## 2-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 2.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単 位	数 量
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 20t吊	台	1
モンケン	質量1.0t(2.0t)	台	1

(注)1. 現場の路面状況等によりラフテレーンクレーンによる施工が困難な場合はクローラクレーン（機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型 22.5t 吊）による。

2. 杭径 300mm で杭長が 5m 以上の場合はモンケンの規格は 2.0 t とする。

## 2-2 ドロップハンマ杭打設歩掛

ドロップハンマ杭打設歩掛は、次表を標準とする。

表 2.2 杭打設歩掛

(10本当たり)

杭 径 (mm)			200			250				300			
杭 長 (m)													
名 称	規 格	単位	2	3	4	3	4	5	6	3	4	5	6
土木一般世話役		人	0.26	0.30	0.34	0.41	0.48	0.55	0.61	0.65	0.81	0.98	1.14
とび工		〃	0.52	0.60	0.68	0.82	0.96	1.10	1.22	1.30	1.62	1.96	2.28
普通作業員		〃	0.52	0.60	0.68	0.82	0.96	1.10	1.22	1.30	1.62	1.96	2.28
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)20t吊	日	0.26	0.30	0.34	0.41	0.48	0.55	0.61	0.65	0.81	0.98	1.14
諸 雑 費		%	1.0										

(注)1. ラフテレーンクレーンは賃料とする。

2. クローラクレーンによる場合の運転時間は「ラフテレーンクレーン賃料日数×7時間」とする。

3. 諸雑費はモンケン、二本構損料であり、労務費及びラフテレーンクレーン賃料（クローラクレーンの場合は損料及び運転経費）の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 3. 単価表

## (1) ドロップハンマ杭打工 10 本当り単価表

SWB231710

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表2.2
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
R C 杭		本	10	
ラフテレーンクレーン 賃料又はクローラ クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第2次基準値)20t吊又 は機械駆動式ウインチ・ラチ スジブ型22.5t吊	日 又は h		表2.2
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラクレーン	機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型 22.5t吊	機-1	

## ⑦ 木杭及び矢板打工（人力、ドロップハンマ工）（建地－E）

## 1. 人力木杭打工

本資料は、木杭長 3m 以下のものに適用する。

表 1.1 人力杭打歩掛表(1 本当り) (単位：人)

杭長(m) \ 末口	6cm 以下	6cm を超え 9cm 以下	9cm を超え 12cm 以下	12cm を超え 15cm 以下
1.2	0.04	0.06	0.08	—
1.5	—	0.09	0.13	0.19
1.8	—	0.12	0.22	0.23
2.1	—	—	0.36	0.57
2.4	—	—	0.47	0.69
2.7	—	—	—	0.80
3.0	—	—	—	1.09

- (注) 1. 本表は、普通地質における 80%以上 100%の根入率の場合であり、根入率 70%以上 80%未満は 2 割減、70%未満の場合は 3 割減とする。  
 2. 本表は杭木小運搬、先端仕拵え、元口切揃え及び足場器具損料一切を含む。  
 3. 杭抜取歩掛は本表の 7 割とすること。  
 4. 本表以外のものは、本表の直近下位を取ること。  
 5. 本歩掛は、普通作業員を使用すること。

## 2. 単価表

## (1) 人力木杭打工 1 本当り単価表

SWB231810

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1.1
杭 丸 太		本	1	
諸 雑 費		式	1	
計				

## (2) 人力木杭抜取工 1 本当り単価表

SWB231820

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1.1
諸 雑 費		式	1	
計				

## ⑧ 泥水運搬工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、工事の施工に伴い発生する泥水を、汚泥吸排車（8.0t）を使用して運搬する場合に適用する。  
なお、泥水処理が必要な場合は、泥水処理費を別途計上する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記のとおりとする。

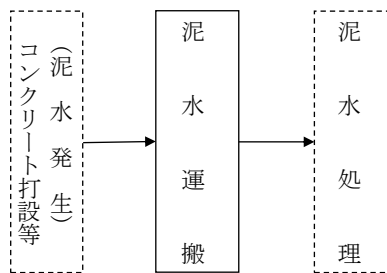


図2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

運搬機械・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	適 用
汚泥吸排車	積載質量 8.0t	

## 4. 汚泥吸排車の運搬作業

汚泥吸排車（8.0t）による泥水 100m³ 当りの運搬日数は、下表とする。

表 4.1 吸排車泥水運搬日数（100m³ 当り）

積込運搬機種・規格	汚泥吸排車 積載質量 8.0t 吸入管径 75mm				
D I D 区間：無し					
運搬距離 (km)	2.0以下	6.3以下	14.8以下	25.7以下	60.0以下
運搬日数 (日)	2.2	2.6	3.2	4.3	6.5
D I D 区間：有り					
運搬距離 (km)	1.9以下	5.9以下	13.1以下	22.6以下	60.0以下
運搬日数 (日)	2.2	2.6	3.2	4.3	6.5

- （注）1. 上表は、泥水 100m³ を運搬（泥水の吸入及び排出を含んだ）する日数である。  
 2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。  
 3. 自動車専用道路を利用する場合には、別途考慮する。  
 4. D I D（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。  
 5. 運搬距離が、60km を超える場合は、別途考慮する。

## 5. 単価表

(1) 汚泥吸排車運搬 100m<sup>3</sup>当り単価表

SWB232010

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
汚 泥 吸 排 車 運 転	積載質量8.0t吸入 管径75mm	日		表 4.1 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
汚 泥 吸 排 車	積載質量8.0t吸入管 径75mm	機－19	運転労務数量→1.20 燃料消費量 →96 機械損料数量→1.44

## 第4章 コンクリート工

① コンクリート工……………Ⅱ-4-①- 1	③ 溶接金網設置工……………Ⅱ-4-③- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-4-①- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-4-③- 1
2 施工概要……………Ⅱ-4-①- 1	2 施工歩掛……………Ⅱ-4-③- 1
3 レディーミクストコンクリート……………Ⅱ-4-①- 2	3 単価表……………Ⅱ-4-③- 1
4 コンクリート打設工法の選定……………Ⅱ-4-①- 5	④ 張りコンクリート……………Ⅱ-4-④- 1
5 施工パッケージ……………Ⅱ-4-①- 7	1 適用範囲……………Ⅱ-4-④- 1
6 施工歩掛……………Ⅱ-4-①-12	2 施工概要……………Ⅱ-4-④- 2
7 単価表……………Ⅱ-4-①-14	3 機種の選定……………Ⅱ-4-④- 4
② 型枠工……………Ⅱ-4-②- 1	4 施工歩掛……………Ⅱ-4-④- 4
②-1 型枠工……………Ⅱ-4-②- 1	5 単価表……………Ⅱ-4-④- 6
1 適用範囲……………Ⅱ-4-②- 1	
2 施工概要……………Ⅱ-4-②- 1	
3 施工パッケージ……………Ⅱ-4-②- 2	
②-2 型枠工(省力化構)……………Ⅱ-4-②- 5	
1 適用範囲……………Ⅱ-4-②- 5	
2 施工概要……………Ⅱ-4-②- 5	
3 施工パッケージ……………Ⅱ-4-②- 5	

## 第4章 コンクリート工

### ① コンクリート工（建地－Ⅰ）

#### 1. 適用範囲

本資料は、一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）の人力及び機械によるコンクリート打設、及び人力によるモルタル練に適用する。

##### 1-1 適用できる範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）

- (1) 無筋構造物（表 1. 1 を参照）
- (2) 鉄筋構造物（表 1. 1 を参照）
- (3) 小型構造物（表 1. 1 を参照）
- (4) モルタル練

##### 1-2 適用できない範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）


- (1) ダムコンクリート、トンネル覆工コンクリート、砂防コンクリート、コンクリート舗装、消波根固めブロック、コンクリート桁及び軽量コンクリート等の特殊コンクリート打設、並びに、橋梁床版の養生工
- (2) 場所打擁壁工 (1) (2)
- (3) 函渠工 (1) (2)
- (4) 共同溝工（ただし、現場打ちの電線共同溝（C・C・BOX）を除く。）
- (5) 橋台・橋脚工 (1) (2)
- (6) 張りコンクリート工（平均厚さ 5cm 以上 10cm 以下）
- (7) 深礎工

表 1. 1 コンクリート構造物の分類

構造物種別	コンクリート構造物の分類
無筋構造物	マシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等
鉄筋構造物	水路、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、橋梁床版、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物
小型構造物	コンクリート断面積が 1m <sup>2</sup> 以下の連続している側溝、笠コンクリート等、コンクリート量が 1m <sup>3</sup> 以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等

#### 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。



（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-1 施工フロー

## 3. レディーミクストコンクリート（県）

## (1) 適用範囲

離島を除く全ブロックとする。ただしアジテータ車通行不能箇所、小運搬方法のためにレディーミクストコンクリートが使用困難又は不適当な箇所は除く。

## (2) 種別と適用（県－Ⅰ）

品質管理監査会議制度の監査に合格し、㊟マークを取得した工場で製造された JIS A5308（レディーミクストコンクリート）に適合するものを原則とし下表によるものとする。

## 【土木工事】

種別	主 な 適 用 工 種	規 格	セメントの種類	コード名
無筋	通常ダム、砂防ダム	18-5-40 W/C=60%以下	B B	C0030
	重力式擁壁等のマッシュな無筋構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物で半重力式擁壁	18-8-40 W/C=60%以下	B B	C0032
	重力式橋台	18-8-40 W/C=60%以下	B B	
	袋詰コンクリート	30-5-40 C=370kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=50%以下	N	C0033
	水中コンクリート	(特) 30-15-40 C=370kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=50%以下	N	C0114
有筋	水門、ひ門、函渠類、擁壁等、排水機場、 (注1) 非合成床版	24-12-25 W/C=55%以下	N	C0058
		※24-12-25 W/C=50%以下	N	C0057
	P C桁橋の横桁及び間詰コンクリート、 (注1) 合成床版	30-8-25 W/C=55%以下	N	C0075
		※30-8-25 W/C=50%以下	N	C0076
	P C橋用主桁用	40-12-25 W/C=55%以下	N	C0035
	橋梁工事の水中場所打杭	30-18-25 C=350kg/m <sup>3</sup> 以上 W/C=55%以下	B B	C0078
	水門、ひ門、函渠類、擁壁、橋台、橋脚、 桟蓋	21-12-25 W/C=55%以下	B B	C0045
		※21-12-25 W/C=50%以下	B B	C0052
	函渠類、擁壁、橋台、橋脚	24-12-25 W/C=55%以下	B B	C0039
		※24-12-25 W/C=50%以下	B B	C0038

※コンクリート標準示方書及び道路橋示方書等により、水セメント比を低減し塩害対策を行う場合。

(注1) 非合成床版、合成床版については、施工条件等によりスランプ値を12cmとするときには、事業課と調整すること。



## 【土木工事】

主な適用工種	規格	セメントの種類	コード名
最大高さ 1m 程度の擁壁、側溝、ブロック基礎、笠コンクリート断面積が小さく（1m <sup>2</sup> 以下）連続している構造物。 最小寸法 16cm 未満	18-8-25 W/C=60%以下	B B	C0031
最大高さ 1m 程度の擁壁、側溝、ブロック基礎、笠コンクリート等のコンクリート断面積が小さく（1m <sup>2</sup> 以下）連続している構造物。 最小寸法 16cm 以上	18-8-40 W/C=60%以下	B B	C0032
形状が複雑な構造物及び集水桝、空気弁、排泥弁、道路照明・標識・防護柵の基礎等の小量（1m <sup>3</sup> 以下）のコンクリート量で点在する構造物。	18-8-25 W/C=60%以下	B B	C0031
積ブロック及び石積張の胴込、裏込コンクリート	18-8-25 W/C=60%以下	B B	
異形ブロック	18-5-40 W/C=60%以下	B B	C0037
コンクリート舗装	M4.5-2.5-40	N	C0092
RCCP	M4.5-※-20	N	C0095
RCCP	M5.0-※-20	N	C0097
部材寸法 16cm 未満 平張ブロックの敷コンクリート	18-8-25	B B	C0099
部材寸法 16cm 以上	18-8-40	B B	C0101

## 【港湾工事】

主な適用工種	規格	セメントの種類	コード名
防波堤上部工、蓋コンクリート、本体ブロック、異形ブロック（消波・被覆）、根固ブロック、袋詰コンクリート、係船岸上部工、胸壁、係船直柱基礎（重力式）、水叩コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	B B	C0032
係船柱基礎（杭式）、胸壁、係船岸上部工（栈橋上部工除く）、消波ブロック、控壁、控杭上部工	24-12-25 W/C=55%以下	B B	C0039
ケーソン、ウエル、セルラーブロック、L型ブロック	※24-12-25 W/C=50%以下	B B	C0038
ケーソン、ウエル、セルラーブロック、L型ブロック	※30-8-25 W/C=50%以下	N	C0076
エプロン舗装	M4.5-2.5-40	N	C0092

注) ※設計基準強度は、詳細設計時の規格値を確認のこと。

※ケーソン、ウエル、セルラーブロック及びL型ブロックについては、  
施工条件等によりスランプ値を 12cm とするときには、事業課と調整すること。

(注) 1. やむを得ず施工上早強セメントを使用する場合は、上表の設計基準強度即ち4週強度を1週強度とする。

2. AEコンクリートの空気量は4.5%を標準とする。

3. ※印は使用する骨材の種類による区分で、下記表示例のごとく「普通」「軽量1種」等を明記する。

また、※※印は使用するセメントの種類による区分で、指定する必要がある場合は、下記表示例のごとく、普通ポルトランドセメント（N）早強ポルトランドセメント（H）等を下記要領により明記すること。

(1) セメントの種類による区分

	(記号)
普通ポルトランドセメント	N
早強ポルトランドセメント	H
超早強ポルトランドセメント	UH
中庸熱ポルトランドセメント	M
高炉セメント	A種 BA
〃	B種 BB
〃	C種 BC
シリカセメント	A種 SA
〃	B種 SB
〃	C種 SC
フライアッシュセメントA種	FA
〃	B種 FB
〃	C種 FC

(3) 骨材の種類による区分


	(粗骨材)	(細骨材)	(記号)
普通コンクリート	砂利、碎石		
	又は高炉ス	砂又は碎石	普通
	ラグ粗骨材		
軽量コンクリート	人工軽量粗骨材	砂	軽量1種
	人工軽量粗骨材	人工軽量細骨材又は人	
		工軽量細骨材に一部砂	軽量2種
		を混入した	
		もの	

(4) 呼び方の例（レディーミクストコンクリートの呼び方は次の例による）

(2) 粗骨材の最大寸法による区分

	(記号)
最大寸法 40mm	40
〃 25mm	25
〃 20mm	20
〃 15mm	15

例	普通	21	8	20	N
	軽量2種	27	21	15	H



(5) 書き方の例

高炉B種にあつては、16-8-40 高炉B種とする。

4. 現場条件等により上表によりがたい場合は別途考慮することができる。

5. 塩害対策を必要とする橋梁のコンクリートの水セメント比は標準仕様書を参照のこと。

## 4. コンクリート打設工法の選定

コンクリート打設工法の選定は、図4-1及び図4-2、図4-3を標準とするが、現場状況等を考慮し、これにより難しい場合は、別途考慮する。

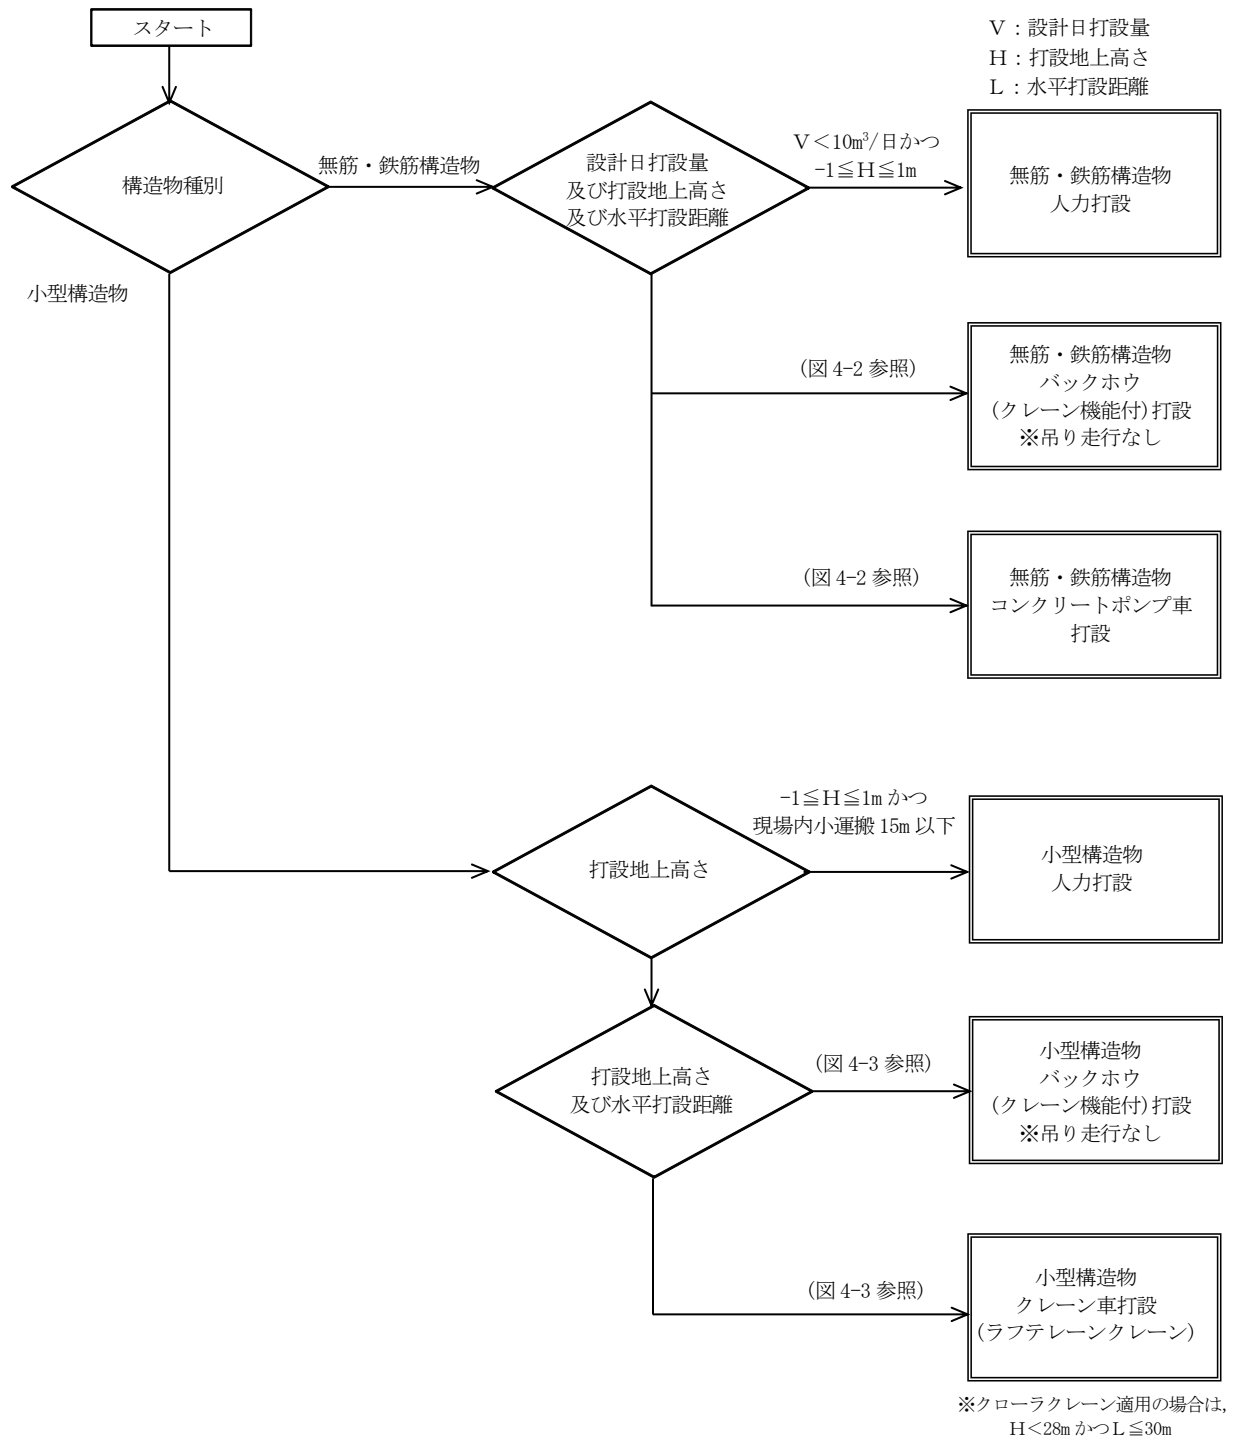


図4-1 コンクリート打設工法の選定

## (1) 無筋・鉄筋構造物

打 設 地 上 高 さ	4.5m 超	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ただし $L \leq 4.0m$ ※吊り走行なし	コンクリートポンプ車打設		コンクリートポンプ車打設		適用範囲外
	4.5m 以下						
	1.0m 超	人力打設 (現場内小運搬 15m 以下)	10m <sup>3</sup> /日以上		100m <sup>3</sup> /日以上		適用範囲外
	1.0m 以下						
	0m	10m <sup>3</sup> /日未満	10m <sup>3</sup> /日以上	100m <sup>3</sup> /日未満	100m <sup>3</sup> /日以上	500m <sup>3</sup> /日未満	500m <sup>3</sup> /日以上
	-1.0m 以上	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ただし $L \leq 2.0m$ ※吊り走行なし	コンクリートポンプ車打設		コンクリートポンプ車打設		適用範囲外
	-1.0m 未満						
	-6.5m 以上						
	-6.5m 未満						

設 計 日 打 設 量


図 4-2 コンクリート打設工法の選定(無筋・鉄筋構造物)

## (2) 小型構造物

打 設 地 上 高 さ	28m 以下	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ※吊り走行なし		クレーン車打設 【ラフテレーンクレーン】		クレーン車打設 【クローラクレーン】		適用範囲外
	4.5m 超							
	4.5m 以下	人力打設 (現場内小運搬 15m 以下)		15m 以下		15m 超		適用範囲外
	1.0m 超							
	1.0m 以下	2m 以下	2m 超	4m 以下	4m 超	20m 以下	20m 超	30m 以下
	0m							30m 超
	-1.0m 以上	バックホウ (クレーン機能付) 打設 ※吊り走行なし		クレーン車打設 【ラフテレーンクレーン】		クレーン車打設 【クローラクレーン】		適用範囲外
	-1.0m 未満							
	-6.5m 以上							
	-6.5m 未満							

水 平 打 設 距 離

図 4-3 コンクリート打設工法の選定(小型構造物)

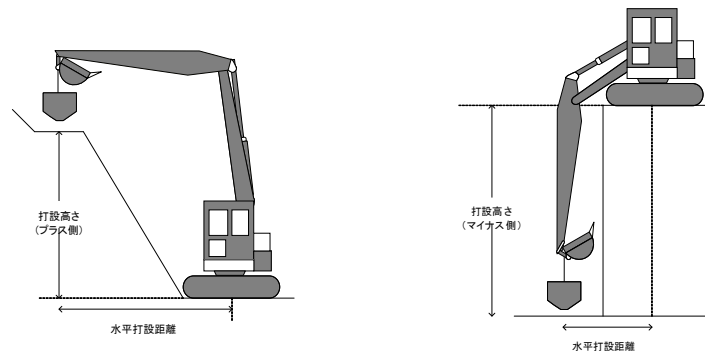

(参考図)バックホウによるコンクリート打設範囲

## 5. 施工パッケージ

## 5-1 コンクリート (SCB240010)

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 5.1 コンクリート 積算条件区分一覧

(積算単位：m<sup>3</sup>)

構造物 種別	打設工法	コンク リート 規格	設計日 打設量	養生工の 種類	圧送管 延長距離区分	現場内小 運搬の有無	打設高さ、 水平打設距離
無筋 ・ 鉄筋 構造物	コンクリー トポンプ車 打設	(表 4. 3)	10m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満	養生無し	延長無し	—	—
					60m 以下		
					60m を超え 120m 以下		
					120m を超え 180m 以下		
					180m を超え 240m 以下		
				一般養生	延長無し		
					60m 以下		
					60m を超え 120m 以下		
					120m を超え 180m 以下		
					180m を超え 240m 以下		
			特殊養生 (練炭, シェットヒータ)	延長無し			
				60m 以下			
				60m を超え 120m 以下			
				120m を超え 180m 以下			
				180m を超え 240m 以下			
	100m <sup>3</sup> 以上 500m <sup>3</sup> 未満	養生無し	延長無し	—	—		
			240m 以下				
		一般養生	延長無し				
			240m 以下				
		特殊養生 (練炭, シェットヒータ)	延長無し				
			240m 以下				
	—	養生無し	—	—	—	—	
							一般養生
							特殊養生 (練炭, シェットヒータ)
	人力打設	—	—	養生無し	—	有り	—
						無し	
				一般養生		有り	
無し							
特殊養生 (練炭, シェットヒータ)				有り			
				無し			
				無し			

構造物 種別	打設工法	コンク リート 規格	設計日 打設量	養生工の 種類	圧送管 延長距離区分	現場内小 運搬の有無	打設高さ、 水平打設距離
小型 構造物	クレーン車 打設	(表 4. 3)	—	養生無し	—	—	(表 4. 4)
				一般養生			
				特殊養生（練炭）			
				特殊養生（ジェットヒータ）			
	バックホウ （クレーン機能付） 打設		—	養生無し	—	—	—
				一般養生			
				特殊養生（練炭）			
				特殊養生（ジェットヒータ）			
	人力打設		—	養生無し	—	有り	—
				無し			
				一般養生		有り	
				特殊養生（練炭）		無し	
				特殊養生（練炭）		有り	
				特殊養生（ジェットヒータ）		無し	

- (注) 1. 上表は、一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）のコンクリート打設、締固め、表面仕上、養生、15m以下の人力運搬車による現場内小運搬（人力打設で、現場内小運搬「有り」の場合）、シュート、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料、電力に関する経費、ホースの筒先作業等を行う機械付補助作業（コンクリートポンプ車打設の場合）、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助作業（クレーン車打設及びバックホウ（クレーン機能付）打設の場合）等、その施工に要する全ての費用を含む。
2. コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は、無筋構造物が+0.07、鉄筋構造物が+0.03、小型構造物が+0.06とする。
3. 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設において、コンクリートポンプ車圧送のコンクリートのスランプ値及び粗骨材の最大寸法は、次表のとおりとする。

表 5. 2 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車圧送のコンクリートの標準範囲

スランプ (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)
8 ～ 12	40 以下

4. 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設において、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超える場合は、超えた部分について圧送管延長距離を積算条件区分から選択する。この場合、圧送管の日々の組立・撤去費用を含む。なお、圧送管の固定足場（受枠）を必要とする場合は、別途計上する。
5. 無筋・鉄筋構造物バックホウ（クレーン機能付）打設及び小型構造物バックホウ（クレーン機能付）打設のバケット容量は、 $V=0.3\text{m}^3$ を標準とする。
6. 小型構造物クレーン車打設において、クローラクレーンを使用する場合は、現場条件から打設高さを検討し、適当なブーム長さを設定する。
7. 小型構造物クレーン車打設のバケット容量は、 $V=0.6\text{m}^3$ を標準とする。
8. 特殊養生は、河川・海岸・道路工事等における寒中コンクリートの養生に適用する。なお、養生方法は給熱養生を標準とし、異形ブロック製作における養生は適用しない。養生のための足場は別途計上とする。

表 5. 3 コンクリート規格

積算条件	区分		
コンクリート 規格	21-8-25(20)(普通)	24-8-40(普通)	24-12-40(高炉)
	21-12-25(20)(普通)	24-12-40(普通)	21-12-40(高炉)
	24-8-25(20)(普通)	4.5-2.5-40(普通)	40-8-25(早強)
	24-12-25(20)(普通)	21-8-25(20)(高炉)	40-12-25(早強)
	27-8-25(20)(普通)	21-12-25(20)(高炉)	21-8-25(早強)
	27-12-25(20)(普通)	24-8-25(20)(高炉)	21-12-25(早強)
	30-8-25(20)(普通)	24-12-25(20)(高炉)	24-8-25(早強)
	30-12-25(20)(普通)	19.5-5-40(高炉)	24-12-25(早強)
	40-8-25(20)(普通)	19.5-8-40(高炉)	18-8-25(高炉)
	40-12-25(20)(普通)	19.5-12-40(高炉)	18-12-25(高炉)
	18-8-40(普通)	18-5-40(高炉)	21-5-80(高炉)
	18-12-40(普通)	21-5-40(高炉)	18-3-40(高炉)
	19.5-8-40(普通)	18-8-40(高炉)	21-3-40(高炉)
	21-8-40(普通)	18-12-40(高炉)	Y-020000(各種)
	21-12-40(普通)	21-8-40(高炉)	
	22.5-8-40(普通)	24-8-40(高炉)	

表 5. 4 打設高さ, 水平打設距離

積算条件	区分
打設高さ, 水平打設距離	打設高さ約 17m 以下, 水平打設距離約 17m 以下
	打設高さ約 25m 以下, 水平打設距離約 18m 以下
	打設高さ約 25m 以下, 水平打設距離約 20m 以下
	打設高さ約 28m 以下, 水平打設距離約 20m 以下
	水平打設距離約 30m 以下

## (2) 代表機材規格

下表機材は、当該パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 5.5 コンクリート 代表機材規格一覧

項目	代表機材規格	備考
機械	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m <sup>3</sup> /h	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合
	バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）]16t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）]20t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）]25t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）]35t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合
	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50t 吊	・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合
	K2 業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力 126 MJ/h (30,100kcal/h) 油種 灯油	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（練炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合
労務	K3 —	
	R1 普通作業員	
	R2 特殊作業員	
	R3 土木一般世話役	
材料	R4 運転手（特殊）	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合
	Z1 生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C55%	
	Z2 軽油 1.2 号 パトロール給油	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合
	Z3 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（練炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合
	Z4 —	
市場単価	S —	



## 5-2 モルタル練 (SCB240060)

## (1) 条件区分

モルタル練の条件区分は、次表を標準とする。

表 5. 6 モルタル練 積算条件区分一覧 (積算単位：m<sup>3</sup>)

セメント種類	混合比
普通	1 : 1
	1 : 2
	1 : 3
高炉	1 : 1
	1 : 2
	1 : 3

表 5. 7 モルタル材料 (1m<sup>3</sup> 当り)

混 合 比	セ メ ン ト	砂
1 : 1	1,100kg	0.75 m <sup>3</sup>
1 : 2	720kg	0.95 m <sup>3</sup>
1 : 3	530kg	1.05 m <sup>3</sup>

- (注) 1. 上表は、人力によるモルタル練作業、小運搬、通常の養生費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料(損料等)を含む。  
 2. 上表は、材料ロスを含む。  
 3. 上表は、目地等の仕上げを含まない。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 5. 8 モルタル練 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1	—
	K2	—
	K3	—
労務	R1	普通作業員
	R2	—
	R3	—
	R4	—
材料	Z1	セメント 高炉 B 25kg 袋入
	Z2	砂 細目 (洗い)
	Z3	—
	Z4	—
市場単価	S	—

## 6. 施工歩掛

## 6-1 圧送管組立・撤去

## 6-1-1 適用範囲

本歩掛は、表 6. 1 に示す施工パッケージ以外で、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超える場合の、超えた部分の圧送管延長分の組立・撤去到適用する。

表 6. 1 本歩掛が適用できない施工パッケージ

・函渠 (1)	・重力式擁壁	・もたれ式擁壁
・逆 T 型擁壁	・ L 型擁壁	・コンクリート

## 6-1-2 圧送管組立・撤去歩掛

コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超える場合は、超えた部分の圧送管延長分について、次表の労務を、組立・撤去歩掛として計上する。

なお、これにより難しい場合は別途考慮する。

表 6. 2 圧送管組立・撤去歩掛 (10m 当り)

名 称	単 位	組 立	撤 去
普 通 作 業 員	人	0.26	0.20

(注) 圧送管の固定足場 (受枠) を必要とする場合は、別途計上する。

## 6-2 養生工

## 6-2-1 適用範囲

本歩掛は、表 6. 3 に示す施工パッケージ以外の養生工に適用する。

表 6. 3 本歩掛が適用できない施工パッケージ

・ヒューム管 (B 形管)	・函渠 (1)	・現場打基礎コンクリート
・天端コンクリート	・小型擁壁 (B)	・重力式擁壁
・もたれ式擁壁	・逆 T 型擁壁	・ L 型擁壁
・コンクリート		

## 6-2-2 一般養生工

一般養生工における歩掛は、次表を標準とする。

表 6. 4 養生歩掛 (10m<sup>3</sup> 当り)

名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
普 通 作 業 員	人	0.31	0.16	0.64
諸 雑 費 率	%	12	25	16

(注) 諸雑費は、シート、養生マット、角材、パイプ、散水等に使用する機械の損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 6-3 養生工 (特殊養生)

## 6-3-1 適用範囲

本歩掛は、表 6. 5 に示す施工パッケージ以外の河川、海岸、道路工事等における寒中コンクリートの養生に適用する。なお、養生方法は給熱養生を標準とし、異形ブロック製作における養生は、適用しない。

表 6. 5 本歩掛が適用できない施工パッケージ

・ヒューム管 (B 形管)	・函渠 (1)	・現場打基礎コンクリート
・天端コンクリート	・小型擁壁 (B)	・重力式擁壁
・もたれ式擁壁	・逆 T 型擁壁	・ L 型擁壁
・コンクリート		

## 6-3-2 特殊養生工

## 6-3-2-1 特殊養生工（練炭養生）

練炭による特殊養生歩掛は、次表を標準とする。

表 6. 6 特殊養生歩掛（練炭養生） (10m<sup>3</sup> 当り)

名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
普 通 作 業 員	人	0.88	0.54	1.6
諸 雑 費 率	%	25	25	32

(注) 1. 諸雑費は、練炭、コンロ、シート、養生マット、角材、パイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 養生のための足場は、別途計上する。

## 6-3-2-2 特殊養生工（ジェットヒータ養生）

## (1) 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 6. 7 機種を選定

機 械 名	規 格
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油

## (2) 施工歩掛

ジェットヒータによる特殊養生歩掛は、次表を標準とする。

表 6. 8 特殊養生歩掛（ジェットヒータ養生） (10m<sup>3</sup> 当り)

名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
普 通 作 業 員	人	0.74	0.43	2.4
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	日	1.6	1.8	7.8
諸 雑 費 率	%	13	28	33

(注) 1. ジェットヒータは、賃料とする。

2. 諸雑費は、電力に関する経費、シート、養生マット、角材、パイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3. 養生のための足場は、別途計上する。

## (3) 運転時間

ジェットヒータによる特殊養生に要する施工機械運転日当り運転時間は、次表を標準とする。

表 6. 9 施工機械運転日当り運転時間 (h/日)

名 称	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	18.5	15.2	20.1

(注) ジェットヒータの運転時間当り燃料消費量は、灯油 3.6ℓ/h とする。

## 7. 単価表

(1) 圧送管組立・撤去費 10m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB220410

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人	0.46 × L/B	表 6.2
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 1. Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超えた部分の圧送管延長とする。

2. Bは、コンクリートの標準日打設とする。

3. 設計日打設量が 10m<sup>3</sup> 以上 100m<sup>3</sup> 未満の場合は、標準日打設量を 69m<sup>3</sup> とする。4. 設計日打設量が 100m<sup>3</sup> 以上 500m<sup>3</sup> 未満の場合は、標準日打設量を 280m<sup>3</sup> とする。(2) 養生工（一般養生）10m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB240050

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 6.4
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(3) 養生工（特殊養生・練炭）10m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB240050

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 6.6
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(4) 養生工（特殊養生・ジェットヒータ）10m<sup>3</sup> 当り単価表

SWB240050

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表 6.8
業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運転	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	日		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(5) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適 用 単 価 表	指 定 事 項
〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油 種 灯 油	機-16		燃料消費量 → 表 6.9 機械賃料数量 → 1.20

## ② 型 枠 工

### ②-1 型枠工（建地－Ⅰ）

#### 1. 適用範囲

本資料は、一般土木工事の構造物及び「土木構造物設計マニュアル（案）－土木構造物・橋梁編－」（平成11年10月28日建設省）に基づき設計された場所打ち鉄筋構造物（ボックスカルバート、L型、逆T式擁壁、張出し式・壁式橋脚）の施工にかかる型枠、橋梁の床版部・支承部・連結部等に使用する発泡スチロールによる撤去しない埋設型枠に適用する。

##### 1-1 適用できる範囲


- (1) 平均設置高 30m 以下の場合
- (2) 第Ⅱ編第2章共通工④-1 場所打擁壁工 (Ⅰ) , ②③-1 函渠工 (Ⅰ)。ただし「3-2 化粧型枠」に限る。

##### 1-2 適用できない範囲

- (1) 張りコンクリート工（平均厚さ 5cm 以上 10cm 以下）、鋼橋床版、コンクリート桁、砂防、ダム、トンネル等で、標準歩掛において別途、型枠の基準が設定されている工種の場合
- (2) 「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－」（平成13年12月21日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の型枠工
- (3) 第Ⅱ編第2章共通工④-1 場所打擁壁工 (Ⅰ) , ②③-1 函渠工 (Ⅰ)。ただし「3-2 化粧型枠」を除く。
- (4) 第Ⅳ編第4章橋梁工⑩-1 橋台・橋脚工 (Ⅰ)
- (5) 化粧型と型枠が一体となった製品等を使用し、貼付・はく離作業が不要な場合

#### 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

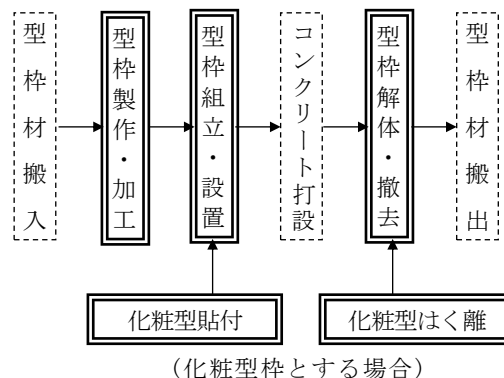

- (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。  
 2. 構造物の分類は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。  
 3. 水抜きパイプの有無にかかわらず適用できる。

図2-1 施工フロー

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 型枠（SCB240210）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。


表 3.1 型枠 積算条件区分一覧（積算単位：㎡）

型枠の種類	構造物の種類
一般型枠	鉄筋・無筋構造物
	小型構造物
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）
	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き
	均しコンクリート
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物
	小型構造物
	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）
撤去しない埋設型枠	床版部
	支承部・連結部

- (注) 1. 上表は型枠の組立・設置・撤去、水抜パイプの設置、はく離剤塗布及びケレン作業の他、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離剤及び電気ドリル、電気ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上（下）げ及び型枠の製作・組立・解体に要する機械の費用等、その施工に要する全ての費用を含む。ただし、化粧型枠（材料費）及び撤去しない埋設型枠（材料費）は含まない。
2. 撤去しない埋設型枠の床版部には、接着・小運搬を含む。また、支承部・連結部には発泡スチロールの加工・接着・現場内小運搬を含む。
3. 水抜きパイプの有無にかかわらず適用できる。ただし、水抜きパイプ材料は必要量を別途計上する。
4. コンクリート、足場、支保は含まない。
5. 化粧型枠（使い捨て型）の材料費は、別途計上する。
6. 化粧型枠の処分費が必要な場合は、別途計上する。
7. 撤去しない埋設型枠の材料費（発泡スチロール）は、別途計上とする。なお、床版部はハンチ等の加工費も含めて別途計上する。
8. 撤去しない埋設型枠の設置面積は下記とする。


$$\text{設置面積 (m}^2\text{)} = B \times L \quad B: \text{設置幅 (m)} \\ L: \text{設置延長 (m)}$$

(1) 床版部

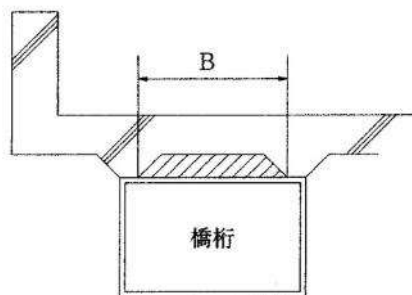

(2) 支承部・連結部

$$B = b_1 + b_2 + b_3$$

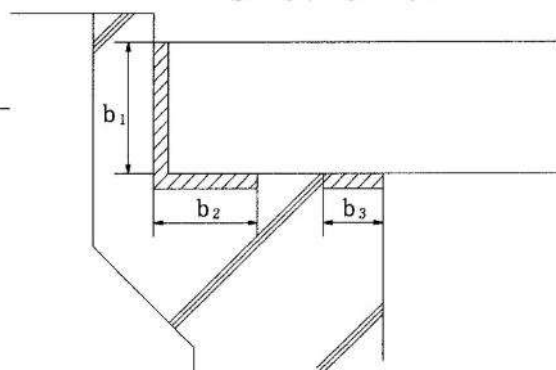

## 9. 撤去しない埋設型枠の材料（発泡スチロール）の使用量

支承部・連結部の発泡スチロールの使用量は、次式による。

$$\text{使用量 (m}^2\text{)} = \text{設置面積 (m}^2\text{)} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{(式 3.1)}$$

K：ロス率

表 3.2 ロス率(K)

ロ ス 率	+ 0.04
-------	--------

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.3 型枠 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	型わく工	一般型枠・化粧型枠の場合
		特殊作業員	撤去しない埋設型枠の場合
		トンネル特殊工	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜きの場合
	R2	普通作業員	
		トンネル作業員	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜きの場合
	R3	土木一般世話役	
		トンネル世話役	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜きの場合
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-2 化粧型枠（SCB226360）

## (1) 条件区分

化粧型枠の積算条件区分はない。

積算単位は、 $m^2$ とする。

- (注) 1. 化粧型の貼付・はく離作業が必要な化粧型枠（使い捨て型）の製作・設置・撤去、はく離剤及び電気ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上（下）げ機械に要する費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等）の内、一般型枠との差額のみを含む。ただし、化粧型枠（材料費）は含まない。
2. 化粧型と型枠が一体となった製品を使用し、貼付・はく離作業が不要な場合は適用できない。
3. 化粧型枠の材料費は別途計上する。
4. 化粧型枠の処分費が必要な場合は別途計上する。

## (2) 代表機材規格

下記機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表 3. 4 化粧型枠 代表機材規格一覧

項目		代表機材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	型わく工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## 3-3 化粧型枠（材料費）

## (1) 条件区分

化粧型枠（材料費）の積算条件区分はない。

積算単位は $m^2$ とする。

## 3-4 撤去しない埋設型枠（材料費）

## (1) 条件区分

撤去しない埋設型枠（材料費）の積算条件区分はない。

積算単位は $m^2$ とする。



## ②-2 型枠工（省力化構造）（建地－Ⅰ）


## 1. 適用範囲

本資料は、「土木構造物設計マニュアル（案）一樋門編一」（平成13年12月21日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の内、平均設置高30m以下の型枠工（円形型枠、化粧型枠を除く）に適用する。

なお、上記適用範囲以外の積算は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工②-1型枠工」によるものとする。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。



（注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

図 2-1 施工フロー

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕（SCB240410）

## (1) 条件区分

型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕における積算条件区分はない。

積算単位は㎡とする。

（注）1. 型枠工（省力化構造）における型枠の製作・設置・撤去、はく離剤塗布及びケレン作業の他、型枠用合板、さん木、洋釘、電気ドリル、電気ノコギリ、鋼製型枠損料、電力に関する経費、組立支持材及びはく離剤等の費用及び仮設材の持上（下）げ機械に要する費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。

2. 半径5m以下の円形部分には適用しない。

3. 水抜パイプの設置は、別途考慮する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.1 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕 代表機労材規格一覧

項目		代表機労材規格	備考
機械	K1	—	
	K2	—	
	K3	—	
労務	R1	型わく工	
	R2	普通作業員	
	R3	土木一般世話役	
	R4	—	
材料	Z1	—	
	Z2	—	
	Z3	—	
	Z4	—	
市場単価	S	—	

## ③ 溶接金網設置工（建地－F）

## 1. 適用範囲

本資料は、河川護岸の平場部に、溶接金網を設置する場合に適用する。

## 2. 施工歩掛

溶接金網設置歩掛は、次表を標準とする。

表 2.1 溶接金網設置歩掛（100m<sup>2</sup> 当り）

名 称	単 位	数 量
普 通 作 業 員	人	2
溶 接 金 網	m <sup>2</sup>	100

(注) 本歩掛には、スぺーサの設置作業を含む。  
なお、スぺーサの材料費は別途計上すること。

## 3. 単価表

(1) 溶接金網設置 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB240510

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人	2	表 2.1
溶 接 金 網		m <sup>2</sup>	100	〃
諸 雑 費		式	1	
計				

## ④ 張りコンクリート工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、コンクリートの厚さが平均 5cm 以上 10cm 以下の張りコンクリート打設に適用する。

## 1-1 適用できる範囲

- (1) 縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして、法面排水による洗掘防止等を行うもの。
- (2) 防草コンクリートとして、路肩（路側に隣接する法尻・法肩を含む）や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うもの。

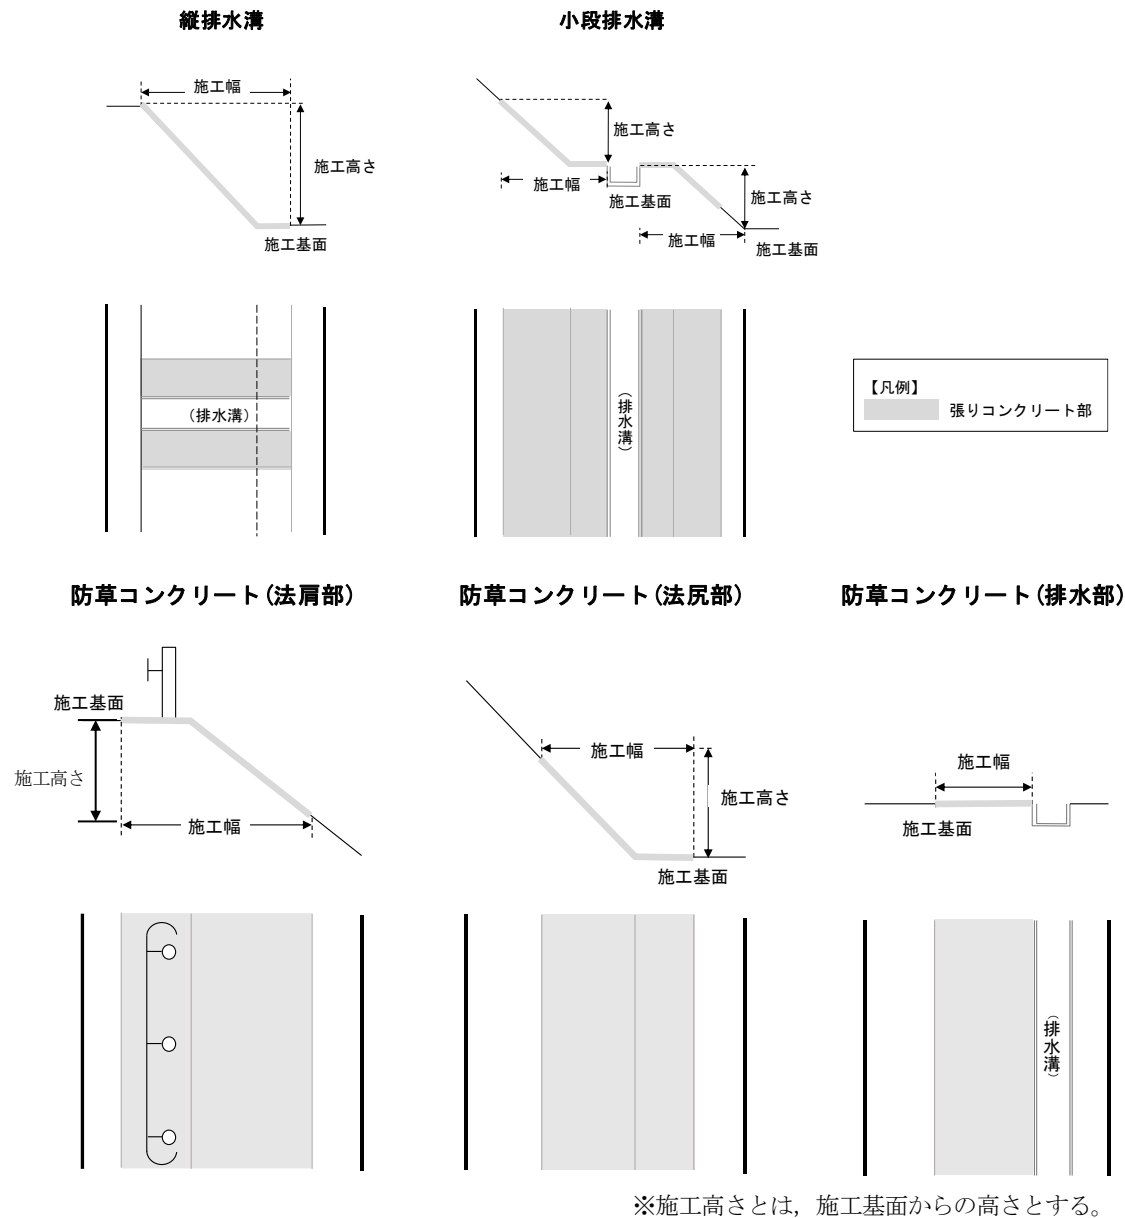


図 1-1 張りコンクリートの例

## 1-2 適用できない範囲


- (1) 歩道などのコンクリート舗装
- (2) 鉄筋、金網・鉄筋格子などを含む場合

## 2. 施工概要


## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

## 【張りコンクリート（縦排水溝・小段排水溝）】



## 【張りコンクリート（防草コンクリート）】




- （注）
1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである
  2. 基面整正は、張りコンクリート（防草コンクリート）施工箇所における掘削・盛土等の土工を行わない場合のみ計上する。
  3. 型枠工（組立、解体・撤去）及び目地材設置の有無にかかわらず適用できる。
  4. 表面仕上は、こて仕上、刷毛仕上のいずれの場合も適用できる。

図 2-1 施工フロー

## 2-2 コンクリート打設工法の選定

コンクリート打設工法の選定は、図2-1を標準とするが、現場状況等を考慮し、これにより難しい場合は、別途考慮する。

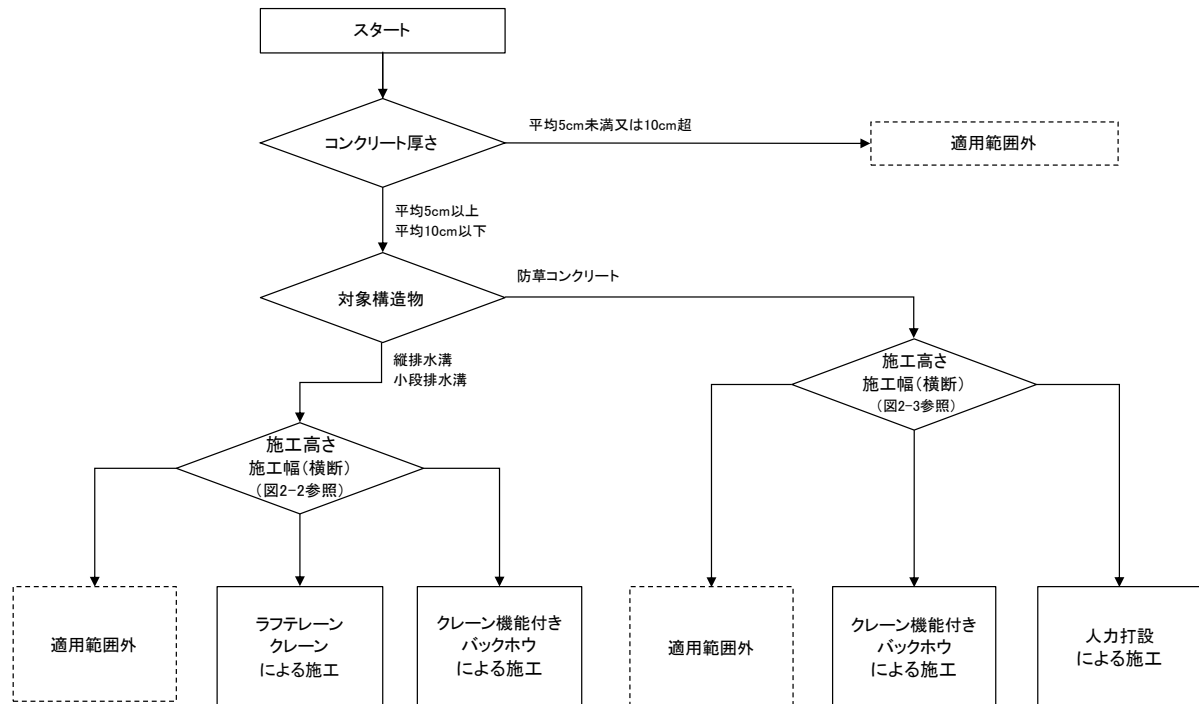

- (注) 1. 機械によるコンクリート打設を行う場合、作業半径内にレディーミクストコンクリートを搬入できることを前提とする。  
2. 適用範囲外の場合は「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。

図2-1 コンクリート打設工法の選定

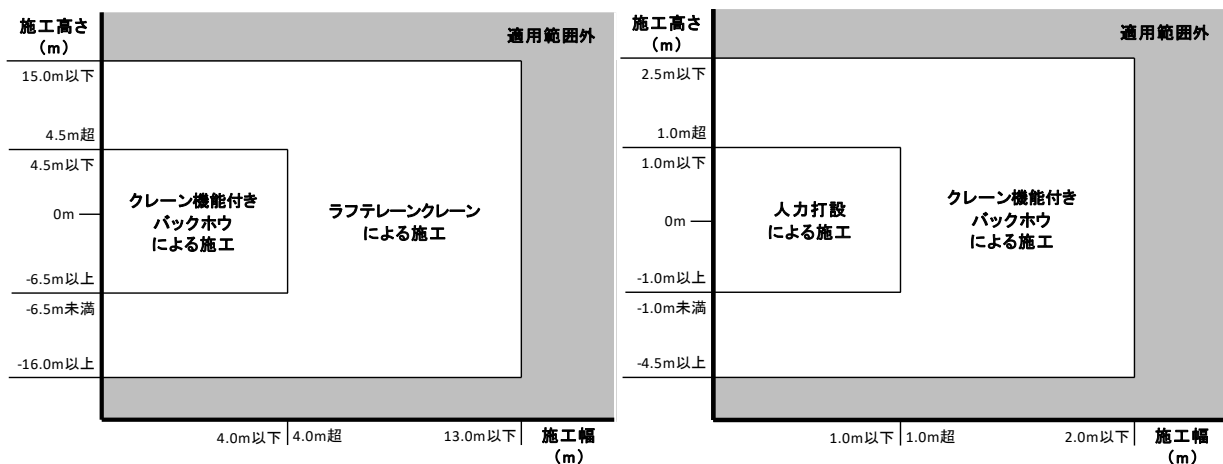


図2-2 コンクリート打設工法の選定(縦排水溝・小段排水溝)

図2-3 コンクリート打設工法の選定(防草コンクリート)

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

構造物種別	作業区分	機 械 名	規 格	単位	数量
縦排水溝 小段排水溝	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2011年規制） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ） 吊能力 2.9t	台	1
		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 25t 吊	台	1
防 草 コンクリート	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ） 吊能力 1.7t	台	1

(注) 1. ラフテレーンクレーン、バックホウ（クローラ型）標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.28m<sup>3</sup>（平積 0.2m<sup>3</sup>） 吊能力 1.7t は、賃料とする。

## 4. 施工歩掛

## 4-1 基面整正

基面整正は、張りコンクリート（防草コンクリート）施工箇所における掘削・盛土等の土工を行わない場合のみ計上する。

施工歩掛は、次表を標準とする。

表 4.1 基面整正歩掛 (100m<sup>2</sup> 当り)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2
普 通 作 業 員		〃	3.2

## 4-2 型枠工

張りコンクリート工の型枠の組立、解体・撤去にかかる作業で歩掛は、次表を標準とする。

表 4.2 型枠工歩掛 (型枠面積 10m<sup>2</sup> 当り)

名 称	規 格	単 位	縦排水溝	小段排水溝	防 草 コンクリート
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	0.90	0.43
型 わ く 工		〃	1.6	1.6	0.86
普 通 作 業 員		〃	1.2	1.2	0.52
諸 雑 費		%	6	6	12

(注) 1. 上表は、はく離剤塗布及びケレン作業を含む。

2. 諸雑費は、型枠用合板、組立支持材、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-3 コンクリート打設

## 4-3-1 材料の使用量

材料の使用量は、次式による。

使用量＝設計量×（1+K）……………式 4.1

K：ロス率

表 4.3 ロス率(K)

材 料	構造物種別	ロス率
レディーミクスト コンクリート	縦排水溝・小段排水溝 防草コンクリート	+0.21

## 4-3-2 縦排水溝・小段排水溝

張りコンクリート（縦排水溝・小段排水溝）にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。

表 4.4 コンクリート打設歩掛(縦排水溝・小段排水溝) (100m<sup>2</sup>当り)

名 称	規 格	単位	縦排水溝		小段排水溝	
			バックホウ	ラフテレーンクレーン	バックホウ	ラフテレーンクレーン
土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	3.9	1.8	2.8
特 殊 作 業 員		〃	2.1	5.0	2.1	3.8
普 通 作 業 員		〃	5.8 (5.0)	8.0 (7.2)	3.5 (3.1)	5.4 (5.1)
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2011年規制） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	h	16.5	—	13.3	—
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値）25t 吊り	日	—	1.9	—	1.5
諸 雑 費		%	1 (0.7)	0.5 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.3)

- (注) 1. 目地材設置を行わない場合は、（ ）内の数値を計上する。  
 2. 上表は、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。  
 3. 諸雑費は、コンクリートバケット（ホッパ）の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 4-3-3 防草コンクリート

張りコンクリート（防草コンクリート）にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。

表 4.5 コンクリート打設歩掛(防草コンクリート) (100m<sup>2</sup>当り)

名 称	規 格	単位	防草コンクリート	
			バックホウ	人力打設
土 木 一 般 世 話 役		人	0.60	1.0
特 殊 作 業 員		〃	1.1	—
普 通 作 業 員		〃	1.9 (1.6)	3.2 (2.9)
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	日	0.89	—
諸 雑 費		%	4 (0.7)	3 (0.2)

- (注) 1. 目地材設置を行わない場合は、（ ）内の数値を計上する。  
 2. バックホウ打設には、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務を含む。  
 3. 上表は、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。  
 4. バックホウ打設の諸雑費は、コンクリートバケット（ホッパ）の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 5. 人力打設には、シュートの架設、移設等の作業を含む。  
 6. 人力打設の諸雑費は、シュートの損料、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 7. バックホウ（クローラ型）は、賃料とする。

## 4-4 養生

一般養生における歩掛は、次表を標準とする。

表 4.6 一般養生歩掛 (100m<sup>2</sup> 当り)

名 称	規 格	単 位	縦 排 水 溝 小 段 排 水 溝	防 草 コ ン ク リ ー ト
土 木 一 般 世 話 役		人	0.21	0.09
普 通 作 業 員		〃	0.56	0.31
諸 雑 費		%	2	2

(注) 1. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工6-3養生工（特殊養生）」による。なお、養生工（特殊養生）による場合の数量は、次式による。

$$\text{特殊養生 (m}^3\text{)} = \text{一般養生 (m}^2\text{)} \times t$$

$$t: \text{コンクリートの厚さ (m)}$$

2. 諸雑費は、シート・養生マット等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 5. 単価表

(1) 基面整正 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB240710

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 型枠工 10m<sup>2</sup> 当り単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

SWB240720

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2
型 枠 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(3) コンクリート打設工 100m<sup>2</sup> 当り単価表（縦排水溝・小段排水溝）

SWB240730

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.4
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式 4.1
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2011年規制） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	h		表 4.4 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値）25t 吊り	日		表 4.4 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 4.4
計				



(4) コンクリート打設工 100m<sup>2</sup>当り単価表（防草コンクリート）

SWB240730

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.5
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
コ ン ク リ ー ト		m <sup>3</sup>		式 4.1
バックホウ（クローラ型） 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	日		表 4.5 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 4.5
計				

(5) 養生工 100m<sup>2</sup>当り単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

SWB240740

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.6
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## (6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ）	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0.28m <sup>3</sup> （平積 0.2m <sup>3</sup> ）吊能力 1.7t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 39.5 機械賃料数量→ 1.6
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ）	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2011年規制） 山積 0.8m <sup>3</sup> （平積 0.6m <sup>3</sup> ）吊能力 2.9t	機-1	

## 第5章 仮 設 工

① 仮設工……………Ⅱ-5-①- 1	⑥ 仮設材設置撤去工……………Ⅱ-5-⑥- 1
② 鋼矢板(H形鋼)工……………Ⅱ-5-②- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑥- 1
②-1 パイプロハンマ工……………Ⅱ-5-②- 1	2 施工概要……………Ⅱ-5-⑥- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-5-②- 1	3 機種の選定……………Ⅱ-5-⑥- 1
2 施工概要……………Ⅱ-5-②- 2	4 施工歩掛……………Ⅱ-5-⑥- 2
3 施工歩掛……………Ⅱ-5-②- 4	5 H形鋼の使用区分……………Ⅱ-5-⑥- 3
4 単価表……………Ⅱ-5-②-20	6 仮設材質料に係る修理費及び損耗費等の取扱いについて……………Ⅱ-5-⑥- 3
②-2 パイプロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜工) ……………Ⅱ-5-②-24	7 部材質量……………Ⅱ-5-⑥- 4
1 適用範囲……………Ⅱ-5-②-24	8 単価表……………Ⅱ-5-⑥- 6
2 施工概要……………Ⅱ-5-②-24	⑦ 足場支保工……………Ⅱ-5-⑦- 1
3 機種の選定……………Ⅱ-5-②-24	⑦-1 足場工……………Ⅱ-5-⑦- 1
4 編成人員……………Ⅱ-5-②-25	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑦- 1
5 施工歩掛……………Ⅱ-5-②-25	2 施工概要……………Ⅱ-5-⑦- 1
6 単価表……………Ⅱ-5-②-27	3 施工歩掛……………Ⅱ-5-⑦- 2
②-3 油圧圧入引抜工……………Ⅱ-5-②-28	4 単価表……………Ⅱ-5-⑦- 2
1 適用範囲……………Ⅱ-5-②-28	5 参考図(足場工)……………Ⅱ-5-⑦- 3
2 施工概要……………Ⅱ-5-②-28	⑦-2 支保工……………Ⅱ-5-⑦- 4
3 施工歩掛……………Ⅱ-5-②-30	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑦- 4
4 単価表……………Ⅱ-5-②-38	2 施工概要……………Ⅱ-5-⑦- 4
②-4 プレボーリング……………Ⅱ-5-②-45	3 施工歩掛……………Ⅱ-5-⑦- 5
1 適用範囲……………Ⅱ-5-②-45	4 単価表……………Ⅱ-5-⑦- 6
2 機種の選定……………Ⅱ-5-②-45	5 参考……………Ⅱ-5-⑦- 7
3 編成人員及び運転時間……………Ⅱ-5-②-46	⑧ 締切排水工……………Ⅱ-5-⑧- 1
4 施工歩掛……………Ⅱ-5-②-46	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑧- 1
5 単価表……………Ⅱ-5-②-49	2 施工概要……………Ⅱ-5-⑧- 1
③ 矢板工(アースオーガ併用圧入工)……………Ⅱ-5-③- 1	3 施工歩掛……………Ⅱ-5-⑧- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-5-③- 1	4 内訳書及び単価表……………Ⅱ-5-⑧- 3
2 施工概要……………Ⅱ-5-③- 1	⑨ ウエルポイント工……………Ⅱ-5-⑨- 1
3 機種の選定……………Ⅱ-5-③- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑨- 1
4 編成人員……………Ⅱ-5-③- 1	2 施工概要……………Ⅱ-5-⑨- 1
5 施工歩掛……………Ⅱ-5-③- 2	3 施工歩掛……………Ⅱ-5-⑨- 2
6 単価表……………Ⅱ-5-③- 3	4 内訳書及び単価表……………Ⅱ-5-⑨- 4
④ 鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜工)……………Ⅱ-5-④- 1	⑩ 土のう工……………Ⅱ-5-⑩- 1
1 適用範囲……………Ⅱ-5-④- 1	⑩-1 土のう工……………Ⅱ-5-⑩- 1
2 施工概要……………Ⅱ-5-④- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑩- 1
3 施工歩掛……………Ⅱ-5-④- 2	2 施工歩掛……………Ⅱ-5-⑩- 1
4 単価表……………Ⅱ-5-④- 3	3 単価表……………Ⅱ-5-⑩- 2
⑤ 鋼矢板施工法選定(参考)……………Ⅱ-5-⑤- 1	⑩-2 大型土のう工……………Ⅱ-5-⑩- 3
⑤-1 鋼矢板打込施工法選定表(参考) ……………Ⅱ-5-⑤- 1	1 適用範囲……………Ⅱ-5-⑩- 3
⑤-2 鋼矢板・H形鋼引抜施工法選定フロー(参考) ……………Ⅱ-5-⑤- 4	2 施工概要……………Ⅱ-5-⑩- 3
	3 機種の選定……………Ⅱ-5-⑩- 3
	4 製作・設置歩掛……………Ⅱ-5-⑩- 4

5 施工歩掛	Ⅱ-5-⑩- 4	⑰ 防塵処理工	Ⅱ-5-⑰- 1
6 単価表	Ⅱ-5-⑩- 5	1 適用範囲	Ⅱ-5-⑰- 1
⑪ 仮橋・仮栈橋工	Ⅱ-5-⑪- 1	2 施工概要	Ⅱ-5-⑰- 1
1 適用範囲	Ⅱ-5-⑪- 1	3 機種の選定	Ⅱ-5-⑰- 1
2 施工概要	Ⅱ-5-⑪- 1	4 施工歩掛	Ⅱ-5-⑰- 1
3 機種の選定	Ⅱ-5-⑪- 2	5 単価表	Ⅱ-5-⑰- 3
4 施工歩掛	Ⅱ-5-⑪- 3	⑱ 法面工(仮設用モルタル吹付工)	Ⅱ-5-⑱- 1
5 単価表	Ⅱ-5-⑪- 9	1 適用範囲	Ⅱ-5-⑱- 1
6 参考図	Ⅱ-5-⑪-12	2 施工概要	Ⅱ-5-⑱- 1
⑫ 汚濁防止フェンス工	Ⅱ-5-⑫- 1	3 機種の選定	Ⅱ-5-⑱- 1
1 適用範囲	Ⅱ-5-⑫- 1	4 施工歩掛	Ⅱ-5-⑱- 2
2 施工概要	Ⅱ-5-⑫- 1	5 材料の使用数量	Ⅱ-5-⑱- 2
3 機種の選定	Ⅱ-5-⑫- 1	6 単価表	Ⅱ-5-⑱- 3
4 施工歩掛	Ⅱ-5-⑫- 1	⑲ 交通誘導警備員	Ⅱ-5-⑲- 1
5 使用材料	Ⅱ-5-⑫- 1	1 適用範囲	Ⅱ-5-⑲- 1
6 内訳書及び単価表	Ⅱ-5-⑫- 2	2 計上区分	Ⅱ-5-⑲- 1
⑬ 仮囲い設置・撤去工	Ⅱ-5-⑬- 1		
1 適用範囲	Ⅱ-5-⑬- 1		
2 施工概要	Ⅱ-5-⑬- 1		
3 日当り編成人員	Ⅱ-5-⑬- 1		
4 日当り施工量	Ⅱ-5-⑬- 1		
5 諸雑費	Ⅱ-5-⑬- 1		
6 仮設材損料	Ⅱ-5-⑬- 1		
7 単価表	Ⅱ-5-⑬- 2		
8 参考図(仮囲い概念図)	Ⅱ-5-⑬- 2		
⑭ 仮設防護柵工(切土及び発破防護柵工)	Ⅱ-5-⑭- 1		
1 適用範囲	Ⅱ-5-⑭- 1		
2 施工概要	Ⅱ-5-⑭- 1		
3 施工歩掛	Ⅱ-5-⑭- 3		
4 内訳書及び単価表	Ⅱ-5-⑭- 4		
⑮ 濁水処理工(一般土木工事)	Ⅱ-5-⑮- 1		
1 適用範囲	Ⅱ-5-⑮- 1		
2 施工概要	Ⅱ-5-⑮- 1		
3 施工歩掛	Ⅱ-5-⑮- 1		
4 単価表	Ⅱ-5-⑮- 2		
⑯ 敷鉄板設置・撤去工	Ⅱ-5-⑯- 1		
1 適用範囲	Ⅱ-5-⑯- 1		
2 施工概要	Ⅱ-5-⑯- 1		
3 機種の選定	Ⅱ-5-⑯- 1		
4 施工歩掛	Ⅱ-5-⑯- 2		
5 諸雑費	Ⅱ-5-⑯- 2		
6 単価表	Ⅱ-5-⑯- 2		

## 第5章 仮設工

### ① 仮設工

#### (1) 仮設工項目（建地－Ⅰ）

- 1) 型枠、支保工、足場工に要する費用
- 2) 山留（土留、仮締切）、仮井筒、築島工に要する費用
- 3) 水替工、仮水路に要する費用
- 4) 工事施工に必要な機械設備（コンクリートプラント、アスファルトプラント等）に要する費用
- 5) 用水、電力等の供給設備に要する費用
- 6) 仮道、仮橋、現道補修等に要する費用

#### (2) 仮設工の積算

##### 1) 仮設工として積算する内容は次のとおりとする。

- イ．型枠、支保工、足場工の設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の損料（賃料）
- ロ．山留（土留、仮締切）、仮井筒、築島工の設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の損料（賃料）
- ハ．水替工、仮水路の設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の電力料及び損料（賃料）
- ニ．工事施工に必要な機械設備の設置、撤去、及び補修等に要する費用
  - (イ) コンクリートプラント、アスファルトプラント等の設置、撤去及び当該施設の補修に要する費用
  - (ロ) トンネル工事における照明設備に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の電力料
- ホ．電力、用水等の供給設備の設置、撤去、及び補修に要する費用
  - (イ) 電力、用水等の供給設備に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該供給設備の使用期間中の損料（賃料）
- ヘ．仮道、仮橋、現道補修等に要する費用
  - (イ) 仮道、仮橋に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該仮施設の使用期間中の損料（賃料）
  - (ロ) 公道等の補修に要する費用
- ト．工事施工に必要な防護施設（転落、飛来等の防止柵及び発破用防護棚等）、仮囲い（工事用防護塀）に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該防護施設等の使用期間中の損料（賃料）
- チ．工事施工に伴う防じん対策（簡易舗装、タイヤ洗浄装置、路面清掃等）に係る設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料（賃料）
- リ．仮区画線に係る費用

##### 2) 積算方法

仮設費の積算（工事用仮設材を後続工事に継続して使用する場合、発注後の工期延期により仮設物の存置が長期となる場合等）は、現場条件を的確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

## 3) 仮設工事の取扱いについて（県－Ⅰ）

仮設工事はこれを指定仮設工事と任意仮設工事に分類して次のとおり取り扱うものとする。

## イ 指定仮設工事

仮設工事の工法を指定して施工する必要を認めるもの……一般住民の生活、生命、財産に影響を及ぼす恐れのあるもので、次に掲げるものおよびこれらに類するもの。

## (イ) 仮橋、仮道

一般交通の用に供するもの。

## (ロ) 仮 締 切

人家、公共施設等での影響が大きい堤防の機能を一時的に喪失させるような工事の仮締切で、例えば本堤を開削するために締切する場合等。

## (ハ) 仮 水 路

人家、公共施設等への影響が大きいものおよび管理者の協議等により本工事と同程度の施工を要するもの。

## (ニ) 仮 土 留

人家、公共施設等への影響が大きいもので、例えば護岸堤防で人家等に近接して仮土留工を施工する場合等。

## (ホ) 防 災 設 備

人家、公共施設等に近接した箇所で、①発破作業等で施工する場合の防護柵、②落石防止用の柵または囲い等の工法を指定して施工するもの。

## (ヘ) これ以外で特に工法を指定するもの

仮設工事のうち、諸般の条件により請負者の自主的な工法にまかせることが不適当な場合。

## ロ 指定仮設工事の取扱い

(イ) 指定仮設工事設定図書に基づき施工し、完了検査（部分完了を含む）、変更手続も本工事と同様に設計変更の対象とするが請負者の都合によるものは内容的に上廻った工事を承認しても変更の対象としない。

(ロ) 指定仮設工事のうち工事施工中に状況変化等のために指定仮設工事とする必要がなくなった場合または任意仮設工事のうち工事施工中に状況変化等のために指定仮設工事とする必要を生じた場合にはそれぞれ設計変更を行なうものとする。

## ハ 任意仮設工事

指定仮設工事以外の仮設工事で、積算方式に対し他の手段方法をもって施工をしても本工事を安全かつ完全に実施し、他に支障を及ぼさないと認められる軽易なもので次のとおりとする。

簡易な仮締切、仮水路、仮土留、工事用仮道、仮橋、栈橋、保安設備、プラント、索道、水替、運搬方法およびこれらに類するもの。

## ニ 任意仮設工事の取扱い

(イ) 任意仮設工事は原則として変更しない。ただし本工事の内容変更に伴う工事量に増減および想定した施工条件の変化等により特に変更を要すると認めた場合は設計変更の対象とする。

(ロ) 監督員は請負者の施工する仮設工事の工法、手段の内容について必要事項の指示をすることができる。

(ハ) 手戻りは原則として請負者の負担とする。

## 4) 設計図書の作成（県－Ⅰ）

- イ 仮設工事の区分を工事費内訳書の摘要欄に指定仮設工事又は任意仮設工事と明記する。
- ロ 任意仮設工事の場合の契約用金抜設計書には
- (イ) 工事費内訳書に仮設費の内訳を下記の種類別に記入し各々一式と明記する。
  - (ロ) 設計・積算上で想定した地質、湧水、水位その他重要な施工条件を文章、資料、参考図等により明記する。
  - (ハ) 詳細図は添付しない。


種 類	仮 設 工 事 名
排 水 仮 設	仮締切工、瀬替工、水替工、仮水路工等
保 安 仮 設	発破施設、防護柵
運 搬 仮 設	仮道、仮橋、現道補修、ケーブル施設、運搬用軌道、索道
設 備 仮 設	用水、電力施設、プラント設備等
工 事 用 仮 設	仮土留、舗装工事の夜間照明設備等

## 5) 注意事項（県－Ⅰ）


- イ 支保工は一般には空立米当りの損料で積算しているが、これを指定仮設工事とする場合はその構造図および明細図を添付して積算するものとする。
- ロ 任意仮設工事は原則として工法変更を行わないので、次の事項に留意して慎重に設計を行うこと。
- (イ) 現場に最も適合しているかどうか。
  - (ロ) 経済的であるかどうか。（比較）
  - (ハ) 他によい方法がないかどうか。例えば瀬替等を行って仮締切を軽易なものとすることができないか。
  - (ニ) 会計検査、完了検査に際して十分説明できるかどうか。
  - (ホ) 請負者の行う工法についての写真等の資料は整備しておくこと。

## 6) 指定仮設の例（県－Ⅰ）


例1 河川本堤を開削して横断暗渠を設置する場合、鋼矢板の仮締切工は設計図および明細書を添付して積算する。この場合、仮締切工は3)－イ－(v)に該当するので指定仮設工事とする。

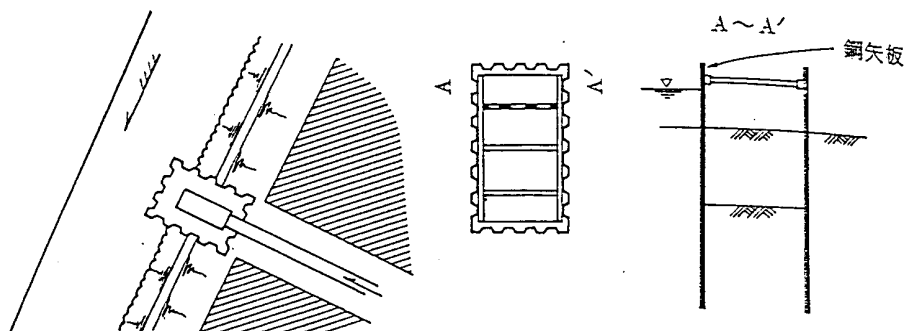

例2 橋梁改築工事が長期を要するので仮道、仮橋を設け一般交通の用に供する場合、仮道、仮橋は設計図および明細書を添付して積算する。この場合仮橋、仮道工は3)－イ－(i)に該当するので指定仮設工事とする。

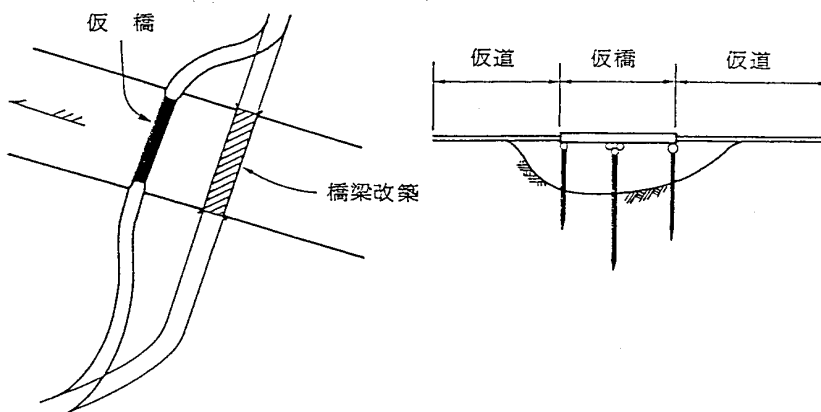

例3 人家、公共施設等への影響の大きい仮土留工は3)－イ－(ii)に該当するので指定仮設工事とする。

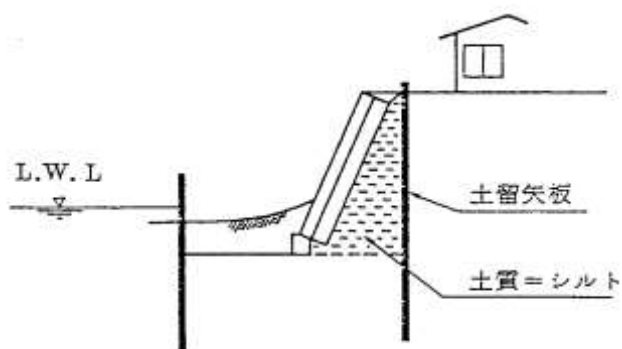

## (3) 仮設材の損料率（建地－Ⅰ）

表 2.1 土留、仮締切、築島、仮橋等の材料損料率

種 別 期 間	損 料 率 （ % ）		
	木 材	鋼 材	じゃかご
3 ヶ月未満	60	10	100
6 ヶ月 "	70	20	100
1 年 "	90	30	100
2 年 "	100	50	100
3 年 "	100	70	100

(注) 1. 再使用不可能なもの及び長さ 2m 未満の場合は全損とする。

ただし、鋼材の内回収可能なものについては、スクラップ控除する。

2. タイロッドは 1 工事全損としスクラップ控除する。

3. ボルト、カスガイ、釘、鉄線等は全損とする。

4. 上表は、「建設用仮設材損料算定基準」（昭和 44 年 6 月 12 日付け建設省機械発第 65 号）及び「建設用仮設材賃料積算基準」（平成 7 年 3 月 29 日付け建設省経機発第 43 号）に示す材料以外のものに適用する。

表 2.2 足場材、支保材、防護柵の材料損料率


	損 料 率 (%)			
	木 材	金 網	シート	ワイヤロープ
3 ヶ月未満	25	80	30	20
6 ヶ月 "	40	90		
1 年 "	50	100		
2 年 "	75	100		
3 年 "	100	100		

(注) 1. 簡易な足場材又は、期間が 1 ヶ月未満の木材については、損料率 15%とする。

2. 上表は、「建設用仮設材損料算定基準」及び「建設用仮設材賃料積算基準」に示す材料以外のものに適用する。

## (4) 鋼矢板の賃料期間の算定

鋼矢板の賃料期間の算定については、下記を標準とする。

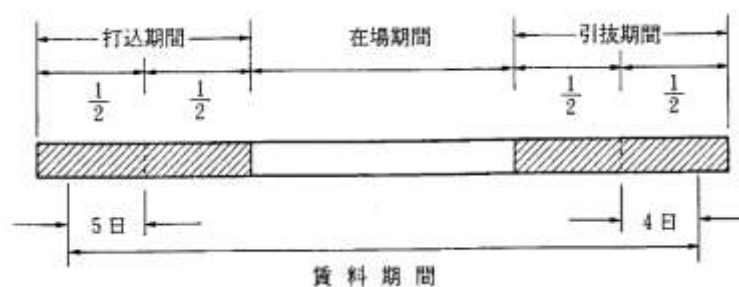

$$\text{賃料期間 (日)} = (\text{打込期間} \times 1/2) + (\text{在場期間}) + (\text{引抜期間} \times 1/2) + (5 \text{ 日} + 4 \text{ 日})$$

(注) 1. 仮設材H杭についても同様の扱いにする。

2. 土留、締切、路面覆工等に使用される切梁腹起し覆工板については打込（引抜）日数を設置（撤去）日数と読みかえ同様の扱いとする。


3. 損料材についても同様の扱いとする。



## (5) 適用区分による賃料の補正について

供用日数（または月数）の長短による賃料にかかる市場価格の適用区分が変わることによって賃料計上額（1 現場当り修理及び損耗費を除く。）が当該日数（または月数）の増加に比例せず減少する場合がある。したがって、減少する時点までの供用日数（または月数）における賃料計上額（1 現場当り修理及び損耗費を除く。）は、その減少する時点における賃料計上額（1 現場当り修理及び損耗費を除く。）を上限とし、下記の方法により減額補正する。

(イメージ図)

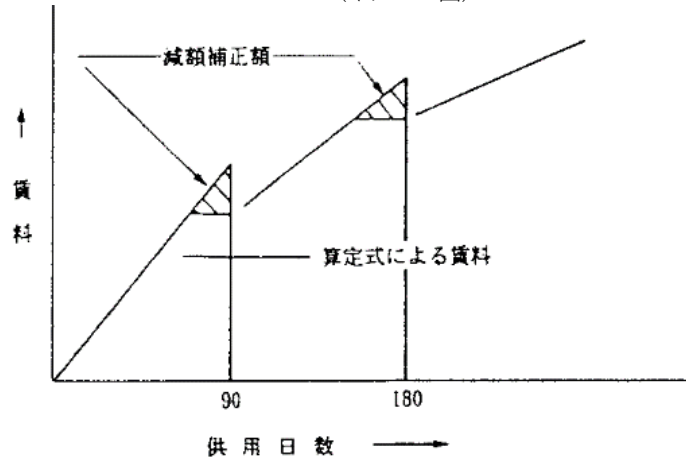

(参考) 賃料の補正の考え方

比較計算をし、安価となる賃料を採用することとする。具体的な計算方法は以下のとおり。

仮設材規格	適用区分	賃料単価	単位	区分
H形鋼（山留主部材）250～400 型	90 日以内	130	円/t・日	①
	180 日以内	115	〃	②
	360 日以内	105	〃	③
	720 日以内	90	〃	④
	1080 日以内	80	〃	⑤

注：上表の賃料単価は、実際とは異なる。

計算例①……供用日数を 170 日とした場合

賃料（供用日数×賃料単価）の決定にあたっては、下記方法により賃料を比較し、安価となる賃料を採用することとなる。

$$\text{賃料 1} = 170 \text{ 日} \times 115 \text{ 円/t・日} = 19,550 \text{ 円/t}$$

（供用日数より区分②単価使用）

$$\text{賃料 2} = 181 \text{ 日} \times 105 \text{ 円/t・日} = 19,005 \text{ 円/t}$$

（供用日数より安価となる区分③単価使用）

∴賃料 1 > 賃料 2 より、安価となる賃料 2 を採用

計算例②……継続工事となる場合で、総供用日数 170 日、当該工事供用日数 70 日とした場合

総供用日数に対応した適用区分の賃料単価を選択することとなるが、当該工事の賃料（供用日数×賃料単価）の決定にあたっては、下記方法により賃料を比較し、安価となる賃料を採用することとなる。

$$\text{賃料 1} = 170 \text{ 日} \times 115 \text{ 円/t・日} = 19,550 \text{ 円/t} \quad (\text{総供用日数より区分②単価使用})$$

$$\text{賃料 2} = 181 \text{ 日} \times 105 \text{ 円/t・日} = 19,005 \text{ 円/t} \quad (\text{総供用日数より安価となる区分③単価使用})$$


∴賃料 1 > 賃料 2 より、安価となる賃料 2 を採用し、当該工事の供用日数分は下記のとおり計上する。

$$19,005 \text{ 円} \times (70 \text{ 日} / 170 \text{ 日}) = 7,825.58 \approx 7,825 \text{ 円/t} \quad (\text{小数点以下切り捨て})$$


## (6) 工事用仮設材（鋼矢板、H形鋼等）の計上について

下記により難い場合は、別途考慮する。

## (6)-1 当初より撤去しない場合、又は、当初より一部を撤去しない場合

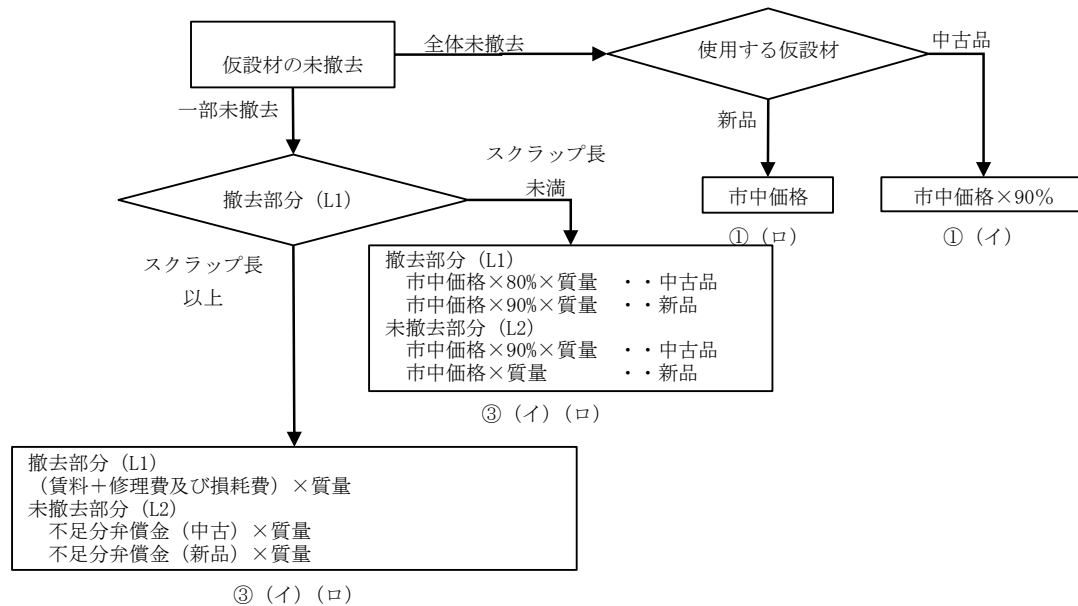


## (6)-2 当初より撤去する場合、又は、現地の状況で一部もしくは全体が撤去できなくなった場合

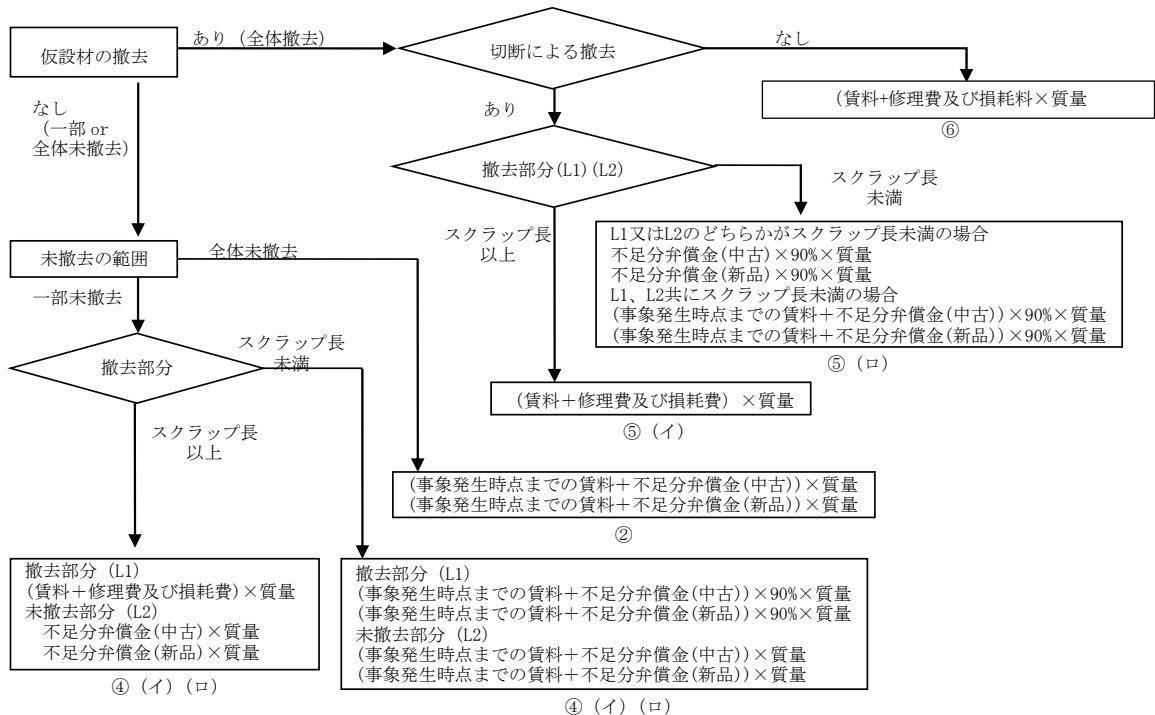

なお、当初より賃料を計上していたが、賃貸契約期間中に、引き抜き不能等の事象が発生したり、賃貸契約期間が延びて購入に切り替えとなった場合については、後述の（注）に記載のとおり別途考慮すること。

- ① 当初より撤去しない場合（SWB250010）
- （イ） 中古品の場合は市中価格の90%とする。
- （ロ） 新品を使用する場合、又は中古品が入手不可能な場合は市中価格とする。
- ② 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本ものが全て撤去出来なくなった場合（SWB250050）
- （事象発生時点までの賃料+（不足分弁償金（中古）））×質量
- （事象発生時点までの賃料+（不足分弁償金（新品）））×質量


- ③ 当初より、現地の状況で1本もののうち、一部を撤去しない場合（SWB250020, SWB250030）
- （新品でない場合）

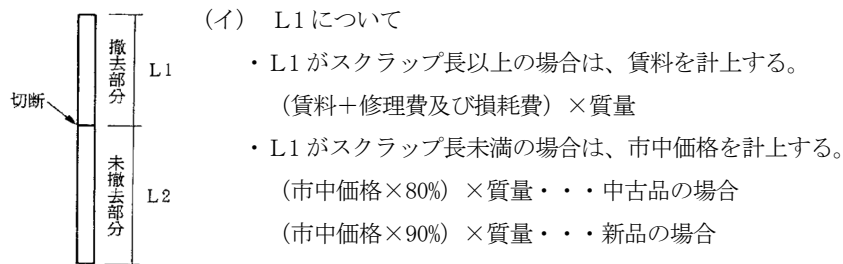

（ロ） L2について

- ・ L1 がスクラップ長以上の場合は、L2（未撤去部分）については、不足分弁償金を計上する。  
（不足分弁償金（中古））×質量  
（不足分弁償金（新品））×質量
- ・ L1 がスクラップ長未満の場合は、L2（未撤去部分）については、市中価格を計上する。  
（市中価格×90%）×質量・・・中古品の場合  
（市中価格）×質量・・・・・・新品の場合


- ④ 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本もののうち、一部が撤去出来なくなった場合
- (SWB250020, SWB250040)

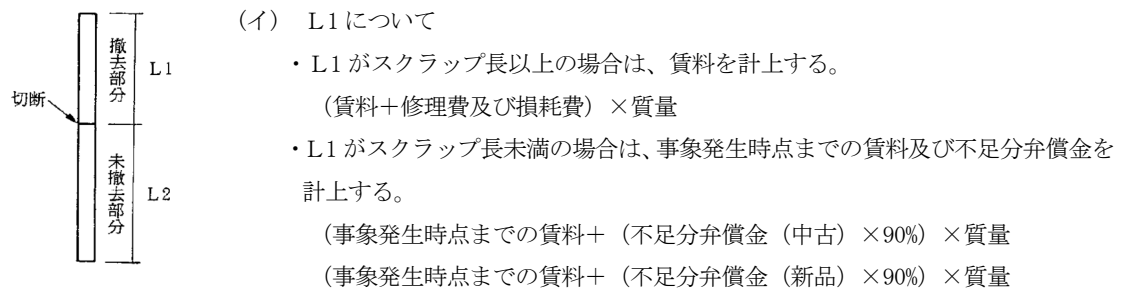

（ロ） L2について

- ・ L1 がスクラップ長以上の場合は、L2（未撤去部分）については、不足分弁償金を計上する。  
（不足分弁償金（中古））×質量  
（不足分弁償金（新品））×質量
- ・ L1 がスクラップ長未満の場合は、L2（未撤去部分）については、事象発生時点までの賃料+不足分弁償金を計上する。  
（事象発生時点までの賃料+（不足分弁償金（中古））×質量  
（事象発生時点までの賃料+（不足分弁償金（新品））×質量

⑤ 当初は切断をせず撤去するものとしていたが、現地の状況により切断を行い撤去した場合（SWB250040）



(イ) スクラップ長以上のL1 又はL2 について

- ・ 賃料を計上する。

(賃料+修理費及び損耗費) × 質量

(ロ) スクラップ長未満のL1 又はL2 について

- ・ L1 又はL2 のどちらかがスクラップ長未満の場合、不足分弁償金を計上する。

(不足分弁償金(中古) × 90%) × 質量

(不足分弁償金(新品) × 90%) × 質量

- ・ L1, L2 共にスクラップ長未満の場合、事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。

(事象発生時点までの賃料+(不足分弁償金(中古) × 90%)) × 質量

(事象発生時点までの賃料+(不足分弁償金(新品) × 90%)) × 質量

⑥ 当初より切断をせず撤去する場合（SWB250040）

- ・ 賃料を計上する

(賃料+修理費及び損耗費) × 質量

- (注) 1. 当初より賃料を計上していたが、賃貸契約期間中に、引き抜き不能や撤去部分がスクラップ長未満など別の現場に転用できない資材については、全損扱いとし、事象発生時点までの賃料+不足分弁償金を、全損扱いとなった資材の全質量分計上すること。
2. 賃貸契約期間が延びて購入に切り替えとなった資材についても、切り替え時点までの賃料+不足分弁償金を、購入に切り替えた資材の全質量分計上すること。
3. 購入への切り替えは、賃貸契約期間延長後の賃料（賃料+修理費及び損耗費等）と、購入へ切り替えた場合の金額（切り替え時点までの賃料+不足分弁償金）を比較するなど、適宜判断すること。
4. ③(イ)の2項目の様にスクラップ長未満のL1（撤去部分）を市中価格にて計上する場合において、その撤去部分を「官保有材」とする場合に、市中価格×90%（中古）×質量又は市中価格（新品）×質量を計上するなど、別途考慮し計上すること。

## (7) 仮設材質料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて

鋼矢板等の1現場あたり修理費及び損耗費は、次式のとおりとする。

$$Y = a \cdot b$$

Y：鋼矢板等の1現場あたり修理費及び損耗費（円/t） ※覆工板は単位を（円/m<sup>2</sup>）に読み替える。

a：係数 b：市場価格

表 2. 3 鋼矢板等の1現場あたり修理費及び損耗費算定のための係数及び市場価格

名称		補助工法	係数 (a)	市場価格 (b)
鋼矢板	本矢板	無	3.60	鋼矢板 整備費
		有	2.60	
	軽量鋼矢板	無	2.75	軽量鋼矢板 整備費
		有	1.98	
H形鋼	杭工	無	2.37	H形鋼 整備費
		有	1.73	

- (注) 1. 修理費及び損耗費は、整備費、修理費（特別ケレン・穴埋め・曲がり直し等）、切断による短尺補償、打込による破損を含む。
2. 修理費及び損耗費は、土質、打込又は引抜き等の作業条件を十分考慮して適用を決定する。
3. 補助工法とは、ウォータージェットまたはアースオーガ併用法、硬質地盤専用法、プレボーリング工法等をいう。

## (8) 賃料の補正

鋼矢板、H形鋼、覆工板及び鋼製マット（以下「鋼矢板等」という。）の1現場あたりの修理費及び損耗費は、鋼矢板等の1現場における使用回数が2以上になるときには、次式により求めた補正率を乗じて補正することができる。

$$\text{補正率} = \frac{1}{2}(n+1) \quad \text{[この式において、nは鋼矢板等の使用回数とする]}$$

※建設用仮設材質料積算基準（建設機械等損料表）を参照

標準長さ及びスクラップ長さ			
品名	規格	標準長 (m)	スクラップ長 (m)
鋼矢板 [本矢板]	2 型	4 以上～8 以下	4 未満
	3 型	6 ～ 15	5 "
	4 型	13 ～ 20	8 "
	5 L 型	15 ～ 22	9 "
H形鋼 [杭 用]	H200 型	4 ～ 8	4 "
	H250 型	6 ～ 12	4 "
	H300 型	8 ～ 16	5 "
	H350 型	10 ～ 18	6 "
	H400 型	10 ～ 18	6 "
	H594 型	7 ～ 9	7 "
山留主部材	H250～400	3 ～ 7	3 "

(注) スクラップ長さ以上のものについては賃料扱いとする。

(物資)

## (9) 矢板打込・引抜き（県）

1. 矢板長：矢板長は本工事及び仮設工共 0.5m ピッチとする。
2. 打込長：矢板全長を打込む必要がある場合でも、打込み工法にかかわらず、つかみ代 0.5m を控除する。

## (10) そ の 他

- イ 供用日（月）数は、仮設材を工事現場に存置する日（月）数をいい、使用回数は、鋼矢板及びH形鋼は打込みから引抜き（山留用H形鋼については架設から解体）まで、覆工板及び鋼製マットにあっては、敷設から撤去までをそれぞれ1回として算定した数をいう。
- ロ 仮設材の所在地は近傍に所在する場合を除いて県庁とする。ただし、鋼矢板の5L型の所在地は、近傍に所在する場合を除いて大阪とする。
- ハ 鋼矢板締切を計上する場合の工種別の締切方法は、原則として下表による。但し、この方法は鋼矢板締切の一応の基準であるので、各工事の締切方法については適正且つ経済的な方を十分検討すること。

工 種	総締切延長Lに対し、1回当たり締切延長L。(現場に打込む矢板延長)	締切転用回数	摘 要
樋 門 、 樋 管 等	$L_0 = L$	$N = 1$	
橋台、橋脚、床土工帯工、井筒	$L_0 = L/2$	$N = 2$	
河 川 、 海 岸 護 岸	$l \leq 40\text{m}$ の場合…………… $L_0 = L$ $40 < l \leq 160\text{m}$ の場合… $L_0 = L/N$ $l > 160\text{m}$ の場合…………… $L_0 = L/4$	$N = 1$ $N = l/40$ $N = 4$	$l$ = 工事延長 小数以下1位 止め

(注)  $l$ は工事延長で当該工事のうち、鋼矢板締切を必要とする部分の工事延長である。

## (11) 仮設道路

仮設道路は新設するものと、既設の農道や堤防等を利用するもの或は既設のものを拡巾して使用するもの等があり、その状態は雑多で且つ運搬資材の量等により一概に標準化することは至難であるが、一応の基準として次の事項の参考に積算することとする。既設の農道、堤防等重量物運搬に対応し難いものについては路盤の状態を判断し必要な敷砂利や補修費を計上する。市町村道を利用する場合は原則として路面工及び補修費は計上しない。但し工事用のために著しく破損するおそれのあるものについては状況勘案の上考慮する。

- 1) 巾 員 総巾員 4.00m
- 2) 勾 配 原則として 1/10 以内
- 3) 路面高 地形により異なるもなるべく優先的に使用する。
- 4) 築 造 土 残土利用できるものは優先的に使用する。
- 5) 敷 地 官地又は買収予定地を最大限に利用し不足分を借地とする。
- 6) 仮設位置 現実に且つ経済的に使用できるものを選定する。
- 7) 路面工
  - イ 敷砂利の散布巾 車道巾員（総巾員－2×0.50m）とする。
  - ロ 敷砂利散布厚 路盤の状態により異なるものも下記を標準として考慮する。
 

新設道路の路盤が砂利交り土の場合	0～5cm 程度
新設道路の路盤が土砂の場合	5～10cm 程度
既設道路の路盤が砂利交りの場合	0～3cm 程度
既設道路の路盤が土砂の場合	3～7cm 程度
  - ハ 路面拵手間 必要に応じて路盤又は路床整正を計上するものとする。  
機械施工の場合は「第Ⅳ編第1章①路盤工」を計上する。
  - ニ 敷砂利手間 機械施工の場合は、上記「①路盤工」の路盤材敷均し歩掛を計上する。

- 8) 補修費 補修を要する回数、面積及び補充材は道路の状態により異なるものも下記を標準として考慮する。

イ 補修手間 「7) ハ 路面拵手間」と同じ歩掛とする。

ロ 補修回数 工期 30 日に付き 1 回

ハ 補修面積 標準として補修作業 1 回につき次の通りとする。

(イ) 機械施工

車道の全面積

(ロ) 人力施工

新設道路の路盤が砂利交り土の場合 車道面積の 1/4

〃 土砂の場合 〃 1/2

既設道路の路盤が砂利交り土の場合 〃 1/5

〃 土砂の場合 〃 1/3

## 二 補修用敷砂利の平均散布厚

区 分 \ 工 期		100 日未満	100 日以上 150 日未満	150 日以上 200 日未満	200 日以上 250 日未満	250 日未満
新設	路盤が土砂の場合	—	1cm	2cm	3cm	4cm
	路盤が砂利交り土の場合	—	—	1	2	2
既設	路盤が土砂の場合	—	1	2	3	4
	路盤が砂利交り土の場合	—	—	1	2	2

ホ 補修用敷砂利の量＝補修面積(ハ)×平均散布厚(ニ) ※回数倍はしないこと

- 9) 借地に対する特別の措置（役務費参照）

借地の条件として特に耕作土を一時取除き工事完了後原形に復旧する場合には、これ等に要する経費を計上することができる。耕作土の取除き厚は 50cm、整地手間は 2.0 人/100m<sup>2</sup>を標準として仮設費として計上する。

なお、耕作土を一時借置するために必要な用地の借地料の計上もできるが役務費として計上すること。

平成 29 年 5 月 12 日付け建技第 97 号にて調査依頼のありました件につきましては、別紙のとおり回答します。

10) 既設の道路（道路法適用外）

農道、堤防の天端等重量物運搬に対応出来難い路盤のものについては敷砂利及び補修費を計上することができ、その基準は前記 5) の路面工及び補修費を適用する。

11) 機械搬入路

仮設道路費に多額を要し、資材は小運搬方式とするが機械搬入のため民有地内を通行する場合に必要な用地の借上料を計上することができる。但し役務費とする。その巾員は 4m 以内とする。又必要に応じ築造復旧に要する経費も計上することができる。

12) 仮（棧）橋

仮設砂防の流路等において兩岸工事を施工するとき資材搬入を川越えに行う場合の小運搬費の算定は対岸を含めた平均距離とすることは勿論、渡河のため必要な足場を設けることができる。その設置箇所は小運搬費と比較検討する。

イ 小運搬用棧橋の基準

高さ、幅及び長さは次を標準とする。

通常護岸天端より河床迄の高さ

但し最低高は  $L \cdot W \cdot L + \text{余裕高}$

巾、高さ以下 2.0m のもの 1.0m

高さ 2～3m もの、上巾 1.0m、下巾 2.0m、平均 1.5m

長さ、所要高を水平に引いた距離と河床巾の平均長

ロ 機械搬入用仮橋の基準

河床土の軟弱な箇所又は水深 0.50m 以上の場合で、他に搬入路がなく渡河する場合に設置する。

高さ  $L \cdot W \cdot L + \text{河川余裕高以内}$

但し、河川堤防の状況により不適當な場合は搬入路高迄とする。

巾員 4.0m

長さ 必要最小限とする。

ハ 資材運搬用仮橋

仮設道路の一部として仮橋を設ける場合は次の通りとする。

高さ 運搬路路面高

巾員 4.00m

長さ 通常の出수에支障なき最小限の長さとする。


13) 借地料（仮設）

役務費参照



(12) 電力施設の積算基準（県-C）

高圧受電の模図

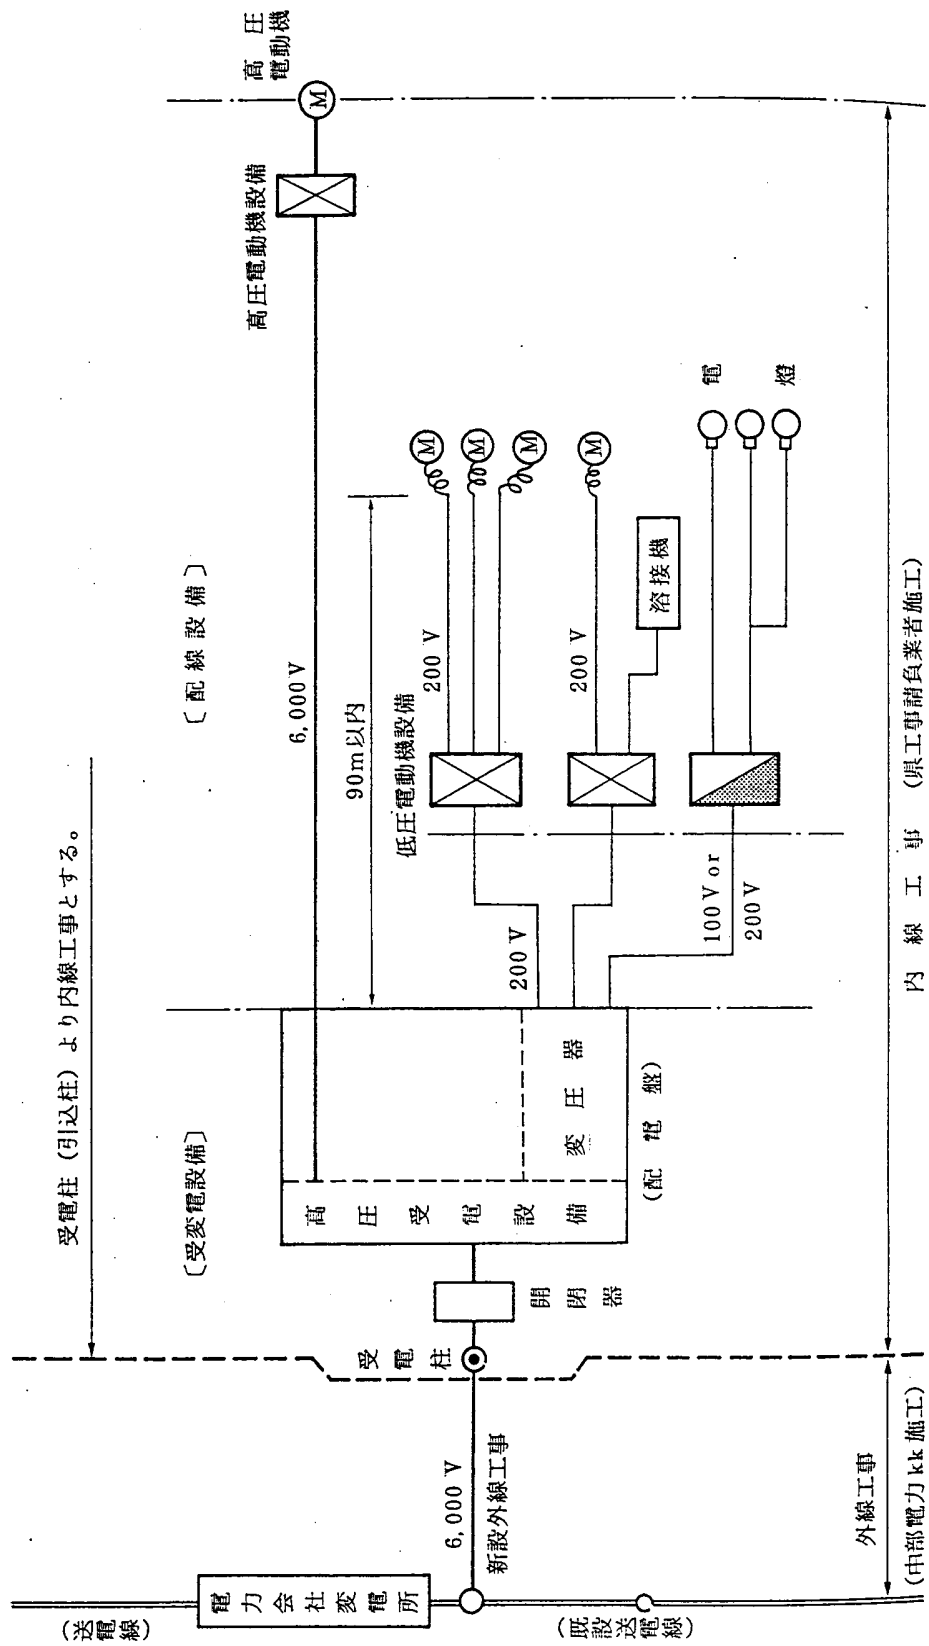

## 1) 内線工事費

## イ 適用範囲

土木工事において工事用電力を受電し使用するための一般的な仮設電力設備で契約電力 300kW 未満のものについて適用する。この際、キュービクル式受変電設備の損料は別途積算するものとする。ただし工事現場の条件等により、これを適用することが不合理な場合又は特殊な設備とする場合は別途積算するものとする。

## ロ 損料項目の構成

## イ) 受電設備

電柱、区分開閉器、分電盤、配線材、その他資材

## ロ) 高圧配電線路

電柱、架空線、支線（1 径間 40m）、その他資材

## ハ) 低圧配電線路

電柱、架空線、支線（1 径間 30m）、その他資材

## ニ) 高圧電動機設備

高圧負荷開閉器（高圧カットアウト）、高圧ケーブル、第A種接地、結線費、その他資材

## ホ) 低圧電動機設備

カバースイッチ（安全開閉器）、電線、第C種接地、結線費、その他資材

## ハ 損料項目の計上数量

## イ) 高圧受電設備

当該工事の契約電力が 50kW 以上のものに適用し、1 工事につき 1 式を計上すること。ただし、施工場所が 2 箇所以上で明らかに電源引き込みが 2 以上となる場合はそれに応じた容量の受電設備を 2 以上計上してよい。

## ロ) 低圧受電設備

当該工事の契約電力が 25kW 及び 50kW 未満の区分による受電設備を 1 工事につき 1 式を計上すること。ただし、施工場所が 2 箇所以上で明らかに電源引き込みが 2 以上となる場合はそれに応じた容量の受電設備を 2 以上計上してよい。

## ハ) 高圧配電線路

高圧電動機のある場合、受電地点から高圧電動機設置地点までの経路を現場の実情に応じて高圧配電線路を計上する。

## ニ) 低圧配電線路

受電設備地点から各負荷設備にいたる径間とするが各負荷が受電地点を中心に放射状に配置される場合を除き、低圧幹線を描き、これより分岐するような配線経路を想定する。

## ホ) 高圧電動機

大容量コンプレッサー、大型クレーン等の高圧負荷の台数分を計上する。

内線工事省略単価表

単価コード	単 価 名 称	規 格 ・ 摘 要	単位	備 考
T00905001	高压受電設備材料	50kw 以上 100kw 未満 3 ヶ月未満＋別途損料	1 式	キュービクル式受変電設備損料 は建設機械等損料算定表参照
T00905003	高压受電設備材料	50kw 以上 100kw 未満 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満＋別途損料	1 式	同 上
T00905005	高压受電設備材料	50kw 以上 100kw 未満 6 ヶ月以上 1 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905007	高压受電設備材料	50kw 以上 100kw 未満 1 年以上 2 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905009	高压受電設備材料	50kw 以上 100kw 未満 2 年以上 3 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905011	高压受電設備材料	100kw 以上 200kw 未満 3 ヶ月未満＋別途損料	1 式	〃
T00905013	高压受電設備材料	100kw 以上 200kw 未満 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満＋別途損料	1 式	〃
T00905015	高压受電設備材料	100kw 以上 200kw 未満 6 ヶ月以上 1 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905017	高压受電設備材料	100kw 以上 200kw 未満 1 年以上 2 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905019	高压受電設備材料	100kw 以上 200kw 未満 2 年以上 3 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905021	高压受電設備材料	200kw 以上 300kw 未満 3 ヶ月未満＋別途損料	1 式	〃
T00905023	高压受電設備材料	200kw 以上 300kw 未満 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満＋別途損料	1 式	〃
T00905025	高压受電設備材料	200kw 以上 300kw 未満 6 ヶ月以上 1 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905027	高压受電設備材料	200kw 以上 300kw 未満 1 年以上 2 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905029	高压受電設備材料	200kw 以上 300kw 未満 2 年以上 3 年未満＋別途損料	1 式	〃
T00905031	高压配電線路材料	10 径間 400m 3 ヶ月未満	m	
T00905033	高压配電線路材料	10 径間 400m 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	m	
T00905035	高压配電線路材料	10 径間 400m 6 ヶ月以上 1 年未満	m	
T00905037	高压配電線路材料	10 径間 400m1 年以上 2 年未満	m	
T00905039	高压配電線路材料	10 径間 400m <sup>2</sup> 年以上 3 年未満	m	
T00905041	高压電動機設備材料	3 ヶ月未満	1 箇所	
T00905043	高压電動機設備材料	3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	1 箇所	
T00905045	高压電動機設備材料	6 ヶ月以上 1 年未満	1 箇所	
T00905047	高压電動機設備材料	1 年以上 2 年未満	1 箇所	
T00905049	高压電動機設備材料	2 年以上 3 年未満	1 箇所	
T00905051	低压受電設備材料	25kw 未満 3 ヶ月未満	1 式	
T00905053	低压受電設備材料	25kw 未満 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	1 式	
T00905055	低压受電設備材料	25kw 未満 6 ヶ月以上 1 年未満	1 式	
T00905057	低压受電設備材料	25kw 未満 1 年以上 2 年未満	1 式	
T00905059	低压受電設備材料	25kw 未満 2 年以上 3 年未満	1 式	


内線工事省略単価表

単価コード	単 価 名 称	規 格 ・ 摘 要	単位	備 考
T00905061	低圧受電設備材料	25kw 以上 50kw 未満 3 ヶ月未満	1 式	
T00905063	低圧受電設備材料	25kw 以上 50kw 未満 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	1 式	
T00905065	低圧受電設備材料	25kw 以上 50kw 未満 6 ヶ月以上 1 年未満	1 式	
T00905067	低圧受電設備材料	25kw 以上 50kw 未満 1 年以上 2 年未満	1 式	
T00905069	低圧受電設備材料	25kw 以上 50kw 未満 2 年以上 3 年未満	1 式	
T00905071	低圧配電線路材料	10 径間 300m 3 ヶ月未満	m	
T00905073	低圧配電線路材料	10 径間 300m 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	m	
T00905075	低圧配電線路材料	10 径間 300m 6 ヶ月以上 1 年未満	m	
T00905077	低圧配電線路材料	10 径間 300m 1 年以上 2 年未満	m	
T00905079	低圧配電線路材料	10 径間 300m 2 年以上 3 年未満	m	
T00905081	低圧電動機設備材料	3 ヶ月未満	1 箇所	
T00905083	低圧電動機設備材料	3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	1 箇所	
T00905085	低圧電動機設備材料	6 ヶ月以上 1 年未満	1 箇所	
T00905087	低圧電動機設備材料	1 年以上 2 年未満	1 箇所	
T00905089	低圧電動機設備材料	2 年以上 3 年未満	1 箇所	
T00905091	高圧受電設備取付工	50kw 以上 100kw 未満	1 式	
T00905093	高圧受電設備取付工	100kw 以上 200kw 未満	1 式	
T00905095	高圧受電設備取付工	200kw 以上 300kw 未満	1 式	
T00905097	高圧配電線路取付工	10 径間 400m	m	
T00905099	高圧電動機設備取付工		1 箇所	
T00905101	高圧受電設備撤去工	50kw 以上 100kw 未満	1 式	
T00905103	高圧受電設備撤去工	100kw 以上 200kw 未満	1 式	
T00905105	高圧受電設備撤去工	200kw 以上 300kw 未満	1 式	
T00905107	高圧配電線路撤去工	10 径間 400m	m	
T00905109	高圧電動機設備撤去工		1 カ所	
T00905111	低圧受電設備取付工	25kw 未満	1 式	
T00905113	低圧受電設備取付工	25kw 以上 50kw 未満	1 式	
T00905115	低圧配電線路取付工	10 径間 300m	m	
T00905117	低圧電動機設備取付工		1 カ所	
T00905119	低圧受電設備撤去工	25kw 未満	1 式	
T00905121	低圧受電設備撤去工	25kw 以上 50kw 未満	1 式	
T00905123	低圧配電線路撤去工	10 径間 300m	m	
T00905125	低圧電動機設備撤去工		1 カ所	

備考：配電線路工は m 当りの単価に換算されている。


## 2) 積算例 1

ケーソン工事の場合

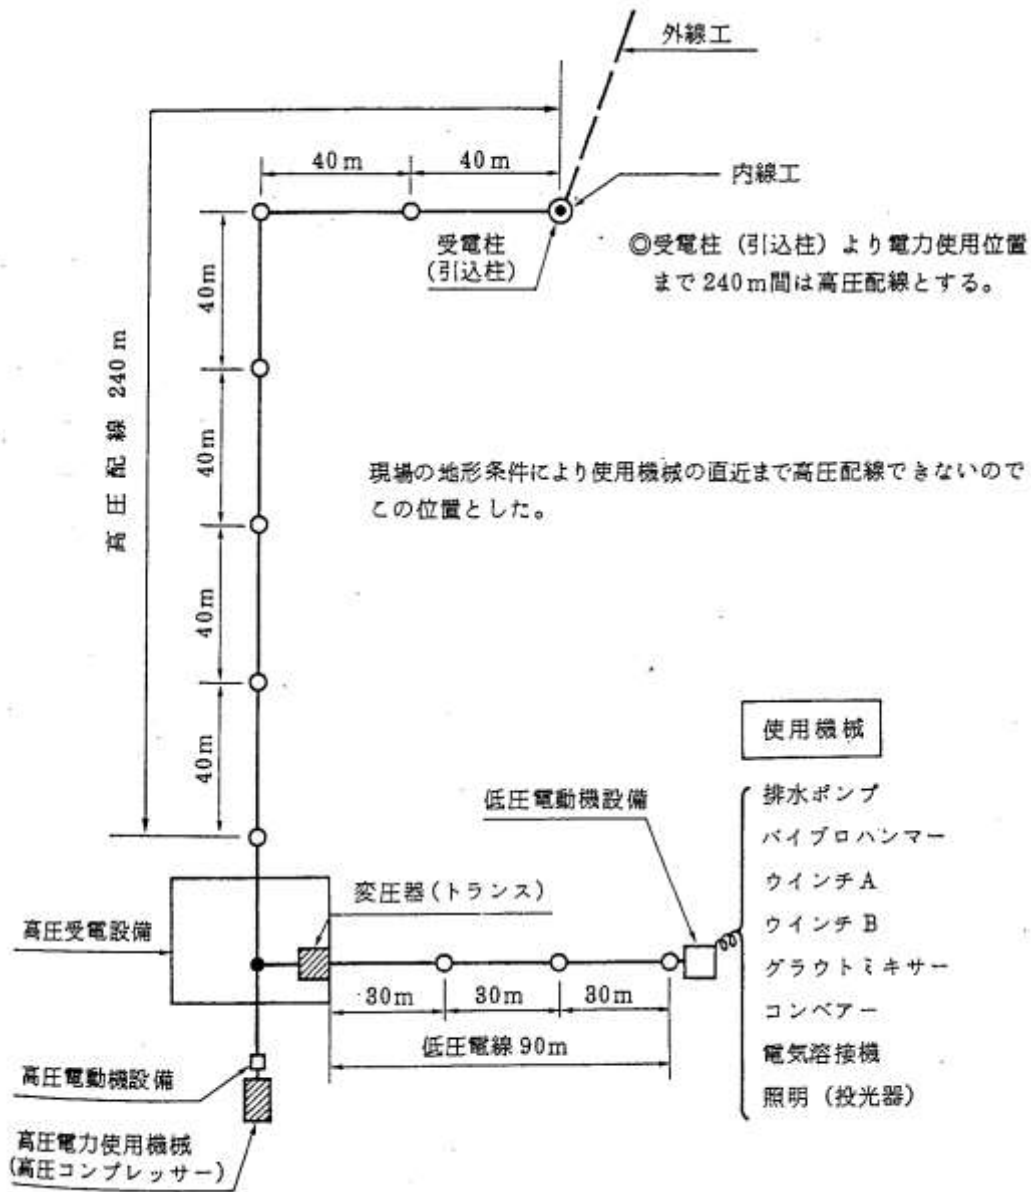

## (13) 段差摺付の考え方

【標準図】



## (ア) 縦断段差

一般交通の用に供さなければならない場合の道路縦断方向の段差は、舗設中の合材により 1 : 20 (5%) 以上の勾配で擦付ける。

## (イ) 横断段差

横断方向の段差は、生じないように施工するものとし、やむ得ず横断方向に段差を付した状態で、一般交通の用に供さなければならない場合には、舗装中の合材により、1 : 5 (20%) 程度で擦付ける。

## (ウ) 支道擦付・路肩擦付

支道擦付は、本線舗装と平行して行うものとし、本線舗装と支道の段差をつけないよう施工する。やむ得ず段差が生じる場合の擦付勾配は 1 : 10 (10%) 程度とし適切な保安施設を設置する。

## (エ) その他

擦付材は、本舗装前に撤去することを原則とする。

## ② 鋼矢板（H形鋼）工（建地－Ⅰ）

## ②－Ⅰ バイブロハンマ工

## 1. 適用範囲

本資料は、電動式バイブロハンマ、油圧式可変超高周波型バイブロハンマ（以下「油圧式バイブロハンマ」という）による鋼矢板・H形鋼の継施工を伴う打込み（ウォータジェット併用施工を含む）及び引抜き陸上施工及び水上施工に適用する。

なお、陸上施工とは、クレーンを陸上に設置して行う施工のことで、次の形態が該当する。

- ・クレーンの設置場所：陸上（栈橋上等を含む）
- ・鋼矢板・H形鋼の施工場所：陸上部又は水中部

また、水上施工とは、クレーンを台船上に設置して行う施工のことである。

継施工における施工法は、次のとおりである。

〔鋼矢板〕 先行する鋼矢板を打込み後、それに接続する鋼矢板を鉛直に建込んだ状態で継手部を溶接する方法。

〔H形鋼〕 先行するH形鋼を打込み後、それに接続するH形鋼を鉛直に建込んだ状態で継手部をボルトにより接合する方法。

鋼矢板型式毎の打込長（引抜長）の適用範囲は、表1. 1～表1. 3を標準とし、これにより難しい場合は、別途考慮する。

## (1) 打込み（電動式バイブロハンマ）

表1. 1 打込長 (m)

鋼矢板種類		普通					広 幅			広 幅 (ハット形)			
鋼矢板型式		I A型	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱ <sub>w</sub> 型	Ⅲ <sub>w</sub> 型	Ⅳ <sub>w</sub> 型	10H型	25H型	45H型	50H型
打込長 (m)	バイブロハンマ 単 独 施 工	6以下	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	15以下	19以下	19以下	19以下
	ウォータジェット 併 用 施 工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	25以下	—	—

H 形 鋼 型 式		H200	H250	H300	H350	H400
打込長 (m)	バイブロハンマ 単 独 施 工	12以下	15以下	25以下	25以下	25以下
	ウォータジェット 併 用 施 工	15以下	19以下	25以下	25以下	25以下

## (2) 打込み（油圧式バイプロハンマ）

表1.2 打込長 (m)

鋼矢板種類		普 通					広 幅			広 幅 (ハット形)			
鋼矢板型式		I A型	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	45H型	50H型
打込長 (m)	バイプロハンマ 単 独 施 工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	15以下	19以下	19以下	19以下
	ウォータージェット 併 用 施 工	—	15以下	19以下	25以下	25以下	15以下	19以下	25以下	19以下	25以下	—	—

H 形 鋼 型 式		H200	H250	H300	H350	H400
打込長 (m)	バイプロハンマ 単 独 施 工	6以下	15以下	25以下	25以下	25以下
	ウォータージェット 併 用 施 工	—	19以下	25以下	25以下	25以下

## (3) 引抜き（電動式バイプロハンマ、油圧式バイプロハンマ）

表1.3 引抜長 (m)


	電動式バイプロハンマ	油圧式バイプロハンマ
鋼 矢 板 H 形 鋼	25以下	25以下

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

## (1) 打込み

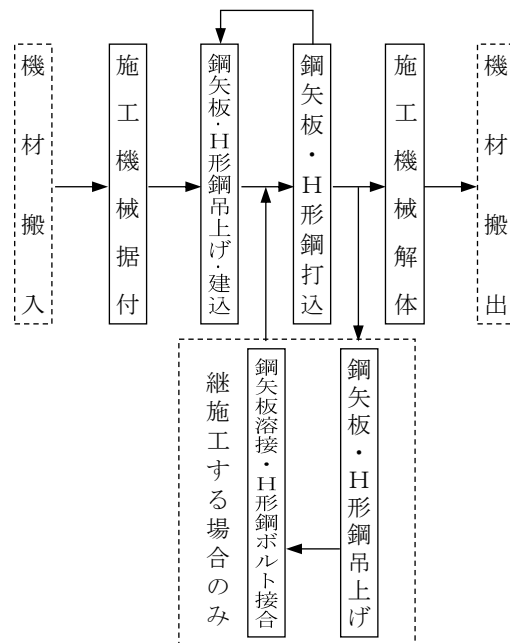


※導材（ガイド）及び敷鉄板の施工を含む。

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-1 施工フロー(打込み)



## (2) 打込み（ウォータジェット併用施工）

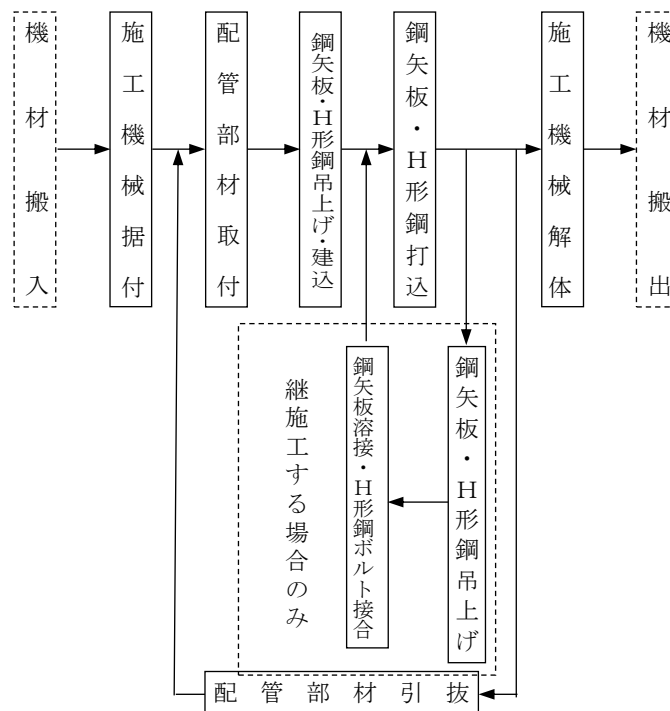


※導材（ガイド）及び敷鉄板の施工を含む。

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図 2-2 施工フロー（打込み（ウォータジェット併用施工））

## (3) 引抜き

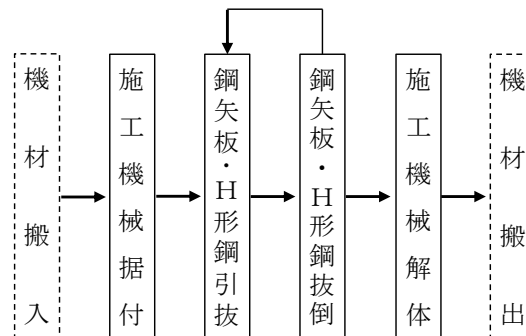

※敷鉄板の施工を含む。

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図 2-3 施工フロー（引抜き）

## 3. 施工歩掛

## 3-1 機種の選定

## (1) バイプロハンマの規格

鋼矢板、H形鋼の打込み、引抜きに使用するバイプロハンマの規格は、次表を標準とする。

なお、ハット形鋼矢板の打込みに使用するバイプロハンマは、フランジ把持式の専用チャック装備を標準とする。

## 1) 打込み（電動式バイプロハンマ）



図 3-1 電動式バイプロハンマ 機種の選定範囲

表 3.1 機種の選定(電動式バイプロハンマ)

施 工 方 法		バイプロハンマ単独施工	ウォータージェット併用施工	
最 大 N 値		$N_{max} < 50$	$50 \leq N_{max} < 100$	$100 \leq N_{max} \leq 180$
打 込 長	15m 以下	電動式・普通型 60kW 電動式・可変モーメント型 (ハット形鋼矢板用) 60kW		電動式・普通型 90kW 電動式・可変モーメント型 (ハット形鋼矢板用) 90kW
	25m 以下	電動式・普通型 90kW 電動式・可変モーメント型 (ハット形鋼矢板用) 90kW		
杭 打 ち 用 ウォータージェット		—		エンジン式・排出ガス対策型 (第1次基準値) ポンプ圧力14.7MPa 吐出量325 ℓ/min×2台 (14.7MPa 325 ℓ/min×1台)(注)1

(注) 1. 杭打ち用ウォータージェットの( )書きは $N_{max} < 50$ で転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合に計上する。

2. 対象地盤の最大N値が、50を超えるものについては、式3.1により換算N値を求めたうえで適用する。

$$\text{換算N値} = \frac{1,500}{\text{落下50回当り貫入量 (cm)}} \cdots \cdots \text{式 3.1}$$

3. 打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。

## 2) 打込み（油圧式バイプロハンマ）

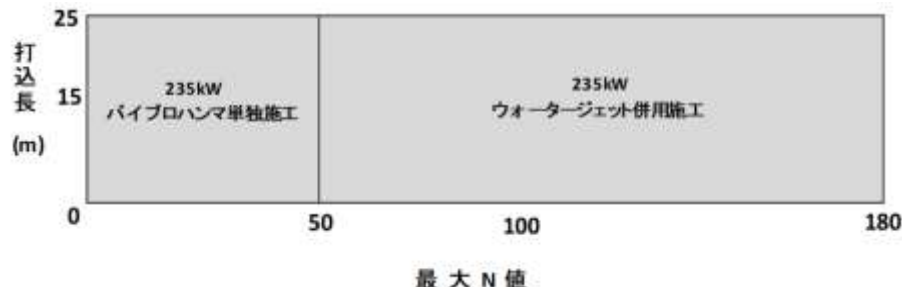


図 3-2 油圧式バイプロハンマ 機種の選定範囲

表 3. 2 機種の選定(油圧式バイプロハンマ)

施 工 方 法		バイプロハンマ単独施工	ウォータージェット併用施工	
最 大 N 値		$N_{max} < 50$	$50 \leq N_{max} < 100$	$100 \leq N_{max} \leq 180$
打 込 長	25m 以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型（第2次基準値）235kW		
杭 打 ち 用 ウォータージェット		—	エンジン式・排出ガス対策型（第1次基準値） ポンプ圧力14.7MPa 吐出量325 ℓ/min×2台 (14.7MPa 325 ℓ/min×1台) (注)1	

(注) 1. 杭打ち用ウォータージェットの（ ）書きは、 $N_{max} < 50$ で転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合に計上する。

2. 対象地盤の最大N値が、50を超えるものについては、式3. 1により換算N値を求めたうえで適用する。

3. 打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。

## 3) 引抜き

引抜き作業に使用する機械・規格は、N値にかかわらず次表を標準とする。

表3. 3 引抜き作業の機種の選定

	電動式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ	
	引 抜 長	規 格	引 抜 長	規 格
鋼 矢 板 H 形 鋼	25m 以下	電動式・普通型 60kW	25m 以下	油圧式・可変超高周波型 ・排出ガス対策型 (第2次基準値) 235kW

(注) 1. 上表は、広幅鋼矢板（Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw）及びハット形鋼矢板（10H, 25H, 45H, 50H）には適用しない。

2. 引抜き長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜き長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。

## (2) 付属機械

バイプロハンマの付属機械の機械・規格は、次表を標準とするが、現場条件により次表により難しい場合は、施工に必要な吊上げ機械・規格に入れ替えて計上する。なお、水上施工の場合の台船、引船は表3. 5を標準とする。

表3. 4 付属機械の機種の選定

バイプロハンマ種別	施 工 内 容	機 械 名	規 格
電動式バイプロハンマ	打込み(WJ併用施工を含む)・引抜き	ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第1次基準値) 50～55t吊
油圧式バイプロハンマ	打込み(WJ併用施工を含む)		
	引抜き	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊

(注) 現場条件により濁水処理が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章⑤濁水処理工（一般土木工事）」により別途計上する。

表3. 5 台船・引船

杭打機台船	矢板積台船	引 船
クレーン付台船 台船(300t積) 1台 クローラークレーン(40～50t吊)1台	台 船(200t積) 1台	引 船(鋼製 D 200PS型 15GT)1台

## 3-2 日当り編成人員

鋼矢板、H形鋼の打込・引抜作業の日当り編成人員は、表3. 6を標準とする。なお、水上施工の1船団に対する船舶作業の日当り編成人員は、表3. 7を標準とする。

表 3. 6 打込・引抜作業の日当り編成人員 (人/日)

項 目	区 分	土木一般世話役	とび工	普通作業員	溶接工
パイプロハンマ 単 独 施 工 (打 込 み, 引 抜 き)	継施工無し	1	2	1	—
	鋼矢板(溶接接合)	1	2	1	2
	H形鋼 (ボルト接合)	1	3	1	—
ウォータジェット 併 用 施 工	継施工無し	1	2	1	1
	鋼矢板(溶接接合)	1	2	1	2
	H形鋼(ボルト接合)	1	3	1	1

表 3. 7 船舶作業の日当り編成人員 (人/日)

職 種	杭打機台船	矢板積台船	引 船
高 級 船 員	1		1

- (注) 1. 船員は休日以外の休止日については、共通仮設費の準備費における繋船費として計上する。  
 2. 潜水士は必要に応じて船員と同様な方法で計上する。  
 3. 海上及び港湾工事で、これにより難い場合は別途考慮する。  
 4. 上表は打込み又は引抜作業時の配置人員であり、搬入、搬出等の回航は共通仮設費における運搬費として計上する。

## 3-3 日当り施工枚(本)数

## (1) 打込み(継施工無し)

鋼矢板、H形鋼の日当り打込枚数及び本数(N)は、表3. 8～表3. 19による。

## 1) 電動式パイプロハンマによる施工(Nmax&lt;50)

表3. 8 日当り施工枚(本)数(N)(陸上施工) [枚(本)/日]

型式 打込長(m)	I A 型	II 型	III 型	IV 型	V <sub>1</sub> 型	II <sub>w</sub> 型	III <sub>w</sub> 型	IV <sub>w</sub> 型	10H 型	25H 型	45H 型	50H 型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	57	56	55	54	52	55	53	52	53	51	49	48	56	54	52	49	47
4以下	51	49	47	44	40	46	43	39	42	39	36	34	48	44	41	36	32
6以下	47	43	40	37	32	40	36	32	35	31	28	26	43	38	34	28	25
9以下		38	35	31	26	34	30	26	29	25	22	21	37	32	28	22	19
12以下		33	29	26	21	29	25	21	24	20	18	16	32	27	23	18	15
15以下		29	26	22	18	25	21	18	20	17	15	13		23	19	15	12
19以下			24	21	16		20	16		16	14	13			18	14	11
23以下				18	14			14							15	12	9
25以下				16	13			13							14	10	8

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表3. 9 日当り施工枚(本)数(N)(水上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	I A型	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	29	28	28	28	27	28	28	27	28	27	28	28	27	27	26
4以下	27	26	26	25	23	26	25	23	24	23	26	25	24	22	21
6以下	26	25	24	22	21	23	22	21	22	20	24	23	21	19	17
9以下		23	22	20	18	21	20	18	19	17	23	20	19	16	14
12以下		21	19	18	15	19	17	15	17	15	21	18	16	14	12
15以下		19	18	16	14	17	15	14	15	13		16	15	12	10
19以下			17	15	13		15	13		12			14	11	9
23以下				14	11			11					12	10	8
25以下				13	10			10					11	9	7

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

2) 油圧式バイプロハンマによる施工 (N<sub>max</sub><50)

表3. 10 日当り施工枚(本)数(N)(陸上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	45H型	50H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	56	55	53	51	55	53	51	52	50	49	47	56	54	52	49	46
4以下	48	46	43	39	45	42	38	41	37	35	33	48	44	40	35	31
6以下	42	39	36	31	39	35	31	34	30	27	25	42	37	33	27	24
9以下	37	33	30	25	33	29	25	28	24	21	20		31	27	21	18
12以下	31	28	25	20	28	24	20	23	19	17	15		26	22	17	14
15以下	28	25	21	17	24	20	17	19	16	14	13		22	18	14	12
19以下		21	18	14		17	14		13	12	11			16	12	10
23以下			16	12			12							13	10	8
25以下			14	11			11							12	9	7

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表3. 11 日当り施工枚(本)数(N)(水上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	28	28	28	27	28	28	27	27	27	28	28	27	26	26
4以下	26	25	25	23	25	24	23	24	23	26	25	24	22	20
6以下	24	23	22	20	23	22	20	21	20	24	22	21	18	17
9以下	22	21	20	17	21	19	17	19	17		20	18	16	14
12以下	20	19	17	15	19	17	15	16	14		18	16	13	11
15以下	19	17	15	13	17	15	13	14	13		16	14	11	10
19以下		16	14	11		13	11		11			12	10	8
23以下			12	10			10					11	8	7
25以下			11	9			9					10	8	6

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

## 3) 電動式バイブロハンマとウォータジェット併用施工

表3.12 日当り施工枚(本)数(N)(陸上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	64 (68)	62 (67)	60 (65)	56 (62)	62 (66)	59 (65)	56 (62)	59 (64)	55 (62)	64 (68)	61 (65)	58 (63)	52 (60)	49 (57)
4以下	40 (44)	38 (43)	35 (41)	31 (38)	37 (43)	34 (40)	31 (38)	34 (40)	30 (37)	40 (44)	36 (41)	33 (39)	28 (35)	25 (32)
6以下	29 (33)	27 (32)	25 (30)	22 (27)	27 (31)	24 (29)	22 (27)	24 (29)	21 (26)	29 (33)	25 (30)	23 (28)	19 (25)	17 (22)
9以下	22 (25)	20 (24)	18 (22)	16 (20)	20 (24)	18 (22)	16 (20)	17 (21)	15 (19)	21 (25)	19 (23)	17 (21)	14 (18)	12 (16)
12以下	17 (19)	15 (18)	14 (17)	12 (15)	15 (18)	13 (17)	12 (15)	13 (16)	11 (15)	16 (19)	14 (17)	13 (16)	10 (14)	9 (12)
15以下	13 (16)	12 (15)	11 (14)	9 (12)	12 (15)	11 (14)	9 (12)	10 (13)	9 (12)	13 (16)	11 (14)	10 (13)	8 (11)	7 (10)
19以下		11 (13)	10 (12)	8 (10)		9 (11)	8 (10)	9 (11)	8 (10)		10 (12)	9 (11)	7 (9)	6 (8)
23以下			8 (10)	7 (9)			7 (9)		6 (8)			7 (9)	6 (8)	5 (7)
25以下			7 (9)	6 (8)			6 (8)		6 (7)			6 (8)	5 (7)	4 (6)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する必要がある場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表3.13 日当り施工枚(本)数(N)(水上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	30 (31)	30 (31)	29 (30)	28 (30)	30 (31)	29 (30)	28 (30)	29 (30)	28 (30)	30 (31)	29 (31)	29 (30)	27 (29)	26 (29)
4以下	24 (25)	23 (25)	22 (24)	20 (23)	23 (24)	22 (24)	20 (23)	21 (23)	20 (22)	23 (25)	22 (24)	21 (23)	19 (22)	17 (21)
6以下	19 (21)	18 (20)	17 (20)	16 (18)	18 (20)	17 (19)	16 (18)	17 (19)	15 (18)	19 (21)	18 (20)	16 (19)	14 (17)	13 (16)
9以下	16 (17)	15 (17)	14 (16)	12 (15)	15 (17)	14 (16)	12 (15)	13 (16)	12 (15)	16 (17)	14 (16)	13 (15)	11 (14)	10 (13)
12以下	13 (14)	12 (14)	11 (13)	10 (12)	12 (14)	11 (13)	10 (12)	11 (13)	9 (12)	13 (14)	11 (13)	10 (12)	9 (11)	8 (10)
15以下	11 (12)	10 (12)	9 (11)	8 (10)	10 (12)	9 (11)	8 (10)	9 (11)	8 (10)	11 (12)	10 (11)	9 (11)	7 (9)	6 (8)
19以下		9 (10)	8 (10)	7 (9)		8 (10)	7 (9)	8 (9)	7 (9)		8 (10)	8 (9)	6 (8)	5 (7)
23以下			7 (8)	6 (8)			6 (8)		6 (7)			6 (8)	5 (7)	5 (6)
25以下			6 (8)	5 (7)			5 (7)		5 (7)			6 (7)	5 (6)	4 (5)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する必要がある場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

4) 電動式バイブロハンマとウォータジェット併用施工 ( $100 \leq N_{\max} \leq 180$ )

表3. 14 日当り施工枚(本)数(N)(陸上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	58	55	52	46	55	50	46	50	45	57	52	48	42	37
4以下	33	31	27	23	30	26	23	26	22	33	28	25	20	17
6以下	23	21	19	15	21	18	15	17	15	23	19	17	13	11
9以下	17	15	13	11	15	13	11	12	10	17	14	12	9	8
12以下	13	11	10	8	11	10	8	9	8	12	10	9	7	6
15以下	10	9	8	6	9	8	6	7	6	10	8	7	5	4
19以下		7	6	5		6	5	6	5		7	6	4	4
23以下			5	4			4		4			5	4	3
25以下			5	4			4		4			4	3	3

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表3. 15 日当り施工枚(本)数(N)(水上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	29	28	27	26	28	27	26	27	25	29	27	26	24	23
4以下	21	20	19	16	20	18	16	18	16	21	19	17	15	13
6以下	17	15	14	12	15	14	12	13	12	16	14	13	11	9
9以下	13	12	11	9	12	10	9	10	9	13	11	10	8	7
12以下	10	10	8	7	9	8	7	8	7	10	9	8	6	5
15以下	9	8	7	6	8	7	6	6	5	9	7	6	5	4
19以下		7	6	5		6	5	5	5		6	5	4	3
23以下			5	4			4		4			4	3	3
25以下			4	3			3		3			4	3	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

## 5) 油圧式バイプロハンマとウォータジェット併用施工

表3. 16 日当り施工枚(本)数(N)(陸上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	61 (66)	58 (64)	55 (62)	51 (58)	58 (64)	54 (61)	50 (58)	53 (60)	49 (57)	56 (62)	52 (60)	46 (55)	42 (51)
4以下	36 (42)	34 (40)	31 (37)	27 (34)	33 (39)	30 (36)	26 (33)	29 (36)	26 (33)	31 (38)	28 (35)	23 (30)	20 (27)
6以下	26 (30)	24 (29)	21 (27)	18 (24)	23 (28)	21 (26)	18 (23)	20 (25)	17 (23)	22 (27)	19 (25)	16 (21)	13 (19)
9以下	19 (23)	17 (21)	15 (20)	13 (17)	17 (21)	15 (19)	13 (17)	14 (19)	12 (17)	16 (20)	14 (18)	11 (15)	9 (13)
12以下	14 (17)	13 (16)	11 (15)	10 (13)	13 (16)	11 (14)	9 (13)	11 (14)	9 (12)	12 (15)	10 (14)	8 (11)	7 (10)
15以下	12 (14)	10 (13)	9 (12)	8 (10)	10 (13)	9 (12)	8 (10)	9 (11)	7 (10)	9 (12)	8 (11)	6 (9)	5 (8)
19以下		8 (11)	7 (10)	6 (8)		7 (10)	6 (8)	7 (9)	6 (8)	8 (10)	7 (9)	5 (7)	4 (6)
23以下			6 (8)	5 (7)			5 (7)		5 (7)		5 (7)	4 (6)	4 (5)
25以下			5 (7)	4 (6)			4 (6)		4 (6)		5 (7)	4 (5)	3 (5)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表3. 17 日当り施工枚(本)数(N)(水上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	30 (31)	29 (30)	28 (30)	27 (29)	29 (30)	28 (30)	27 (29)	28 (29)	27 (29)	28 (30)	27 (29)	26 (28)	24 (27)
4以下	22 (24)	21 (23)	20 (23)	18 (21)	21 (23)	20 (22)	18 (21)	19 (22)	18 (21)	20 (23)	19 (22)	17 (20)	15 (18)
6以下	18 (20)	17 (19)	15 (18)	14 (17)	17 (19)	15 (18)	14 (17)	15 (18)	13 (16)	16 (18)	14 (17)	12 (15)	11 (14)
9以下	14 (16)	13 (16)	12 (15)	10 (13)	13 (15)	12 (14)	10 (13)	11 (14)	10 (13)	12 (15)	11 (14)	9 (12)	8 (11)
12以下	11 (13)	11 (13)	10 (12)	8 (11)	10 (13)	9 (12)	8 (11)	9 (11)	8 (10)	10 (12)	9 (11)	7 (9)	6 (8)
15以下	10 (11)	9 (11)	8 (10)	7 (9)	9 (11)	8 (10)	7 (9)	7 (9)	6 (9)	8 (10)	7 (9)	6 (8)	5 (7)
19以下		7 (9)	7 (8)	6 (7)		6 (8)	6 (7)	6 (8)	5 (7)	7 (9)	6 (8)	5 (7)	4 (6)
23以下			6 (7)	5 (6)			5 (6)		4 (6)		5 (7)	4 (5)	3 (5)
25以下			5 (6)	4 (6)			4 (6)		4 (5)		4 (6)	3 (5)	3 (4)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。



6) 油圧式バイプロハンマとウォータージェット併用施工 ( $100 \leq N_{\max} \leq 180$ )

表3. 18 日当り施工枚(本)数(N)(陸上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	51	48	44	38	47	42	38	41	36	45	40	33	29
4以下	27	24	21	17	24	20	17	20	16	22	19	15	12
6以下	18	16	14	11	16	13	11	13	11	15	12	9	8
9以下	13	12	10	8	11	9	8	9	7	10	9	6	5
12以下	10	9	7	6	8	7	6	7	5	8	6	5	4
15以下	8	7	6	4	7	5	4	5	4	6	5	4	3
19以下		5	5	4		4	4	4	3	5	4	3	2
23以下			4	3			3		3		3	2	2
25以下			3	3			3		2		3	2	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表3. 19 日当り施工枚(本)数(N)(水上施工)

[枚(本)/日]

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	V <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	27	26	25	23	26	24	23	24	22	25	24	21	19
4以下	18	17	15	13	17	15	13	15	13	16	14	12	10
6以下	14	13	11	9	12	11	9	10	9	12	10	8	7
9以下	11	10	8	7	9	8	7	8	7	9	7	6	5
12以下	8	7	6	5	7	6	5	6	5	7	6	4	4
15以下	7	6	5	4	6	5	4	5	4	5	5	3	3
19以下		5	4	3		4	3	4	3	4	4	3	2
23以下			4	3			3		3		3	2	2
25以下			3	2			2		2		3	2	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

## (2) 打込み（継施工有り）

鋼矢板，H形鋼 1 枚（本）につき 1 箇所継施工（打込み）する場合の日当り打込枚数及び本数（N）は，表 3. 20～表 3. 31 を標準とする。

また，鋼矢板，H形鋼 1 枚（本）につき 2 箇所以上継施工を行う場合は，表 3. 32 の補正係数（F）を，表 3. 20～表 3. 31 の枚数及び本数に乗じて，1 日当り継施工枚数及び本数を次式により求める。

鋼矢板，H形鋼 1 枚（本）当り X 箇所継ぐ場合の日当り継施工枚数及び本数＝ $N \times F$

なお，日当り継施工枚数及び本数については，小数点第 1 位を四捨五入し、整数とする。

1) 電動式バイブロハンマによる施工（ $N_{\max} < 50$ ）

表 3. 20 日当り継施工枚（本）数（N）（陸上施工）（1 枚（本）当り 1 箇所継ぎ）

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2 以下	21	17	15	8	19	15	10	10	8	18	14	13	10
4 以下	20	16	14	8	18	14	10	9	7	17	13	12	9
6 以下	19	15	13	8	17	13	9	9	7	16	12	11	9
9 以下	18	14	12	7	16	12	9	8	7	15	11	10	8
12 以下	17	13	11	7	15	11	8	8	6	14	10	9	7
15 以下	16	12	10	6	14	11	8	8	6	12	10	8	6
19 以下		12	10	6		10	7		6		9	8	6
23 以下			9	6			7				8	7	5
25 以下			9	6			7				8	6	5

（注）施工枚（本）数には，導材（ガイド）及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表 3. 21 日当り継施工枚（本）数（N）（水上施工）（1 枚（本）当り 1 箇所継ぎ）

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2 以下	15	13	12	7	14	12	9	8	7	14	11	10	9
4 以下	15	12	11	7	14	11	8	8	6	13	11	10	8
6 以下	14	12	10	7	13	11	8	8	6	12	10	9	7
9 以下	14	11	10	6	12	10	8	7	6	11	10	8	7
12 以下	13	11	9	6	12	9	7	7	6	11	9	8	6
15 以下	12	10	9	6	11	9	7	7	5	10	8	7	6
19 以下		10	9	6		9	7		5		8	7	5
23 以下			8	5			6				7	6	5
25 以下			8	5			6				7	6	5

（注）施工枚（本）数には，導材（ガイド）の施工手間が含まれている。

2) 油圧式バイプロハンマによる施工 ( $N_{\max} < 50$ )

表 3. 22 日当り継施工枚(本)数(N) (陸上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	21	17	15	8	19	15	10	10	8	18	14	13	10
4以下	20	16	14	8	18	14	10	9	7	17	13	11	9
6以下	19	15	13	8	17	13	9	9	7	16	12	10	8
9以下	18	14	12	7	16	12	9	8	7	14	11	9	8
12以下	16	13	11	7	14	11	8	8	6	13	10	9	7
15以下	15	12	10	6	13	10	7	7	6	12	9	8	6
19以下		11	9	6		9	7		5		9	7	6
23以下			9	5			6				8	6	5
25以下			8	5			6				7	6	5

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表 3. 23 日当り継施工枚(本)数(N) (水上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	15	13	12	7	14	12	9	8	7	14	11	10	9
4以下	15	12	11	7	14	11	8	8	6	13	11	10	8
6以下	14	12	10	7	13	11	8	8	6	12	10	9	7
9以下	13	11	10	6	12	10	7	7	6	11	9	8	7
12以下	13	11	9	6	12	9	7	7	5	11	9	7	6
15以下	12	10	9	6	11	9	7	6	5	10	8	7	6
19以下		10	8	5		8	6		5		7	6	5
23以下			8	5			6				7	5	5
25以下			7	5			5				7	5	4

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

## 3) 電動式バイブロハンマとウォータジェット併用施工

表 3. 24 日当り継施工枚(本)数(N) (陸上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	22 (23)	17 (18)	15 (15)	8 (9)	20 (21)	15 (16)	11 (11)	10 (10)	8 (8)	19 (19)	14 (15)	13 (13)	10 (11)
4以下	18 (19)	15 (15)	13 (13)	8 (8)	17 (18)	13 (14)	9 (10)	9 (9)	7 (7)	15 (16)	12 (13)	11 (11)	9 (9)
6以下	16 (17)	13 (14)	11 (12)	7 (7)	14 (15)	11 (12)	8 (9)	8 (8)	6 (7)	13 (14)	10 (11)	9 (10)	7 (8)
9以下	13 (14)	11 (12)	9 (10)	6 (7)	12 (13)	10 (11)	7 (8)	7 (8)	6 (6)	11 (12)	9 (10)	8 (9)	6 (7)
12以下	11 (12)	9 (10)	8 (9)	5 (6)	10 (11)	8 (9)	6 (7)	6 (7)	5 (6)	9 (10)	8 (9)	6 (8)	5 (6)
15以下	9 (11)	8 (9)	7 (8)	5 (5)	9 (10)	7 (8)	5 (6)	5 (6)	5 (5)	8 (9)	7 (8)	5 (7)	5 (6)
19以下		8 (8)	7 (8)	4 (5)		6 (7)	5 (6)	5 (6)	4 (5)	7 (8)	6 (7)	5 (6)	4 (5)
23以下			6 (7)	4 (5)			5 (5)		4 (4)		5 (6)	4 (5)	4 (5)
25以下			5 (6)	4 (4)			4 (5)		4 (4)		5 (6)	4 (5)	3 (4)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表 3. 25 日当り継施工枚(本)数(N) (水上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	16 (16)	13 (14)	12 (12)	7 (8)	15 (15)	12 (12)	9 (9)	8 (9)	7 (7)	14 (14)	11 (12)	10 (11)	9 (9)
4以下	14 (14)	12 (12)	10 (11)	7 (7)	13 (13)	11 (11)	8 (8)	8 (8)	6 (6)	12 (13)	10 (10)	9 (10)	7 (8)
6以下	12 (13)	10 (11)	9 (10)	6 (6)	11 (12)	9 (10)	7 (8)	7 (7)	6 (6)	11 (11)	9 (10)	8 (9)	7 (7)
9以下	11 (11)	9 (10)	8 (9)	5 (6)	10 (11)	8 (9)	6 (7)	6 (7)	5 (6)	9 (10)	8 (8)	7 (8)	6 (7)
12以下	9 (10)	8 (9)	7 (8)	5 (5)	9 (10)	7 (8)	6 (6)	6 (6)	5 (5)	8 (9)	7 (7)	6 (7)	5 (6)
15以下	8 (9)	7 (8)	6 (7)	4 (5)	8 (9)	6 (7)	5 (6)	5 (6)	4 (5)	7 (8)	6 (7)	5 (6)	4 (5)
19以下		7 (7)	6 (7)	4 (5)		6 (7)	5 (5)	5 (5)	4 (5)	6 (7)	6 (6)	4 (5)	4 (5)
23以下			5 (6)	4 (4)			4 (5)		4 (4)		5 (6)	4 (5)	4 (4)
25以下			5 (6)	3 (4)			4 (5)		3 (4)		5 (5)	4 (4)	3 (4)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

4) 電動式バイブロハンマとウォータージェット併用施工 ( $100 \leq N_{\max} \leq 180$ )

表 3. 26 日当り継施工枚(本)数(N) (陸上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	21	17	14	8	19	15	10	10	8	18	14	12	10
4以下	17	14	11	7	15	12	8	8	6	14	11	9	7
6以下	14	11	10	6	12	10	7	7	6	11	9	7	6
9以下	11	9	8	5	10	8	6	6	5	9	7	6	5
12以下	9	8	7	4	8	7	5	5	4	7	6	5	4
15以下	8	7	6	4	7	6	4	4	4	6	5	4	3
19以下		5	5	3		5	4	4	3	6	5	3	3
23以下			4	3			3		3		4	3	2
25以下			4	3			3		3		3	3	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表 3. 27 日当り継施工枚(本)数(N) (水上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	16	13	11	7	14	12	9	8	7	14	11	10	8
4以下	13	11	10	6	12	10	7	7	6	11	9	8	7
6以下	11	9	8	5	10	8	6	6	5	9	8	7	5
9以下	9	8	7	5	9	7	5	5	5	8	7	5	5
12以下	8	7	6	4	7	6	5	5	4	7	6	4	4
15以下	7	6	5	4	6	5	4	4	3	6	5	4	3
19以下		5	5	3		5	4	4	3	5	4	3	2
23以下			4	3			3		3		3	3	2
25以下			3	2			2		2		3	3	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

## 5) 油圧式バイプロハンマとウォータジェット併用施工

表 3. 28 日当り継施工枚(本)数(N) (陸上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	22 (22)	17 (17)	15 (15)	8 (9)	20 (20)	15 (16)	10 (11)	10 (10)	8 (8)	18 (19)	14 (14)	12 (13)	10 (10)
4以下	17 (19)	14 (15)	12 (13)	7 (8)	16 (17)	12 (13)	9 (9)	8 (9)	7 (7)	14 (16)	11 (12)	10 (11)	8 (9)
6以下	15 (16)	12 (13)	10 (11)	6 (7)	13 (14)	11 (12)	8 (8)	8 (8)	6 (6)	12 (14)	10 (11)	8 (9)	7 (8)
9以下	12 (14)	10 (11)	9 (10)	6 (6)	11 (12)	9 (10)	7 (7)	6 (7)	5 (6)	10 (11)	8 (9)	7 (8)	5 (7)
12以下	10 (11)	8 (10)	7 (9)	5 (6)	9 (10)	7 (8)	5 (7)	6 (6)	5 (5)	8 (10)	7 (8)	5 (7)	5 (6)
15以下	9 (10)	7 (8)	6 (8)	4 (5)	8 (9)	6 (8)	5 (6)	5 (6)	4 (5)	7 (8)	6 (7)	4 (6)	4 (5)
19以下		6 (8)	6 (7)	4 (4)		5 (7)	4 (5)	4 (5)	4 (4)	6 (7)	5 (6)	4 (5)	3 (4)
23以下			5 (6)	3 (4)			4 (5)		3 (4)		4 (5)	3 (4)	3 (4)
25以下			4 (5)	3 (4)			3 (4)		3 (4)		4 (5)	3 (4)	2 (4)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表 3. 29 日当り継施工枚(本)数(N) (水上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	16 (16)	13 (13)	12 (12)	7 (7)	15 (15)	12 (12)	9 (9)	8 (8)	7 (7)	14 (14)	11 (11)	10 (11)	8 (9)
4以下	13 (14)	11 (12)	10 (11)	6 (7)	12 (13)	10 (11)	8 (8)	7 (8)	6 (6)	11 (12)	10 (10)	9 (9)	7 (8)
6以下	12 (13)	10 (11)	9 (9)	6 (6)	11 (12)	9 (10)	7 (7)	7 (7)	5 (6)	10 (11)	8 (9)	7 (8)	6 (7)
9以下	10 (11)	8 (10)	8 (9)	5 (6)	9 (10)	8 (8)	6 (7)	6 (6)	5 (5)	8 (10)	7 (8)	6 (7)	5 (6)
12以下	8 (9)	8 (8)	7 (8)	4 (5)	8 (9)	6 (8)	5 (6)	5 (6)	4 (5)	7 (8)	6 (7)	5 (6)	4 (5)
15以下	8 (8)	7 (8)	6 (7)	4 (5)	7 (8)	6 (7)	5 (5)	4 (5)	4 (5)	6 (7)	5 (6)	4 (5)	4 (5)
19以下		5 (7)	5 (6)	4 (4)		5 (6)	4 (5)	4 (5)	3 (4)	6 (7)	5 (6)	4 (5)	3 (4)
23以下			5 (5)	3 (4)			4 (4)		3 (4)		4 (5)	3 (4)	2 (4)
25以下			4 (5)	3 (4)			3 (4)		3 (3)		3 (5)	3 (4)	2 (3)

(注) 1. 凡例

上 段:  $50 \leq N_{\max} < 100$ 下段( )書き:  $N_{\max} < 50$ で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

2. 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

6) 油圧式バイブロハンマとウォータージェット併用施工 ( $100 \leq N_{\max} \leq 180$ )

表 3. 30 日当り継施工枚(本)数(N) (陸上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	20	16	14	8	18	14	10	9	7	17	13	11	9
4以下	15	12	10	6	13	10	7	8	6	12	10	8	6
6以下	12	10	8	5	10	8	6	6	5	10	7	6	5
9以下	9	8	7	4	8	6	5	5	4	7	6	4	4
12以下	8	7	5	4	6	5	4	4	3	6	5	4	3
15以下	6	5	5	3	6	4	3	4	3	5	4	3	2
19以下		4	4	3		3	3	3	2	4	3	3	2
23以下			3	2			2		2		3	2	2
25以下			3	2			2		2		3	2	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)及び敷鉄板の施工手間が含まれている。

表 3. 31 日当り継施工枚(本)数(N) (水上施工) (1枚(本) 当り 1箇所継ぎ)

型式 打込長(m)	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型	H250	H300	H350	H400
2以下	15	12	11	7	14	11	8	8	6	13	11	9	8
4以下	12	10	9	6	11	9	7	7	5	10	8	7	6
6以下	10	8	7	5	9	7	5	5	5	8	7	5	5
9以下	8	7	6	4	7	6	5	5	4	7	5	4	4
12以下	6	5	5	3	6	5	4	4	3	6	5	3	3
15以下	6	5	4	3	5	4	3	4	3	4	4	3	2
19以下		4	3	2		3	2	3	2	3	3	3	2
23以下			3	2			2		2		3	2	2
25以下			3	2			2		2		3	2	2

(注) 施工枚(本)数には、導材(ガイド)の施工手間が含まれている。

## 7) 鋼矢板，H形鋼1枚（本）当り箇所継施工箇所数による補正

表 3. 32 補正係数(F)[鋼矢板(H形鋼)1枚(本)当り2箇所以上継施工を行う場合]

適 用		鋼矢板 II, III, IV, V <sub>L</sub> , II <sub>w</sub> , III <sub>w</sub> , IV <sub>w</sub> , 10H, 25H											
最 大 N 値		単独施工 (N <sub>max</sub> <50)				ウォータージェット併用施工 (50≤N <sub>max</sub> <100)				ウォータージェット併用施工 (100≤N <sub>max</sub> ≤180)			
継施工箇所数		2箇所	3箇所	4箇所	5箇所	2箇所	3箇所	4箇所	5箇所	2箇所	3箇所	4箇所	5箇所
補正係数 (F)	陸上施工	0.63	0.46	0.37	0.30	0.70 (0.67)	0.54 (0.51)	0.44 (0.42)	0.38 (0.35)	0.74	0.60	0.50	0.43
	水上施工	0.67	0.51	0.41	0.34	0.72 (0.70)	0.57 (0.55)	0.48 (0.45)	0.41 (0.38)	0.76	0.62	0.53	0.46

適 用		H形鋼 H250, H300, H350, H400											
最 大 N 値		単 独 施 工 (N <sub>max</sub> <50)				ウォータージェット併用施工 (50≤N <sub>max</sub> <100)				ウォータージェット併用施工 (100≤N <sub>max</sub> ≤180)			
継施工箇所数		2箇所	3箇所	4箇所	5箇所	2箇所	3箇所	4箇所	5箇所	2箇所	3箇所	4箇所	5箇所
補正係数 (F)	陸上施工	0.66	0.49	0.39	0.33	0.72 (0.69)	0.57 (0.54)	0.48 (0.44)	0.41 (0.37)	0.77	0.63	0.54	0.48
	水上施工	0.69	0.53	0.43	0.36	0.75 (0.72)	0.60 (0.57)	0.51 (0.47)	0.44 (0.40)	0.79	0.66	0.57	0.50

(注) ウォータージェット併用施工における ( ) 書きは、N<sub>max</sub><50 の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。

## (3) 継施工費

表 3. 33 継施工費

鋼矢板・H形鋼型式		継施工費(円/箇所)
鋼 矢 板	Ⅱ型	6,270
	Ⅲ型	6,610
	Ⅳ型	6,820
	V <sub>L</sub> 型	8,090
	V <sub>L</sub> 型	8,360
	Ⅱ <sub>w</sub> 型	7,470
	Ⅲ <sub>w</sub> 型	7,700
	Ⅳ <sub>w</sub> 型	8,230
	10H型(ハット)	12,200
	25H型(ハット)	13,100
H 形 鋼	H250	23,700
	H300	30,200
	H350	43,100
	H400	61,700

(注) 継施工費に含まれる費用は、次のとおりである。

鋼矢板継施工費：溶接棒費用，補強板材料費，開先加工費

H形鋼継施工費：補強板材料費，接続用ボルト・ナット材料費，

H形鋼孔明け加工費



## (4) 引抜き

鋼矢板、H形鋼の日当り引抜き枚数及び本数（N）は、次表を標準とする。

表3.34 日当り施工枚(本)数(N) [枚(本)/日]

引 抜 長 (m)	2以下	4以下	6以下	9以下	12以下	15以下	19以下	23以下	25以下
陸 上 施 工	91	78	68	58	50	43	38	33	30
水 上 施 工	50	46	42	38	34	31	28	25	24

## 3-4 諸雑費

諸雑費は、共下がり防止及び導材（ガイド）用の溶接棒及び電気溶接機損料、導材（ガイド）賃料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、ウォータジェット併用施工用付属機器に関する経費（配管バンド及び溶接棒、電気溶接機損料、工事用水中モータポンプ損料、水槽及び配管損料）、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に下表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3.35 諸雑費率 (%)

施 工 区 分	バイプロハンマ 規 格		諸 雑 費 率				
			継 続 施 工 無 し		継 続 施 工 有 り		
			普通・広幅 鋼矢板 H形鋼	ハット形 鋼矢板	普通・広幅 鋼矢板	ハット形 鋼矢板	H形鋼
バイプロハンマ 単独施工・打込み	電動式	60kW	19 13	16 11	17 12	15 11	17 12
		90kW	22 15	18 13	20 14	17 12	20 14
	油圧式	235kW	1 1	1 1	2 1	2 1	1 1
ウォータジェット 併用施工・打込み	電動式	60kW	18(22) 14(16) (注)2	16(19) 13(15) (注)2	18(21) 14(16) (注)2	16(19) 13(15) (注)2	17(20) 13(15) (注)2
		90kW	20(24) 15(18) (注)2	18(21) 14(16) (注)2	20(23) 15(18) (注)2	17(20) 14(16) (注)2	19(22) 15(17) (注)2
	油圧式	235kW	6(7) 5(5) (注)2	5(6) 5(5) (注)2	6(7) 5(6) (注)2	6(6) 5(5) (注)2	5(6) 5(5) (注)2
引 抜 き	電動式	60kW	18 12 (注)3	—	—	—	—
	油圧式	235kW	0.2 — (注)3	—	—	—	—

(注) 1. 凡例

上段：陸上施工の場合

下段：水上施工の場合

2. ウォータジェット併用施工・打込みにおける（ ）書きは、 $N_{\max} < 50$  の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する必要が生じた場合に計上する。

3. 引抜きの諸雑費率は、広幅鋼矢板には適用しない。

## 3-5 その他

(1) ウォータジェット併用施工時に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

(2) ウォータジェット併用施工時に発生する濁水の運搬・処理が必要な場合は別途計上する。

## 4. 単価表

(1) バイプロハンマ施工による鋼矢板等の打込み又は引抜き 10 枚（本） 当り単価表

(鋼矢板)SWB250200

(H 型鋼)SWB250210

(引抜き)SWB250240

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 3. 6 表 3. 8～3. 11, 3. 20～3. 23, 3. 32, 3. 34
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	〃 〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
溶 接 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 (必要に応じて計上) 〃
バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 3. 1～3. 4 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 200PS 型 15GT	〃	$\frac{10}{N}$	表 3. 5 (必要に応じて計上) 〃 機械損料
ク レ ー ン 付 台 船 運 転	台船 300t 積 クローラクレーン 45～50t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (必要に応じて計上) 〃 機械損料
矢 板 積 台 船 運 転	200t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (必要に応じて計上) 〃 機械損料
継 施 工 費		箇所	10× X	表 3. 33 (必要に応じて計上)
諸 雑 費		式	1	表 3. 35
計				

(注) N：日当り施工枚（本）数〔枚（本）/日〕

X：1 枚（本）当り継施工箇所数〔箇所/枚（本）〕

（ ）書き：H形鋼（継施工有り）の場合に適用する。

- (2) バイプロハンマとウォータージェット併用施工による鋼矢板等の打込み 10 枚（本） 当り単価表（鋼矢板）SWB250220  
（H 型鋼）SWB250230

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 3.6 表 3.12～3.19, 3.24～3.32, 3.34
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	〃 〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
溶 接 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$	〃 〃
バイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 3.1～3.2, 3.4 〃 機械損料
杭打ち用ウォーター ジェット 運 転	エンジン式・排出ガス対策型（第 1 次基準値）ポンプ圧力 14.7MPa, 吐出量 325ℓ/min	〃	$\frac{10}{N} \times \text{台数}$	表 3.1～3.2 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 200PS 型 15GT	〃	$\frac{10}{N}$	表 3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料
クレーン付台船運転	台船 300t 積 クローラークレーン 45～50t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料
矢板積台船運転	200t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料
継 施 工 費		箇所	10×X	表 3.33（必要に応じて計上）
諸 雑 費		式	1	表 3.35
計				

- (注) N：日当り施工枚（本）数〔枚（本）/日〕  
X：1 枚（本）当り継施工箇所数〔箇所/枚（本）〕  
（ ）書き：H形鋼（継施工有り）の場合に適用する。  
[ ] 書き：鋼矢板（継施工有り）の場合に適用する。

- (3) 矢板積台船（200t 積）運転 1 日当り単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
矢板積台船	200t 積	供用日	1.3	機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (4) 機械運転単価表 (陸上施工)

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	適用
パイプロハンマ 杭 打 機	電動式・普通型 60kW 90kW	機-20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 69 機械損料1 → パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型] 60kW, 90kW 機械損料数量 → 1.3 機械損料2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値)]50～55t 吊 機械損料数量 → 1.3	打込み 引抜き
パイプロハンマ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	電動式・ 可変モーメント型 60kW 90kW	機-20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 69 機械損料1 → パイプロハンマ (単体) [電動式・可変モーメント型] 60kW, 90kW 機械損料数量 → 1.3 機械損料2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値)]50～55t 吊 機械損料数量 → 1.3	打込み
パイプロハンマ 杭 打 機	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 235kW	機-20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 523 機械損料1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出ガス対 策型(第2次基準値)] 機械損料数量 → 1.3 機械損料2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値)]50～55t 吊 機械損料数量 → 1.3	打込み
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 570 機械損料1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出ガス対 策型(第2次基準値)] 機械損料数量 → 1.2 機械損料2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第 1次基準値)]25t 吊 機械損料数量 → 1.2	引抜き
パイプロハンマ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 235kW	機-20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 523 機械損料1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出ガス対 策型(第2次基準値)] 機械損料数量 → 1.3 機械損料2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値)]50～55t 吊 機械損料数量 → 1.3	打込み
杭 打 ち 用 ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	機-24	燃料消費量 → 120 機械損料数量 → 1.3	打込み

## (5) 機械運転単価表 (水上施工)

名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バイプロハンマ ( 単 体 )	電動式・普通型 60kW, 90kW	機-25	機械損料数量 → 1.3
バイプロハンマ ( 単 体 ) (ハット形鋼矢板用)	電動式・可変モーメント型 60kW, 90kW	機-25	機械損料数量 → 1.3
バイプロハンマ ( 単 体 )	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 235kW	機-24	燃料消費量 → 454 機械損料数量 → 1.3
バイプロハンマ ( 単 体 ) (ハット形鋼矢板用)	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 235kW	機-24	燃料消費量 → 454 機械損料数量 → 1.3
杭 打 ち 用 ウオータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325 ℓ/min	機-24	燃料消費量 → 120 機械損料数量 → 1.3
クレーン付台船	クローラクレーン 45~50t 吊 台船 300t 積	機-11	船員名称 → 高級船員 運転労務数量 → 1.0 (クローラクレーン) 燃料消費量 → 51 機械損料数量 → 1.3 機械損料単位 → 供用日 (台 船) 機械損料数量 → 1.3
引 船	鋼製 D 200PS 型 15GT	機-11	船員名称 → 高級船員 運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 111 (重油) 機械損料数量 → 1.0 機械損料単位 → 供用日

## ②-2 バイブロハンマエ（軽量鋼矢板打込引抜工）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、電動式バイブロハンマによる軽量鋼矢板の打込み、引抜きに適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

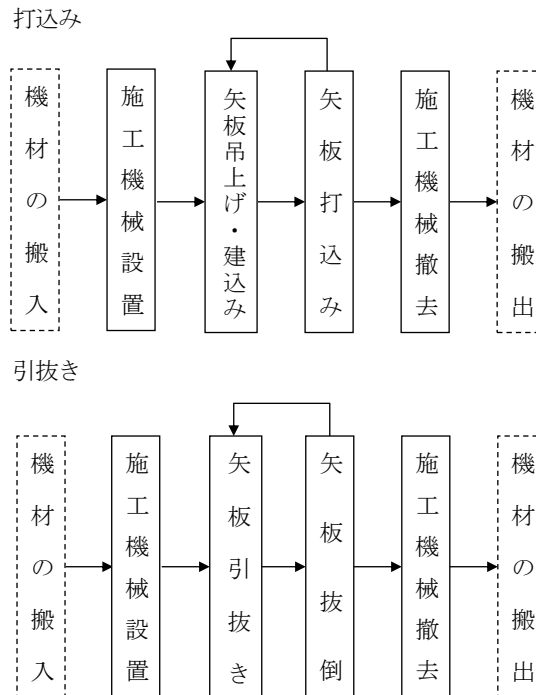


図 2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

機械・規格は次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
バイブロハンマ	15kW	台	1	
クローラクレーン	機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型 16t 吊	〃	1	
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16t 吊	〃	1	必要時のみ計上
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型（第1次基準値） 17/20kVA	〃	1	〃

（注）1. トラッククレーンは、現場内小運搬用として次の場合のみ計上する。

①施工場所から 30m 以内のところに矢板置場を設けることができない場合

②作業場所が狭小で民家その他施設、構造物などを破損又は危険にさらす恐れのある場合

2. 発動発電機は、商用電源がない場合に計上する。

## 4. 編成人員

軽量鋼矢板の打込み、引抜き作業の編成人員は、次表を標準とする。

表 4.1 打込み、引抜き作業の編成人員 (人)

土木一般世話役	とび工	普通作業員
1	2	1

## 5. 施工歩掛

## 5-1 打込み及び引抜き施工時間

矢板 1 枚当り打込み及び引抜き施工時間は、次式による。

$$TC = \frac{Ts + Tb}{fc} \dots\dots\dots (\text{分/枚})$$

TC : 矢板 1 枚当り施工時間 (分/枚)

Ts :     "       準備時間 (分/枚)

Tb :     "       打込み又は引抜き時間 (分/枚)

fc : 現場の条件による作業係数

## (1) 軽量鋼矢板 1 枚当り準備時間 (Ts)

軽量鋼矢板 1 枚当り準備時間は、次表を標準とする。

表 5.1 軽量鋼矢板 1 枚当り準備時間(Ts) (分/枚)

打 込 み	引 抜 き
$Ts = 0.3 \cdot L + 2$	$Ts = 0.15 \cdot L + 1.5$

(注) L : 矢板長さ (m)

## (2) 軽量鋼矢板 1 枚当り打込み又は引抜き時間 (Tb)

$$Tb = \gamma \cdot t \cdot K \dots\dots\dots (\text{分/枚})$$

$\gamma$  : 土質による打込み又は引抜き時間 (分/m)

t : 矢板根入長 (m)

K : 軽量鋼矢板の種類による係数

① 土質による打込み又は引抜き時間 ( $\gamma$ )

土質による打込み又は引抜き時間は、次表を標準とする。

表 5.2 打込み又は引抜き時間 (分/m)

工 種		( $\gamma_1$ ) レキ質土・砂・砂質土	( $\gamma_2$ ) 粘性土
打 込	バイブロハンマ	$0.02 \cdot N_1 + 0.7$	$0.03 \cdot N_2 + 0.7$
引 抜	バイブロハンマ	0.4	0.7

(注)1.  $N_1$ ,  $N_2$  : 各地質ごとの根入長に対する加重平均N値

2.  $\gamma$  の算出については  $\gamma_1 \cdot \gamma_2$  を各々算出し、下式により加重平均する。

$$\gamma = \frac{\gamma_1 \times \ell_1 + \gamma_2 \times \ell_2}{\ell_1 + \ell_2}$$

$\gamma$  : 土質による打込み又は引抜き時間 (分/m)

$\gamma_1$  : レキ質土・砂・砂質土の打込み又は引抜き時間 (分)

$\ell_1$  :  $\gamma_1$  に対する根入長 (m)

$\gamma_2$  : 粘性土の打込み又は引抜き時間 (分)

$\ell_2$  :  $\gamma_2$  に対する根入長 (m)

## ② 軽量鋼矢板の種類による係数 (K)

表 5.3 軽量鋼矢板の種類による係数(K)

矢 板 種 類	打 込 み	引 抜 き
軽量鋼矢板 250mm	0.5	0.6
軽量鋼矢板 333mm	0.8	0.95

③ 現場の条件による作業係数（ $f_c$ ）

作業係数は、次式による。

$$f_c = f_0 + f_1 + f_2 + f_3 + f_4$$

 $f_0$ ：基準作業係数 $f_1 \sim f_4$ ：作業条件による補正係数表 5.4 基準作業係数( $f_0$ )

打 込 み	引 抜 き
0.8	0.7

表 5.5 作業条件による補正係数

条 件 \ 係 数		-0.05	0	+0.05	摘 要
$f_1$	家屋、鉄道、橋梁、道路施設、構造物などによる障害の程度	かなりある	な し	－	作業中断の有無、並びに機械の行動に制約される。
$f_2$	現場の広さによる作業難易の程度	不 良	普 通	－	機械の移動、矢板の仮置場所、矢板の吊込みなどに十分な広さがあるか。
$f_3$	足場の状況により作業に及ぼす程度	不 良	普 通	良	不陸、軟弱等による足場の良否
$f_4$	施 工 規 模 (1 工事当り)	100 枚未満	100 枚以上 300 枚未満	300 枚以上	

## 5-2 運転時間

## (1) バイプロハンマ、クローラクレーン、発動発電機

- ・軽量鋼矢板 1 枚当り運転時間＝ $TC$
- ・運転日当り運転時間（ $T$ ）＝「建設機械等損料表」のバイプロハンマの標準時間
- ・バイプロハンマの電源に商用電源を用いた場合の電力料の算出は、1 枚当り施工時間（ $TC$ ）に、0.7 を乗じたものとする。

## (2) トラッククレーン

- ・軽量鋼矢板 1 枚当り運転時間＝ $TC \times 0.6$



## 6. 単価表

## (1) バイプロハンマによる軽量鋼矢板打込み又は引抜き 10 枚当り単価表

SWB251010

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$	表 4.1
と び 工		〃	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 2$	〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$	〃
バ イ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		h	$\frac{10 \cdot TC}{60}$	ベースマシン + バイプロハンマ
発 動 発 電 機 運 転		日	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T}$	必要に応じて計上
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転		h	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times 0.6$	〃
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) T=バイプロハンマ運転日当り運転時間 (h)

TC=軽量鋼矢板 1 枚当り施工時間 (分)

(小数第 1 位四捨五入、整数止めとする。)

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
電 動 式 バ イ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	15kW	機-5	機械損料 1→バイプロハンマ 15kW (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→バイプロハンマの時間当り電力消費量 (kWh) T→バイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジ ン駆動・排出ガス 対策型 (第 1 次基準値) 17/20kVA	機-12	運転時間→バイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 16t 吊	機-1	

## ②-3 油圧圧入引抜き工（建地-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、油圧式杭圧入引抜き機による鋼矢板の圧入（ $N_{max} \leq 600$ ）及び引抜きの施工に適用する。

なお、継矢板の施工法は、先行する鋼矢板を圧入後、それに接続する鋼矢板を鉛直に建込んだ状態で継手部を溶接するものである。

$N_{max} \leq 50$  の施工における油圧式杭圧入引抜き機の反力チャックのつかみ代は次のとおりとする。

- ・Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ<sub>L</sub>、Ⅵ<sub>L</sub>、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw型の場合：500mmを標準とする。
- ・ハット形鋼矢板（10H、25H型）の場合：550mmを標準とする。

$N_{max} \leq 50$  の施工における布掘深さ（又は、地表面よりの余裕高さ）は反力チャックのつかみ代と同じ幅を標準とする。なお、 $50 < N_{max} \leq 600$  の施工における布掘深さ（又は、地表面よりの余裕高さ）は、1,000mmを標準とする。

また、鋼矢板型式毎の圧入長（引抜長）の適用範囲は、次表を標準とし、これにより難しい場合は、別途考慮する。

表 1.1 圧入長(引抜長) (m)

鋼矢板の型式		Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ <sub>L</sub> 型	Ⅵ <sub>L</sub> 型	Ⅱw型	Ⅲw型	Ⅳw型	10H型	25H型
圧入長	$N_{max} \leq 25$	10以下	15以下	20以下	25以下	25以下	12以下	25以下	25以下	12以下	25以下
	$N_{max} \leq 50$	12以下	18以下	20以下	25以下	25以下	14以下	25以下	25以下	14以下	25以下
	$50 < N_{max} \leq 600$	10以下	15以下	20以下	25以下	25以下	12以下	25以下	25以下	—	—
引抜長		12以下	18以下	20以下	25以下	25以下	—				

(注) 1. 圧入長（引抜長）とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長（引抜長）であり、鋼矢板長とは異なる。

2. 圧入（ $N_{max} \leq 50$ ）は、杭打ち用ウォータジェットを使用する場合に適用するものとし、 $N_{max} \leq 25$ においても転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する場合は適用できる。


3. 最小圧入長は、4.0m以上を標準とする。

4. 圧入（ $600 < N_{max}$ ）は別途考慮する。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー


施工フローは、下記を標準とする。

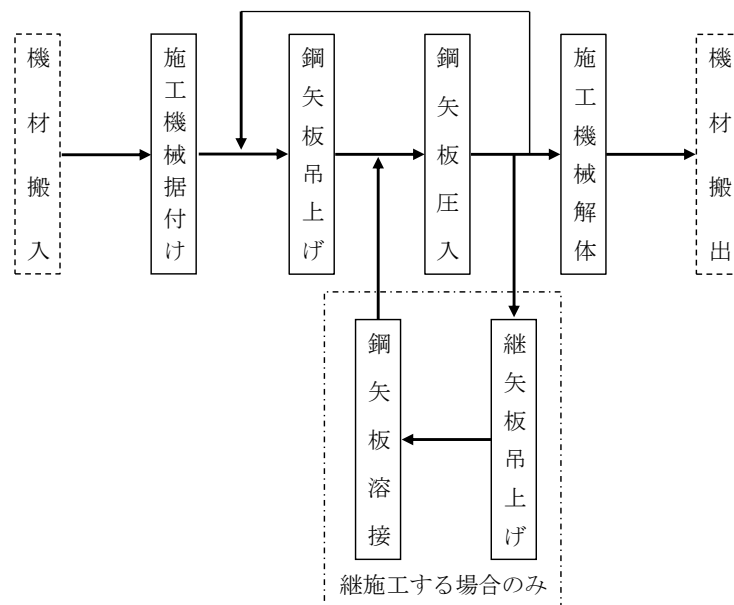(1) 圧入（ $N_{max} \leq 25$ ）

※ 施工機械足場用の敷鉄板の施工を含む。

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。


図 2-1 施工フロー(圧入( $N_{max} \leq 25$ ))

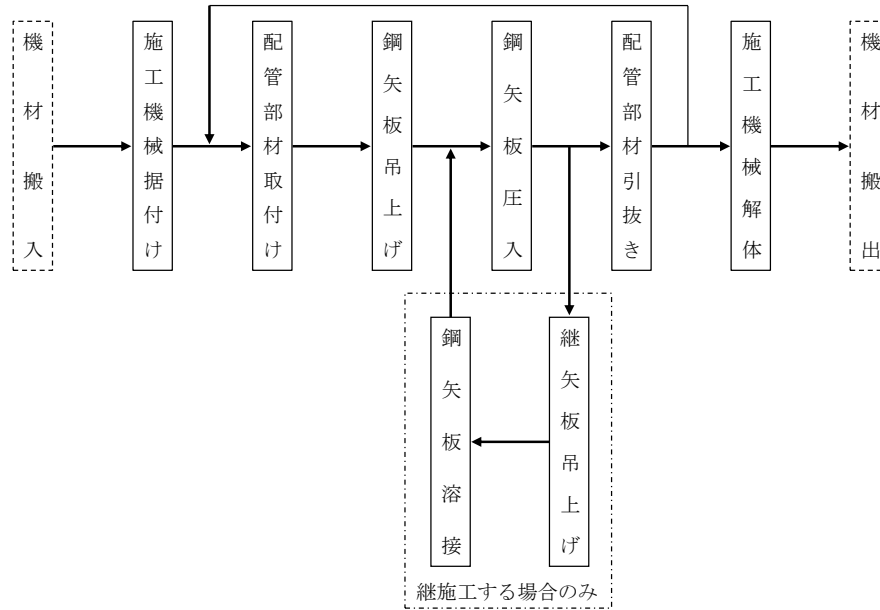(2) 圧入 ( $N_{max} \leq 50$ )

※ 施工機械足場用の敷鉄板の施工を含む。

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-2 施工フロー(圧入 ( $N_{max} \leq 50$ ))

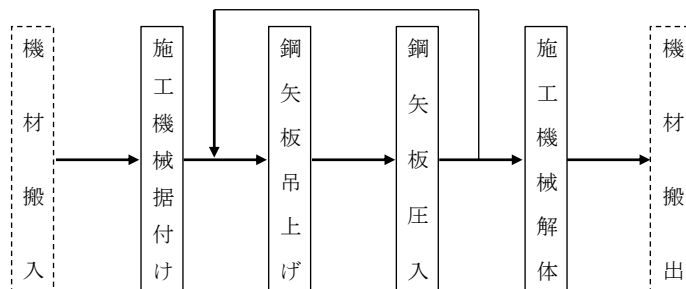
(3) 圧入 ( $50 < N_{max} \leq 600$ )

※ 施工機械足場用の敷鉄板の施工を含む。

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-3 施工フロー(圧入 ( $50 < N_{max} \leq 600$ ))

## (4) 引抜き

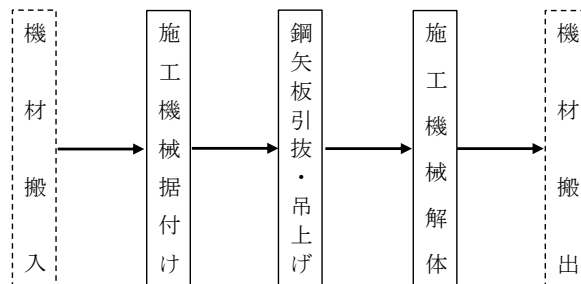

※ 施工機械足場用の敷鉄板の施工を含む。

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-4 施工フロー(引抜き)

## 3. 施工歩掛

## 3-1 機種を選定

## (1) 油圧式杭圧入引抜機

油圧式杭圧入引抜機の規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種を選定

作業の種類		圧 入			引 抜 き
最 大 N 値		Nmax≦25	Nmax≦50	50<Nmax≦600	－
鋼 矢 板 型 式	Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	エンジン式ユニット・ 排出ガス対策型 （第1次基準値） 圧入力 981～1,471kN 引抜力 1,079～1,569kN		エンジン式ユニット （硬質地盤専用）・ 排出ガス対策型 （第2次基準値） 普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	エンジン式ユニット・ 排出ガス対策型 （第1次基準値） 圧入力 981～1,471kN 引抜力1,079～1,569kN
	V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	エンジン式ユニット・ 排出ガス対策型 （第1次基準値） 広幅鋼矢板用 圧入力 981～1,471kN 引抜力1,079～1,569kN		エンジン式ユニット （硬質地盤専用）・ 排出ガス対策型 （第2次基準値） 広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	エンジン式ユニット・ 排出ガス対策型 （第1次基準値） 広幅鋼矢板用 圧入力 981～1,471kN 引抜力1,079～1,569kN
	Ⅱ <sub>w</sub> ・Ⅲ <sub>w</sub> ・Ⅳ <sub>w</sub> 型			－	
	10H・25H型	エンジン式ユニット・ 排出ガス対策型 （第2次基準値） ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN		－	－

(注) 圧入 ( $N_{max} \leq 50$ ) は、杭打ち用ウォータージェットを使用する場合に適用するものとし、 $N_{max} \leq 25$ においても転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する場合は適用できる。

油圧式杭圧入引抜機の付属機械の機械・規格は、次表を標準とする。

作業の種類 機械名	圧入 (Nmax≤25) 引抜き	圧入 (Nmax≤50)	圧入 (50<Nmax≤600)	備 考
ラフテレーンクレーン (注)4	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t 吊 (注)2		油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t 吊 (注)2	陸上からの施工時のみ
杭 打 ち 用 ウオータージェット	—	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	—	
クレーン付台船	クローラクレーン 35～40t 吊 台船 300t 積 (注)3		—	水上からの施工時のみ
引 船	鋼製 D 100PS 型 4.9GT (注)3		—	

5. 濁水処理装置が必要な場合は、「第Ⅱ編5章⑮濁水処理工（一般土木工事）」により別途計上する。

## 3-2 日当り編成人員

(1) 油圧圧入引抜き工の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表 3. 3 日当り編成人員 (人/日)

作 業 の 種 類	土木一般世話役	特 殊 作 業 員	と び 工	溶 接 工 (注) 2
圧入 ( $N_{\max} \leq 25$ )	1	1	2	2
圧入 ( $N_{\max} \leq 50$ )	1	1	2	2
圧入 ( $50 < N_{\max} \leq 600$ )	1	1	2	—
引抜き	1	1	2	—

(注) 1. 圧入 ( $N_{\max} \leq 50$ ) は、杭打ち用ウォータージェットを使用する場合に適用する。

2. 溶接工は継矢板を施工する場合のみ計上する。

(2) 水上施工の1船団に対する船舶作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表3. 4 船舶作業の日当り編成人員 (人/日)

職 種	レ ー ン 付 台 船	船
高 級 船 員	1	1

(注) 1. 船員は、休日以外の休止日については、共通仮設費の準備費における繋船費として計上する。

2. 潜水士が必要な場合は、船員と同様な方法で別途計上する。

3. 海上及び港湾工事で、上表により難しい場合は別途考慮する。

4. 上表は、圧入又は引抜き作業の配置人員であり、搬入、搬出等の回航は共通仮設費の運搬費として計上する。

## 3-3 日当り施工枚数

(1) 圧入、引抜き（継施工なし）

鋼矢板の圧入及び引抜き作業における日当り施工枚数 (N) は、表 3. 5～表 3. 12 を標準とする。

1) 圧入 ( $N_{\max} \leq 25$ )

表 3. 5 日当り施工枚数 (N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	35	28	22	18	15	13	—
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	31	24	19	16	13	11	9.7
Ⅱ <sub>w</sub> ・Ⅲ <sub>w</sub> ・Ⅳ <sub>w</sub> 型	31	24	19	15	13	11	9.5
10H・25H型	28	21	17	14	11	9.3	8.3

(注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。

2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。

3. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。

4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。

2) 圧入 ( $N_{\max} \leq 50$ )

表 3.6 日当り施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	24 (27)	19 (22)	16 (18)	13 (15)	11 (13)	9.3 (11)	— (—)
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	23 (25)	18 (20)	14 (16)	12 (14)	10 (12)	8.4 (9.9)	7.5 (8.9)
Ⅱ <sub>w</sub> ・Ⅲ <sub>w</sub> ・Ⅳ <sub>w</sub> 型	23 (25)	18 (20)	14 (16)	12 (14)	9.8 (11)	8.3 (9.7)	7.4 (8.7)
10H・25H型	21 (23)	16 (19)	13 (15)	11 (12)	8.7 (10)	7.3 (8.8)	6.5 (7.8)

- (注) 1. 圧入 ( $N_{\max} \leq 50$ ) は、杭打ち用ウォータージェットを使用する場合に適用する。  
 2. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 3. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 4. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 5. 上 段： $25 < N_{\max} \leq 50$   
 下段( )書き： $N_{\max} \leq 25$  で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。  
 6. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。

3) 圧入 ( $50 < N_{\max} \leq 100$ )

表 3.7 日当り施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	13	9.2	6.9	5.5	4.4	3.6	—
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	12	8.2	6.1	4.8	3.9	3.2	2.8
Ⅱ <sub>w</sub> ・Ⅲ <sub>w</sub> ・Ⅳ <sub>w</sub> 型	12	8.2	6.1	4.8	3.9	3.2	2.8

- (注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 3. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。  
 5. 本歩掛は、オーガによる先行掘削の有無にかかわらず適用できる。

4) 圧入 ( $100 < N_{\max} \leq 180$ )

表 3.8 日当り施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	11	7.8	5.7	4.6	3.7	3.0	—
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	9.7	6.8	5.0	4.0	3.2	2.6	2.3
Ⅱ <sub>w</sub> ・Ⅲ <sub>w</sub> ・Ⅳ <sub>w</sub> 型	9.7	6.8	5.0	4.0	3.2	2.6	2.3

- (注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 3. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。  
 5. 本歩掛は、オーガによる先行掘削の有無にかかわらず適用できる。

5) 圧入 ( $180 < N_{max} \leq 250$ )

表 3. 9 日当り施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	11	7.4	5.4	4.3	3.5	2.8	—
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	9.4	6.5	4.8	3.7	3.0	2.5	2.2
Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型	9.4	6.5	4.8	3.7	3.0	2.5	2.2

- (注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 3. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。  
 5. 本歩掛は、オーガによる先行掘削の有無にかかわらず適用できる。

6) 圧入 ( $250 < N_{max} \leq 375$ )

表 3. 10 日当り施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	9.3	6.4	4.7	3.7	3.0	2.4	—
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	8.1	5.6	4.1	3.2	2.6	2.1	1.8
Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型	8.1	5.6	4.1	3.2	2.6	2.1	1.8

- (注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 3. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。  
 5. 本歩掛は、オーガによる先行掘削の有無にかかわらず適用できる。

7) 圧入 ( $375 < N_{max} \leq 600$ )

表 3. 11 日当り施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型	7.6	5.2	3.8	3.0	2.4	1.9	—
V <sub>L</sub> ・VI <sub>L</sub> 型	6.6	4.5	3.3	2.6	2.1	1.7	1.5
Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型	6.6	4.5	3.3	2.6	2.1	1.7	1.5

- (注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 3. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。  
 5. 本歩掛は、オーガによる先行掘削の有無にかかわらず適用できる。



## 8) 引抜き

表3. 12 日当り施工枚数(N) (枚/日)

引抜き長 鋼矢板型式	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ <sub>L</sub> ・Ⅵ <sub>L</sub> 型	58	48	40	34	30	25	23

- (注) 1. 引抜き長とは、地表面より鋼矢板の引抜き長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表1. 1による。  
 3. 最小引抜き長は、4.0m以上を標準とする。  
 4. 日当り施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。

## (2) 圧入（継施工あり）

鋼矢板1枚につき1箇所継施工（圧入）する場合の日当り施工枚数（N）は、表3. 13～表3. 14を標準とする。

鋼矢板1枚につき2箇所以上継施工を行う場合は、表3. 15の補正係数を、表3. 13～表3. 14の枚数に乗じて、日当り継施工枚数を求める。

(注) 鋼矢板1枚当たりX箇所継ぐ場合の日当り継施工枚数 $N' = N \times F$ （F：補正係数）

日当り継施工枚数 $N'$ が10以上の場合は、小数第1位を四捨五入し、整数とする。

日当り継施工枚数 $N'$ が10未満の場合は、小数第2位を四捨五入し、小数第1位とする。

1) 圧入継施工（ $N_{max} \leq 25$ ）

表3. 13 日当り継施工枚数(N) (枚/日)

圧入長 鋼矢板型式	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ型	17	15	13	—	—	—	—
Ⅲ型	14	13	11	10	—	—	—
Ⅳ型	13	12	10	9.5	8.6	7.9	—
Ⅴ <sub>L</sub> 型	7.6	7.1	6.6	6.2	5.7	5.2	5.0
Ⅵ <sub>L</sub> 型	6.4	6.0	5.6	5.3	5.0	4.6	4.4
Ⅱ <sub>w</sub> 型	15	13	11	—	—	—	—
Ⅲ <sub>w</sub> 型	12	11	9.7	8.6	7.9	7.1	6.2
Ⅳ <sub>w</sub> 型	9.2	8.4	7.7	7.0	6.5	6.0	5.3
10H型	8.4	7.6	7.0	—	—	—	—
25H型	6.8	6.3	5.9	5.5	5.0	4.5	4.2

- (注) 1. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 2. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表1. 1による。  
 3. 最小圧入長は、4.0m以上を標準とする。  
 4. 日当り継施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。

2) 圧入継施工 ( $N_{\max} \leq 50$ )

表 3. 14 日当り継施工枚数(N) (枚/日)

鋼矢板型式 \ 圧入長	6m 以下	9m 以下	12m 以下	15m 以下	19m 以下	23m 以下	25m 以下
Ⅱ型	14 (15)	12 (13)	11 (12)	—	—	—	—
Ⅲ型	12 (13)	11 (11)	9.6 (10)	8.4 (9.2)	7.5 (8.4)	—	—
Ⅳ型	11 (11)	9.7 (10)	8.9 (9.5)	7.9 (8.6)	7.1 (7.9)	6.2 (7.1)	—
V <sub>L</sub> 型	7.0 (7.1)	6.4 (6.7)	5.8 (6.2)	5.5 (5.8)	5.0 (5.5)	4.4 (5.0)	4.4 (4.7)
VI <sub>L</sub> 型	5.9 (6.1)	5.5 (5.7)	5.1 (5.3)	4.8 (5.1)	4.4 (4.8)	4.0 (4.4)	4.0 (4.2)
Ⅱ <sub>w</sub> 型	13 (13)	11 (12)	9.4 (10)	8.5 (9.4)	—	—	—
Ⅲ <sub>w</sub> 型	11 (11)	9.5 (10)	8.2 (8.9)	7.5 (8.2)	6.7 (7.1)	5.7 (6.7)	5.2 (6.2)
Ⅳ <sub>w</sub> 型	8.3 (8.6)	7.5 (7.9)	6.7 (7.2)	6.2 (6.7)	5.7 (6.0)	5.0 (5.7)	4.6 (5.3)
10H型	7.6 (7.9)	6.9 (7.4)	6.2 (6.7)	5.7 (6.0)	—	—	—
25H型	6.3 (6.5)	5.8 (6.1)	5.3 (5.6)	5.0 (5.1)	4.5 (4.7)	3.9 (4.5)	3.9 (4.2)

- (注) 1. 圧入 ( $N_{\max} \leq 50$ ) は、杭打ち用ウォータージェットを使用する場合に適用する。  
 2. 圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。  
 3. 鋼矢板型式毎の適用範囲は、表 1. 1 による。  
 4. 最小圧入長は、4.0m 以上を標準とする。  
 5. 上 段 :  $25 < N_{\max} \leq 50$   
 下段 ( ) 書き :  $N_{\max} \leq 25$  で、転石等により、やむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合。  
 6. 日当り継施工枚数には、敷鉄板の施工手間が含まれている。

## 3) 鋼矢板 1 枚当り継施工箇所数による補正

表 3. 15 補正係数(F)(鋼矢板1枚当り2箇所以上継施工を行う場合)

鋼矢板 1 枚当り継施工箇所数 (X)	2 箇所	3 箇所	4 箇所	5 箇所
補正係数 (F)	0.66	0.50	0.40	0.34

## (3) 継施工費

「第Ⅱ編第 5 章仮設工②-1 パイプロハンマ工 3. 施工歩掛 3-3 日当り施工枚 (本) 数 (3) 継施工費」により別途計上する。

## (4) 鋼矢板の引抜き・切断

鋼矢板を鉛直に吊上げた状態で、鋼矢板を切断する場合については、別途計上する。

## (5) 油圧式杭圧入引抜機の据付け・解体歩掛

据付け・解体は、施工前の準備としての施工機械の配置、試運転調整等と施工後の施工機械の解体・撤去作業であり、歩掛は次表を標準とする。

表 3. 16 据付・解体歩掛

作業の種類	労務(人/回)			組合せ機械運転時間(日/回)	
	土木一般世話役	特殊作業員	とび工	油圧式杭圧入引抜機	ラフテレーンクレーン
圧入( $N_{max} \leq 25$ )	0.29	0.29	0.58	0.25	0.30
圧入( $N_{max} \leq 50$ )	0.50	0.50	1.00	0.29	0.45
圧入( $50 < N_{max} \leq 600$ )	1.10	1.10	2.19	0.59	0.90
引抜き	0.19	0.19	0.39	0.13	0.19

- (注) 1. 圧入( $N_{max} \leq 50$ )は、杭打ち用ウォータジェットを使用する場合に適用する。  
 2. 本歩掛は、既設鋼矢板、反力架台いずれを使用する場合も適用できる。  
 3. 本表は、据付・解体1回当りの歩掛である。したがって、1工事で機械1組につき、工事着工時には1回、現場内移設時には移設回数分計上する。  
 4. 水上施工等で反力架台が設置できない場合には、初期鋼矢板の施工は、パイプロハンマ工により別途計上する。また、引抜きにおいても残鋼矢板の施工はパイプロハンマ工により別途計上する。

(初期又は残鋼矢板:Ⅱ～Ⅳ型4枚,  $V_L \sim VI_L$ 型及びⅡw～Ⅳw型3枚, 10H・25H型4枚)  
 なお、クレーン付台船及び引船の運転日数は、土木一般世話役の歩掛を「日/回」と読み替えて適用するものとし、回航費用は別途計上する。

## 3-4 諸雑費

圧入( $N_{max} \leq 25$ )、圧入( $N_{max} \leq 50$ )及び引抜きにおける諸雑費は、共下がり防止用の溶接棒及び電気溶接機損料、施工機械足場用の敷鉄板賃料、ウォータジェット併用施工用付属機器に関する経費(配管バンド、溶接棒、電気溶接機損料、工事用水中モータポンプ損料、水槽及び配管損料)、現場内小運搬に関する経費、電力に関する経費等の費用(継施工に関する経費は除く)であり、労務費、機械損料及び機械運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

圧入( $50 < N_{max} \leq 600$ )における諸雑費は、溶接棒、施工機械足場用の敷鉄板賃料、電気溶接機損料、現場内小運搬に関する経費、排出土処理用のバックホウ運転に関する経費、オーガスクリュ及びオーガヘッド並びにケーシング損料等の費用であり、労務費、機械損料及び機械運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

なお、上記諸雑費に含まれるもの以外で施工に際し、オーガスクリュ及びオーガヘッド等へ付着した土等を除去するための高圧洗浄機やエアーコンプレッサーを用いる必要が生じた場合は、別途考慮すること。

表 3. 17 諸雑費率

(%)

作業の種類	陸上施工				水上施工			
	継施工なし		継施工あり		継施工なし		継施工あり	
	普通・広幅鋼矢板	ハット形鋼矢板	普通・広幅鋼矢板	ハット形鋼矢板	普通・広幅鋼矢板	ハット形鋼矢板	普通・広幅鋼矢板	ハット形鋼矢板
圧入( $N_{max} \leq 25$ )	1	1	2	2	1	1	3	2
圧入( $N_{max} \leq 50$ )	8	6	8	7	6	5	8	7
圧入( $50 < N_{max} \leq 600$ )	16	—						
引抜き	0.2 (注)2	—						

(注) 1. 圧入( $N_{max} \leq 50$ )は、杭打ち用ウォータジェットを使用する場合に適用する。

2. 引抜きの諸雑費率は、広幅鋼矢板には適用しない。

## 4. 単価表

(1) 鋼矢板圧入 10 枚当り単価表 ( $N_{\max} \leq 25$ )

SWB251330

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 3.3 表 3.5
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表 3.1 〃 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第2次基準値)25t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表 3.2 (注)2 〃 機械損料
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40t 吊 台船 300t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.17
計				

(注)1. N：日当り施工枚数（枚/日）

2. 陸上からの施工時のみ計上する。

3. 水上からの施工時のみ計上する。

(2) 鋼矢板圧入 10 枚当り単価表 (Nmax≤50)

SWB251340

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 3.3 表 3.6
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表 3.1 〃 機械損料
杭 打 ち 用 ウォータジェット運転	エンジン式・ 排出ガス対策型（第1次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 3250/min	〃	$\frac{10}{N}$	表 3.2 〃 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第2次基準値）25t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃（注）3 〃 機械損料
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40t 吊 台船 300t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃（注）4 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃（注）4 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.17
計				

(注)1. 本単価表は、杭打ち用ウォータジェットを使用する場合に適用する。

2. N：日当り施工枚数（枚/日）

3. 陸上からの施工時のみ計上する。

4. 水上からの施工時のみ計上する。

(3) 鋼矢板圧入 10 枚当り単価表 (50&lt;Nmax≤600)

SWB251390

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 3.3 表 3.7～表 3.11
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表 3.1 〃 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第1次基準値）50～51t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表 3.2（注）2 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.17
計				

(注)1. N：日当り施工枚数（枚/日）

2. 陸上からの施工時のみ計上する。

(4) 継鋼矢板圧入 10 枚当り単価表 (Nmax ≤ 25)

SWB251350

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 1$	表 3.3 表 3.13, 表 3.15
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 1$	〃 〃
と び 工		〃	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 2$	〃 〃
溶 接 工		〃	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 2$	〃 〃
継 施 工 費		箇所	10 × X	
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	表 3.1 表 3.13, 表 3.15 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t 吊	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	表 3.2 (注)2 〃 機械損料
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40t 吊 台船 300t 積	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	〃 (注)3 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	〃 (注)3 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.17
計				

(注)1. NorN' : 日当り継施工枚数 (枚/日)

X : 1 枚当り継施工箇所数 (箇所/枚)

2. 陸上からの施工時のみ計上する。

3. 水上からの施工時のみ計上する。

(5) 継鋼矢板圧入 10 枚当り単価表 (N<sub>max</sub> ≤ 50)

SWB251360

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 1$	表 3.3 表 3.14, 表 3.15
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 1$	〃 〃
と び 工		〃	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 2$	〃 〃
溶 接 工		〃	$\frac{10}{\text{NorN}'} \times 2$	〃 〃
継 施 工 費		箇所	10 × X	
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	表 3.1 表 3.14, 表 3.15 機械損料
杭 打 ち 用 ウォータジェット運転	エンジン式・ 排出ガス対策型（第1次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 3250/min	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	表 3.2 〃 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型（第2次基準値）25t 吊	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	〃 (注)3 〃 機械損料
クレーン付台船運転	クローラークレーン 35～40t 吊 台船 300t 積	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	〃 (注)4 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	〃	$\frac{10}{\text{NorN}'}$	〃 (注)4 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.17
計				

(注)1. 本単価表は、杭打ち用ウォータジェットを使用する場合に適用する。

2. NorN' : 日当り継施工枚数 (枚/日)

X : 1 枚当り継施工箇所数 (箇所/枚)

3. 陸上からの施工時のみ計上する。

4. 水上からの施工時のみ計上する。

(6) 鋼矢板引抜き 10 枚当り単価表

SWB251370

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 3.3 表 3.12
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表 3.1 〃 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型(第2次基準値)25t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表 3.2 (注)2 〃 機械損料
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40t 吊 台船 300t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	表 3.17
計				

(注)1. N：日当り施工枚数（枚/日）

2. 陸上からの施工時のみ計上する。
3. 水上からの施工時のみ計上する。



(7) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体1回当り単価表

SWB251380

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3. 16
特 殊 作 業 員		〃		〃
と び 工		〃		〃
油圧式杭圧入引抜機運転		日		表 3. 1 表 3. 16 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型(第2次基準値)25t 吊	〃		表 3. 2 (注)2 〃 機械損料
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型(第1次基準値)50～51t 吊	〃		〃 (注)2 〃 機械損料
クレーン付台船運転	クローラークレーン 35～40t 吊 台船 300t 積	〃	da	〃 (注)3 〃 機械損料
引 船 運 転	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	〃	da	〃 (注)3 〃 機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) 1. da：土木一般世話役の据付・解体歩掛（日/回）

2. 陸上からの施工時のみ計上する。

3. 水上からの施工時のみ計上する。

## (8) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型 (第1次基準値) 圧入力 981～1,471kN 引抜力 1,079～1,569kN	機-24	燃料消費量 → 132 機械損料数量 → 1.45
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型 (第1次基準値) 広幅鋼矢板用 圧入力 981～1,471kN 引抜力 1,079～1,569kN	機-24	燃料消費量 → 132 機械損料数量 → 1.45
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型 (第2次基準値) ハット形鋼矢板 900mm 用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN	機-24	燃料消費量 → 202 機械損料数量 → 1.45
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第2次基準値) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 → 202 機械損料数量 → 1.45
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅴ <sub>L</sub> ・Ⅵ <sub>L</sub> ・Ⅱ <sub>w</sub> ・Ⅲ <sub>w</sub> ・Ⅳ <sub>w</sub> 型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第2次基準値) 広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 → 202 機械損料数量 → 1.45
杭 打 ち 用 ウオータジェット	エンジン式・排出ガス対策型(第1次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	機-24	燃料消費量 → 120 機械損料数量 → 1.45
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t 吊	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 107 機械損料数量 → 1.45
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t 吊	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.45
ク レ ー ン 付 台 船	(クローラクレーン) 35～40t 吊 (台船) 300t 積	機-11	運転1日当り単価表 船員名称 → 高級船員 運転労務数量 → 1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 → 45 機械損料数量 → 1.45 機械損料単位 → 供用日 (台船) 機械損料数量→1.45
引 船	鋼製 D 100PS 型 4.9GT	機-11	運転1日当り単価表 船員名称 → 高級船員 運転労務数量 → 1.00 主燃料 → 重油 燃料消費量 → 57 機械損料数量 → 1.21 機械損料単位 → 供用日

## ②-4 プレボーリング（建地、建災-I）

## 1. 適用範囲

本資料は、プレボーリング工法によるH形鋼の施工（打込み）に適用する。

## 2. 機種の選定

## 2-1 アースオーガ（プレボーリング用）の規格

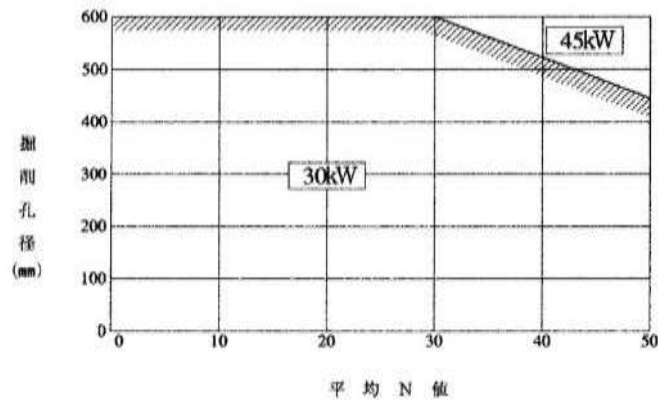


図 2-1 アースオーガ規格選定図

表 2.1 クローラ式杭打機標準機種

アースオーガ規格	杭 打 機
30kW	ディーゼルハンマ及びアースオーガ併用・直結三点支持式
45kW	〃

(注) 1. 打込みを行う場合のディーゼルハンマ規格はラム質量 1.3t を標準とする。  
 2. 打込みを行わない場合はディーゼルハンマに替えて、モンケン（2t）の装備を標準とする。

## (1) アースオーガ径

H形鋼サイズとアースオーガ径の関係は、次表を標準とする。

表 2.2 H形鋼サイズとアースオーガ径

H 形 鋼 サ イ ズ	H200	H250	H300	H350
アースオーガ径	φ 350mm	φ 400mm	φ 450mm	φ 500mm

## 2-2 その他の機種

## (1) 補助クレーン

現場内小運搬用クレーンは、トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型 16t 吊）を標準とし、下記の場合等必要に応じて考慮する。

- ① 施工場所から 30m 以内のところに材料置場を設けることができない場合。
- ② 民家、その他施設、構造物等を破損又は危険にさらす恐れのある場合。

## (2) バックホウ

バックホウ（クローラ型）は、掘削土の処理作業（穴埋作業及び簡単な整正を含む）として標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）山積 0.45m³（平積 0.35m³）を標準とする。

## 3. 編成人員及び運転時間

## 3-1 編成人員

H形鋼施工の1班編成は、次表を標準とする。

ただし、杭打機等の運転労務は「第Ⅰ編第7章①建設機械運転労務」により別途計上する。

表 3.1 H形鋼施工編成人員 (人)

工 種 \ 職 種		土 木 一 般 世 話 役	と び 工	普通作業員
打込み	プレボーリング	1	2	1

## 3-2 運転時間

- (1) H形鋼施工機械の運転日当り運転時間は「建設機械等損料算定表」の杭打機の標準時間とする。
- (2) 補助クレーンは、単独機械とし、運転時間は打込み施工時間の60%とする。
- (3) バックホウの杭1本の施工に要する運転時間は、 $T_c \times 0.3$ min/本とする。

## 4. 施工歩掛

H形鋼1本当りの打込施工時間は次式による。

$$T_c = \frac{T_s + T_b}{F} \quad (\text{min/本})$$

$T_c$  : H形鋼1本当り施工時間 (min /本)

$T_s$  : H形鋼1本当り準備時間 (min /本)

$T_b$  : H形鋼1本当り打込時間 (min /本)

$F$  : 作業係数

4-1 H形鋼1本当り準備時間 ( $T_s$ )

準備時間は、足場づくり、杭打機の移動、H形鋼の吊込み、芯出し、機械の給油脂等を含む時間であり、次表とする。

表 4.1 H形鋼1本当り準備時間 (min/本)

工 種		時間
打込み	プレボーリング	12

(注)1. 準備時間には打込みのための時間も含む。

2. 打込みをしない場合は2分を減ずるものとする。

4-2 H形鋼1本当り打込み時間（T<sub>b</sub>）

## (1) プレボーリング

$$T_b = T_{b0} + T_{bh}$$

$$T_{b0} = \gamma_0 \times \ell_0 \times K_0$$

$$T_{bh} = \gamma \times \ell \times K$$

T<sub>b</sub> : H形鋼1本当り掘削・打込時間 (min/本)T<sub>b0</sub> : H形鋼1本当り掘削時間 (min /本)T<sub>bh</sub> : H形鋼1本当り打込時間 (min /本) $\gamma_0$  : 掘削の単位作業時間 (min/m) $\ell_0$  : 掘削深さ (m)K<sub>0</sub> : ハンマ係数 $\gamma$  : 打込単位作業時間 (min/m) $\ell$  : 打止め長さ (m)

K : ハンマ係数

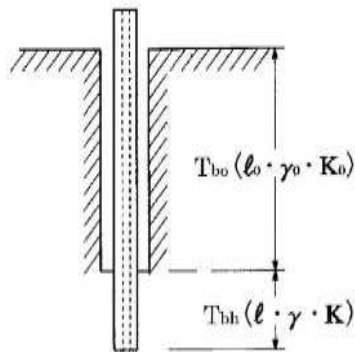


図4-1 施工状況(プレボーリング)

表4.2 掘削・打込単位作業時間( $\gamma_0, \gamma$ )

工種	土質	
	砂質土・レキ質土 ( $\gamma_{01}, \gamma_1$ )	粘性土 ( $\gamma_{02}, \gamma_2$ )
アースオーガ掘削	$0.03N_1 + 1.5$	$0.05N_2 + 1.5$
ディーゼルハンマ打止め	$0.03N_1 + 0.4$	$0.05N_2 + 0.4$

(注)1.  $N_1, N_2$  : 各土質ごとの根入長に対する加重平均N値2.  $\gamma$  の算出については,  $\gamma_{01}, \gamma_1, \gamma_{02}, \gamma_2$  を各々算出し, 次式により加重平均する。

$$\gamma_0 = \frac{\gamma_{01} \times \ell_{01} + \gamma_{02} \times \ell_{02}}{\ell_{01} + \ell_{02}}$$

 $\gamma_0$  : 施工土質に対する掘削単位作業時間 (min/m) $\gamma_{01}$  : 砂質土・レキ質土に対する掘削単位作業時間 (min/m) $\gamma_{02}$  : 粘性土に対する掘削単位作業時間 (min/m) $\ell_{01}$  :  $\gamma_{01}$  に対する掘削深さ (m) $\ell_{02}$  :  $\gamma_{02}$  に対する掘削深さ (m) $\gamma$  の計算は, ディーゼルハンマ打込みの場合に準ずるが  $\ell$  は打止めのための根入長とする。表4.3 H形鋼のハンマ係数( $K_0, K$ )

ハンマ係数	H形鋼の規格 (掘削径)	H200 (φ350)	H250 (φ400)	H300 (φ450)	H350 (φ500)
	工種				
$K_0$	アースオーガ掘削	0.90	0.95	1.00	1.10
K	ディーゼルハンマ打止め	0.90	0.95	1.00	1.05

## 4-3 作業係数（F）

現場作業条件による作業係数（F）は、表 4.4 の基準作業係数（F<sub>0</sub>）に表 4.5 の作業条件による補正係数を加え算出する。

$$F = F_0 + (f_1 + f_2 + f_3)$$

F : 作業係数

F<sub>0</sub> : 基準作業係数

f<sub>1</sub>～f<sub>3</sub> : 作業条件による補正係数

## (1) 基準作業係数

機種による係数は、次表とする。

表 4.4 基準作業係数

工 種		F <sub>0</sub>
打込み	プレボーリング	0.80

## (2) 作業条件による補正係数

作業条件による係数は、次表を標準とする。

表 4.5 作業条件による補正係数

条 件 \ 補正值		-0.05	0	+0.05	摘 要
f <sub>1</sub>	家屋, 鉄道, 橋梁, 道路, 施設, 構造物などによる障害の程度	かなりある	なし	—	作業中断の有無, 並びに機械の行動に制約される。
f <sub>2</sub>	現場の広さによる作業難易の程度	不良	普通	—	機械の移動, 矢板の仮置場所, 矢板の吊込みなどに十分な広さがあるか。
f <sub>3</sub>	施 工 規 模 (1工事当り)	50本未満	50本以上 150本未満	150本以上	

## 4-4 諸雑費

諸雑費は、オーガスクリュ及びオーガヘッド損料、発動発電機を使用した場合の発動発電機損料及び運転経費等の費用であり、労務費、杭打機損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、商用電源を使用した場合は（ ）内の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 4.6 諸雑費率 (%)

諸雑費率	11 (4)
------	--------

## 5. 単価表

## (1) プレボーリング工法によるH形鋼打込み 10 本当り単価表

SWB251720

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 1$	表3.1
と び 工		〃	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 2$	〃
普 通 作 業 員		〃	$10 \times T_c / 60 \times 1 / T \times 1$	〃
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転		h	$10 \times T_c / 60$	本体+ハンマ 機械損料
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型16t吊	〃	$10 \times T_c / 60 \times 0.6$	必要に応じて計上 機械損料
バ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型山積 0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	〃	〃 × 0.3	3-2(3) 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.6
計				

(注) T<sub>c</sub> : H形鋼1本当り施工時間 (min / 本)

T : 杭打機の運転日当り運転時間 (h/日)

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機	ラム質量1.3t オーガ出力 30kW 45kW	機-4	電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型16t吊	機-1	
バ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	機-1	

(注) 1. qp : 杭打機の時間当り燃料消費量 (ℓ/h)

qh : ディーゼルハンマの時間当り燃料消費量 (ℓ/h)

Eo : アースオーガの時間当り電力消費量 (kWh)

## ③ 矢板工（アースオーガ併用圧入工）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、アースオーガ併用圧入杭打機による鋼矢板の打込みに適用する。なお、適用できる鋼矢板はⅡ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ<sub>L</sub>型とし、オーガ径はⅡ，Ⅲ，Ⅳ型はφ320mm，Ⅴ<sub>L</sub>型はφ400mmとする。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

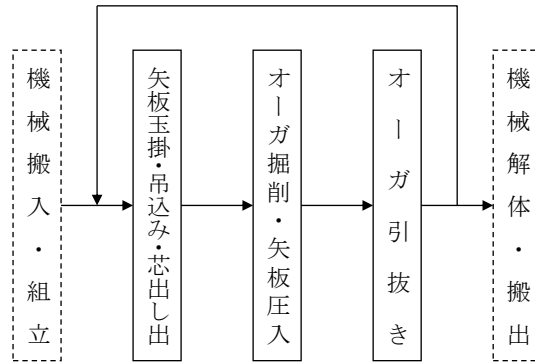


図 2-1 施工フロー

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

最大N値	$N_{max} \leq 50$	$50 < N_{max} \leq 65$
圧入長	20m以下	
機種	アースオーガ（油圧式） 併用圧入杭打機 34kN・m	アースオーガ 併用圧入杭打機 90kW

（注）1. 電動式オーガ（90kW）は、鋼矢板Ⅴ<sub>L</sub>型のみ適用する。

2. 対象地盤の最大N値が50を超えるものについては、次式により換算N値を求めた上で適用する。

$$\text{換算N値} = \frac{1,500}{\text{落下50回当り貫入量 (cm)}}$$

3. 圧入長とは、地表面からの鋼矢板の圧入長さであり、鋼矢板長とは異なる。

4. 油圧式オーガについては最大掘削トルク、電動式オーガについてはオーガ出力を示す。

## 4. 編成人員

鋼矢板の打込圧入作業の編成人員は、次表を標準とする。

表 4.1 打込圧入の編成人員（人）

土木一般世話役	とび工	普通作業員
1	2	1



## 5. 施工歩掛

5-1 鋼矢板の1日当りの圧入枚数（N）は、表5.1～5.4による。

表 5. 1 日当り施工枚数(Ⅱ型) (枚/日)

最大N値Nmax 圧入長(m)	25 以下	25を超え 50以下
2以下	38	34
2を超え 4以下	33	26
4を超え 6以下	29	21
6を超え 8以下	26	18
8を超え10以下	23	15
10を超え13以下	21	13
13を超え16以下	18	11
16を超え20以下	16	9

表 5. 2 日当り施工枚数(Ⅲ型) (枚/日)

最大N値Nmax 圧入長(m)	25 以下	25を超え 50以下
2以下	37	32
2を超え 4以下	31	23
4を超え 6以下	27	19
6を超え 8以下	24	15
8を超え10以下	21	13
10を超え13以下	19	11
13を超え16以下	17	9
16を超え20以下	15	8

表 5. 3 日当り施工枚数(Ⅳ型) (枚/日)

最大N値Nmax 圧入長(m)	25 以下	25を超え 50以下
2以下	36	30
2を超え 4以下	30	22
4を超え 6以下	26	17
6を超え 8以下	22	14
8を超え10以下	20	12
10を超え13以下	18	10
13を超え16以下	15	8
16を超え20以下	13	7

表 5.4 日当り施工枚数(V<sub>L</sub>型) (枚/日)

最大N値N <sub>max</sub> 圧入長(m)	25 以下	25を超え 50以下	50を超え 65以下
2以下	35	29	25
2を超え 4以下	29	20	16
4を超え 6以下	24	15	11
6を超え 8以下	21	12	9
8を超え10以下	19	10	7
10を超え13以下	16	8	6
13を超え16以下	14	7	5
16を超え20以下	12	6	4

(注) 最大N値が 50 を超えるものについては、換算N値とする。

## 5-2 諸雑費

諸雑費は、掘削土処理（穴埋め作業等）作業費、矢板等設置現場内小運搬費、オーガスクリュ及びオーガヘッド損料、電力に関する経費、足場材（敷鉄板等）、鋼矢板圧入金具取付に関する経費等の費用であり、労務費、杭打機損料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 5.5 諸雑費率 (%)

機 種	諸雑費率
アースオーガ（油圧式）併用圧入杭打機34kN・m	34
アースオーガ併用圧入杭打機90kW	39

## 6. 単価表

## (1) アースオーガ併用圧入工法による鋼矢板打込み 10 枚当り単価表

SWB251110

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.1 表5.1～5.4
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃
杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 表5.1～5.4
諸 雑 費		式	1	表5.5
計				

(注) N：日当り施工枚数（枚/日）

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラ式 アースオーガ	アースオーガ（油圧式） 併用圧入杭打機 34kN・m	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →57 機械損料数量→1.59
	アースオーガ 併用圧入杭打機 90kW		運転労務数量→1.00 燃料消費量 →74 機械損料数量→1.59

## ④ 鋼矢板（H形鋼）工（クレーン引抜工）


## 1. 適用範囲

本資料は、引抜長 10m 以上 20m 以下の鋼矢板及びH形鋼のクレーンとワイヤ式杭抜き機による施工に適用する。  
適用にあたっては、現場条件により他工法との比較検討を行うものとする。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

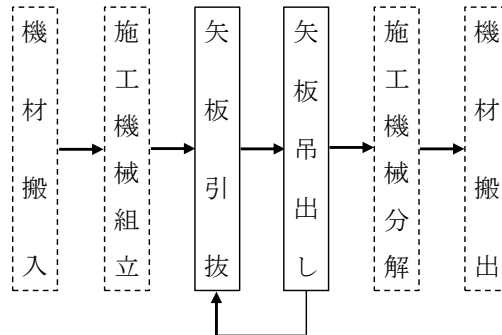

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図 2-1 施工フロー

## 2-2 参考図等

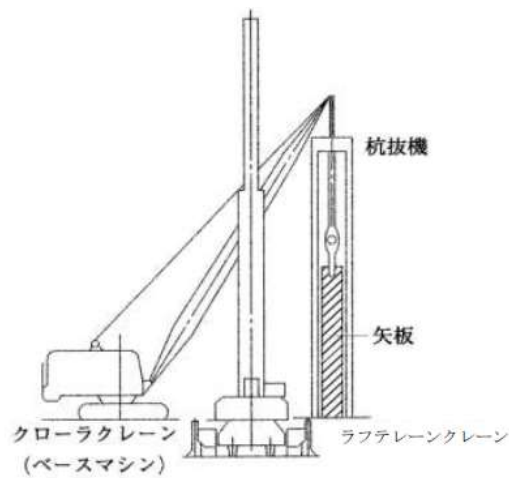


図 2-2 施工図

## 3. 施工歩掛

## 3-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要
杭 抜 き 機	(杭抜き機) ワイヤ式 最大引抜き力2,940kN (300t) (クローラクレーン) 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 30～35t吊	台	1	ワイヤ式杭抜き機 ＋ クローラクレーン (ベースマシン)
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第1次基準値） 20t吊	〃	1	合引き及び吊出し用

- (注) 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。  
2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 3-2 日当り編成人員

クレーン引抜き作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表3.2 日当り編成人員 (人/日)

土木一般世話役	と び 工	普 通 作 業 員
1	2	1

## 3-3 日当り引抜き枚[本]数

矢板、H形鋼の施工1日当り引抜き枚[本]数(N)は、次表を標準とする。

表3.3 日当り引抜き枚[本]数(N) (枚[本]/日)

作業補正条件 引抜き長 (m)	家屋、鉄道、橋梁、道路、施設 及び構造物による障害	
	有 り	無 し
10以上 12以下	20	23
12を超え15以下	18	20
15を超え20以下	15	17

- (注) 家屋、鉄道、橋梁、道路、施設及び構造物による障害の有無は、作業中断の有無及び作業の行動制限の有無によって判断する。



## ⑤ 鋼矢板施工法選定表（参考）

## ⑤-1 鋼矢板打込施工法選定表（参考）

鋼矢板打込施工法選定表は、陸上での一般的な施工条件（鋼矢板型式、環境条件、N値及び継施工の有無）を基として経済性を考慮した参考の選定表である。なお、現場施工条件等により本表により難しい場合は、比較検討すること。

鋼矢板 型式	環境 対策	打込長	継施工無し				継施工有り		
			N値				N値		
			Nmax≦25 ※1	25<Nmax≦50 ※1.2	50<Nmax≦180 ※2	≦600	Nmax≦25 ※1	25<Nmax≦50 ※1.2	50<Nmax≦180 ※2
I A型	無し	L≦6m	電動式バイプロハンマ		—		—		
II 型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	電動式バイプロハンマ	電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦9m	油圧式杭圧入引抜機						
		9m<L≦15m							
	低振動	L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	油圧式バイプロハンマ	油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦10m	油圧式杭圧入引抜機						
		10m<L≦15m							
	無振動	4m≦L≦10m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 （硬質地盤専用）	—	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—
		10m<L≦12m	—						
	III 型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	電動式バイプロハンマ	電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用
4m≦L≦12m			油圧式杭圧入引抜機						
12m<L≦19m									
低振動		L<4m	電動式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用
		4m≦L≦9m	油圧式杭圧入引抜機						
		油圧式杭圧入引抜機							
		9m<L≦15m							
15m<L≦19m									
無振動		4m≦L≦15m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 （硬質地盤専用）	—	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—
	15m<L≦18m	—							

鋼矢板 型式	環境 対策	打込長	継施工無し				継施工有り			
			N値				N値			
			Nmax≦25 ※1	25<Nmax≦50 ※1,2	50<Nmax≦180 ※2	≦600	Nmax≦25 ※1	25<Nmax≦50 ※1,2	50<Nmax≦180 ※2	
Ⅳ型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータジェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータジェット併用	
		4m≦L≦9m	油圧式杭圧入引抜機				油圧式杭圧入引抜機			
		9m<L≦15m								
		15m<L≦25m								
	低振動	L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータジェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータジェット併用	
		4m≦L≦19m	油圧式杭圧入引抜機				油圧式杭圧入引抜機			
		19m<L≦20m								
		20m<L≦25m								
	無振動	4m≦L≦20m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)		油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	—	
	ⅤL型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータジェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータジェット併用
4m≦L≦15m			油圧式杭圧入引抜機							
15m<L≦25m										
低振動		L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータジェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータジェット併用	
		4m≦L≦25m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機						
無振動		L<4m	—	—	50<Nmax≦65	—	—	—	—	
		4m≦L≦20m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	電動式 アース オーガ 併用圧 入杭打機	65<Nmax≦600 油圧式杭圧入引 抜機 (硬質地盤専用)	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用		
		20m<L≦25m								
ⅤL型		無振動	4m≦L≦25m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)		油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	—
Ⅱw型		無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータジェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータジェット併用
	4m≦L≦9m		油圧式杭圧入引抜機							
	9m<L≦15m									
	低振動	L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータジェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータジェット併用	
		4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機							
		12m<L≦15m								
	無振動	4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)		油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータジェット併用	—	
		12m<L≦14m	—		—	—				

鋼矢板 型式	環境 対策	打込長	継施工無し				継施工有り			
			N値				N値			
			Nmax≦25 ※1	25<Nmax≦50 ※1.2	50<Nmax≦180 ※2	≦600	Nmax≦25 ※1	25<Nmax≦50 ※1.2	50<Nmax≦180 ※2	
Ⅲw型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦9m	油圧式杭圧入引抜機							
		9m<L≦19m								
	低振動	L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機							
		12m<L≦19m								
	無振動	4m≦L≦25m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—		
	Ⅳw型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用
			4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機						
12m<L≦25m										
低振動		L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦9m	油圧式杭圧入引抜機							
		9m<L≦25m								
無振動		4m≦L≦25m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	50<Nmax≦600 油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—		
10H型		無し	L≦4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用
			4m<L≦6m	油圧式杭圧入引抜機						
	6m<L≦15m									
	15m<L≦19m		—							
	低振動	L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機							
		12m<L≦15m								
		15m<L≦19m	—							
	無振動	4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—		
		12m<L≦14m	—			—				
25H型	無し	L<4m	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	電動式バイプロハンマ		電動式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦6m	油圧式杭圧入引抜機							
		6m<L≦19m								
		19m<L≦25m	—							
	低振動	L<4m	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	—	油圧式バイプロハンマ		油圧式バイプロハンマ ウォータージェット併用	
		4m≦L≦12m	油圧式杭圧入引抜機							
		12m<L≦19m								
		19m<L≦25m	—							
	無振動	4m≦L≦25m	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—	油圧式杭圧入引抜機	油圧式杭圧入引抜機 ウォータージェット併用	—		


※1. 以下の条件において、現場条件(転石等)により、やむを得ずウォータージェット併用施工とする場合は、別途考慮する。

ただし、低振動条件の油圧式杭圧入引抜機施工区分については、油圧式バイプロハンマ・ウォータージェット併用とする。

・N値条件(電動式バイプロハンマ、油圧式バイプロハンマ):  $N_{max} < 50$ ・N値条件(油圧式杭圧入引抜機):  $N_{max} \leq 25$ ※2. バイプロハンマ工におけるN値区分については、 $25 < N_{max} < 50$ 、 $50 \leq N_{max} \leq 180$ と読み替える。



## ⑤-2 鋼矢板・H形鋼引抜施工法選定フロー（参考）

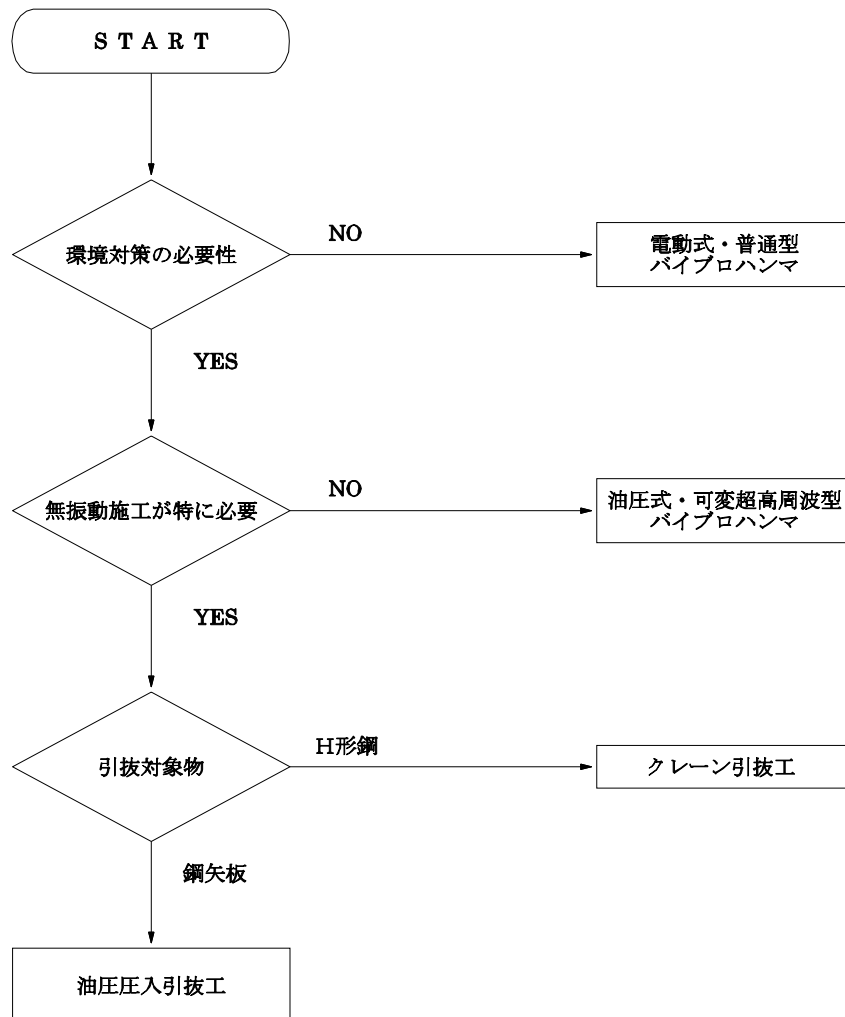

- (注) 1. 上表は、陸上での一般的な施工条件の基で環境対策を考慮したフローであるが、工法の選定にあたっては経済性を考慮すること。
2. 上表は、広幅鋼矢板とハット形鋼矢板については対象外である。


## ⑥ 仮設材設置撤去工（建地－Ⅰ、Ⅱ）

## 1. 適用範囲

本資料は、土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、切梁、腹起し、タイロッド、横矢板（土留板）及び覆工板の設置撤去工に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

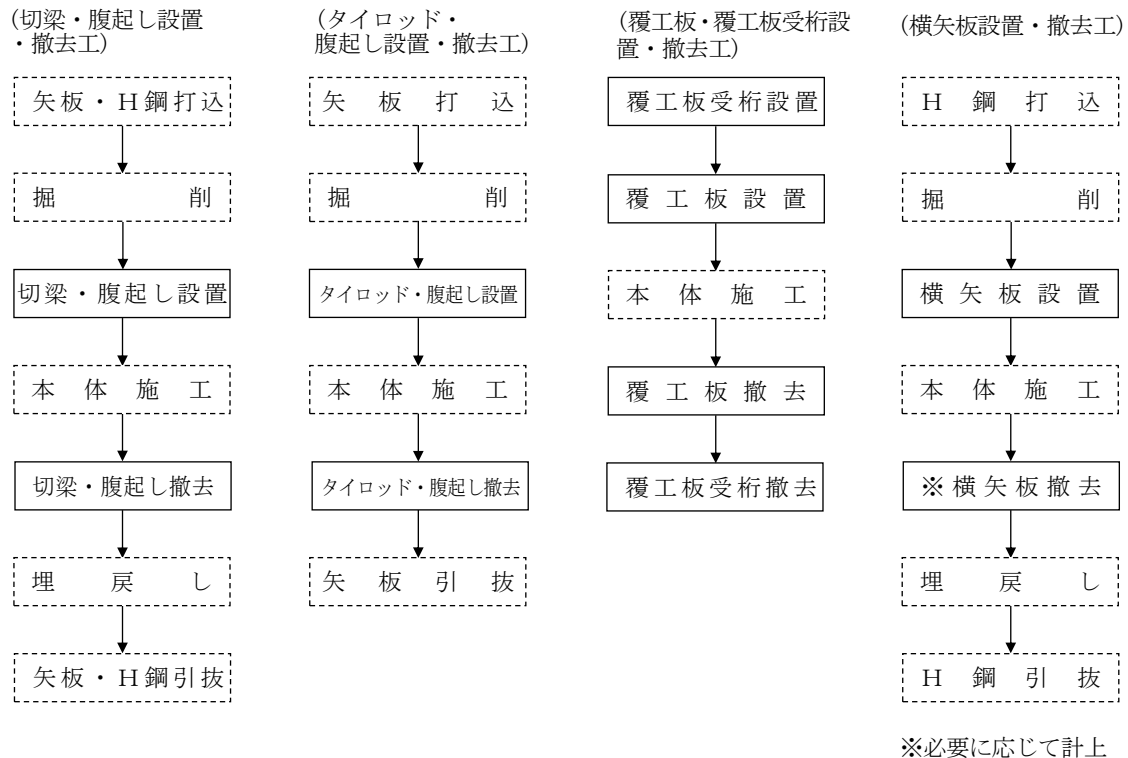

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 （第2次基準値） 25t吊	台	1	

（注） 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

2. 現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適合した機種とすることができる。

## 4. 施工歩掛

## 4-1 施工歩掛

各工種の施工歩掛は、次表を標準とする。

表4.1 施工歩掛

名 称	規 格	単 位	工 種 区 分					
			1		2		3	
			切梁・腹起し (10t当り)		タイロッド・腹起し (10t当り)		横 矢 板 (10m <sup>2</sup> 当り)	
			設 置	撤 去	設 置	撤 去	設 置	撤 去
土木一般世話役		人	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	0.4	0.2
と び 工		〃	3.2(1.9)	1.9(1.2)	9.9	4.4	—	—
溶 接 工		〃	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	—	—
普 通 作 業 員		〃	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	1.2	0.6
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	—	—
諸 雑 費 率		%	4	6	8	9	—	—
歩掛算出の施工 質量又は施工面積			主部材及び副部材の 全質量		タイロッド及び 腹起し材の質量		壁 面 積	

- (注) 1. 切梁・腹起しにおいては、加工材を標準とし、中間支柱の施工は含まない。また、火打ブロックを使用する場合は、( ) 内の値を計上する。  
 2. タイロッド施工時の鋼矢板の穴開け加工費を含む。  
 3. タイロッド・腹起しにおいては、中埋土の充填排除は含まない。  
 4. 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表4.2 覆工板・覆工板受桁設置、撤去歩掛

名 称	規 格	単位	工 種 区 分					
			4		5		6	
			覆工板設置面積700㎡以下		覆工板設置面積700㎡を超える			
			覆工板・覆工板受桁 (100㎡当り)		覆 工 板 (100㎡当り)		覆工板受桁 (10t当り)	
			設置	撤去	設置	撤去	設置	撤去
土木一般世話役		人	2.9	1.8	0.8	0.5	1.6	1.0
と び 工		〃	4.6	2.7	2.5	1.4	1.6	1.0
溶 接 工		〃	2.1	1.3	—	—	1.6	1.0
普 通 作 業 員		〃	5.1	3.2	0.8	0.5	3.2	2.0
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	日	2.9	1.8	0.8	0.5	1.6	1.0
諸 雑 費 率		%	3	4	—	—	5	6
歩掛算出の施工 面積又は施工質量			覆工板の面積		覆工板の面積		覆工板受桁の質量	

- (注) 1. 工種区分「4」は、覆工板及び受桁、桁受の設置撤去の歩掛が含まれており、1工事当りの覆工板設置面積700m<sup>2</sup>以下に適用する。覆工板設置面積が700m<sup>2</sup>を超える場合は、工種区分「5」及び「6」を適用する。  
 2. 覆工板においては、据置式（はめこみ式）の加工材を標準とし、路面のすりつけ作業は含まない。  
 3. 覆工板受桁においては、加工材を標準とする。  
 4. 覆工板受桁用桁受においては、(注)3に準じ加工材を標準とする。なお、歩掛算出については覆工板受桁の質量と覆工板受桁用桁受の質量を含めて算出する。  
 5. 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 5. H形鋼の使用区分

積算にあたっての使用区分は、次表を標準とする。

表5. 1 使用区分

項目 \ 用途	切梁・腹起し	親杭
設計計算	加工材	生材
質量算出	〃	〃
賃料計算	〃	〃

(注) 仮設材設置・撤去工に使用する材料については、「建設用仮設材賃料積算基準」による。

## 6. 仮設材賃料に係る修理費及び損耗費等の取扱いについて

## 6-1 H形鋼等の1現場あたり修理費及び損耗費について

H形鋼等の1現場あたり修理費及び損耗費は、次式のとおりとする。

$$Y = a \cdot b$$

Y：H形鋼等の1現場あたり修理費及び損耗費（円/t） ※覆工板は単位を（円/㎡）に読み替える。

a：係数 b：市場価格

表6. 1 H形鋼等の1現場あたり修理費及び損耗費算定のための係数及び市場価格

名 称	補助工法	係数(a)	市場価格(b)
H形鋼 山留主部材	—	1.09	鋼製山留材 整備費
覆工板	—	1.22	覆工板 整備費

- (注) 1. 修理費及び損耗費は、整備費、修理費（特別ケレン・穴埋め・曲がり直し等）、切断による短尺補償、打込による破損を含む。  
 2. 修理費及び損耗費は、土質、打込又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用を決定する。  
 3. 補助工法とは、ウォータージェットまたはアースオーガ併用工法、硬質地盤専用工法、プレボーリング工法等をいう。

## 6-2 山留主部材等の副部材について

副部材の賃料（1現場あたり修理費及び損耗費を含む。）は、次式のとおりとする。

$$Y = a \cdot b$$

Y：副部材の賃料（円/t） a：係数 b：市場価格

表6. 2 副部材の賃料（1現場あたり修理費及び損耗費を含む。）算定のための係数及び市場価格

名 称			係数 ( a )	市場価格 ( b )
副部材 (A)	基礎価格		1. 21	鋼製山留材 部品 不足分弁償金 (新品)
	供用1日あたり 賃料 (日)	90日以内	1. 48	鋼製山留材 部品 賃料
		180日以内		
		360日以内		
		720日以内	1. 47	
		1080日以内		
	1現場あたり修理費及び損耗費		1. 13	鋼製山留材 部品 整備費
副部材 (B)	1現場あたり修理費及び損耗費		1. 01	鋼製山留材 部品 不足分弁償金 (新品)


## 7. 部材質量

## 7-1 主部材及び副部材の質量算出

主部材及び副部材の質量算出は、次表を標準とする。  
ただし、これにより難しい場合は、別途考慮する。

表7.1 部材質量算出方法

部材名	部 品 名	質量算出方法	摘 要
主部材	切梁, 腹起し, 火打梁, 補助ピース	積上げ	キリンジャッキ・火打受ピース(火打ブロック)の長さに相当する部材長の質量を控除すること。
副部材 (A)	隅部ピース, 交差部ピース, カバープレート, キリン ジャッキ, ジャッキカバー, ジャッキハンドル, 火打受ピース, 腰掛金物, (火打ブロック)	主部材質量 $\times 0.22 (0.67)$	キリンジャッキ・火打受ピースの長さは、どちらも50cmとする。火打ブロックを使用する場合は、( )内の値とする。
副部材 (B)	ブラケット, ボルト・ナット	主部材質量 $\times 0.04 (0.06)$	1回毎全損とする。火打ブロックを使用する場合は、( )内の値とする。

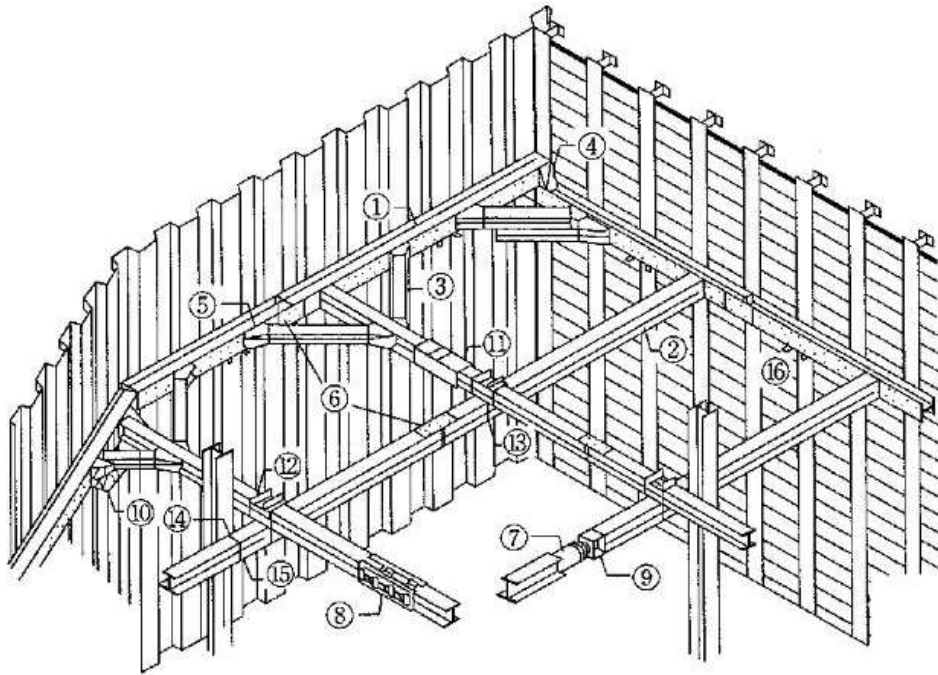

No.	部 材 名 称
1	腹 起 し
2	切 梁
3	火 打 梁
4	隅 部 ピ ー ス
5	火 打 受 ピ ー ス
6	カ バ ー プ レ ー ト
7	キ リ ン ジ ャ ッ キ
8	ジ ャ ッ キ カ バ ー
9	補 助 ピ ー ス
10	自 在 火 打 受 ピ ー ス
11	土 圧 計
12	交 叉 部 ピ ー ス
13	交 叉 部
14	締 付 用 U ボ ル ト
15	切 梁 ブ ラ ケ ッ ト
16	腹 起 ブ ラ ケ ッ ト

図7-1 土留標準図

## 7-2 受桁及び桁受の質量算出

覆工板の受桁及び桁受の質量算出は、次式による。

$$\text{受桁及び桁受質量 (t)} = \text{覆工板設置面積 (m}^2\text{)} \times 0.134 \cdots \text{(式7.1)}$$

ただし、1工事当りの覆工板設置面積が、700m<sup>2</sup> を超える場合は、別途考慮する。

## 8. 単価表

(1) 山留材賃料1t当り単価表

SWB251910

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
主 部 材 賃 料		t	1	
修 理 費 及 び 損 耗 費	主部材	〃	1	
副 部 材 賃 料	副部材(A)	〃	0.22(0.67)	
修 理 費 及 び 損 耗 費	副部材(A)	〃	0.22(0.67)	
修 理 費 及 び 損 耗 費	副部材(B)	〃	0.04(0.06)	
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 覆工板賃料1m<sup>2</sup>当り単価表

SWB251920

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
覆 工 板 賃 料		m <sup>2</sup>	1	
修 理 費 及 び 損 耗 費		〃	1	
諸 雑 費		式	1	
計				

(3) 覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料（設置面積700m<sup>2</sup>以下）1m<sup>2</sup>当り単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
受 桁 ・ 桁 受 賃 料		t	0.134	H形鋼（山留 主部材）
修 理 費 及 び 損 耗 費		〃	0.134	
諸 雑 費		式	1	
計				

(4) 切梁・腹起し設置・撤去10t当り単価表

SWB251930

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表4.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.1
計				

(5) タイロッド・腹起し設置10t当り単価表

SWB251940

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表4.1 機械賃料
タ イ ロ ッ ド	φ32～42mm	t		必要量計上
諸 雑 費		式	1	表4.1
計				

(6) タイロッド・腹起し撤去10t当り単価表

SWB251941

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表4.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.1
計				

(7) 横矢板設置10m<sup>2</sup>当り単価表

SWB251970

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1
普 通 作 業 員		〃		〃
横 矢 板		m <sup>3</sup>		壁面積 (10m <sup>2</sup> )×板厚
諸 雑 費		式	1	
計				

(8) 横矢板撤去10m<sup>2</sup>当り単価表

SWB251971

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	
計				



(9) 覆工板・受桁設置・撤去100㎡当り単価表（覆工板設置面積700㎡以下）

SWB251990

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表4.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.2
計				

(10) 覆工板設置・撤去100㎡当り単価表（覆工板設置面積700㎡を超える）

SWB251950


名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表4.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(11) 覆工板受桁設置・撤去10t当り単価表（覆工板設置面積700㎡を超える）

SWB251960

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2
と び 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表4.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.2
計				

参考図（覆工板受桁及び桁受）

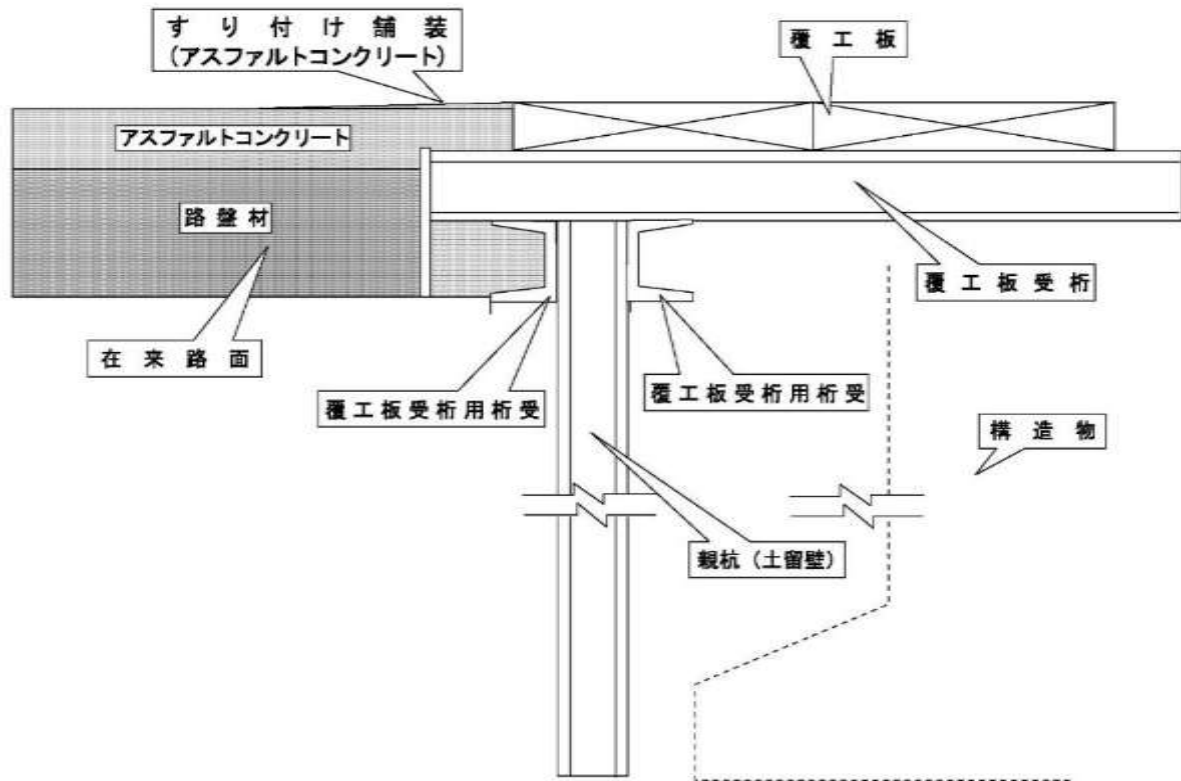

## ⑦ 足場支保工（建地－Ⅰ）

## ⑦－Ⅰ 足場工

## 1. 適用範囲

本資料は、一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の足場工に適用する。


ただし、高さ2m未満の構造物及び鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用できない。

また、「第Ⅱ編第2章共通工④－Ⅰ場所打擁壁工(Ⅰ)」、「第Ⅱ編第2章共通工③－Ⅰ函渠工(Ⅰ)」、「第Ⅳ編第4章橋梁工⑩－Ⅰ橋台・橋脚工(Ⅰ)」については、適用できない。

## 2. 施工概要

## 2－Ⅰ 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

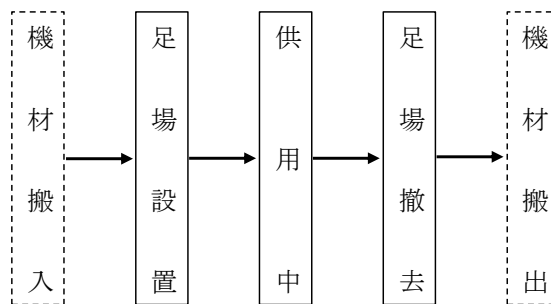

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2－Ⅰ 施工フロー

## 2－Ⅱ 工法の選定

工法の選定は、次図を標準とする。

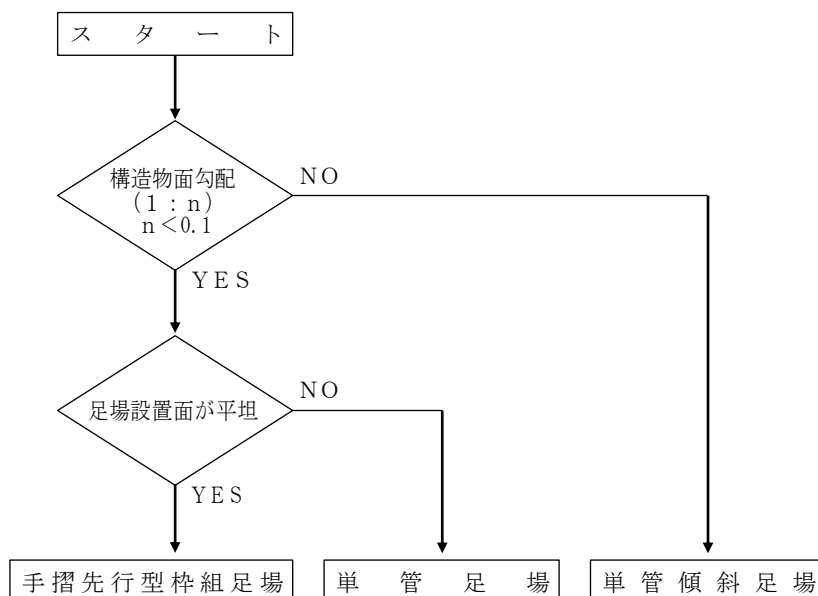


図2－Ⅱ 工法の選定

## 3. 施工歩掛

足場材の設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 足場材設置・撤去歩掛 (100掛 $m^2$ 当り)

名 称	規 格	単位	手摺先行型 枠組足場	単管足場	単管傾斜足場
土木一般世話役		人	1.4	1.7	1.4
と び 工		〃	6.3(7.7)	6.3(7.7)	4.1(5.6)
普 通 作 業 員		〃	1.2	1.6	2.5
ラフテレーン クレーン運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	1.4	0.8	0.8
諸 雑 費 率		%	34(31)	32(29)	35(30)

- (注) 1. 安全ネットが必要な場合は、( ) 内の数値を計上する。  
 2. 諸雑費は、足場工仮設材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 なお、諸雑費には、供用中の足場材損料を含むものとする。  
 ・手摺先行型枠組足場における仮設材内訳は、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、板付布枠、連結ピン、アームロック、ジャッキベース、手摺柱、手摺、手摺枠（二段手摺の機能を有する）、幅木、階段、養生ネット（メッシュシート）等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。  
 ・単管足場における仮設材内訳は、丸パイプ、直交クランプ、自在クランプ、直線ジョイント、固定ベース、足場板、敷板、壁つなぎ、階段、養生ネット（メッシュシート）等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。  
 ・単管傾斜足場における仮設材内訳は、丸パイプ、直交クランプ、自在クランプ、直線ジョイント、足場板、固定ベース、養生ネット（メッシュシート）等である。また、安全ネットを設置した場合の安全ネットである。  
 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 4. 単価表

(1) 手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場100掛 $m^2$ 当り単価表

SWB252110

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人		表3.1
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表3.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表3.1
計				

## 5. 参考図（足場工）


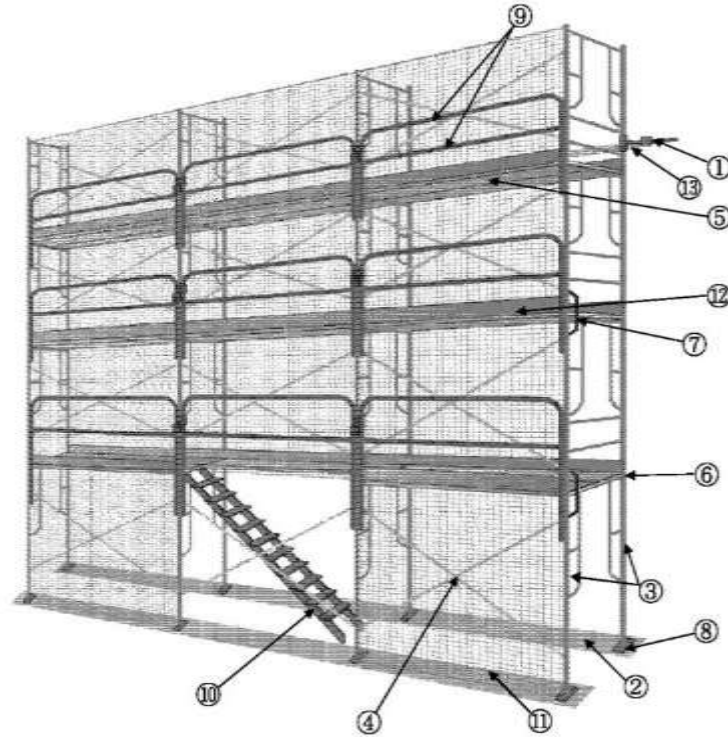


図5-1 足場工参考図

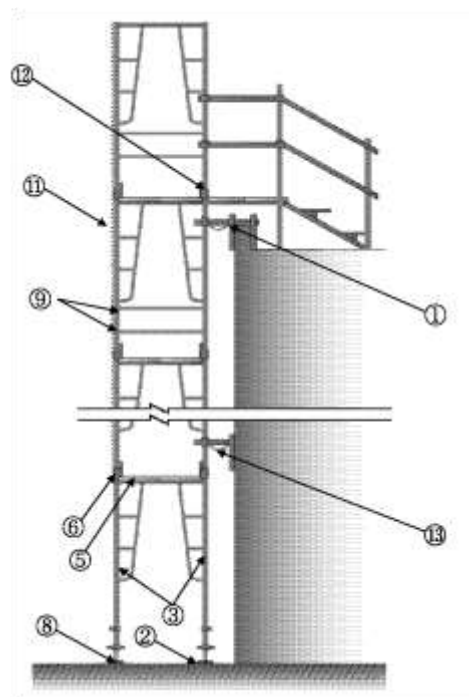

- ① 壁つなぎ
- ② 敷板
- ③ 建柱
- ④ 筋違い
- ⑤ 板付布柱
- ⑥ 連結ピン
- ⑦ アームロック
- ⑧ ジャッキベース
- ⑨ 二段手摺
- ⑩ 階段
- ⑪ 養生ネット(メッシュシート)
- ⑫ 幅木
- ⑬ 安全ネット

図5-2 足場工断面参考図

## ⑦-2 支保工

## 1. 適用範囲

本資料は、一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の支保工に適用する。


ただし、鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用できない。

また、「第Ⅱ編第2章共通工④-1場所打擁壁工(1)」、「第Ⅱ編第2章共通工③-1函渠工(1)」、「第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工(1)(2)」、「第Ⅳ編第4章橋梁工⑨-1橋台・橋脚工(1)」については、適用できない。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

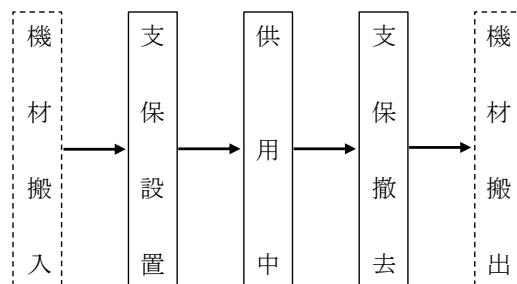

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2-1 施工フロー

## 2-2 工法の選定

工法の選定は、次図による。

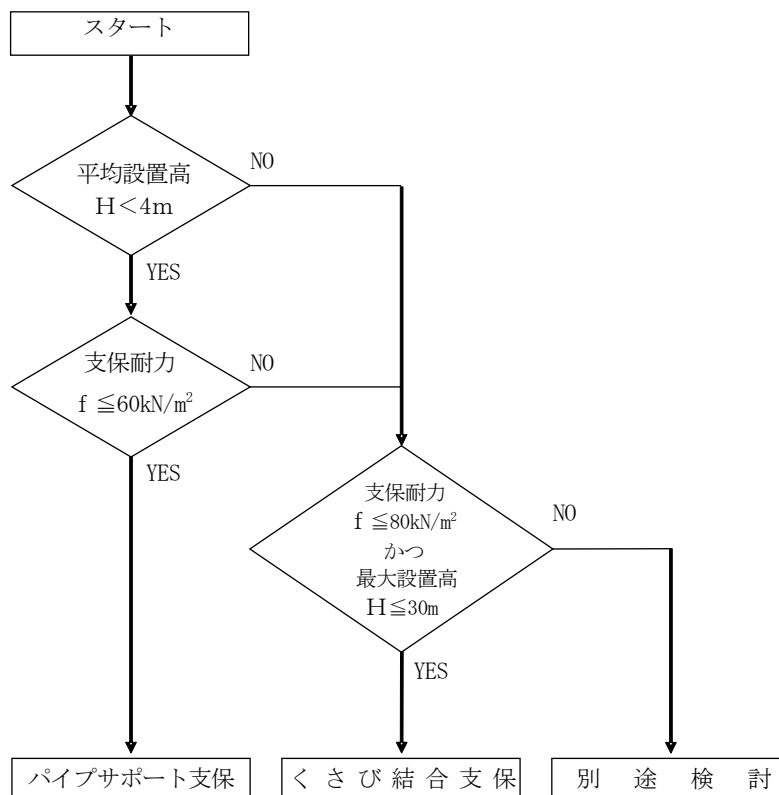


図2-2 工法の選定

## 3. 施工歩掛

支保材の設置・撤去歩掛は、表3.1を標準とする。ただし、パイプサポート支保の総設置数量40空 $\text{m}^3$ 以下の小規模工事では表3.2を標準とする。

表3.1 支保材設置・撤去歩掛 (100空 $\text{m}^3$ 当り)

名 称	規 格	単 位	支保耐力 $f$ (kN/ $\text{m}^2$ )			
			パイプサポート支保		くさび結合支保	
			$f \leq 40$	$40 < f \leq 60$	$f \leq 40$	$40 < f \leq 80$
コンクリート厚(t) (参考)		cm	$t \leq 120$	$120 < t \leq 190$	$t \leq 120$	$120 < t \leq 250$
土 木 一 般 世 話 役		人	2.6	4.2	1.4	2.1
型 わ く 工		〃	4.7	8.7	1.3	2.7
と び 工		〃	2.2	2.4	3.3	4.2
普 通 作 業 員		〃	5.1	11.1	3.3	6.0
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	—		0.5	1.2
諸 雑 費 率		%	15		33	

(注) 1. 諸雑費は、仮設材等の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

- ・パイプサポート支保における仮設材内訳は、パイプサポート、型枠受台、根がらみ、水平つなぎ、根がらみクランプ、直交クランプ、頭つなぎ等である。
- ・くさび結合支保における仮設材内訳は、ジャッキベース、大引受ジャッキ、建地材、つなぎ材、斜材等である。

2. 参考値のコンクリート厚について、張出し部等で断面の変化する場合のコンクリート厚は、平均とする。

3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

表3.2 支保材設置・撤去歩掛(小規模) (10空 $\text{m}^3$ 当り)

名 称	単 位	支保耐力 $f$ (kN/ $\text{m}^2$ )
		パイプサポート支保
		$f \leq 40$
コンクリート厚 (t) (参考)	cm	$t \leq 120$
土 木 一 般 世 話 役	人	0.29
型 わ く 工	〃	0.53
と び 工	〃	0.25
普 通 作 業 員	〃	0.57
諸 雑 費 率	%	13

## 4. 単価表

(1) パイプサポート支保・くさび結合支保100 空<sup>3</sup> 当り単価表

SWB252210

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1
型 わ く 工		〃		〃
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日		表3.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表3.1
計				

(2) パイプサポート支保（小規模）10 空<sup>3</sup> 当り単価表


SWB252211



名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2
型 わ く 工		〃		〃
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				








## 5. 参 考

## (1) 足場工の計算例（土木工事数量算出要領）

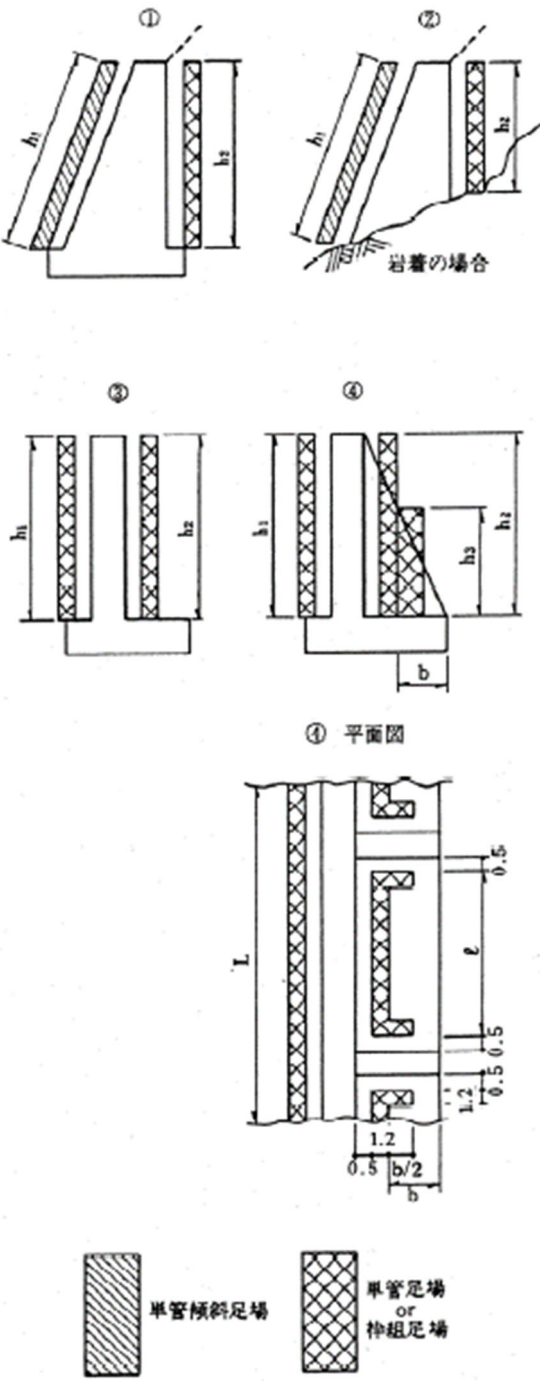
盛土部擁壁	 <p>① ②</p> <p>③ ④</p> <p>⑤ 平面図</p> <p>単管傾斜足場 単管足場 or 枠組足場</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配 1 分未満）場合 Ⅰ．標準（足場設置面が平坦）・・・枠組足場 Ⅱ．Ⅰ が不適当な場合・・・単管足場</li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配 1 分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（h）2.0m 未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>盛土部の石積、ブロック積は足場を計上しない。</li> <li>足場工面積（掛 <math>m^2</math>） <math>L = \text{延長（m）}</math> ① 単管傾斜 <math>= h_1 \times L</math> 枠組 <math>= h_2 \times L</math> ② 単管傾斜 <math>= h_1 \times L</math> 枠組 or 単管 <math>= h_2 \times L</math> ③ 枠組 <math>= h_1 \times L + h_2 \times L</math> ④ （<math>h_3 &lt; 2.0m</math> の場合） 枠組 <math>= h_1 \times L + h_2 \times \Sigma \ell</math> （<math>h_3 &gt; 2.0m</math> の場合） 枠組 <math>= h_1 \times L + h_2 \times \Sigma \ell + N \times (h_3 \times b)</math> <math>N = \text{控え壁（扶壁）数}</math></li> </ol>
-------	--	---

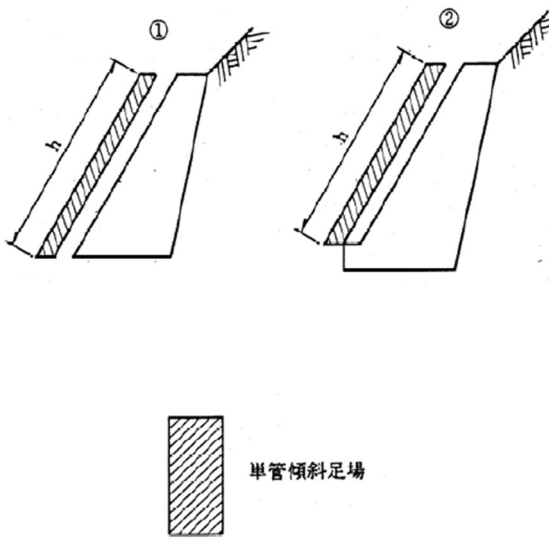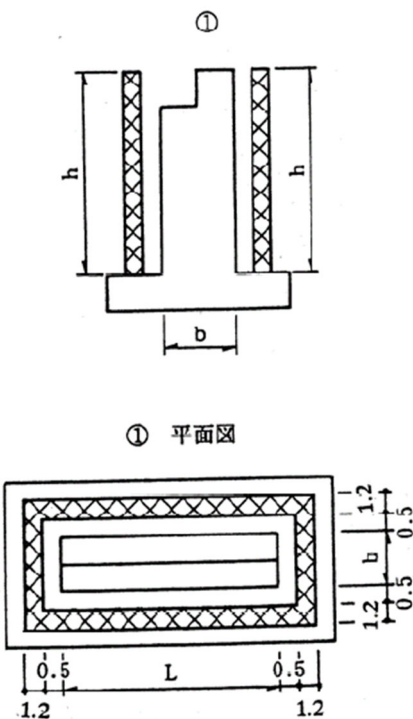切土部擁壁		<ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配1分未満）場合 Ⅰ．標準（足場設置面が平坦）・・・桝組足場 Ⅱ．Ⅰが不適当な場合・・・単管足場</li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配1分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>足場工面積（掛<math>m^2</math>） ① ② 単管傾斜＝<math>h \times L</math></li> </ol>
橋台		<ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配1分未満）場合 Ⅰ．標準（足場設置面が平坦）・・・桝組足場 Ⅱ．Ⅰが不適当な場合・・・単管足場</li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配1分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>フーチング部についても高さ（h）が2.0m以上の場合は足場を計上する。</li> <li>足場工面積（掛<math>m^2</math>） ① 桝組＝<math>\{2(b+L) + 8.8\} \times h</math> ② (<math>h_3 &lt; 2.0m</math>の場合) 桝組＝<math>\{L + 2 \times b_1 + 4.4 + 2 \times (\varnothing - 1.0)\} \times h_1 + h_1 \times b_2</math> (<math>h_3 &gt; 2.0m</math>の場合) 桝組＝<math>\{L + 2 \times b_1 + 4.4 + 2 \times (\varnothing - 1.0)\} \times h_1 + h_1 \times b_2 + h_2 \times b_3 \times 2</math> ③ 単管傾斜＝<math>h_1 \times L</math> 桝組＝<math>(L + 2 \times b_1 + 4.4) \times h_2 + h_3 \times b_2</math></li> </ol>

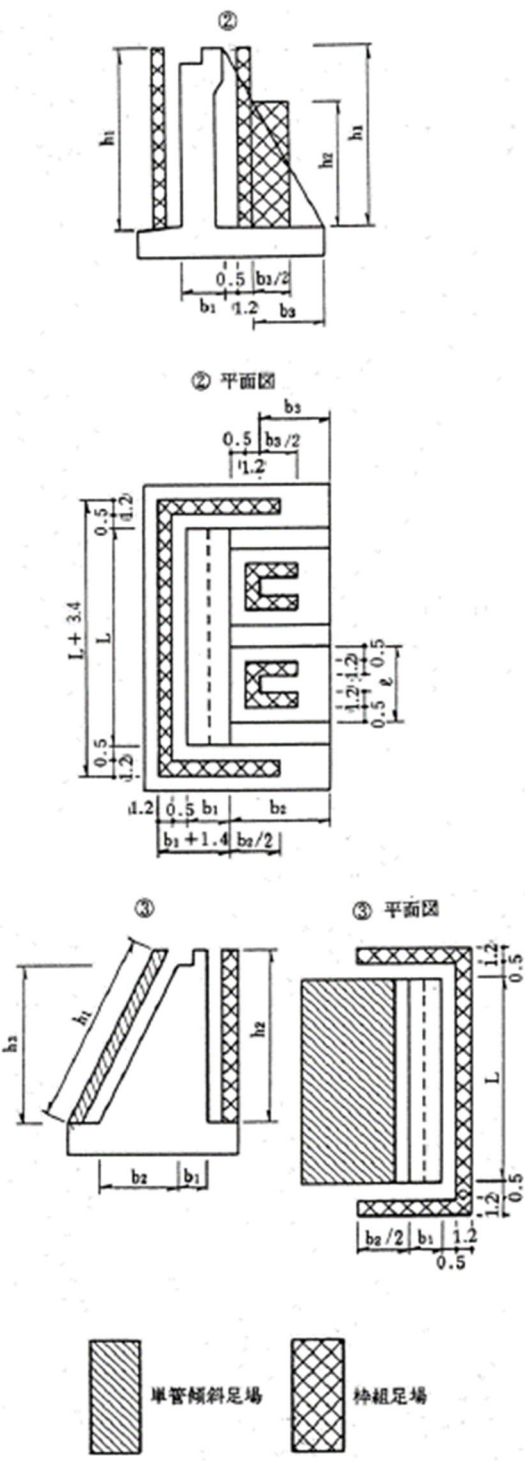
橋 台	 <p>② 平面図</p> <p>③ 平面図</p> <p>単管傾斜足場      桝組足場</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配1分未満）場合             <ol style="list-style-type: none"> <li>標準（足場設置面が平坦）・・・桝組足場</li> <li>I が不適当な場合・・・単管足場</li> </ol> </li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配1分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>フーチング部についても高さ（h）が2.0m以上の場合は足場を計上する。</li> <li>足場工面積（掛<math>m^2</math>）             <ol style="list-style-type: none"> <li>桝組 = <math>\{2(b+L) + 8.8\} \times h</math></li> <li><math>(h_3 &lt; 2.0m)</math> の場合 桝組 = <math>\{L + 2 \times b_1 + 4.4 + 2 \times (\ell - 1.0)\} \times h_1 + h_1 \times b_2</math> <math>(h_3 &gt; 2.0m)</math> の場合 桝組 = <math>\{L + 2 \times b_1 + 4.4 + 2 \times (\ell - 1.0)\} \times h_1 + h_1 \times b_2 + h_2 \times b_3 \times 2</math></li> <li>単管傾斜 = <math>h_1 \times L</math> 桝組 = <math>(L + 2 \times b_1 + 4.4) \times h_2 + h_3 \times b_2</math></li> </ol> </li> </ol>
--------	--	--

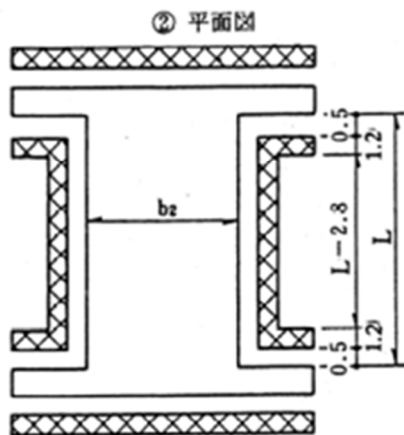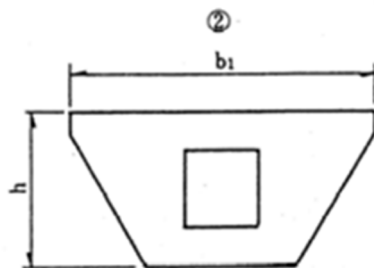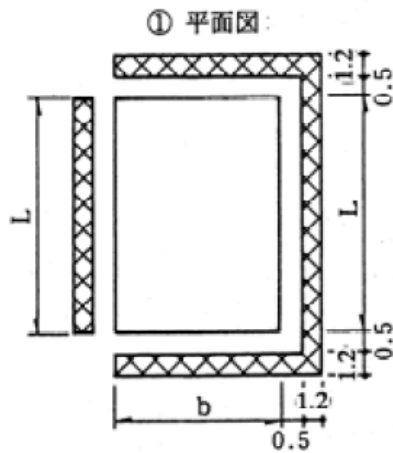函  
渠  
・  
樋  
管


1. 枠組足場を標準とする。
2. 高さ (h) が2.0m未満は原則として足場は計上しない。
3. 足場工面積 (掛 $m^2$ )
  - ①  
枠組 $=h_1 \times L + (L + 2 \times b + 4.4) \times h_2$
  - ②  
枠組 $=2 \times (L + 2 \times b_1 - b_2 - 4.4) \times h$

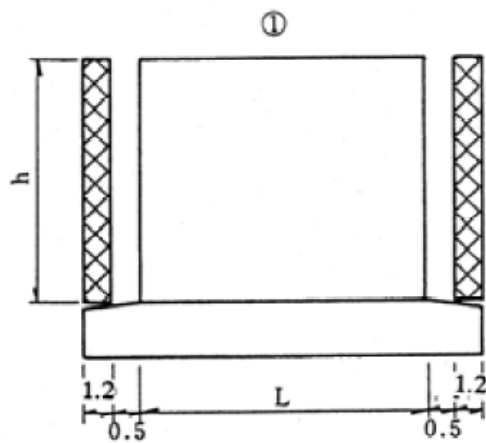橋  
脚


① 平面図



②（埋戻しを考慮しない場合）

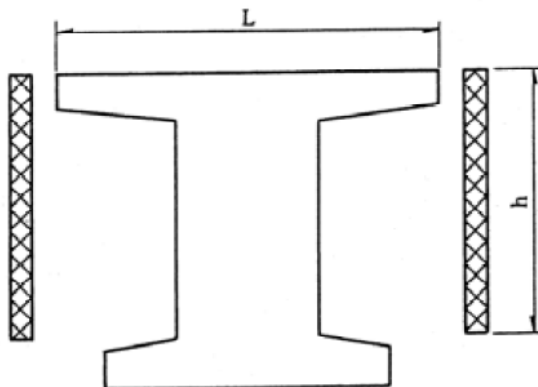

②（埋戻しを考慮しない場合）平面図

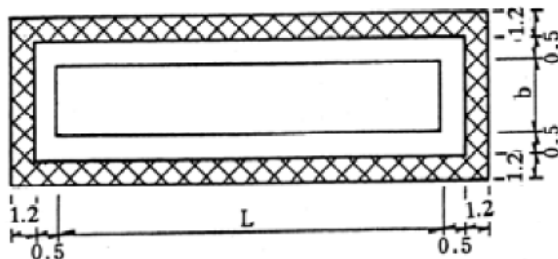


1. 枠組足場を標準とする。  
直に近い場合（勾配1分以下）は枠
2. 高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。
3. フーチング部についても高さ（h）が2.0m以上の場合は足場を計上する。
4. 足場工面積（掛 $m^2$ ）
  - ① 枠組＝ $\{2(b+L)+8.8\} \times h$
  - ②（埋戻しを考慮しない場合）  
枠組＝ $\{2 \times (b+L)+8.8\} \times h$
  - ②（埋戻しを考慮する場合）  
枠組＝ $\{2 \times (b+L_1)+8.8\} \times h_1 + \{2 \times (b+L_2)+8.8\} \times h_2$
  - ③（埋戻しを考慮しない場合）  
枠組＝ $\{2 \times (b+L)+8.8\} \times h$
  - ③（埋戻しを考慮する場合）  
枠組＝ $\{2 \times (b+L_1)+8.8\} \times 2 \times h_1 + \{2 \times (b+L_2)+8.8\} \times h_2$
  - ④ 枠組＝ $\{4 \times (b_1+b_2)+17.6\} \times h$

## (2) 支保工の計算例（土木工事数量算出要領）

函 渠 ・ 橋 脚 等	<div data-bbox="411 360 678 633"> <p>①</p> </div> <div data-bbox="279 723 837 974"> <p>②（埋戻しを考慮しない場合）      ②（埋戻しを考慮する場合）</p> </div> <div data-bbox="359 1104 742 1400"> <p>③（埋戻しを考慮しない場合）</p> </div> <div data-bbox="319 1456 766 1758"> <p>③（埋戻しを考慮する場合）</p> </div>	<p>支保工の体積（空 <math>\text{m}^3</math>） 左図に示す内空体積</p>
----------------------------	--	--

## (3) 支保工概念図（参考例）（土木工事数量算出要領）

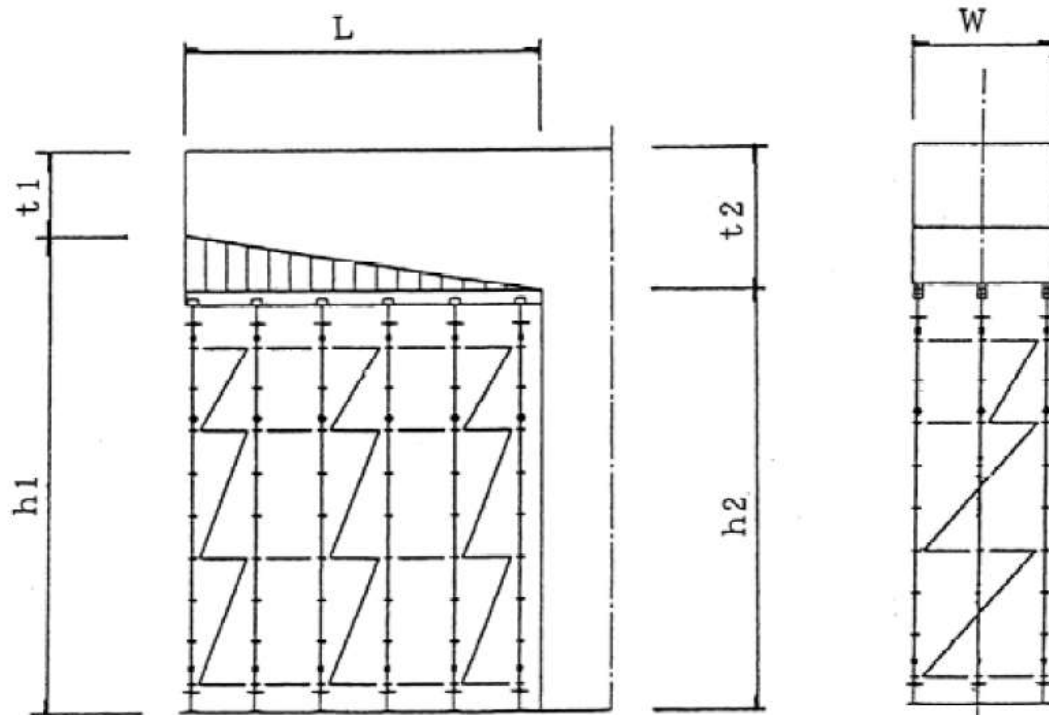

支保工対象数量は、完成内空断面とする。

- ◎ 支保耐力決定のためのコンクリート厚（ $t$ ）は、次式により算出する。

$$t = (t1 + t2) \div 2$$

- ◎ 支保工の空体積（空  $m^3$ ）は、次式により算出する。

$$V = (h1 + h2) \div 2 \times L \times W$$

## ⑧ 締切排水工（建地-D）


## 1. 適用範囲

本資料は、仮設工のうち河川、道路、砂防工事などの水中締切、地中締切の排水工事で、全揚程が15m以下の場合に適用するものとし、ダム本体工事などの大規模工事の排水工事には適用しない。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

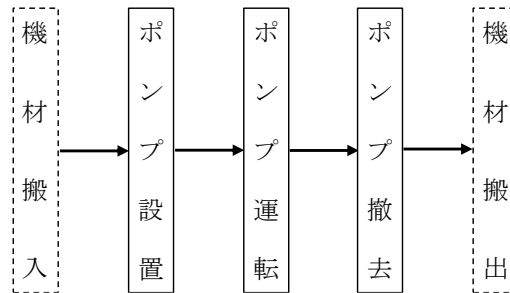

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-1 施工フロー

## 2-2 排水方法の選定

排水方法は、作業時排水又は常時排水とする。

（1）作業時排水とは、作業前（1～3時間）から排水し始めて、作業終了後には排水を中止する方法をいう。

なお、作業時排水には、コンクリート打設前後の型枠組立・養生などのための一時的に昼夜排水するものも含む。

（2）常時排水とは、昼夜連続的に排水する方法をいう。

## 3. 施工歩掛

## 3-1 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種を選定（ポンプ運転）

機 械 名	規 格		単 位	数 量				摘 要
				排 水 量 (m <sup>3</sup> /h)				
				0以上 40未満	40以上 120未満	120以上 450未満	450以上 1,300未満	
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型（潜水ポンプ） 口径150mm，全揚程15m以下		台	1	－	1	－	
	普通型（潜水ポンプ） 口径200mm，全揚程15m以下		〃	－	1	2	5	
発 動 発 電 機	ディーゼル エンジン駆動 排出ガス対策型 （第2次基準値）	定格容量 25kVA	〃	1	－	－	－	
		定格容量 35kVA	〃	－	1	－	－	
		定格容量 60kVA	〃	－	－	1	－	
		定格容量 100kVA	〃	－	－	－	1	

- （注）1. 工事用水中モータポンプの動力源は、発動発電機を標準とする。  
 2. 工事用水中モータポンプ及び発動発電機は、賃料とする。  
 3. 現場状況等により上表により難しい場合は、別途考慮する。  
 4. 現場条件により、工事用水中モータポンプの動力源が商用電源の場合は、別途考慮する。



## 3-2 運転工歩掛

## (1) 運転日数

排水期間中のポンプの運転日数は、工事の規模、現場状況などから積上げて算出するものとする。

## (2) 労務歩掛

ポンプの排水現場1箇所当りの日当り運転歩掛は、次表とする。

表3.2 ポンプ運転歩掛 (人/1箇所・日)

名 称	排 水 方 法	
	作 業 時 排 水	常 時 排 水
特 殊 作 業 員	0.14	0.17

- (注) 1. 歩掛は、運転日当り運転時間が作業時排水8h、常時排水24hを標準としたものである。
2. 労務単価は、時間外手当等を考慮しない。
3. 歩掛は、排水方法にかかわらず、排水現場1箇所当りポンプ台数が1～5台の運転労務歩掛を標準としたものである。現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。
4. 1工事中に数分割の締切がある場合は、1締切現場を1箇所とする。

## (3) 諸雑費

諸雑費は、ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に下表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表3.3 諸雑费率 (%)

排 水 方 法	作 業 時 排 水	常 時 排 水
諸 雑 費 率	3	1

## 3-3 設置・撤去歩掛

ポンプの設置・撤去に要する1箇所当りの歩掛は、次表を標準とする。

表3.4 設置・撤去歩掛 (1箇所)

名 称	規 格	単 位	数 量
土 木 一 般 世 話 役		人	0.5
特 殊 作 業 員		〃	0.1
普 通 作 業 員		〃	2.0
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	0.5

- (注) 1. バックホウは、賃料とする。
2. 歩掛及び運転日数は、1締切現場当りポンプ設置・撤去台数が1～5台が標準であり、上表により難しい場合は、別途考慮する。
3. 使用機械・規格については上表を標準とするが、現場条件により上表により難しい場合は、別途選定できるものとする。
4. 歩掛には、配管設置・撤去労務を含む。
5. 1工事中に数分割の締切がある場合は、1締切現場を1箇所とする。

## 4. 内訳書及び単価表

## (1) 締切排水内訳書

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ポ ン プ 運 転		日		単価表(2)
ポンプ設置・撤去		箇所		単価表(3)
計				

## (2) ポンプ運転1日当り単価表

SWB252310

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
特 殊 作 業 員		人		表3.2
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ 運 転	普通型（潜水ポンプ）	日	1	表3.1 機械賃料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第2次基準値）	〃	1	表3.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表3.3
計				

## (3) ポンプ設置・撤去1箇所当り単価表

SWB252320

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日		表3.4 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (4) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	普通型（潜水ポンプ）	機－30	機械賃料数量→(常時排水) 1.1 (作業時排水) 1.2
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 定格容量 25kVA 定格容量 35kVA 定格容量 60kVA 定格容量100kVA	機－16	(常時排水) 燃料消費量→ 25kVA→ 79 35kVA→115 60kVA→199 100kVA→312  機械賃料数量→ 1.1
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第2次基準値） 定格容量 25kVA 定格容量 35kVA 定格容量 60kVA 定格容量100kVA	機－16	(作業時排水) 燃料消費量→ 25kVA→ 26 35kVA→ 38 60kVA→ 66 100kVA→104  機械賃料数量→ 1.2
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量 → 69 機械賃料数量→ 1.16

## ⑨ ウエルポイント工（建地-C）

## 1. 適用範囲

本資料は、構造物等の掘削工事におけるウエルポイント工に適用する。


## 2. 施工概要

## 2-1 施工内容

この工法は、地下水低下工法の一つで、真空効果を利用して強制的に土中の水を抜き取る工法である。

## 2-2 施工フロー


施工フローは、下記を標準とする。

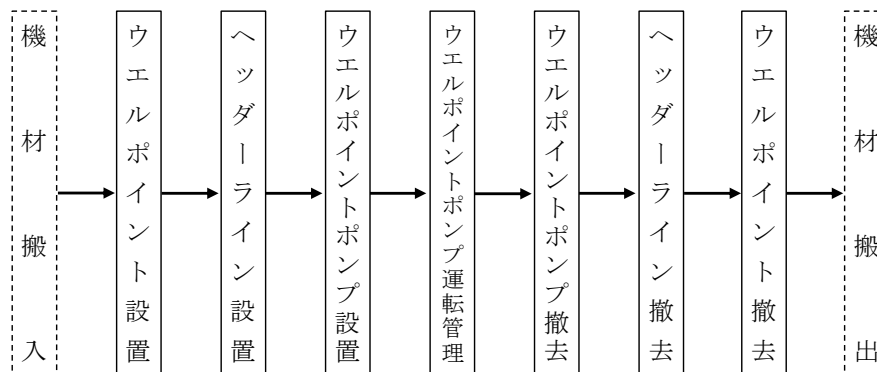

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-1 施工フロー

## 2-3 参考図等

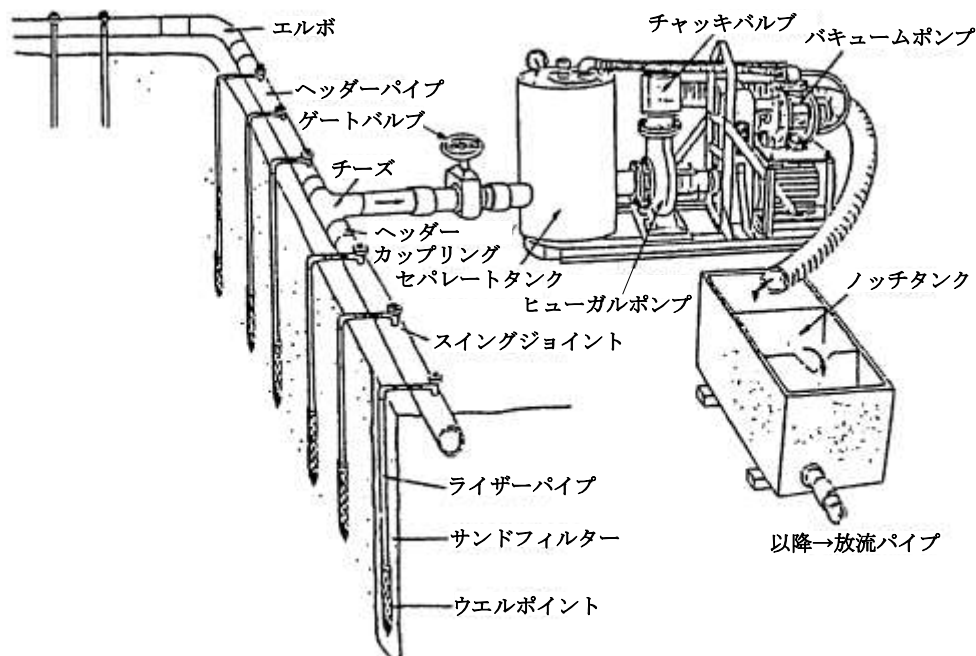

（用語の説明）

ウエルポイント……ウエルポイント、ライザーパイプ、スイングジョイント  
 ヘッダーライン……ヘッダーパイプ、ヘッダーカップリング、エルボ、チーズ等  
 ウエルポイントポンプ（1組）……バキュームポンプ、ヒューガルポンプ、セパレートタンク、  
 チャッキバルブ、ゲートバルブ、ノッチタンク、放流パイプ等

図2-2 参考図

## 3. 施工歩掛

## 3-1 ウエルポイント設置・撤去歩掛

ウエルポイント設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 ウエルポイント設置・撤去歩掛 (100本当たり)

名 称	規 格	単 位	施工規模			
			100本未満		100本以上	
			設 置	撤 去	設 置	撤 去
土 木 一 般 世 話 役		人	2.7	1.8	2.3	1.2
特 殊 作 業 員		〃	7.5	5.0	6.5	3.5
普 通 作 業 員		〃	7.5(11.5)	7.6	6.7(10.1)	5.4
ジ ェ ッ ト 装 置		日	2.5	—	2.1	—
諸 雑 費 率		%	32(33)	36	34(36)	37

(注) 1. 歩掛に含まれる作業

〔設置〕ウエルポイント組立・打込み、ヘッダーライン設置までである。

〔撤去〕ヘッダーライン撤去、ウエルポイント引抜き・解体までである。

2. ( ) 書きはサンドフィルターを使用する場合。

3. 諸雑費は、サンドフィルターを使用する場合の材料費、スパナ、パイプレンチ、チェンソー、ペンチ、水位計の工具費、トラック（クレーン装置付）運転経費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

4. 諸雑費内の電力に関する経費については、低圧電力・臨時契約を標準としており、これにより難しい場合は「ウエルポイント設置」の諸雑費率から1%減ずるものとし、電力使用量を次式により求め別途計上する。

電力使用量 (kWh) = 15kW × 0.9 × Td × Th × ウエルポイント施工本数…式3.1

Td : ウエルポイント施工1本当たりジェット装置運転日数 (日/本)

Th : ジェット装置運転日当たり運転時間 (h/日)

表3.2 ウエルポイント施工1本当たりジェット装置運転日数 (Td)

	Td (日/本)
施工規模 100 本未満	0.025
100 本以上	0.021

表3.3 ジェット装置運転日当たり運転時間 (Th)

	Th (日/本)
施工規模 100 本未満	5.0
100 本以上	4.2

5. 歩掛には、現場内小運搬を含む。

6. 本歩掛は、商用電源（低圧電力・臨時契約）を標準としているため、基本料金、工事費負担金、受電設備等の費用を別途計上する。

## 3-2 ウエルポイントポンプ設置・撤去歩掛

ウエルポイントポンプ設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表3.4 ウエルポイントポンプ設置・撤去歩掛 (1組当り)

名 称	単位	設 置	撤 去
土 木 一 般 世 話 役	人	0.3	0.1
特 殊 作 業 員	〃	0.9	0.6
普 通 作 業 員	〃	1.2	0.8
諸 雑 費 率	%	36	26

- (注) 1. 上表は、ゲートバルブから放流パイプまでの設置・撤去歩掛である。  
 2. 諸雑費は、放流パイプの損料、スパナ、パイプレンチ、チェントング、ペンチ、水位計の工具費、トラック（クレーン装置付）運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 3. 歩掛には、現場内小運搬を含む。

## 3-3 ウエルポイントポンプ運転管理歩掛

ウエルポイントポンプ運転管理歩掛は、次表を標準とする。

表3.5 ウエルポイントポンプ運転管理歩掛 (1日当り)

名 称	単位	ポンプ使用組数
		1～5組
土 木 一 般 世 話 役	人	0.2
特 殊 作 業 員	〃	0.7
諸 雑 費 率	%	38×使用組数

- (注) 1. 歩掛は、運転日当り運転時間が24hを標準としたものである。現場条件により難しい場合は別途考慮する。  
 2. 労務単価は、時間外手当等を考慮しない。  
 3. ポンプ使用組数は、1組から5組を標準とし、これ以外は別途考慮する。  
 4. 諸雑費は、スパナ、パイプレンチ、チェントング、ペンチ、水位計の工具費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。  
 5. 諸雑費内の電力に関する経費については、低圧電力・臨時契約を標準としており、これにより難しい場合は、諸雑費率5%×使用組数とし、電力使用量を次式により求め別途計上する。  

$$1日当り電力使用量(kWh) = 18.5kW \times 0.9 \times 24h \times \text{使用組数} \cdots \cdots \text{式3.2}$$
  
 6. 本歩掛は、商用電源（低圧電力・臨時契約）を標準としているため、基本料金、工事費負担金、受電設備等の費用を別途計上する。

## 3-4 その他

- (1) ウエルポイント設置時に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。  
 (2) ウエルポイント設置時に発生する濁水の処理設備、運搬・処理及び下水道による処理が必要な場合は、別途計上する。

## 4. 内訳書及び単価表

## (1) ウエルポイント工内訳書

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ウ エ ル ポ イ ン ト 設 置		本		単価表 (3)
ウ エ ル ポ イ ン ト 撤 去		〃		〃
ウエルポイントポンプ設置		組		単価表 (5)
ウエルポイントポンプ撤去		〃		〃
ウエルポイントポンプ運転管理		日		単価表 (6)
ウ エ ル ポ イ ン ト 工 損 料		式	1	単価表 (7)
ジ ェ ッ ト 装 置 損 料		〃	1	単価表 (8)
計				

## (2) ウエルポイント設置・撤去100本当り内訳書

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ウ エ ル ポ イ ン ト 設 置		本		単価表 (3)
ウ エ ル ポ イ ン ト 撤 去		〃		単価表 (3)
計				

## (3) ウエルポイント設置又は撤去100本当り単価表

SWB252411

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.1
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## (4) ウエルポイントポンプ設置・撤去1組当り内訳書

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ウエルポイントポンプ設置		組		単価表 (5)
ウエルポイントポンプ撤去		〃		単価表 (5)
計				

## (5) ウエルポイントポンプ設置又は撤去1組当り単価表

SWB252431

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.4
特 殊 作 業 員		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

## (6) ウエルポイントポンプ運転管理1日当り単価表

SWB252440

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.5
特 殊 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

(7) ウェルポイント工損料1式当り単価表

SWB252450

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ウェルポイントポンプ 損料（供用1日当り）		日		$\frac{\text{供用1箇月当り損料}}{30} \times \text{使用組数}$
〃（1現場当り）		組		
ウェルポイント損 料（供用1日当り）		日		$\frac{\text{供用1箇月当り損料}}{30} \times \text{使用本数}$
〃（1現場当り）		本		
ヘッダーライン損 料（供用1日当り）		日		$\frac{\text{供用1箇月当り損料}}{30} \times \text{使用延長}$
〃（1現場当り）		m		
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) ヘッダーライン及びウェルポイント部分で海水又は機械器具に対して腐蝕作用のある薬液の影響を直接  
受ける箇所に敷設するものの損料は、現場条件を考慮し、50%の範囲で増額補正することができる。

(8) ジェット装置損料1式当り単価表

SWB252460

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
ジェット装置損料 （供用1日当り）		日		$\frac{\text{供用1箇月当り損料}}{30}$
〃（1現場当り）		組	1	
スターカッター損料 （供用1日当り）		日		$\frac{\text{供用1箇月当り損料}}{30}$
〃（1現場当り）		個	1	
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) スターカッターは必要に応じて計上。

## ⑩ 土のう工（建地－F）

## ⑩－1 土のう工

## 1. 適用範囲

本資料は、簡易な仮締切工に適用するものとし、仕拵、積立、撤去の各作業よりなるものとする。

## 2. 施工歩掛

## 2－1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛

土のう仕拵・積立・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表 2.1 土のう仕拵・積立・撤去歩掛 (100 袋当り)

種別/工種	材 料	仕 拵	積 立	撤 去	合 計
土 の う	化学セシイ土のう	2.0	1.0	1.2	4.2


## 2－2 土のう積材料使用量

材料の使用量については、次表を標準とする。

表 2.2 土のう積材料使用量

規 格	袋数/㎡当り		詰土量・質量/袋	
	小口並べ	側面並べ	㎥/袋	kg/袋
62×48cm	17	14	0.02	40

土のう袋数=1㎡ 当り袋数×直高×延長



(注) 詰土量は地山土量とする。



## 3. 単価表

## (1) 土のう 100 袋当り単価表

SWB252610

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 砂		m <sup>3</sup>	2	100袋×0.02m <sup>3</sup> /袋
普 通 作 業 員		人		表2.1
土 の う	62×48cm	袋	100	
諸 雑 費		式	1	
計				

(2) 土のう積工 10m<sup>2</sup>当り単価表

SWB252620

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 砂		m <sup>3</sup>		表2.2
土 の う	62×48cm	袋		〃
普 通 作 業 員		人		表2.1, 表2.2
諸 雑 費		式	1	
計				

## ⑩-2 大型土のう工（建地-F）

## 1. 適用範囲


本資料は、大型土のうの製作・設置、撤去に適用する。

なお、大型土のうの袋材は、容量 1m<sup>3</sup>を標準とする。


## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

## ①製作・設置



## ②撤去



（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	作業半径	機械名	規格	単位	数量	摘要
製作	—	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	台	1	
設置・撤去	6m以下	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	〃	1	
	6mを超え 20m以下	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	1	

（注） 1. バックホウ及びラフテレーンクレーンは、賃料とする。

2. 現場条件により、上記により難しい場合は、別途考慮する。

## 4. 製作・設置歩掛

## 4-1 編成人員

製作から設置までの一連の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 日当り編成人員 (人)

土 木 一 般 世 話 役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員
1	1	1

(注) 1. 上表は、横取り作業（12mまで：製作現場～仮置場）を含む。

2. 製作現場と設置現場が異なる場合は、積込・荷卸・運搬等必要な費用を別途計上する。

## 4-2 日当り施工量

日当り施工量は、次表を標準とする。

表4.2 日当り施工量

作 業 種 別	単 位	施 工 量
製 作 ・ 設 置	袋	36 (52)

(注) ラフテレーンクレーンを使用する場合は、( ) 内を使用する。

## 4-3 諸雑費

諸雑費は、製作枠等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表4.3 諸雑費率 (%)

諸 雑 費 率	4 (6)
---------	-------

(注) ラフテレーンクレーンを使用する場合は、( ) 内を使用する。

## 5. 施工歩掛

## 5-1 編成人員

製作、設置、撤去作業を単独で行う場合の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表5.1 日当り編成人員 (人)

作 業 種 別	土木一般世話役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員
製 作	1	1	1
設 置	1	1	1
撤 去	1	1	—

(注) 1. 製作には、横取り作業（12mまで：製作現場～仮置場）を含む。

2. 製作現場と設置現場が異なる場合は、積込・荷卸・運搬等必要な費用を別途計上する。

3. 撤去には、中詰材排出を含む。

## 5-2 日当り施工量

日当り施工量は、次表を標準とする。

表5.2 日当り施工量

作 業 種 別	単 位	施 工 量
製 作	袋	62
設 置	〃	86 (80)
撤 去	〃	144 (134)

(注) 1. ラフテレーンクレーンを使用する場合は、( ) 内を使用する。

2. 袋材の処分費及び残土処理費が必要な場合は、別途計上する。

## 5-3 諸雑費

諸雑費は、製作枠等の費用であり、製作労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表5.3 諸雑費率 (%)

諸 雑 費 率（製作）	7
-------------	---

## 6. 単価表

## (1) 大型土のう製作・設置 10 袋当り単価表（バックホウ設置）

SWB252730

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃
普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃
大 型 土 の う	容量1m <sup>3</sup>	袋	10	
土 砂		m <sup>3</sup>	10	ほぐした土量
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.3
計				

(注) D：日当り施工量

## (2) 大型土のう製作・設置 10 袋当り単価表（ラフテレーンクレーン設置）

SWB252731

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	1×10/D	表4.1, 表4.2
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃
普 通 作 業 員		〃	1×10/D	〃
大 型 土 の う	容量1m <sup>3</sup>	袋	10	
土 砂		m <sup>3</sup>	10	ほぐした土量
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	10/D	表4.2 機械賃料
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	表4.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.3
計				

(注) D：日当り施工量

(3) 大型土のう製作 10 袋当り単価表

SWB252732

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	1×10/D	表5.1, 表5.2
特殊作業員		〃	1×10/D	〃
普通作業員		〃	1×10/D	〃
大型土のう	容量1m <sup>3</sup>	袋	10	
土 砂		m <sup>3</sup>	10	ほぐした土量
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	10/D	表5.2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表5.3
計				

(注) D：日当り施工量

(4) 大型土のう設置 10 袋当り単価表

SWB252733

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	1×10/D	表5.1, 表5.2
特殊作業員		〃	1×10/D	〃
普通作業員		〃	1×10/D	〃
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型(第3 次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	10/D	表5.2 作業半径6m以下の場合 機械賃料
ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	表5.2 作業半径6mを超え 20m以下の場合 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) D：日当り施工量

## (5) 大型土のう撤去 10 袋当り単価表

SWB252734

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土木一般世話役		人	1×10/D	表5.1, 表5.2
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型(第3 次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	10/D	表5.2 作業半径6m以下の場合 機械賃料
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 25t吊	〃	10/D	表5.2 作業半径6mを超え 20m以下の場合 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

(注) D:日当り施工量

## (6) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 超低騒音型・排出ガス対策型(第 3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	機-28	<b>【製作・設置】</b> (バックホウによる設置) 運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 98 機械賃料数量 → 1.39  <b>【製作・設置】</b> (ラフテレーンクレーンによる設置) 運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 112 機械賃料数量 → 1.44  <b>【製作】</b> 運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 112 機械賃料数量 → 1.44  <b>【設置】</b> 運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 88 機械賃料数量 → 1.36  <b>【撤去】</b> 運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 74 機械賃料数量 → 1.26

## ⑪ 仮橋・仮栈橋工（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、鋼製による仮橋及び仮栈橋の上部工（桁の架設・撤去、覆工板設置・撤去、高欄設置・撤去）と下部工（橋脚設置・撤去、杭橋脚打込・引抜及び設置・撤去）で、支間長39m以下に適用する。

ただし、下部工は橋脚高24m以下とし、橋脚と杭橋脚の区分については、図2-2 仮橋・仮栈橋工概念図による。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

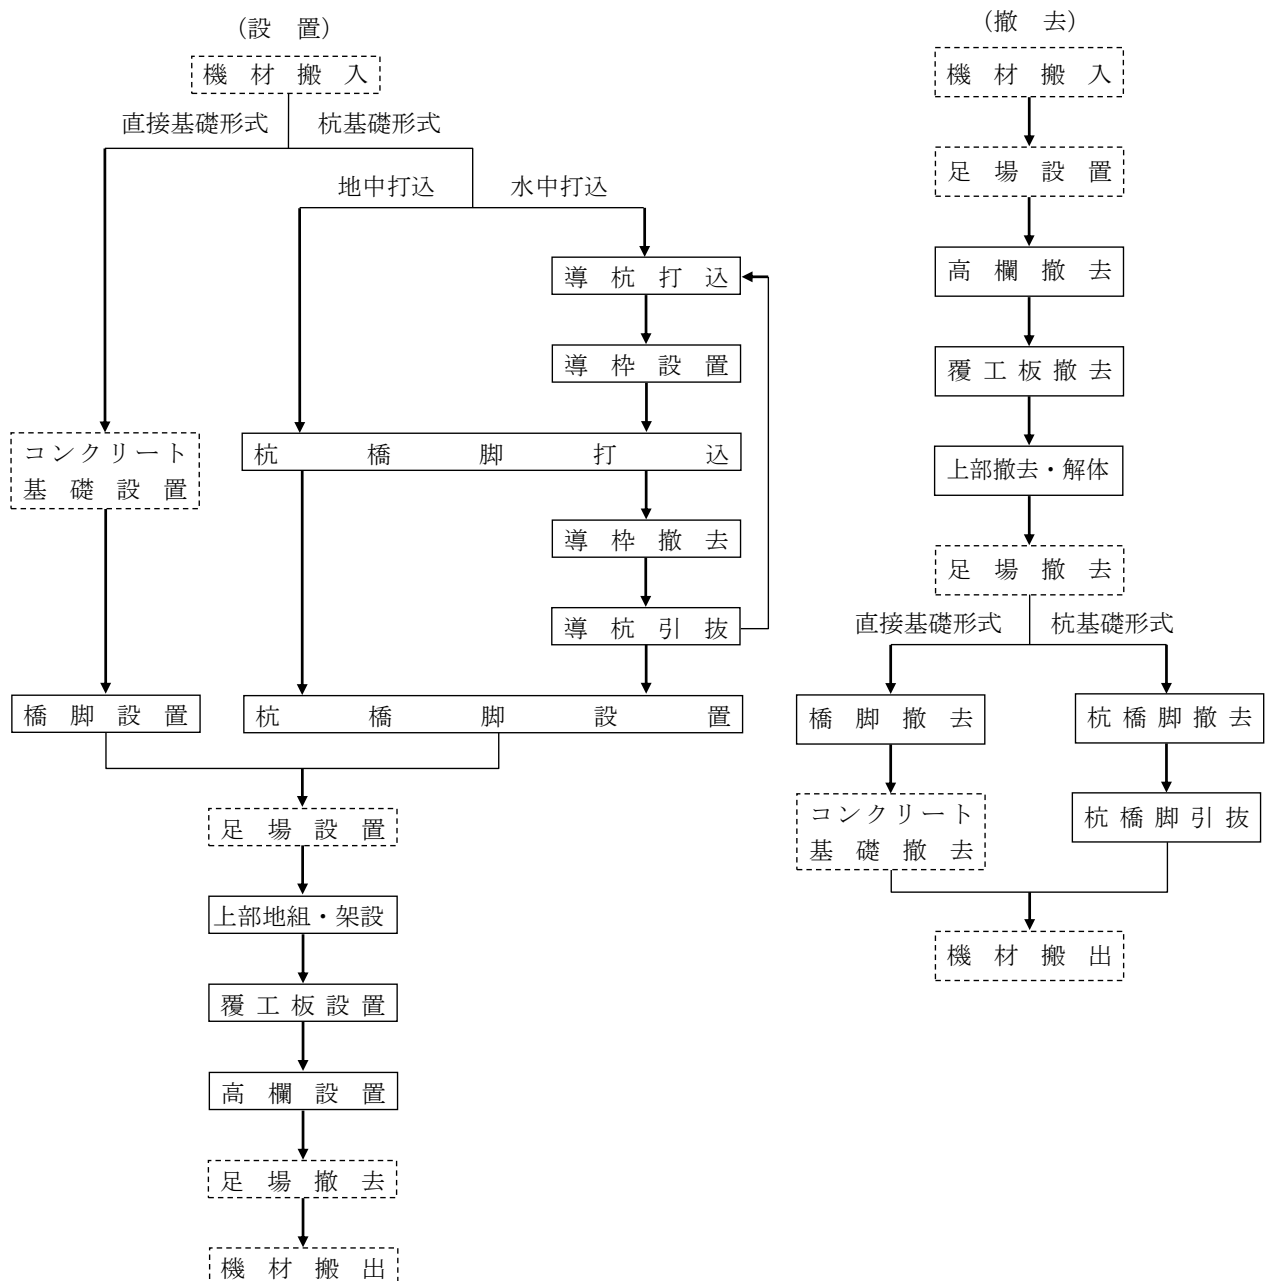


図2-1 施工フロー

## 参考図（概念図）

橋脚、杭橋脚等の区分は、次図による。

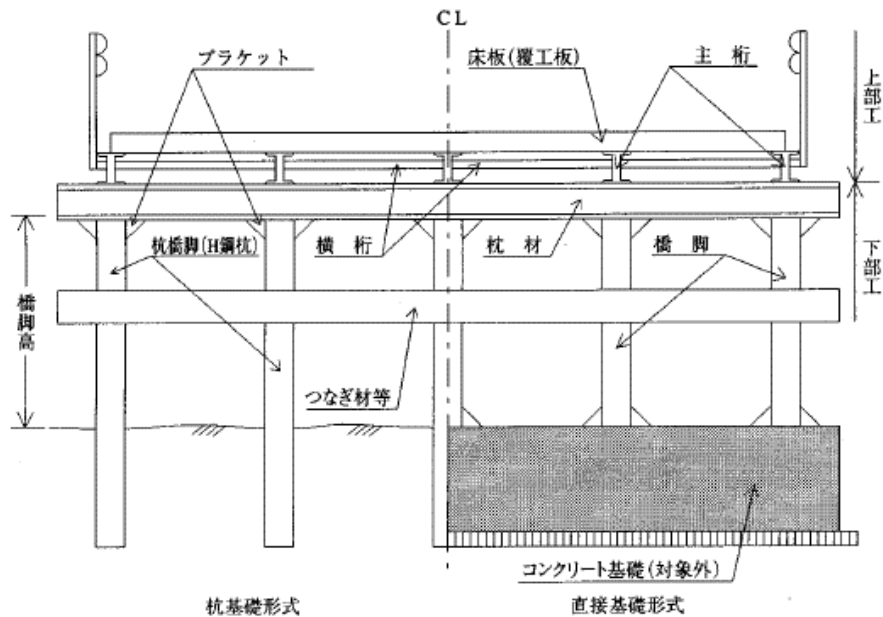


図2-2 仮橋・仮栈橋工概念図

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

作業種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
直接基礎形式	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 〇〇t吊	台	1	
杭基礎形式	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 〇〇t吊	〃	1	

- (注) 1. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一機種で選定することを標準とするが、現場条件により上表により難しい場合は、現場条件に適合した機種とすることができる。
2. ラフテレーンクレーンは賃料、クローラクレーンは損料とする。
3. 杭橋脚打込・引抜、導杭打込・引抜については、表4. 8より選定する。
4. ラフテレーンクレーンで、7t吊、10t吊、45t吊を選定した場合は、排出ガス対策型（第1次基準値）とする。



## 4. 施工歩掛

## 4-1 上部工

## 4-1-1 架設・撤去工

上部工の架設・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.1 架設・撤去工歩掛 (10t当り)

名 称	規 格	単位	数量		摘 要
			架 設	撤 去	
橋りょう世話役		人	0.62	0.34	
橋りょう特殊工		〃	2.1	1.0	
溶 接 工		〃	—	0.13	
普 通 作 業 員		〃	0.41	0.17	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日	0.58	0.29	
諸 雑 費 率		%	6	5	

- (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。  
 2. 本歩掛には、地組・解体作業及び架設に伴う本締めも含む。  
 3. 架設・撤去の対象質量は、架設・撤去すべき主桁、横桁の質量で、高力ボルト、覆工板、高欄の質量は含まない。  
 4. 諸雑費は、電力に関する経費、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-1-2 覆工板設置・撤去工

覆工板設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.2 覆工板設置・撤去工歩掛 (100m<sup>2</sup>当り)

名 称	規 格	単位	数量		摘 要
			設 置	撤 去	
土 木 一 般 世 話 役		人	0.45	0.27	
と び 工		〃	1.5	0.80	
普 通 作 業 員		〃	0.27	0.12	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日	0.47	0.21	
諸 雑 費 率		%	2	2	

- (注) 1. 上表には、路面のすりつけ作業は含まない。  
 2. 諸雑費は、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-1-3 高欄設置・撤去工

高欄設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.3 高欄設置・撤去工歩掛 (100m当り)

名 称	規 格	単位	数量				摘 要
			ガードレール型		単管パイプ型		
			設 置	撤 去	設 置	撤 去	
土 木 一 般 世 話 役		人	1.4	0.87	1.0	0.6	
と び 工		人	4.0	2.8	－	－	
普 通 作 業 員		〃	1.0	1.2	3.8	2.1	
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日	1.4	0.40	－	－	
諸 雑 費 率		%	1	1	－	－	

- (注) 1. 高欄型式は、仮橋はガードレール型、仮棧橋は単管パイプ型を標準とする。  
 2. 諸雑費は、高欄の組立・解体に必要な器具及び吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-2 下部工

## 4-2-1 橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）

橋脚設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.4 橋脚設置・撤去工歩掛 (10t当り)

名 称	規 格	単位	数量		摘 要
			設 置	撤 去	
橋りょう世話役		人	1.7	1.1	
橋りょう特殊工		〃	4.2	3.0	
溶 接 工		〃	1.1	1.0	
普通作業員		〃	2.6	1.4	
ラフテレーンクレーン 運 転	〇〇t吊	日	1.5	0.7	
諸 雑 費 率		%	6	1	

- (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。  
 2. 橋脚設置に伴う本締めも含む。  
 3. 設置・撤去の対象質量は、設置・撤去すべき橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等質量で、高力ボルトの質量は含まない。  
 4. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機（エンジン付）、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、ドリフトピン、仮締めボルト、インパクトレンチ、トルクレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-2-2 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）

## 4-2-2-1 杭橋脚打込・引抜き

## (1) 機種の選定

## (1)-1 機種の選定

H形鋼の打込みに使用する電動式バイプロハンマの機械・規格は、次表を標準とする。

表4.5 機種の選定(打込み)

		バイプロハンマ施工	ウォータジェット併用施工
最大N値		$N_{\max} < 50$	$50 \leq N_{\max} \leq 80$
打込長	20m以下	60kW	
	25m以下	90kW	
杭打ち用ウォータジェット		—	14.7MPa 325 ℓ/min×2台 (14.7MPa 325 ℓ/min×1台)

(注) 1. ウォータジェット併用施工における（ ）書きは、 $N_{\max} < 50$ の場合で、転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータジェットを使用する必要性が生じた場合に計上する。

2. 対象地盤の最大N値が50以上のものについては、次式により換算N値を求めたうえで適用する。

$$\text{換算N値} = \frac{1,500}{\text{落下50回当たり貫入量 (cm)}}$$

3. 打込長は、地表面よりのH形鋼の打込長であり、H形鋼長とは異なる。

4. 本歩掛の適用範囲は、表4.6のとおりとするが、これにより難しい場合は別途考慮する。

表4.6 打込長

H形鋼形式		H200・250	H300	H350・400
打込長 (m)	バイプロハンマ施工	13以下	20以下	25以下
	ウォータジェット併用施工	16以下	25以下	25以下

H形鋼の引抜きに使用する電動式バイプロハンマの機械・規格は、N値に関係なく次表を標準とする。

表4.7 機種の選定(引抜き)

	引抜き長	規格
H形鋼	25m以下	60kW

(注) 引抜き長は、地表面よりのH形鋼の引抜き長であり、H形鋼長とは異なる。

## (1)-2 付属機械

バイプロハンマの付属機器の機械は次表を標準とし、吊上げ能力については現場条件に適合した規格とすることが出来る。現場条件によりこれにより難しい場合は、別途考慮する。

表4.8 付属機器の機械・規格

機種	バイプロハンマ規格	電動式バイプロハンマ	
		60kW	90kW
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値))		〇〇t吊	

## (2) 編成人員

H形鋼の打込み，引抜作業の日当り編成人員は，次表を標準とする。

表4.9 日当り編成人員 (人/日)

施 工 区 分	土 木 一 般 世 話 役	と び 工	普通作業員	特殊作業員
バイプロハンマ施工	1	2	1	—
ウォータジェット併用施工	1	2	1	1

## (3) 日当り施工本数

H形鋼の日当り打込み，引抜本数（N）は次表を標準とする。

① 電動式バイプロハンマによる施工（ $N_{\max} < 50$ ）

表4.10 日当り施工本数(N) (本/日)

型式 打込長 (m)	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	63	59	55	49	45
4以下	47	40	35	28	24
6以下	38	31	26	20	17
8以下	32	25	21	16	13
10以下	27	21	17	13	10
13以下	23	17	14	10	8
16以下	—	—	12	8	7
20以下	—	—	10	7	6
22以下	—	—	—	6	5
25以下	—	—	—	5	4

(注) 継施工が必要な場合，施工本数（N）は別途考慮する。

## ② 電動式バイブロハンマとウォータジェット併用による施工

表4. 11 日当り施工本数(N)

(本/日)

型式 打込長 (m)	H200	H250	H300	H350	H400
2以下	60 (65)	55 (60)	50 (56)	43 (49)	38 (45)
4以下	35 (40)	30 (35)	26 (31)	20 (25)	18 (22)
6以下	25 (29)	21 (25)	17 (21)	13 (17)	11 (15)
8以下	19 (23)	16 (19)	13 (16)	10 (13)	8 (11)
10以下	16 (19)	13 (16)	11 (13)	8 (10)	7 (9)
13以下	13 (15)	10 (13)	8 (11)	6 (8)	5 (7)
16以下	10 (13)	8 (10)	7 (9)	5 (7)	4 (6)
20以下	—	—	6 (7)	4 (5)	3 (5)
22以下	—	—	5 (6)	4 (5)	3 (4)
25以下	—	—	4 (6)	3 (4)	3 (4)

(注) 1. 継施工が必要な場合、施工本数 (N) は別途考慮する。

2. 上 段 :  $50 \leq N_{\max} \leq 80$ 下段 ( ) 書き :  $N_{\max} < 50$  で、転石等により、やむを得ずウォータジェットを使用する  
必要が生じた場合。

## ③ 引抜き

表4. 12 日当り施工本数(N)

(本/日)

引 抜 長 (m)	2以下	4以下	6以下	8以下	10以下	13以下	16以下	20以下	22以下	25以下
引抜数量 (本/日)	56	46	39	34	30	26	22	19	17	16

## (4) 諸雑費

表4. 13 諸雑費率

施 工 区 分	バイブロハンマ 機種・規格		諸 雑 費 率 (%)
バイブロハンマ単独打込	電動式	60kW	20
		90kW	27
ウォータジェット併用打込	電動式	60kW	23 (25)
		90kW	27 (30)
引 抜 き	電動式	60kW	20

(注) 1. ウォータジェット併用打込における ( ) 書きは  $N_{\max} < 50$  の場合で、転石等によりやむを得ずウォータジェットを使用する必要が生じた場合に計上する。

2. 諸雑費は、電力に関する経費、現場内小運搬費用、電気溶接機運搬経費（バイブロハンマ施工時）、ウォータジェット併用施工用付属機器運転経費及び材料費（電力に関する経費、工事用水中モータポンプ及び電気溶接機運転経費、水槽及び配管損料、配管バンド及び溶接棒）等の費用であり、打込労務費、杭打機及びウォータジェットの機械損料及び運転経費の合計額に、上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-2-2-2 杭橋脚設置・撤去工

杭橋脚設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.14 杭橋脚設置・撤去工歩掛 (10t当り)

名 称	規 格	単位	数 量		摘 要
			設 置	撤 去	
橋 り よ う 世 話 役		人	2.1	0.74	
橋 り よ う 特 殊 工		〃	4.9	1.9	
溶 接 工		〃	1.8	0.52	
普 通 作 業 員		〃	1.3	0.27	
クローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日	1.7	0.85	
諸 雑 費 率		%	13	8	

- (注) 1. 高力ボルトの材料費は、必要数量を別途計上する。  
 2. 杭橋脚設置に伴う本締めも含む。  
 3. 設置・撤去の対象質量は、設置・撤去すべき枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。  
 4. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機（エンジン付）、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-2-3 定規工（導杭・導枠）

杭橋脚（H鋼杭）を水中に打込む場合に計上することを標準とする。

## (1) 導杭打込・引抜工

導杭打込・引抜工は、4-2-2-1杭橋脚打込・引抜工による。

導杭の規格は、H形鋼（300×300）とし、施工本数は、杭橋脚打込10本当り8本で、打込長は杭橋脚打込長の50%とする。

## (2) 導枠設置・撤去工

導枠設置・撤去工の歩掛は、次表を標準とする。

表4.15 導枠設置・撤去工歩掛 (杭橋脚打込10本当り)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	0.36	
と び 工		〃	0.87	
普 通 作 業 員		〃	0.17	
クローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日	0.32	
諸 雑 費 率		%	23	

- (注) 諸雑費は、導杭、導枠に使用するH形鋼の賃料、挟締金具及び吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 5. 単価表

(1) 上部工架設・撤去工10t当り単価表

SWB252810

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
橋 り ょ う 世 話 役		人		表4.1
橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日		表3.1, 表4.1 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.1
計				

(2) 覆工板設置・撤去工100m<sup>2</sup>当り単価表

SWB252820

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日		表3.1, 表4.2 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.2
計				

(3) 高欄設置・撤去工100m当り単価表

SWB252830

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 又はクローラクレーン 運 転	〇〇t吊	日		表3.1, 表4.3 ラフテレーンクレーンは機械賃料 クローラクレーンは機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.3
計				

(4) 橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）10t 当り単価表

SWB252840

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
橋 り ょ う 世 話 役		人		表4.4
橋 り ょ う 特 殊 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン	〇〇t吊	日		表3.1, 表4.4 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表4.4
計				

(5) パイプロハンマ施工によるH形鋼の打込み又は引抜き 10 本当り単価表

(H形鋼打込, 又は引抜長〇〇m)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.12
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃
パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5, 表4.8 表4.10～表4.12 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.13
計				

(注) N: 日当り施工本数 [本/日]

(6) パイプロハンマとウォータジェット併用施工によるH形鋼の打込み 10 本当り単価表

(H形鋼打込長〇〇m)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表4.9～表4.12
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃
パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表4.5, 表4.8 表4.10～表4.12 機械損料
杭打ち用ウォータ ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第1次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表4.5 表4.10～表4.12 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.13
計				

(注) N: 日当り施工本数 [本/日]



(7) 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）10t 当り単価表

SWB252860

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
橋 り よ う 世 話 役		人		表4.14
橋 り よ う 特 殊 工		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
クローラクレーン運転	〇〇t吊	日		表3.1, 表4.14 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.14
計				

(8) 導枠設置・撤去工 杭橋脚打込 10 本当り単価表

SWB252870


名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.15
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
クローラクレーン運転	〇〇t吊	日		表3.1, 表4.15 機械損料
諸 雑 費		式	1	表4.15
計				

(9) 機械運転単価表


機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 40-45t吊 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊	機-18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 40-45t→ 64 50-55t→ 74 70t→ 106 80t→ 106 90t→ 121 100t→ 121 120t→ 121 200t→ 136 機械損料数量→ 1.31
バイプロハンマ杭打機	電動式・普通型 60kW 90kW	機-20	運転労務数量→ 1.00 機械損料1→バイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.31 機械損料2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)) 〇〇t吊 燃料消費量 40-45t→ 64 50-55t→ 74 70t→ 106 80t→ 106 90t→ 121 100t→ 121 120t→ 121 200t→ 136 機械損料数量→ 1.31
杭 打 ち 用 ウオータジェット	エンジン式・排出ガス対策型(第1次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325 ℓ/min	機-24	燃料消費量→118 機械損料数量→1.31

## 6. 参考図


## (1) 鈑桁



【側面図】




【断面図】

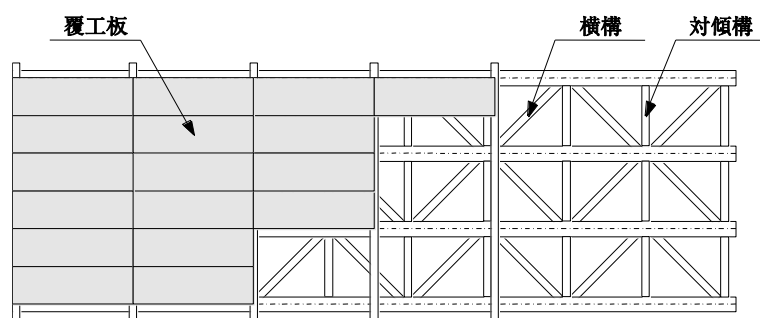


【平面図】


## (2) トラス桁



【側面図】



【断面図】

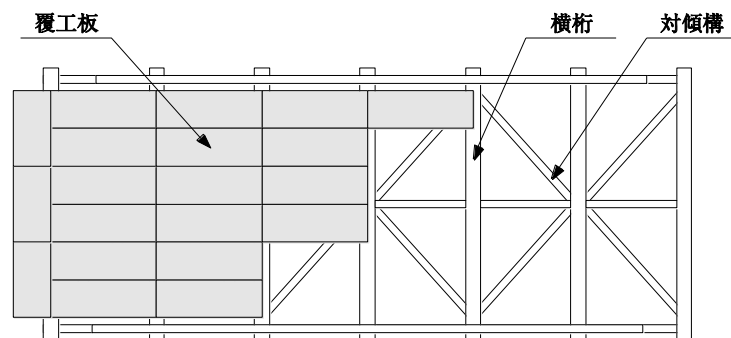

【平面図】


## ⑫ 汚濁防止フェンス工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、河川、海岸工事等に使用する汚濁防止フェンスの設置・撤去で、えい航距離 1km 以下に適用する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

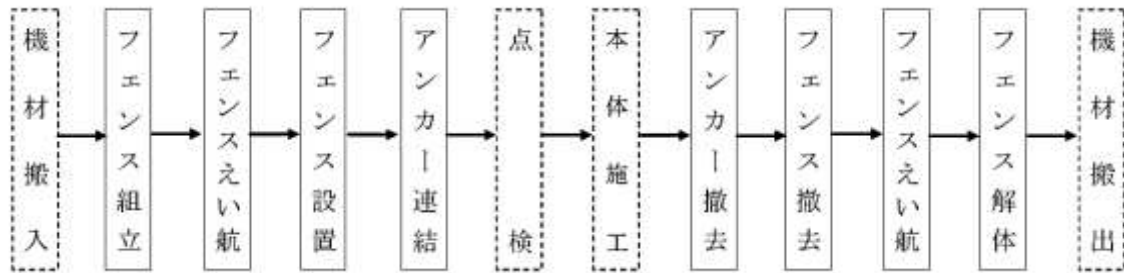

（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図 2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ）	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8m³(平積 0.6m³) 吊能力 2.9t	台	1	

（注） 1. バックホウは賃料とする。  
2. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 4. 施工歩掛

設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表 4.1 設置・撤去歩掛

（100m 当り）

名 称	規 格	単位	数 量	
			設 置	撤 去
土 木 一 般 世 話 役		人	1.3	0.9
普 通 作 業 員		〃	3.2	2.2
バ ッ ク ホ ウ （ ク ロ ー ラ 型 ） 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8m³(平積 0.6m³) 吊能力 2.9t	日	1.3	0.9
諸 雑 費 率		%	3	

（注） 1. 上表には、1km までのフェンスえい航作業を含むものとし、えい航の有無にかかわらず適用できるものとする。  
2. 諸雑費は、船外機船に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。ただし、現場条件により、これより難しい場合は、別途考慮する。

## 5. 使用材料

アンカー工(アンカーブロック、アンカーワイヤ)の費用として、フェンス賃料の 10%を計上することを標準とする。

## 6. 内訳書及び単価表

## (1) 汚濁防止フェンス工内訳書

SWB253010

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 設 置		m		単価表(2)
汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 撤 去		〃		〃
フ ェ ン ス 賃 料		〃		
ア ン カ ー 工		式	1	フェンス賃料×0.10
諸 雑 費		〃	1	
計				

## (2) 汚濁防止フェンス設置・撤去 100m 当り単価表

SWB253020

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1
普 通 作 業 員		〃		〃
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 ) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³) 吊能力2.9t	日		表 4.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 4.1
計				

## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
バ ッ ク ホ ウ ( ク ロ ー ラ 型 )	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³) 吊能力2.9t	機-28	運転労務数量 → 1.00 燃 料 消 費 量 → 83 機械賃料数量 → 1.03

## ⑬ 仮囲い設置・撤去工（建地－E）

## ⑬－1 仮囲い設置・撤去工

## 1. 適用範囲


本資料は、建設工事現場における仮囲いの設置及び撤去に適用する。ただし、塗装及び機材搬出入用等のゲートには適用しない。

表1.1 適用範囲

項 目	適 用 範 囲
基 礎 形 式	丸パイプ土中打込式
囲 い 高 さ	3m

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。



（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

図2-1 施工フロー

## 3. 日当り編成人員

日当り編成人員は、次表を標準とする。

表3.1 日当り編成人員（人）

土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員
1	5

## 4. 日当り施工量

日当り施工量は、次表を標準とする。

表4.1 日当り施工量（m/日）

施 工 区 分	単 位	設 置	撤 去
日 当 り 施 工 量	m	35	49

## 5. 諸雑費

諸雑費は、設置及び撤去における、ハンマ、ラチェットレンチ、脚立、フックボルト、クランプ等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表5.1 諸雑费率（%）

諸 雑 費 率	10
---------	----

## 6. 仮設材損料

仮囲い設置・撤去工に使用する仮設材損料（供用日当り損料）は、次表を標準とする。

表 6.1 仮囲い 10m 当り仮設材損料

名 称	単 位	損 料（円）	摘 要
仮囲い仮設材損料	供用日	147	仮囲い鉄板 丸パイプ

## 7. 単価表


## (1) 仮囲い設置及び撤去 10m 当り単価表

SWB253110

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表3.1, 表4.1
普 通 作 業 員		〃	5×10/D	〃
仮 設 材 損 料		供用日		
諸 雑 費		式	1	表5.1
計				

(注) D：日当り施工量

## 8. 参考図（仮囲い概念図）

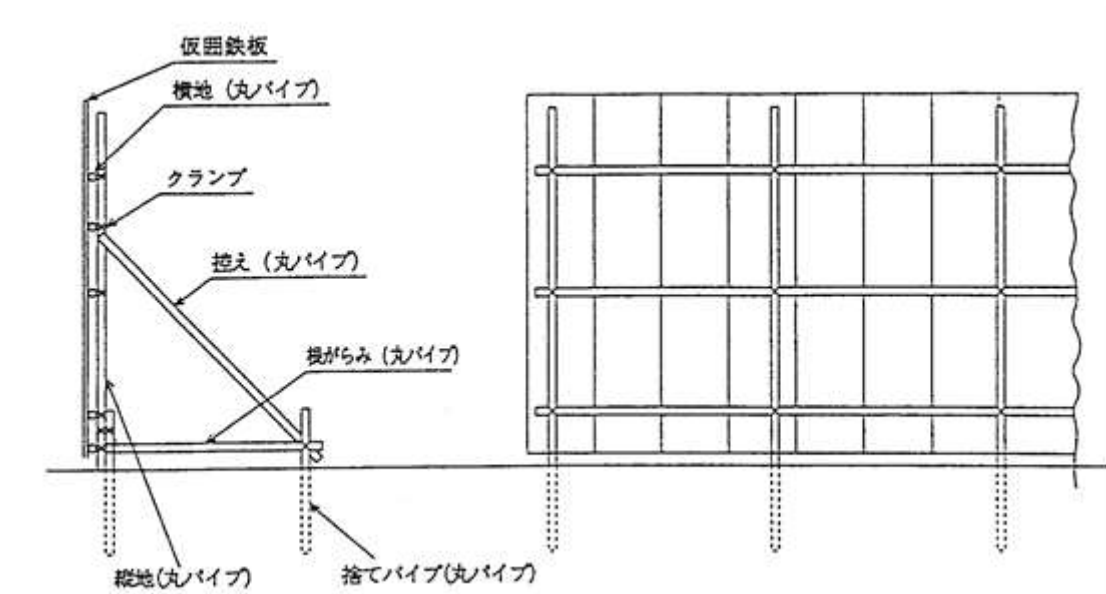

(注) 縦地及び横地等格子材は丸パイプ

## ⑭ 仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）（建地－E）

## 1. 適用範囲


本資料は、切土及び発破による落石又は飛石を防止するための仮設防護柵の設置・撤去に適用する。

ただし、仮設防護柵の支柱はH形鋼とし、仮設防護柵の高さ（地上高）は、2.5～10m、支柱間隔1.5～4.0m及び根入長は2m以下のものとする。

## 2. 施工概要

## 2-1 施工フロー


施工フローは、下記を標準とする。

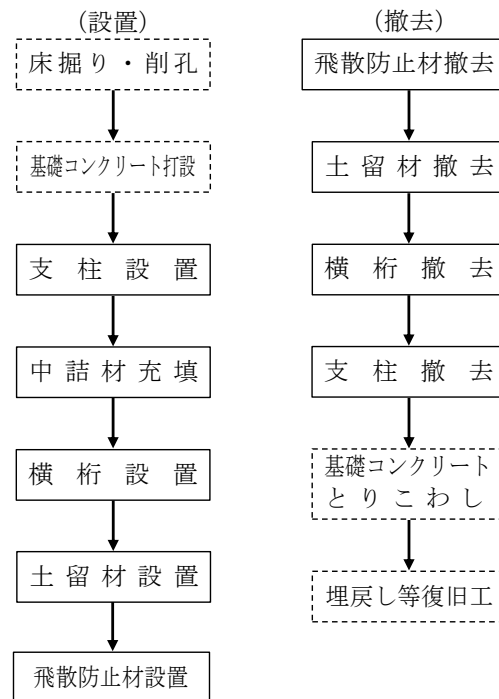


- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。  
 2. 横桁等設置・撤去の有無にかかわらず適用できる。

図2-1 施工フロー



## 2-2 参考図等

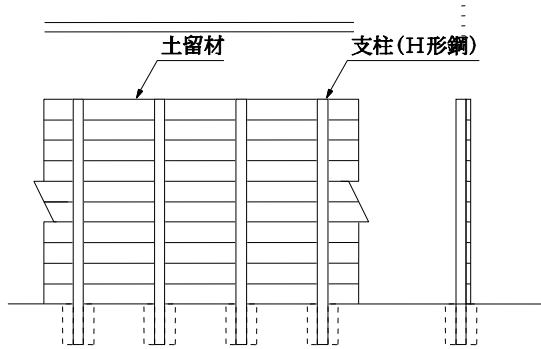

支柱形式	支柱	H形鋼
	横桁	無し
土留材施工内容		全面施工
飛散防止材施工内容		—

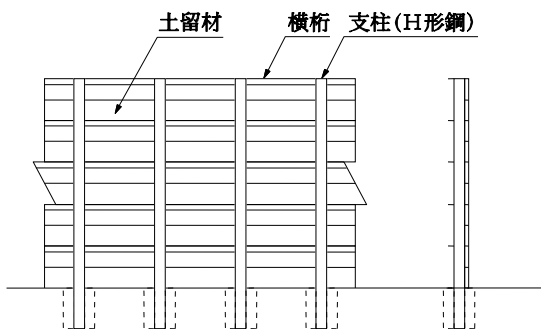

支柱形式	支柱	H形鋼
	横桁	有り
土留材施工内容		土留全面 又は 土留及び 飛散防止材 併用施工
飛散防止材施工内容		

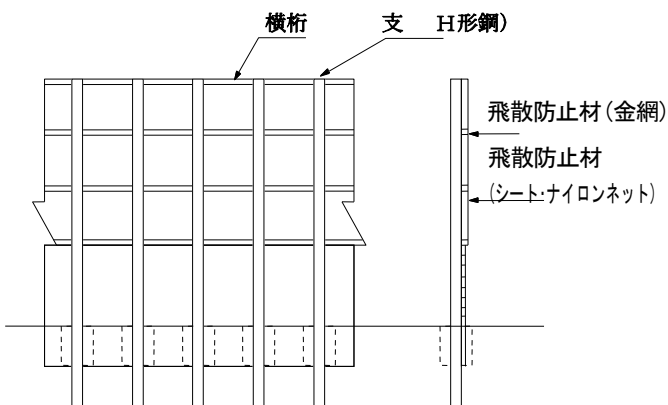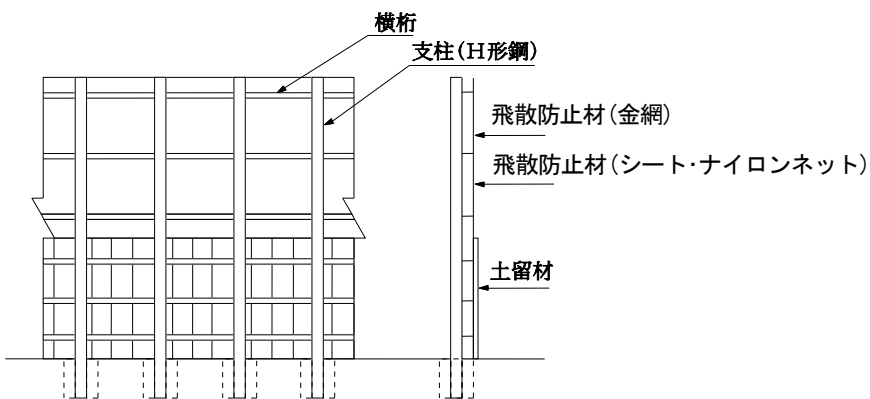

支柱形式	支柱	H形鋼
	横桁	有り
土留材施工内容		—
飛散防止材施工内容		全面施工



## 3. 施工歩掛

## 3-1 機種を選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種を選定

機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 10t吊	台	1	仮設材吊込用
高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	〃	1	切土及び発破防護柵工用 仮設足場

(注) 1. ラフテレーンクレーン及び高所作業車は、賃料とする。  
2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途選定する。

## 3-2 日当り編成人員

切土及び発破防護柵の設置・撤去作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。

表 3. 2 日当り編成人員 (人/日)

作 業 区 分	土木一般世話役	と び 工	普 通 作 業 員
設 置	1	1	2
撤 去	1	1	2

## 3-3 日当り施工量

日当り施工量 (D) は、次表を標準とする。

表 3. 3 日当り施工量(D) (m<sup>2</sup>)

作 業 区 分	設 置	撤 去
日当り施工量 (D)	70	109

## 3-4 諸雑費

諸雑費は、中詰材、溶接棒、電気グラインダー研削板、アセチレンガス、酸素ガス、番線、電気グラインダー損料、電気溶接機運転経費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3. 4 諸雑费率 (%)

作 業 区 分	設 置	撤 去
諸 雑 費 率	11	13

(注) 中詰材の施工の有無及び中詰材種類にかかわらず適用できる。

## 3-5 材料使用量

飛散防止材(金網、シート・ナイロンネット)の使用量は、継重ね量を見込み、次式による。

使用量 (m<sup>2</sup>) = 設計面積 (m<sup>2</sup>) × (1 + K) ……式 3.1

K : ロス率

表3. 5 ロス率(K)

材 料 種 別	ロ ス 率
金 網	+0.04
シート・ナイロンネット	+0.09

## 4. 内訳書及び単価表

(1) 切土及び発破防護柵の設置・撤去 100m<sup>2</sup> 当り内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
切土及び発破防護柵の設置		m <sup>2</sup>	100	単価表(2)
切土及び発破防護柵の撤去		m <sup>2</sup>	100	単価表(2)
計				

(2) 切土及び発破防護柵の設置・撤去 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB253311

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表 3.2, 表 3.3
と び 工		〃	1×100/D	〃
普 通 作 業 員		〃	2×100/D	〃
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 10t 吊	日	1×100/D	表 3.1, 〃 機械賃料
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ 12m	〃	1×100/D	〃 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 3.4
計				

D：日当り施工量（m<sup>2</sup>/日）

## (3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ 12m	機-28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 28 機械賃料数量 → 1.07

## ⑮ 濁水処理工（一般土木工事）（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、一般土木工事（ダム・トンネル及び浚渫工事は除く）における濁水処理工に適用する。

## 1-1 濁水処理設備


濁水処理設備は機械処理沈殿方式とし、濁水処理設備能力は30～60, 100m<sup>3</sup>/hに適用する。なお、濁水処理設備能力30～60, 100m<sup>3</sup>/h以外を使用する場合は別途考慮する。

## 1-2 使用薬剤

使用薬剤は、無機凝集剤、高分子凝集剤、炭酸ガスの3種類使用を標準とする。なお、使用数量については、別途計上する。

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

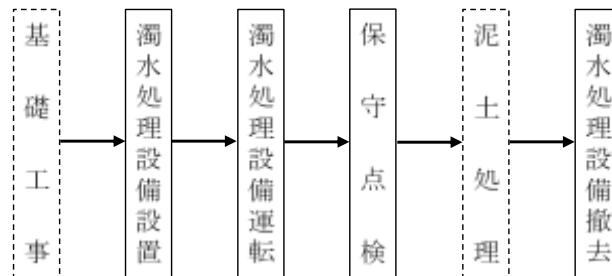

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 濁水処理設備の運転時間は、運転日当り8時間を標準とする。  
 なお、強制排水ポンプが必要な場合は、別途計上する。

図2-1 施工フロー

## 3. 施工歩掛

## 3-1 濁水処理設備設置・撤去

濁水処理設備設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。

表3.1 濁水処理設備設置・撤去歩掛 (1箇所当り)

名 称	規 格	単位	30～60m <sup>3</sup> /h		100m <sup>3</sup> /h	
			設置	撤去	設置	撤去
土木一般世話役		人	3	2	4	3
電 工		〃	4	1	5	1
設 備 機 械 工		〃	8	5	9	6
普 通 作 業 員		〃	5	2	6	4
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1	1	2	2

- (注) 1. 上屋の設置・撤去及び設備の基礎については、上記歩掛に含まない。  
 2. 上記歩掛には、設備の調整に要する費用を含む。  
 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

## 3-2 濁水処理設備運転

濁水処理装置は、損料とする。

## 3-3 濁水処理設備の保守点検

保守点検の歩掛は、次表を標準とする。

表3.2 濁水処理設備保守点検歩掛 (1回当たり)

名 称	単位	数量
設 備 機 械 工	人	0.1
普 通 作 業 員	〃	0.3

- (注) 1. 濁水処理設備の保守点検は、濁水処理設備運転日に1回実施を標準とする。  
2. 保守点検は、濁水処理設備の日常の運転にかかわる全ての保守・点検を含む。

## 3-4 泥土処理作業

泥土処理作業については、現場条件により別途計上する。

## 4. 単価表

## (1) 濁水処理設備設置 1箇所当り単価表

SWB253510

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1
電 工		〃		〃
設 備 機 械 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t 吊	日		表 3.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (2) 濁水処理設備撤去 1箇所当り単価表

SWB253510

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1
電 工		〃		〃
設 備 機 械 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t 吊	日		表 3.1 機械賃料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (3) 濁水処理設備保守・点検 1 回当り単価表

SWB253520

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
設 備 機 械 工		人	0.1	表 3.2
普 通 作 業 員		〃	0.3	〃
諸 雑 費		式	1	
計				

## (4) 濁水処理設備 1 日当り単価表

SWB253530

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
電 力 料		kWh		
濁 水 処 理 装 置 損 料	各 種	日	1	機械損料
諸 雑 費		式	1	
計				

## (5) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
濁 水 処 理 装 置 [ ポ ー タ ブ ル 型 ・ 機 械 処 理 沈 澱 方 式 ]	処理能力 30m <sup>3</sup> /h 処理能力 40m <sup>3</sup> /h 処理能力 60m <sup>3</sup> /h 処理能力 100m <sup>3</sup> /h	機-14	電力消費量 → 45 電力消費量 → 88 電力消費量 → 104 電力消費量 → 112

## ⑩ 敷鉄板設置・撤去工（建地－Ⅰ）


## 1. 適用範囲

本資料は、工事用道路等において、軟弱地盤等により工事用車両の通行や重機の移動に支障がある場合の敷鉄板設置・撤去作業に適用する。


## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。

## ①敷鉄板設置

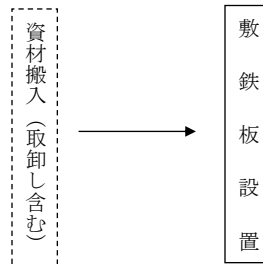

## ②敷鉄板撤去

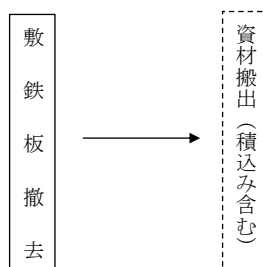

- (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。  
 2. 敷鉄板設置には、位置決め、擦り付け作業等を含む。  
 3. 敷鉄板の接合作業は、本歩掛の対象外とする。

図 2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	敷 鉄 板	
		設 置	撤 去
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8m³ (平積 0.6m³) 吊能力 2.9t	○	○

- (注) 1. バックホウは、賃料とする。  
 2. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。

## 4. 施工歩掛

## 4-1 編成人員

敷鉄板設置・撤去における日当り編成人員は、次表を標準とする。

表4.1 日当り編成人員 (人/日)

使用機械	土木一般世話役	とび工	普通作業員
バックホウ (クローラ型)	1	1	1

## 4-2 日当り施工量

日当り施工量は、次表を標準とする。

表4.2 日当り施工量

作業種別	単位	バックホウ (クローラ型)
設置	m <sup>2</sup>	656
撤去	m <sup>2</sup>	701

(注)敷鉄板の溶接やガス切断等の作業が必要な場合は、別途計上する。

## 5. 諸雑費

諸雑費は、設置及び撤去における、吊金具及びワイヤロープの費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表5.1 諸雑费率 (%)

諸雑费率	1
------	---

## 6. 単価表

(1) 敷鉄板設置 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB253610

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	1×100/D	表4.1, 表4.2
とび工		〃	1×100/D	〃
普通作業員		〃	1×100/D	〃
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	日	100/D	表4.2 機械賃料
諸雑費		式	1	表5.1
計				

(注) D: 日当り施工量

(2) 敷鉄板撤去 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB253611

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表 4. 1, 表 4. 2
と び 工		〃	1×100/D	〃
普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4. 2 機械賃料
諸 雑 費		式	1	表 5. 1
計				

(注) D：日当り施工量

(3) 敷鉄板賃料1枚当り単価表

SWB253630

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
敷 鉄 板 賃 料		枚・日		必要日数を計上
整 備 費		枚	1	必要な場合計上
不 足 分 弁 償 金		t		必要量を計上
諸 雑 費		式	1	
計				

(4) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力 2.9t	機一28	<b>【設置】</b> 運転労務数量 → 1.00 燃 料 消 費 量 → 112 機械賃料数量 → 1.06 <b>【撤去】</b> 運転労務数量 → 1.00 燃 料 消 費 量 → 112 機械賃料数量 → 1.06



## ⑪ 防塵処理工（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、工事施工に伴う防塵対策の内、現道工事、仮道（切替，工事用含む），又は現道を運搬作業に使用するとき等の散水車による防塵処理を行う場合に適用する。

なお，塩化カルシウム散布等による防塵処理を行う場合は別途考慮する。

## 2. 施工概要

施工フローは，次図下記を標準とする。




図 2-1 施工フロー

## 3. 機種の選定

機械・規格は，次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	機種・規格
散 水 車	トラック架装型 5,500～6,500ℓ

## 4. 施工歩掛

## 4-1 散水作業

散水は1回1.0ℓ/㎡を標準とする。

1回当たりの散水作業時間は次式による。

$$1 \text{ 回当たりの散水作業時間} = 1.0 \times \frac{1}{Q} \times A \quad (\text{h/回})$$

Q：時間当り散水量(ℓ/h)

A：散水面積 (㎡)

散水面積は，原則として1車線当りW＝3.0mとして算出する。

$$A = L \times W$$

L：作業1回当たりの対象延べ路線延長 (m)

W：1車線当りの散水幅

## 4-2 時間当り散水量（Q）

散水作業の時間当り散水量の算定は、次式による。

$$Q = \frac{60 \times q}{cm}$$

q：散水車のタンク容量（ℓ），なお，6,500ℓを標準とする。

cm：1サイクル当り所要時間（分）

## 4-3 1サイクル当り所要時間（cm）

$$cm = \frac{2 \times d}{V} + t_1 + t_2 + t_3 + t_4$$

d：給水場所までの片道距離（m）

V：走行速度（m/分）

t<sub>1</sub>：給水ホース取付・取外し時間（分）

t<sub>2</sub>：給水時間（分）

t<sub>3</sub>：待機・現場待時間（分）

t<sub>4</sub>：散水時間（分）

## (1) 走行速度（V）

走行速度は、次表とする。

表 4. 1 走行速度 (m/分)

走行速度	500
------	-----

(2) 給水ホース取付け・取外し時間（t<sub>1</sub>）

給水ホース取付け・取外し時間は、次表とする。

表 4. 2 給水ホース取付・取外し時間 (分)

給水ホース取付・取外し時間	5
---------------	---

(3) 給水時間（t<sub>2</sub>）

給水時間は、次表とする。

表 4. 3 給水時間 (分)

給 水 時 間	18
---------	----

(4) 待機・現場待時間（t<sub>3</sub>）

待機・現場待時間は、次表とする。

表 4. 4 待機・現場待時間 (分)

待機・現場待時間	5
----------	---

(5) 散水時間（t<sub>4</sub>）

散水時間は、次表とする。

表 4. 5 散水時間 (分)

散 水 時 間	10
---------	----

## 5. 単価表

## (1) 防塵処理（散水作業）1 回当り単価表

SWB253710

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
散 水 車 運 転	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	h	$1.0 \times 1/Q \times A$	
諸 雑 費		式	1	
計				

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項
散 水 車	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	機－6	


## ⑱ 法面工（仮設用モルタル吹付工）（建地－E）

## 1. 適用範囲

本資料は、もたれ式擁壁等の掘削部の施工で危険防止のために仮モルタルを吹付ける場合に適用する。  
なお、吹付厚は3cmを標準とする。

## 2. 施工概要

施工フローは次図のとおりとする。

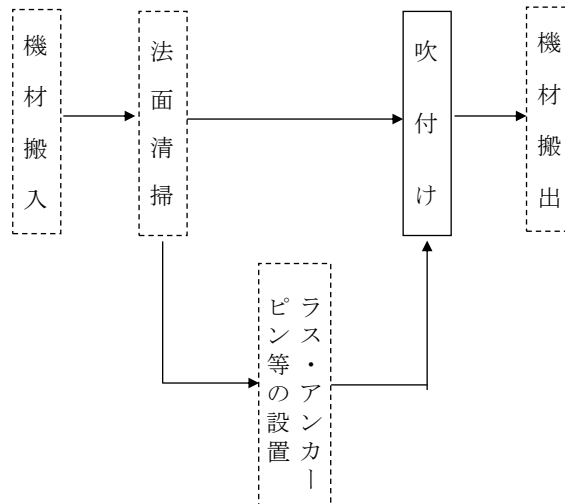

（注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## 3. 機種の選定

使用する機械の機種・規格は、次表を標準とする。

表 3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	台数	摘 要
モルタルコンクリート吹付機 （ 法 面 用 ）	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2 m³/h 所要空気量 10～19m³/min	1	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量 10.5～11.0m³/min 吐出圧力 0.7MPa	1	
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型） 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量（50/60Hz）37/45kVA	1	モルタルコンクリート吹付機、ベルトコンベヤ（ポータブル）、計量器等の動力源
ホ イ ール ロ ード	普通・排出ガス対策型（第2次基準値） 山積 0.34m³	1	骨材投入用
計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1 槽・2 桿	1	
ベ ル ト コ ン ベ ヤ （ ポ ータ ブ ル ）	モータ駆動 機長 7m ベルト幅 350mm	2	材料の投入用
小 型 渦 巻 ポ ンプ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50mm 全揚程 10m	1	揚水用 必要に応じて計上

（注） 空気圧縮機、発動発電機及びホイールローダは賃料とする。

## 4. 施工歩掛

## 4-1 仮設用モルタル吹付工

仮設用モルタル吹付工歩掛は次表を標準とする。

表 4. 1 仮設用モルタル吹付工歩掛 (100m<sup>2</sup> 当り)

名 称	単位	数 量
		吹付厚 3cm
土 木 一 般 世 話 役	人	0.50
法 面 工	〃	2.0
特 殊 作 業 員	〃	0.80
普 通 作 業 員	〃	1.3
モルタルコンクリート吹付機 運 転	h	4.4
空 気 圧 縮 機 運 転	日	0.69
発 動 発 電 機 運 転	〃	0.69
ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転	〃	0.37
計 量 器 損 料	〃	0.69
ベルトコンベヤ (ポータブル) 損 料	〃	1.4
小 型 渦 巻 ポ ン プ 損 料	〃	0.69
諸 雑 費 率	%	4

(注) 1. 上表は仮設ロープにより施工する場合の歩掛である。

2. 本歩掛にはモルタルコンクリート吹付機、空気圧縮機、ベルトコンベヤ (ポータブル) 等の据付撤去及び吹付材料の現場内小運搬を含む。
3. 目地、水抜きパイプ設置の有無にかかわらず本歩掛を適用できる。  
なお、目地、水抜きパイプを設置する際は、材料は別途計上する。
4. 諸雑費は、送水ポンプ損料、水槽損料、骨材ホッパ損料、吹付機のホース、ノズル及び仮設ロープ、ライフライン (仮設ロープの予備)、仮設ロープ・ライフライン固定用の単管、クランプ等の費用として労務費、機械運転経費、機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 4-2 ラス張工

ラス張が必要な場合は、法面清掃の有無にかかわらず「第Ⅵ編第1章④-2 吹付砕工」により計上する。

## 5. 材料の使用数量

吹付材料の使用数量は、次式による。

$$\text{使用数量 (m}^3\text{)} = \text{設計数量} \times (1 + K) \quad \cdots \cdots \text{式 5. 1}$$

K : ロス率

表 5. 1 ロス率(K)

名 称	ロス率	摘 要
吹付材料	+0.27	はね返り損失及び混合の損失を含む

吹付材料の単価は、次式による。

$$\text{吹付材料単価 (m}^3\text{)} = 0.42\text{t} \times \text{普通ポルトランドセメント単価} + 1.24\text{m}^3 \times \text{砂単価} \quad \cdots \cdots \text{式 5. 2}$$

## 6. 単価表

(1) 仮設用モルタル吹付工 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB254010

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	表 4.1
法 面 工		〃	2.0	〃
特 殊 作 業 員		〃	0.80	〃
普 通 作 業 員		〃	1.3	〃
吹 付 材 料		m <sup>3</sup>		表 5.1, 式 5.1, 5.2
目 地 材		m <sup>2</sup>		必要に応じて別途計上する
水 抜 き パ イ プ		m		〃
モルタルコンクリート吹付機 ( 法 面 用 ) 運 転	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2 m <sup>3</sup> /h 所要空気量 10～19m <sup>3</sup> /min	h	4.4	表 4.1, 機械損料
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ 型 (超低騒音型)・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 吐出量 10.5～ 11.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧力 0.7MPa	日	0.69	表 4.1, 機械賃料
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動 (超低騒 音型) 排出ガス対策型 (第 3 次基 準値) 定格容量 (50/60Hz) 37/45kVA	〃	0.69	〃
ホ イ ー ル ロ ー ダ 運 転	普通・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 山積 0.34m <sup>3</sup>	〃	0.37	〃
計 量 器	骨材累加算・機械式 300kg×1 槽・2 桿	〃	0.69	表 4.1, 機械損料
ベ ル ト コ ン ベ ヤ ( ポ ー タ ブ ル )	モータ駆動 機長 7m ベルト幅 350mm	〃	1.4	〃
小 型 渦 巻 ポ ン プ	呼水・片吸込・モータ駆動型 口径 50mm 全揚程 10m	〃	0.69	表 4.1, 機械損料 揚水用 必要に応じて 別途計上する
諸 雑 費		式	1	表 4.1
計				

## (2) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
モルタルコンクリート吹付機 ( 法 面 用 )	湿式 モータ駆動 能力 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量 10～19m <sup>3</sup> /min	機－15	
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ 型 (超低騒音型)・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 吐出量 10.5～ 11.0 m <sup>3</sup> /min 吐出圧力 0.7MPa	機－16	燃料消費量 → 81 機械賃料数量 → 1.71
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 (超低騒 音型) 排出ガス対策型 (第 3 次基 準値) 定格容量 (50/60Hz) 37/45kVA	機－16	燃料消費量 → 36 機械賃料数量 → 1.71
ホ イ ー ル ロ ー ダ	普通・排出ガス対策型 (第 2 次基準値) 山積 0.34m <sup>3</sup>	機－29	運転労務数量 → 0.80 燃料消費量 → 15 機械賃料数量 → 1.58

## ⑱ 交通誘導警備員 （建地－Ⅰ）

### 1. 適用範囲

本資料は、交通誘導警備員及び建設機械の誘導員等の交通管理を行う場合に適用する。

### 2. 計上区分

当該工事の制約条件を勘案した交通規制パターン等による 1 日当たりの交通誘導警備員の配置人員をもとに、工事期間内で配置される人数を計上する。

なお、休憩・休息时间についても交通誘導を行う場合には、交替要員も交通誘導警備員の人数に含めて計上する。

また、夜間勤務や 2 交替制勤務等を行う場合は、「第Ⅰ編第 2 章①直接工事費 3. 労務費」に基づき、労務費の補正を行うこととし、これによりがたい場合は別途考慮する。
